




SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.
PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA
TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
DUITAMA SEDE
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIANTE: YEISON GERARDO RIVERA P.

BITACORA SEMANAL OBRA
SEMANA N°1
HOJA 2
Agosto



ANCLAR EN LOS EXTREMOS VARILLAS DE 1.00m
Y TRASLAPAR 0.60m EL RESTO DEL REFUERZO.


DETALLE COLUMNETA S=12x25
Esc. _____ 1 : 2 5

Descripción: amarre, armado de columnetas y formateo de columnetas

Descripción: detalle de traslapos (eses) para columnetas



Descripción: mampostería en bloque numero 5 se da inicio por muro de patio.

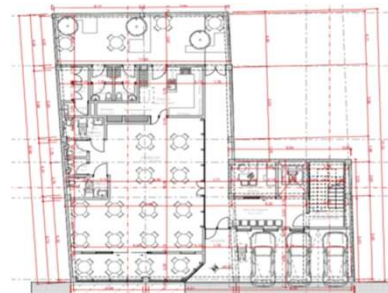

Descripción: mampostería bloque n° 5

se arma columnetas y se verifica el acero.

Se hizo el armado de formaletas para columnetas.

Se verifica las formaletas a la hora de instalarse de que esten a plomo y de que cumpla con los parametros establecidos en el plano

OBSERVACIONES:

se reviso en el plano el trazo de vigas y viguetas

HORAS DIARIAS TRABAJADAS

MAÑANA:

TARDE:

ACCIDENTES LABORALES

SI

NO

X

Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.
PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA
TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO SEDE
FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL
ESTUDIANTE: YEISON

BITACORA SEMANAL OBRA
SEMANA N°2
HOJA 3
Agosto



Descripción: mamposteria n° 5 comedor



Descripción: mamposteria n° 5 fachada



Descripción: mamposteria en bloque numero 5 en pasillos y suministro figurada y amarre de acero



Descripción: mamposteria en consultorio

OBSERVACIONES:

- se arma columnetas y se verifica el acero.
- Se hizo el armado de formaletas para columnetas.
- Se verifica las formaletas a la hora de instalarse de que estén a plomo y de que cumpla con los parametros establecidos en el plano
- se reviso en el plano el trazo de vigas y viguetas
- se revisa la mamposteria de que este a nivel, aplomada y de que cumpla con lo establecido en el plano, respetando puertas y ventanas.
- se controlo el curado de elementos estructurales mediante riego continuo.

HORAS DIARIAS TRABAJADAS	
MAÑANA:	
TARDE:	
ACCIDENTES LABORALES	
	SI
	NO
Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua	



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.
PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA
TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
SEDE DUITAMA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIANTE: YEISON GERARDO RIVERA P.

BITACORA SEMANAL OBRA

SEMANA N°3

HOJA 4

Agosto



Descripción: SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa



Descripción: SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa



Descripción: VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI).



Descripción: VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)

OBSERVACIONES:

se arma vigas, viguetas y se verifica el acero.

Se hizo el armado de formaletas para viguetas.

Se verifica las formaletas a la hora de instalarse de que estén a aplomo y de que cumpla con los parámetros establecidos en el plano

se reviso en el plano el trazo de vigas y viguetas

se controlo el curado de elementos estructurales mediante riego continuo.

mampostería bloque n° 5 zonas faltantes

HORAS DIARIAS TRABAJADAS	
MAÑANA:	
TARDE:	
ACCIDENTES LABORALES	
	SI
	NO
	X

Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES LIMITADA.
 PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA
 TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23




UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 SEDE
 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
 ESTUDIANTE: YEISON

BITACORA SEMANAL OBRA
 SEMANA N°4
 HOJA 5
 Agosto



Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA 3/4", INCLUYE RIGIDIZADOR 5/8" Y VARILLAS EMBEBIDAS 5/8

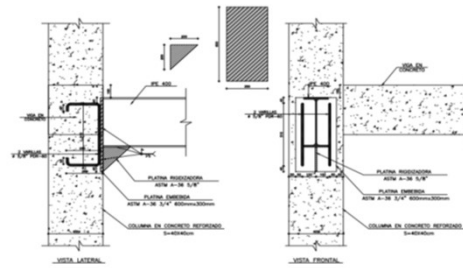

Descripción: detalle de instalacion de platina



Descripción: CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS



Descripción: destesterear viguetas y se controla el curado

OBSERVACIONES:

se arma vigas y se verifica el acero, las medidas de l misma según el plano.

Se hizo el armado de formaletas para columnetas.

Se retiran las formaletas de las viguetas y se inspecciona de que no hayan quedado hormigoneadas

se reviso en el plano el traso de vigas y viguetas

se controlo el curado de elementos estructurales mediante riego continuo.

mamposteria bloque n° 5 zonas faltantes

HORAS DIARIAS TRABAJADAS	
MAÑANA:	
TARDE:	
ACCIDENTES LABORALES	
SI	
NO	X
Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua	



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.

PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA

TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO SEDE

FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL

ESTUDIANTE: YEISON

BITACORA SEMANAL OBRA

SEMANA N°1

HOJA 6

Septiembre



Descripción: formateado de vigas +3.20



Descripción: formaleta lateral de viga



Descripción: formaleta de fachada

Descripción:

se formatea revisando los niveles y diámetros de las vigas según plano.

OBSERVACIONES:

HORAS DIARIAS TRABAJADAS

MAÑANA:

TARDE:

ACCIDENTES LABORALES

SI

NO

X

Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua



Descripción: ensayo de slum



Descripción: vaciado de concreto en vigas



Descripción: aramado de escalera cona cero de 60.000 psi



Descripción: armado de escalera

OBSERVACIONES:

HORAS DIARIAS TRABAJADAS		
MAÑANA:		
TARDE:		
ACCIDENTES LABORALES		
	SI	
	NO	X
<hr/> Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua		



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.
PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA
TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO SEDE
FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL
ESTUDIANTE: YEISON

BITACORA SEMANAL OBRA
SEMANA N°3
HOJA 8
Septiembre



Descripción: isaje de ipe 300 y 400



Descripción: instalacion de platina steel y malla electrosoldada para placa de concreto



Descripción: instalacion de canes



Descripción: instalacion de acero en columnas +3.20 a 6.40

se realiza curado de plancha
se realizo la instalacion de canes

OBSERVACIONES:

HORAS DIARIAS TRABAJADAS		
MAÑANA:		
TARDE:		
ACCIDENTES LABORALES		
	SI	
	NO	X
Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua		



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.
PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA
TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO SEDE
FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL
ESTUDIANTE: YEISON

BITACORA SEMANAL OBRA
SEMANA N°4
HOJA 9
Septiembre




Descripción: formateo de columnas



Descripción: vaciado de concreto en columnas



Descripción: muros no mayores a 1.30 m

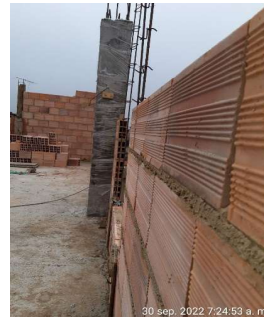

Descripción: armado de columnetas

OBSERVACIONES:

mamposteria bloque n° 5 zonas faltantes

HORAS DIARIAS TRABAJADAS		
MAÑANA:		
TARDE:		
ACCIDENTES LABORALES		
	SI	
	NO	X
<p>Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua</p>		



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.

PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA

TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO SEDE

FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL

ESTUDIANTE: YEISON

BITÁCORA SEMANAL OBRA

SEMANA N°1

HOJA 10

Octubre



4 oct. 2022 4:47:40 p. m.
Obra hogar vida Toca

Descripción: Amarre de acero en vigas +6.40



5 oct. 2022 7:16:13 a. m.
Obra hogar vida Toca

Descripción: se da continuidad con la actividad de pegue de muros en bloque



7 oct. 2022 5:06:30 p. m.

Descripción: Se da continuidad a pegue de muro en bloque



8 oct. 2022 7:19:49 a. m.

Descripción: se da continuidad a amarre de acero en vigas

OBSERVACIONES:

HORAS DIARIAS TRABAJADAS

MAÑANA:

TARDE:

ACCIDENTES LABORALES

SI

NO

X

Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.

PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA

TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO SEDE

FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL

ESTUDIANTE: YEISON

BITACORA SEMANAL OBRA

SEMANA N°2

HOJA 11

Octubre



Descripción: Se da continuidad a pegue de muro en bloque



Descripción: se instalan formaletas para columnas y viguetas y de igual manera se hace el vaciado de concreto



Descripción: se da continuidad con la actividad de pegue de muro en bloque



Descripción: figurado de acero para columnetas

OBSERVACIONES:

HORAS DIARIAS TRABAJADAS

MAÑANA:

TARDE:

ACCIDENTES LABORALES

SI

NO

X

Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES
LIMITADA.
PROYECTO HOGAR VIDA EN EL MUNICIPIO DE TOCA
TOCA - BOYACÁ Calle 4 # 8-23



UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO SEDE
FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL
ESTUDIANTE: YEISON

BITÁCORA SEMANAL OBRA
SEMANA N°3 HOJA 12
Octubre



Descripción: se da continuidad con amarre de aceros

Descripción:



Descripción: amarre de acero en vigas +6.40



Descripción: instalacion de formaleta para columetas

OBSERVACIONES:

HORAS DIARIAS TRABAJADAS	
MAÑANA:	5 HORAS
TARDE:	5 HORAS
ACCIDENTES LABORALES	
	SI
	NO X
Firma: Ing. Yesid Alonso Fagua	
