

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE REPARACIÓN COLECTIVA
EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA
SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**

PASANTÍA

EN EL MARCO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL “ESTADO JOVEN”

PRESENTADO POR:

JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL

INGENIERIA CIVIL

BOGOTÁ 2021

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE REPARACIÓN
COLECTIVA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA
DE LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**

PRESENTADO POR:

JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO

**PROYECTO DE GRADO EN LA MODALIDAD DE PASANTÍA
EN EL MARCO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL “ESTADO JOVEN”**

DIRECTORA

INGENIERA ALEXANDRA MORALES

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

INGENIERIA CIVIL

BOGOTÁ 2021

Nota de aceptación

Firma del jurado 1

Firma del jurado 2

DEDICATORIA

A todas las personas que han contribuido de diverso modo en el logro de este objetivo:
Familiares, compañeros de estudio y trabajo, docentes y amigos.

AGRADECIMIENTO

A todas las personas que han contribuido de diverso modo en el logro de este objetivo:
Familiares, compañeros de estudio y trabajo, docentes y amigos.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| 1. RESUMEN | 11 |
| 2. ABSTRACT..... | 12 |
| 3. INTRODUCCIÓN..... | 13 |
| 4. OBJETIVOS..... | 15 |
| 4.1 Objetivo general..... | 15 |
| 4.2 Objetivos específicos..... | 15 |
| 5. MARCO CONCEPTUAL..... | 16 |
| 5.1 Programa gubernamental “Estado Joven” | 16 |
| 5.2 Ley 1448 de 2011: Unidad para las Víctimas..... | 16 |
| 5.3 Misión de la Unidad para las Víctimas..... | 16 |
| 5.4 Visión de la Unidad para las Víctimas..... | 17 |
| 5.5 Organigrama de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas..... | 17 |
| 5.6 Subdirección de reparación colectiva de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 5.7 Reparación colectiva: ¿qué es la reparación colectiva?..... | 19 |
| 5.7.1 Sujetos de reparación colectiva..... | 20 |
| 5.8 Tipos de sujetos colectivos reconocidos en el ordenamiento legal..... | 21 |
| 5.8.1 Comunidades: campesinas y barriales (no étnicas) | 21 |
| 5.8.2 Comunidades o pueblos étnicos..... | 22 |
| 5.8.3 Organizaciones..... | 24 |
| 5.8.4 Grupos..... | 24 |
| 5.9 Medidas de reparación colectiva..... | 24 |
| 5.9.1 Medidas de restitución..... | 25 |
| 5.9.2 Medidas de rehabilitación psicosocial..... | 25 |
| 5.9.3 Medidas de satisfacción..... | 26 |
| 5.9.4 Garantías de no repetición..... | 27 |
| 5.9.5 Indemnización para sujetos étnicos..... | 28 |
| 5.10 Ruta de reparación colectiva..... | 29 |
| 5.11 Plan integral de reparación colectiva (PIRC) | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 6. ESTADO DEL CONOCIMIENTO | 37 |
| 6.1 Investigación internacional | 37 |
| 6.2 Investigación nacional | 38 |
| 7. METODOLOGÍA..... | 41 |
| 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES..... | 42 |
| 9. RESULTADOS OBTENIDOS..... | 43 |
| 9.1 Primer informe parcial de práctica..... | 43 |
| 9.2 Segundo informe parcial de práctica..... | 44 |
| 9.3 Tercer informe parcial de práctica..... | 45 |
| 9.4 Cuarto informe parcial de práctica..... | 46 |
| 9.5 Quinto informe parcial de práctica..... | 47 |
| 9.6 Informe final de práctica..... | 48 |
| 10. CONCLUSIONES..... | 50 |
| 11. RECOMENDACIONES..... | 51 |
| 12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 52 |
| 13. LISTA DE ANEXOS..... | 55 |

TABLA DE FIGURAS

| | |
|--|-----------|
| Figura 1. Organigrama de la Unidad para las Víctimas..... | 17 |
| Figura 2. Atributos de un sujeto de reparación colectiva..... | 20 |
| Figura 3. Atributos colectivos de comunidades y pueblos étnicos..... | 22 |
| Figura 4. Esquema de fases de la Ruta de Reparación colectiva..... | 30 |
| Figura 5. Modelo operativo para la implementación del programa de reparación colectiva..... | 32 |
| Figura 6. Esquema de un árbol de problemas..... | 33 |
| Figura 7. Cadena de valor del PIRC..... | 35 |
| Figura 8. Cronograma de actividades de pasantía en la UARIV..... | 42 |

TABLA DE TABLAS

| | |
|--|-----------|
| Tabla 1. Definición de territorio para comunidades étnicas en el ordenamiento jurídico colombiano | 23 |
| Tabla 2. Actividades y productos entregados del primer informe parcial de pasantía..... | 43 |
| Tabla 3. Actividades y productos entregados del segundo informe parcial de pasantía..... | 44 |
| Tabla 4. Actividades y productos entregados del tercer informe parcial de pasantía..... | 45 |
| Tabla 5. Actividades y productos entregados del cuarto informe parcial de pasantía..... | 46 |
| Tabla 6. Actividades y productos entregados del quinto informe parcial de pasantía..... | 47 |
| Tabla 7. Informe final de practica en la Unidad para las Victimas..... | 48 |
| Tabla 8. Visto bueno de supervisora y tutora de práctica en informe final..... | 49 |

1. RESUMEN

La mayoría de regiones de Colombia que padecieron los rigores del conflicto armado son regiones empobrecidas, y en las cuales constituye un enorme reto la formulación propia de proyectos básicos de infraestructura por la falta de formación profesional de sus habitantes, sin embargo, en algunos casos con mucho esfuerzo contratando los servicios de consultoría de ingeniería local, logran formular estudios y diseños de proyectos de infraestructura social y comunitaria que presentan ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para dar trámite a procesos de reparación colectiva, mediante los cuales se desembolsan recursos, representados en materiales de construcción y/o dotación de mobiliario para la ejecución de estos, dándose cumplimiento a la Ley 1448 del año 2011.

Dada la precariedad de las condiciones en las cuales se hace la formulación de los proyectos de infraestructura por parte de la mayoría de las comunidades, a lo cual se suma la cultura de actos de corrupción por parte de la dirigencia política en los diferentes niveles de la organización administrativa estatal, se hace necesaria la revisión y supervisión del desarrollo de estos proyectos para garantizar su adecuada ejecución.

2. ABSTRACT

The majority of regions of Colombia that suffered the rigors of the armed conflict are impoverished regions, and in which the formulation of basic infrastructure projects is a huge challenge due to the lack of professional training of its inhabitants, however, in some cases with a lot of effort hiring local engineering consulting services, they manage to formulate studies and designs of social and community infrastructure projects that they present before the Unit for Comprehensive Care and Reparation to Victims to process collective reparation processes, through which they disburse resources, represented in construction materials and / or provision of furniture for the execution of these, in compliance with Law 1448 of the year 2011.

Given the precariousness of the conditions under which the formulation of infrastructure projects is carried out by most of the communities, to which is added the culture of acts of corruption by the political leadership at the different levels of the State administrative organization, review and supervision of the development of these projects is necessary to ensure their proper execution.

3. INTRODUCCIÓN

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) nace para dar cumplimiento a la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” del año 2011. En el marco del desarrollo de sus objetivos misionales para realizar los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en el territorio nacional de Colombia, la Subdirección de Reparación Colectiva de la Entidad apoya con la entrega de materiales el desarrollo de proyectos de construcción de infraestructura social y comunitaria en el territorio nacional. El desarrollo sin supervisión técnica de los proyectos de Infraestructura social y comunitaria que se ejecutan en el marco de las medidas de reparación colectiva emprendidas con recursos del Estado, corre el grave riesgo de ser un foco de corrupción y despilfarro de los mismos, por este motivo debe ejercerse un riguroso control técnico desde el mismo aval para la viabilidad de la ejecución de los proyectos hasta su culminación, para garantizar el eficiente y adecuado empleo de los recursos estatales cumpliendo a cabalidad con el objetivo de llevar a feliz término los programas de reparación colectiva orientados a la restitución de derechos y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las comunidades que en la presente etapa de posconflicto en Colombia buscan retomar sus proyectos colectivos para el progreso social.

Por lo expuesto, la Subdirección de Reparación Colectiva de la UARIV cuenta con un equipo técnico conformado, entre otros, por profesionales en Ingeniería Civil encargados de estudiar la viabilidad y de aprobar la ejecución de las medidas de reparación colectiva orientadas a la construcción de obras de infraestructura social mediante la entrega de los materiales de construcción necesarios para el desarrollo de las obras.

En este contexto de necesidad de profesionales en el área de la ingeniería civil con conocimientos para el apoyo eficiente en la ejecución de las rutas de reparación colectiva establecidas por la entidad se abrió la plaza en concurso en el marco del programa gubernamental “Estado Joven” para un auxiliar del área de ingeniería civil que en modalidad de pasante conformara el grupo técnico apoyando la implementación de las rutas de reparación colectiva desde el área técnica.

El presente documento sintetiza la descripción de las actividades ejecutadas en el marco del desarrollo de la pasantía conformando el equipo técnico como apoyo a la Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Apoyar la ejecución de las medidas de reparación colectiva determinadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizando la supervisión técnica a los proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria formulados de manera conjunta entre la entidad y los sujetos de reparación colectiva en el territorio nacional de Colombia.

4.2 Objetivos específicos

- Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva

- Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

- Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad

- Realizar los reportes e informes técnicos para el seguimiento de avance de proyectos de Infraestructura en ejecución con el aval y apoyo de la Subdirección de Reparación Colectiva

- Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva

- Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 Programa gubernamental “Estado Joven”

El programa gubernamental “Estado Joven” es creado para dar cumplimiento a la Ley 1780 de 2016. Este programa es implementado por el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, constituye el medio para que estudiantes jóvenes del país, realicen prácticas profesionales en el sector público (Gobierno de Colombia, 2016).

5.2 Ley 1448 de 2011: Unidad para las Víctimas

Mediante la Ley 2078 del 8 de enero de 2021, se prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (La Ley 1448 de 2011) hasta el año 2031. La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un sistema integral para la protección, asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado en el país. Para lograr los objetivos de la Ley 1448 se creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad que a partir del año 2012 ha asumido la labor de articular los esfuerzos de todas las instituciones del país que se han puesto en marcha para ayudar a sanar las heridas que le han dejado a la sociedad colombiana varias décadas de conflicto armado (MIN. INTERIOR, 2012)

5.3 Misión de la Unidad para las Víctimas

En concordancia con la Ley 1448 de 2011 la UARIV ha asumido como misión liderar las acciones del Estado y la sociedad colombiana para atender y reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la construcción de paz (UARIV, 2014).

5.4 Visión de la Unidad para las Víctimas

Para el año 2031, la Unidad para las Víctimas será la entidad pública reconocida por su gestión propendente a la reconstrucción del tejido social, la consolidación de la paz y su labor de liderazgo en los procesos de reconciliación en el seno de la sociedad colombiana, mediante procesos de calidad, excelencia e innovación brindando atención, asistencia y reparación integral a toda la población afectada por el conflicto (UARIV, 2014).

5.5 Organigrama de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Figura 1. Organigrama de la Unidad para las Víctimas



Tomado de: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014

5.6 Subdirección de reparación colectiva de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

La Subdirección de Reparación Colectiva hace parte, junto a la Subdirección de Reparación Individual, de la **Dirección de Reparación** de la Unidad para las Víctimas en la que se realizan las gestiones interadministrativas para otorgar a las víctimas la reparación a la cual tienen derecho, en virtud de la Ley 1448 de 2011 (Artículo 21, Decreto 4802 de 2011).

De manera particular, la Subdirección de Reparación Colectiva se encarga de la ejecución y evaluación de las acciones que en materia de reparación a sujetos colectivos sean consideradas por la entidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso (Artículo 23, Decreto 4802 de 2011).

La Subdirección de Reparación colectiva se conforma por cuatro grupos interdisciplinarios que se articulan para el logro de la ejecución de las medidas de reparación a sujetos colectivos, estos grupos y sus enfoques son:

- **Étnico:** Encargado de la formulación y seguimiento de las medidas de reparación implementadas para sujetos colectivos étnicos.
- **No étnico:** Encargado de la formulación y seguimiento de las medidas de reparación implementadas para sujetos colectivos no étnicos.
- **Organizaciones y grupos:** Encargado de la formulación y seguimiento de las medidas de reparación implementadas para sujetos colectivos de organizaciones y grupos.
- **Grupo Transversal:** Conformado por la **unidad financiera** (a cargo del registro y consolidación de las inversiones monetarias de cada medida de reparación colectiva

ejecutada), la **unidad de gestión de proyectos** (encargada de la supervisión y el apoyo a la eficiente gestión de las medidas de reparación) y la **unidad de infraestructura** (encargada de la evaluación y verificación de viabilidad para la ejecución de proyectos de infraestructura comunitaria en el marco de la implementación de las medidas de reparación).

5.7 Reparación colectiva: ¿qué es la reparación colectiva?

La reparación colectiva es un conjunto de medidas a las que tienen derecho los sujetos colectivos que hayan padecido cualquiera los eventos definidos en el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, que implican las afectaciones que configuran la categoría de victimización para un sujeto colectivo:

- a) Las afectaciones debidas a la violación de derechos colectivos

- b) La vulneración grave y manifiesta de los derechos individuales sufridas por miembros de los colectivos

- c) La afectación del colectivo por la vulneración de derechos individuales

La reparación colectiva tiene como propósito la dignificación y reconocimiento de organizaciones, grupos sociales, y comunidades que han sufrido afectaciones por hechos de violencia. Con la ejecución de las medidas de reparación colectiva se logran los objetivos de reconstruir el tejido social, recuperar por parte de las comunidades la confianza en el Estado, y el restablecimiento del Estado Social de Derecho (UARIV, 2014).

5.7.1 Sujetos de reparación colectiva

Un sujeto colectivo es un grupo de personas que comparten una matriz de atributos comunes como producto de un proceso histórico previo a la ocurrencia de los hechos de violencia en el marco del conflicto armado en Colombia que determinan su categoría de victimización. Fundamentalmente son cinco atributos o características: El autorreconocimiento y reconocimiento por terceros (constatable con anterioridad a los hechos de violencia), un proyecto colectivo, el desarrollo de prácticas colectivas, el desarrollo de formas de organización interna definidas, y un territorio común al sujeto colectivo (UARIV, 2014).

Figura 2. Atributos de un sujeto de reparación colectiva



Tomado de: Modelo de reparación colectiva (UARIV, 2019)

5.8 Tipos de sujetos colectivos reconocidos en el ordenamiento legal

Con base en lo dispuesto en los artículos 152 de la ley 1448 de 2011 y 2.2.7.8.2 del decreto 1084 de 2015, el Modelo de Reparación Colectiva establecido reconoce la existencia de cuatro tipos de sujetos colectivos (UARIV, 2019):

- Comunidades: campesinas y barriales (no étnicas)
- Comunidades o pueblos étnicos (Decretos - Ley étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011)
- Organizaciones
- Grupos

5.8.1 Comunidades: campesinas y barriales (no étnicas)

A partir de una revisión y análisis de la obra de Roberto Esposito (Andrade, 2018) *Communitas. Origen y destino de la comunidad. (Buenos Aires: Amorrortu, 2003)*, es posible definir este sujeto colectivo como un grupo de personas que convive en un mismo espacio geográfico, que puede ser de naturaleza rural o urbana, y que sustenta su identidad como colectivo a partir del territorio, de relaciones de parentesco, de una historia de convivencia y de elementos de cooperación y organización en los ámbitos económico, político, cultural y simbólico.

También es propia de estos sujetos la existencia de tensiones y complejidades entre los individuos de la comunidad, lo cual da cuenta de modos de relación, expresión, y acción que se proyectan en el colectivo (UARIV. 2019).

5.8.2 Comunidades o pueblos étnicos

La constitución política nacional reconoce la diversidad cultural y étnica de su población, desde esa base el ordenamiento jurídico colombiano otorga reconocimiento a las comunidades indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, y al pueblo Rrom o Gitano, considerándolos sujetos de especial protección constitucional y titulares de una *categoría especial de derechos fundamentales* como se plasma en la jurisprudencia mediante las sentencias T-380 de 1993, C-169 de 2001, C-359 de 2013, T- 475 de 2016, entre otras (UARIV. 2019).

Consecuentemente a su ordenamiento jurídico, el Estado Colombiano reconoce la *especial afectación* que han sufrido las mencionadas comunidades y pueblos étnicos en el marco del conflicto armado, generando un marco normativo especial que se encuentra configurado en los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011.

Para los sujetos étnicos se tiene en cuenta que sus procesos históricos y de construcción de identidad son diferentes respecto a las demás tipologías de sujetos colectivos. Por esta razón, para la ejecución y evaluación de las medidas de reparación colectiva se reconocen atributos que se abordan teniendo en cuenta los aspectos plasmados en el siguiente cuadro:

Figura 3. Atributos colectivos de comunidades y pueblos étnicos



Tomado de: Modelo de reparación colectiva (UARIV, 2019)

Dada la cosmovisión y valores culturales propios de las comunidades y pueblos étnicos, derivados de una vivencia comunitaria, ancestral e histórica, las comunidades étnicas integran características particulares que los diferencian del resto de sujetos colectivos, particularmente en el sentido y valor que otorgan a su territorio, que va más allá de del sentido productivo (UARIV, 2019). Estas consideraciones sobre el territorio para los sujetos étnicos se reconocen en el ordenamiento jurídico colombiano, como se sintetiza en la siguiente tabla:

Tabla 1. Definición de territorio para comunidades étnicas en el ordenamiento jurídico colombiano

| Indígenas | Comunidad Negra Población Negra Población Raizal Población Palenquera | Pueblo Rrom o Gitano |
|--|---|--|
| <p>El artículo 3 del Decreto 2333 de 2014 lo define como “[...] la ocupación y relación y/o tradicional que estos mantienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con los usos y costumbres, y que constituyen su ámbito tradicional, espiritual y cultural, en el marco de lo establecido en la Ley 21 de 1991 [...]”</p> | <p>Son terrenos respecto de los cuales se determina derecho a la propiedad colectiva. Es en este sentido que las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales comprenden el territorio.■</p> | <p>En razón a que el pueblo Rrom ha desarrollado históricamente su conciencia étnica a partir del nomadismo, sea este real o simbólico, y por esto este derecho se ha visto afectado de manera diferencial con ocasión del conflicto armado, se reitera el derecho de este pueblo y de sus miembros individualmente considerados, a la libre circulación por todo el territorio nacional, salvo las limitaciones legales. (Decreto 2957 de 2010, artículo 5°).</p> |
| <p>Marco normativo: Territorios Indígenas (Decreto 2164 de 1995)</p> | <p>Marco normativo: Tierras de las Comunidades Negras (Artículo 4 ley 70 de 1993)</p> | <p>Marco normativo: Libre circulación (Artículo 5 Decreto 2957 de 2010)</p> |

Tomado de: Modelo de reparación colectiva (UARIV, 2019)

5.8.3 Organizaciones

Se considera como una organización a un grupo de personas vinculadas entre tomando la decisión de pertenecer formalmente a un colectivo, el cual se conforma con el fin de lograr un objetivo común y consensuado entre los miembros de la colectividad. Las organizaciones cuentan con recursos tangibles (activos físicos como bienes muebles, inmuebles y financieros), intangibles (su reconocimiento social y sus prácticas organizativas) y humanos (conocimientos y habilidades de sus miembros para el logro del propósito común), también cuentan estructuras organizacionales, y medios que les permiten desarrollar sus objetivos, que determinan tanto sus prácticas colectivas, como sus formas de relacionamiento (UARIV. 2019).

5.8.4 Grupos

Esta tipología de clasificación de sujetos colectivos hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre por condiciones comunes que les permitieron definir un proyecto colectivo dirigido a la reivindicación de los derechos humanos, evento por el cual se generaron procesos de estigmatización dentro de un territorio específico. A diferencia de las organizaciones, los grupos no tienen estructuras organizacionales definidas, ni medios específicos definidos o acordados que le permitan desarrollar su objetivo al no tener interés en la propiedad o titularidad colectiva de bienes muebles, inmuebles o capital económico (UARIV. 2019).

5.9 Medidas de reparación colectiva

De acuerdo con el artículo 69 de la ley 1448 de 2011, son las acciones que, en acuerdo con el Sujeto de Reparación Colectiva, contribuyen a su reparación integral, estas medidas se clasifican en medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización

(para sujetos étnicos). **Las medidas se implementan a través de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC)** y en ellas subyacen los componentes políticos, materiales y simbólicos (UARIV, 2014).

5.9.1 Medidas de restitución (UARIV. 2019)

Están enfocadas a productos que contribuyan al componente material de la reparación como:

- Reconstrucción, mejoramiento y/o dotación de espacios de uso colectivo (reconstrucción, mantenimiento y/o restauración de infraestructura comunitaria y dotación de mobiliario indispensable)
- Proyectos productivos colectivos (proyectos agropecuarios y de fomento a la comercialización de productos)

Cabe resaltar que las medidas de restitución no se limitan a las cosas materiales en sí (caseta comunal, puesto de salud, escuela, vía, etc...), sino que se integran de a la recuperación de las prácticas colectivas y de los espacios de encuentro en torno a estos bienes. En este sentido, se asocian a lo que se espera lograr en el sujeto colectivo con su ejecución.

5.9.2 Medidas de rehabilitación psicosocial (UARIV. 2019)

Estas medidas tienen como objetivo contribuir a la reconstrucción y el restablecimiento del tejido social u organizativo y las relaciones de confianza, así como al fortalecimiento de la convivencia, tanto al interior de los sujetos colectivos víctimas del conflicto armado, como entre éstos y terceros, incluyendo el Estado colombiano. Adicionalmente, busca aliviar los daños

psicosociales producidos en los atributos del sujeto colectivo, como consecuencia de las graves violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH.

5.9.3 Medidas de satisfacción (UARIV. 2019)

Están enfocadas principalmente a los componentes simbólicos, su implementación implica elementos de los componentes material y político de la reparación colectiva, como resultado de los ejercicios de diálogo, construcción conjunta y concertación con los sujetos de reparación colectiva. Las medidas de satisfacción proporcionan bienestar, dignifican y contribuyen a mitigar el dolor de las víctimas. El logro eficaz de la implementación de estas medidas se manifiesta en el esclarecimiento de los hechos victimizantes, la recuperación del buen nombre del sujeto colectivo, la difusión y fortalecimiento de la memoria histórica, entre otros aspectos.

La determinación de las medidas de satisfacción se enmarca en 4 líneas fundamentales:

- Línea de reconstrucción, apropiación y difusión de la memoria: Mediante el apoyo a la elaboración de piezas audiovisuales o artísticas tales como literatura, teatro, textos, publicaciones y su difusión a la sociedad en galerías.
- Línea de lugares de memoria: Mediante el apoyo a la elaboración de murales, placas, jardines, marcas territoriales, etc.
- Línea de procesos de recuperación del buen nombre de los sujetos de reparación colectiva: Mediante acciones de visibilización del sujeto de reparación colectiva, haciendo énfasis en las cualidades positivas a través de las cuales se hizo reconocer previo a la ocurrencia de los hechos victimizantes o que contribuyan a darlo a conocer nuevamente.

- Línea de actos simbólicos de dignificación a las víctimas: Mediante la promoción de la conmemoración de fechas significativas para las comunidades, organizaciones o grupos víctimas del conflicto armado.

5.9.4 Garantías de no repetición (UARIV. 2019)

Las medidas enmarcadas en la categoría de garantías de no repetición se establecen con referencia a lineamientos que contribuyen a la reparación de los atributos del sujeto colectivo. Estos, lineamientos, dependiendo de las características e historia del Sujeto, pueden vincularse en el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) fundamentalmente mediante la ejecución de estrategias de pedagogía con las comunidades:

- Educación informal frente a la violencia basada en género
- Asistencia técnica para promover los métodos de resolución de conflictos alternativos contemplados en la Ley
- Formación en promoción y fortalecimiento de nuevos liderazgos
- Socialización de rutas de prevención y protección a las víctimas del conflicto armado
- Asistencia técnica para el fortalecimiento de iniciativas para la promoción de los DDHH
- Asistencia técnica para el fortalecimiento de iniciativas locales de reconciliación
- Promoción de espacios de diálogo para la prevención de violaciones a los DDHH
- Acciones para la prevención del racismo y la discriminación racial

- Promoción de escenarios para dar a conocer la diversidad cultural y étnica de la región y de las organizaciones étnicas a terceros
- Apoyo de las estrategias propias de protección comunitaria y control territorial de los pueblos étnicos
- Promoción de espacios de diálogo comunitarios para la prevención del racismo y la discriminación racial
- Fortalecimiento de procesos pedagógicos de educación para la paz.

Los lineamientos que determinan la formulación de estas medidas buscan generar condiciones que contribuyan a la no repetición de la violación a los derechos humanos en el seno de las comunidades, buscando transformar algunas de las causas que facilitaron la victimización de los colectivos y la prevención del surgimiento de nuevos focos de violencia que puedan generar procesos de revictimización.

5.9.5 Indemnización para sujetos étnicos (UARIV. 2019)

Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 establecen la medida de indemnización para las comunidades étnicas, como un mecanismo para proteger su identidad e integralidad, por lo que estas medidas se orientan a la ejecución de proyectos para el fortalecimiento de los sujetos colectivos étnicos. Acatando lo dispuesto en el ordenamiento legislativo, la Unidad para las Víctimas por medio de resolución N°1449 de 2017, estableció los lineamientos y criterios para la implementación y entrega de la indemnización por vía administrativa a estos sujetos de reparación colectiva.

El rubro de la indemnización oscila entre 242 y 394 salarios mínimos legales vigentes, establecidos según los criterios y lineamientos de la resolución 1449 y es entregada a autoridades étnicas representativas de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros o del pueblo Rrom según sea el caso.

Las indemnizaciones a sujetos étnicos se materializan en el marco de la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), de acuerdo con lo concertado dentro de la formulación de estos. La ejecución de las actividades y acciones contempladas en los PIRC dentro de los plazos establecidos y su duración no podrá superar tres años. Al ejecutar el PIRC se habrá contribuido, entre otros, con los siguientes propósitos:

- Restablecer y/o recuperar las prácticas colectivas del sujeto fortaleciendo sus formas de organización y relacionamiento.
- Fortalecer el proyecto colectivo del sujeto étnico recuperando los referentes de autorreconocimiento y/o reconocimiento por terceros del mismo.
- Aportar al restablecimiento y apropiación del territorio por parte del sujeto colectivo.

5.10 Ruta de reparación colectiva

Es el conjunto de fases que inicia desde el momento en que se genera la inclusión de un sujeto colectivo en el Registro Único de Víctimas (RUV) y finaliza con la implementación de la ruta, esto es, cuando se implementan en su totalidad las acciones acordadas con el sujeto plasmadas en el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) (UARIV. 2019).

Para la consolidación exitosa de la ruta de reparación colectiva se adopta el enfoque de Marco Lógico, que permite planear la inversión de los recursos públicos, verificando la coherencia entre la acción formulada y la reparación efectiva del daño colectivo, teniendo como referente las medidas de reparación dispuestas por la ley. Para la implementación exitosa de este enfoque, en cada fase de la ruta, los equipos multidisciplinares que trabajan para este fin deben realizar una serie de actividades que permitan ir avanzando en la planificación y consolidación del PIRC. La ruta se consolida mediante cinco fases (UARIV. 2019):

Figura 4. Esquema de fases de la Ruta de Reparación colectiva



Tomado de: Modelo de reparación colectiva (UARIV, 2019)

1.) **Identificación:** El objetivo de esta fase es realizar la descripción inicial del sujeto colectivo en términos de sus atributos antes del conflicto armado, los daños ocasionados a estos, su estado actual y los actores que tienen relación con el sujeto colectivo.

2.) **Alistamiento:** Mediante esta fase se prepara al sujeto de reparación colectiva y a las entidades nacionales y territoriales, así como a instituciones privadas interesadas en el proceso, en cuanto al conocimiento de la ruta de reparación colectiva y sus implicaciones, esto, mediante la

realización de jornadas de socialización con los diferentes actores involucrados, en las que se logra la concertación y coordinación en el proceso de consolidación e implementación de la ruta.


3.) **Diagnóstico o caracterización del daño:** El propósito de esta fase es profundizar en la identificación de los daños ocasionados a los atributos del sujeto, buscando establecer sus condiciones antes y durante la ocurrencia de los hechos violentos en el marco del conflicto armado, y cómo se encuentran en la actualidad.

4.) **Formulación del PIRC:** Con base en la información de las fases precedentes y de manera concertada con los sujetos se formulan las actividades encaminadas a materializar las medidas de reparación colectivas, estableciendo de manera clara cronogramas y productos del proceso.

5.) **Implementación del PIRC:** En esta última fase, las medidas de reparación concertadas y estipuladas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) son implementadas en concordancia con los principios de la Ley 1448 de 2011, permitiendo más allá de las acciones de reparación puntuales, generar el fortalecimiento fomentando procesos de autogestión sostenibles en el seno de las comunidades afectadas por el conflicto armado y recuperando su confianza con el Estado.

Con la implementación de las medidas de reparación colectiva determinadas mediante el trabajo concertado y mancomunado entre los equipos interdisciplinarios de la Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas se consolida el modelo operativo de implementación del programa de reparación colectiva. Este modelo operativo, se sintetiza en el siguiente esquema:

Figura 5. Modelo operativo para la implementación del programa de reparación colectiva

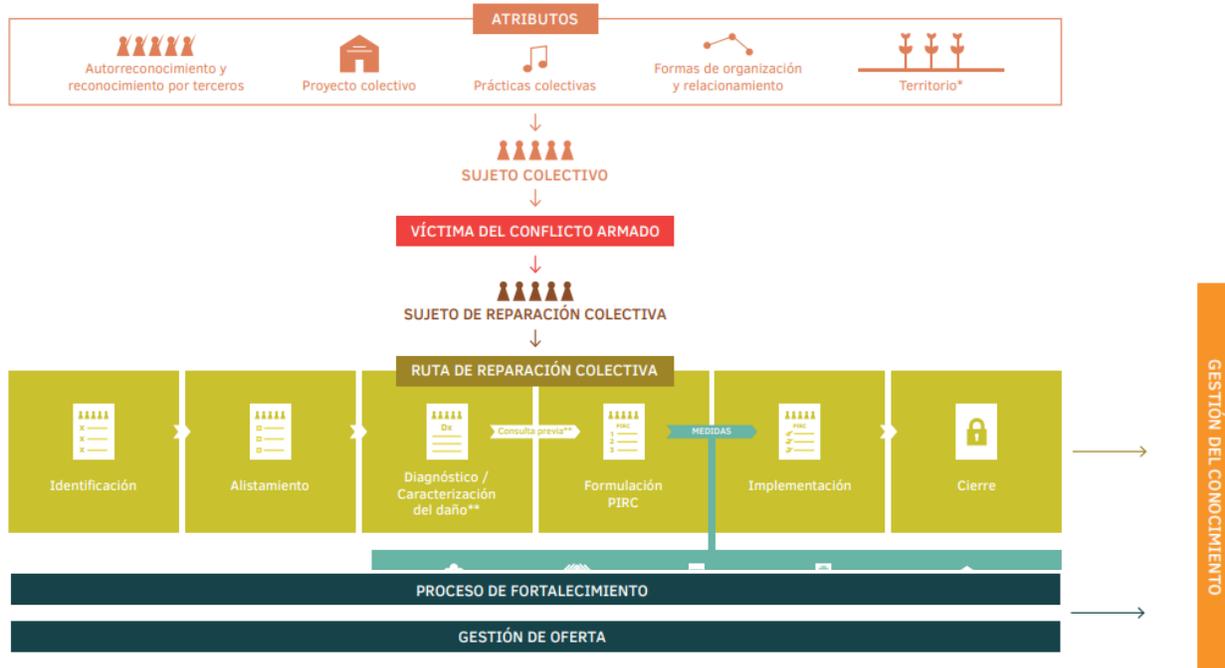

Tomado de: Modelo de reparación colectiva (UARIV, 2019)

5.11 Plan integral de reparación colectiva (PIRC)


Es el instrumento de planeación mediante el cual se define y programa la implementación de las acciones dirigidas a reparar los daños ocasionados, en el marco del conflicto armado, a los atributos de un sujeto colectivo. En él se plasman las actividades concertadas entre la Unidad para las Víctimas y el respectivo sujeto de reparación colectiva, encaminadas a su reparación integral. Para el caso de sujetos de reparación colectiva étnicos, la conformación del PIRC se realiza en el marco del mecanismo de consulta previa estipulado por la Ley (UARIV, 2019).

En el proceso de formulación del PIRC es fundamental la participación mancomunada y concertada con los sujetos de reparación colectiva, ya que la aplicación del mismo busca la reparación a las afectaciones sufridas por el sujeto colectivo. Parte fundamental del proceso de formulación es la información recopilada en la etapa previa de diagnóstico o caracterización del daño, a partir de la cual se formula el PIRC realizando los siguientes pasos (UARIV,2019):

- **Construcción del árbol de problemas y árbol de objetivos:**

Es una representación gráfica que ayuda a identificar y organizar las causas y efectos de los daños a los atributos en el colectivo, mediante la cual se presenta una síntesis de los factores principales determinadores del problema central (los daños sufridos por el colectivo en sus atributos) (UARIV,2019).

Figura 6. Esquema de un árbol de problemas

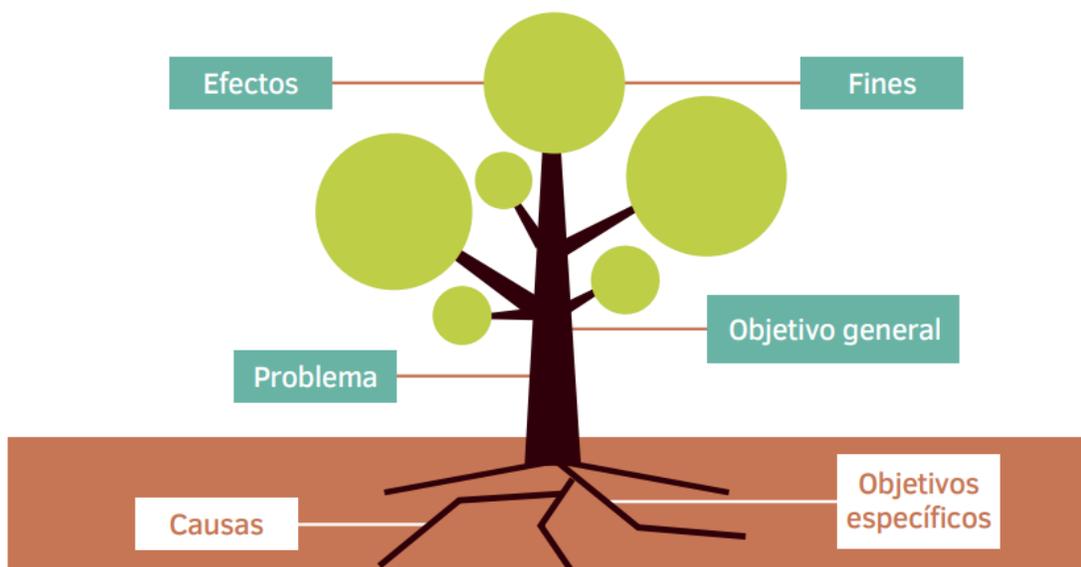

Tomado de: Modelo de reparación colectiva (UARIV, 2019)

- **Identificación de las actividades que se consideran reparadoras por atributo:**

Esta fase se desarrolla en conjunto con el sujeto de reparación teniendo en cuenta los hechos que lo afectaron y las consecuencias de estos hechos sobre el mismo. Las actividades encaminadas a la reparación del colectivo deben mitigar las consecuencias negativas de los mismos, teniendo en cuenta el enfoque de marco lógico adoptado en el proceso, estas actividades contribuyen a la transformación de insumos en productos (UARIV,2019).

- **Clasificación de actividades en productos:**

Para el desarrollo de esta fase, se cuenta con un listado de productos asociados a cada medida de reparación relacionando los daños con los atributos del sujeto de reparación. Los productos son los requeridos para el desarrollo de las actividades propuestas para la reparación del daño. El listado de productos ha sido construido en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (UARIV,2019).


- **Identificación de riesgos en la implementación del PIRC:**

Tiene como objeto el análisis de riesgos que pueden afectar la ejecución del PIRC como base para formular las acciones de prevención y mitigación de los mismos desde los ámbitos social, económico, ambiental y cultural (UARIV,2019).

- **Construcción de la cadena de valor:**

Mediante esta se establece la relación entre objetivos específicos y productos necesarios para su materialización, a través de un conjunto de actividades. En la primera etapa de la cadena de valor se toman insumos, y desatollando las actividades, se transforman en productos (bienes y servicios). Luego, en la segunda etapa, los productos generaran los resultados que deben cumplir los objetivos específicos formulados para la reparación del sujeto en cada uno de sus atributos afectados en el marco del conflicto (UARIV,2019).

Figura 7. Cadena de valor del PIRC

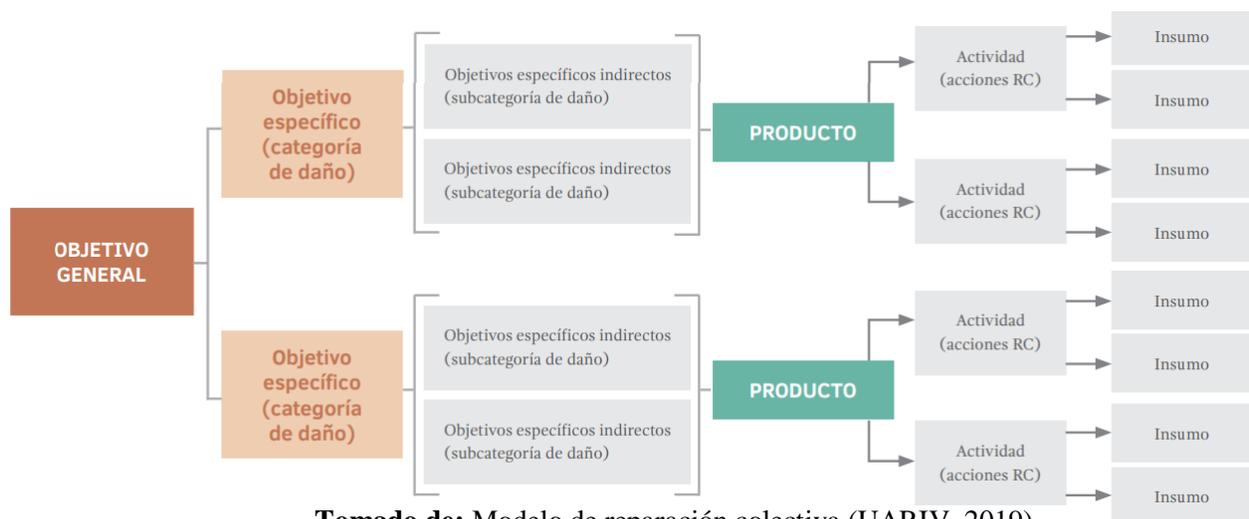

Tomado de: Modelo de reparación colectiva (UARIV, 2019)

- **Definición del cronograma:**

El cronograma de actividades se formula como el instrumento que permite hacer seguimiento a los productos y actividades del PIRC contenidos en la cadena de valor. Al estructurar el cronograma, el responsable puede determinar el orden de las actividades para la ejecución del PIRC. Este ejercicio se realiza en conjunto con el sujeto colectivo (UARIV,2019).

- **Elaboración de la matriz de seguimiento:**

Por medio de esta se realiza el monitoreo de los productos y actividades que componen el PIRC, contiene los indicadores de productos y los indicadores de gestión mediante los cuales se da cuenta del avance en la implementación y con ello del cumplimiento de los objetivos establecidos (UARIV,2019).

Una vez se cuenta con los insumos de las fases de formulación, se procede a presentar el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para la validación técnica de la Dirección de Reparación, la Subdirección de Reparación Colectiva, la Subdirección General y, en los casos de los sujetos de reparación colectiva étnicos, de la Dirección de Asuntos Étnicos. Al contar con la validación de los comités de la UARIV, se procede a la validación final del documento del PIRC con el sujeto colectivo (UARIV,2019).

Las fases enunciadas para la formulación del PIRC muestran el carácter participativo del proceso, así como la importancia de garantizar que se responda de manera efectiva a los daños colectivos identificados para los sujetos de reparación. De este modo, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y/o Indemnización que integren los Planes Integrales de Reparación Colectiva, deberán corresponder a los daños identificados con ocasión del conflicto armado (UARIV,2019).

6. ESTADO DEL CONOCIMIENTO

A continuación, se presentan 6 investigaciones realizadas en los campos nacional e internacional que permiten comprender y dimensionar la importancia de los procesos de reparación en el marco de la atención a las víctimas de conflictos armados en contextos internacionales, y como estos modelos internacionales han influido en el establecimiento del enfoque y modelo de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

6.1 Investigación internacional

Martínez (2018) realizó la tesis de titulación doctoral de la Universidad Complutense de Madrid titulada: *La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la justicia transicional*, en ella presenta un análisis de la política pública formulada con el propósito de la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. A través de su investigación describe los estándares internacionales de procesos estatales de reparación a víctimas haciendo un recuento de la jurisprudencia internacional en la materia y los antecedentes históricos y sociales que la han determinado, así como su adopción y su papel como modelo de las políticas públicas de reparación en Colombia. La metodología de esta investigación se basa en el análisis de normas internacionales y documentación histórica. Como resultado de este análisis se observa la integración en el marco normativo colombiano de los estándares internacionales de reparación integral, con políticas ambiciosas en las diferentes dimensiones que esta implica: Restitución, rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición.

6.2 Investigación nacional

Burbano y García (2016) realizaron el artículo titulado: *La reparación de víctimas de conflictos armados: experiencias internacionales*, publicado por la Revista Inciso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia, en este se presenta un análisis de los procesos de aplicación de justicia transicional y reparación a víctimas de la violencia de conflictos armados del ámbito internacional. A través de la investigación se describen los aspectos relevantes que en materia de reparación han sucedido con ocasión de los conflictos violentos internos en Chile, Argentina, Liberia y Sierra Leona. La metodología de esta investigación se basa en el análisis de publicaciones internacionales y documentación académica referente al tema. Como resultado de este análisis se observa la importancia de ejecutar en los procesos de justicia transicional la reparación a las víctimas de la violencia como eje fundamental para la superación de los rencores causados por los conflictos, y por tanto para la construcción de una paz duradera y la reconciliación en el seno de las naciones.

Villa, Londoño y Barrera (2014, 2015) realizaron los artículos titulados: *Reparación a las víctimas de dictaduras, conflictos armados y violencia política. Parte I*, y *Reparación a las víctimas de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición*, que forman parte del catálogo de la biblioteca electrónica SciELO, en estos se presenta el análisis y reflexiones en torno a los procesos de reparación a las víctimas de la violencia en diferentes escenarios internacionales en los que se han desarrollado procesos transicionales para alcanzar la paz. A través de las investigaciones se hace énfasis en aquellos procesos en los que se ha dado mayor relevancia, protagonismo y significado a las poblaciones victimizadas. La metodología de estas investigaciones se basa en el análisis de publicaciones internacionales y documentación académica referente al tema. Como

resultado de este análisis se observa la importancia de fortalecer y ampliar el concepto de reparación desde el ámbito legislativo, para el logro exitoso de garantías reales que logren la satisfacción de las víctimas del conflicto armado en Colombia integrado los componentes de verdad, justicia y garantías de no repetición.

Caicedo, Enciso y Solano (2020) publicaron el artículo titulado: *La reparación a las víctimas en Colombia: un análisis desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el derecho penal internacional*, que forma parte del catálogo de la biblioteca electrónica SciELO, en este se presenta un análisis de los enfoques legislativos y jurídicos en torno a los procesos de reparación de víctimas de conflictos armados a nivel internacional y Colombia. A través de la investigación se describen aspectos de la jurisprudencia elaborada en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el derecho penal internacional para regular los procesos de reparación integral a víctimas. Como resultado de este análisis se observa que el marco jurídico nacional es acorde a los principios de la jurisprudencia internacional en cuanto a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y su participación en los procesos, también se resaltan las complejidades propias de estos procesos advirtiendo del riesgo de revictimización de los sujetos.

Cardona y Arroyave (2019) publicaron el artículo titulado: *Procesos de reparación, entre la reparación estatal y la recuperación comunitaria*, que forma parte del catálogo de la biblioteca electrónica SciELO, en este se analizan las experiencias en torno al daño y el proceso de reparación de una comunidad víctima de conflicto armado en el departamento de Antioquia, Colombia. Para la realización del análisis se tienen en cuenta aspectos del marco jurídico y legales, así como el testimonio de la comunidad. Como resultado de este análisis se observan las complejidades

subyacentes a los procesos de reparación objetiva, los cuales no en todas las ocasiones cumplen con las expectativas de las comunidades objeto de reparación.

De acuerdo al análisis realizado al estado del arte, es fundamental para la construcción de paz en Colombia y la reconstrucción del tejido social, la reparación integral a las víctimas del prolongado periodo de conflicto armado. Los procesos de reparación se deben planificar y ejecutar teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los individuos (individuales o colectivos), por esta razón se comprende la complejidad del desarrollo de los mismos, estos deben a su vez, estar regulados por un marco legal sólido y en su ejecución requieren de la articulación armónica de las entidades estatales de orden nacional y local en las regiones de Colombia, con la participación de grupos interdisciplinarios de profesionales en diversas áreas del conocimiento que definan de manera acertada las acciones que conduzcan al éxito en el objetivo de la reparación integral a las víctimas.

Con corte a enero de 2020 conforman el registro único de víctimas (RUV) 8'553.416 de víctimas del conflicto armado en Colombia, esta cifra correspondería aproximadamente al 17% de la población total del país, lo que permite evidenciar la magnitud de la labor emprendida por el gobierno nacional a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuya labor concluiría con la vigencia de la Ley 1148 de 2011, pero dada la complejidad del objetivo debido al gran número de víctimas, se prorrogó por diez años más la vigencia de la Ley hasta el año 2031. Además de lo analizado a partir del estado del arte, la cifra de víctimas del conflicto armado en Colombia y las complejidades inherentes a los procesos de reparación integral llevan a comprender el porqué de la demanda de profesionales en múltiples áreas del conocimiento, desde las ciencias humanas hasta las áreas técnicas, para cumplir los objetivos asumidos en el propósito de la reparación integral a las víctimas.

7. METODOLOGÍA

Para el logro de los objetivos de la pasantía se ejecutaron las actividades estipuladas en el plan de práctica presentado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual conto con la aprobación y visto bueno del docente supervisor de pasantía delegado por la Universidad Antonio Nariño y del tutor designado por la entidad estatal. Este documento es el **ANEXO No. 4** del presente trabajo. Para la ejecución de las actividades relacionadas con la pasantía se siguieron los procesos y protocolos establecidos por la subdirección de reparación colectiva de la UARIV.

Los resultados obtenidos como producto de las actividades realizadas en apoyo a los procesos del área técnica de proyectos de infraestructura social y comunitaria de la subdirección de reparación colectiva se sintetizaron en la elaboración de informes mensuales solicitados por la agencia de empleo de la Caja de Compensación Familiar Compensar, a través de la cual el Ministerio de Trabajo delego los fondos de incentivo económico del programa “Estado Joven”, los cuales, dieron cuenta del avance en la ejecución de las actividades de la pasantía desde su inicio hasta su culminación. Las actividades e informes contaron con la supervisión, el visto y la aprobación del tutor y supervisor designados para el desarrollo de la pasantía.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades de la pasantía, ejecutado en un porcentaje de 100%, corresponde al cronograma del plan de practica estipulado desde el inicio de la pasantía, a continuación, se presenta el cronograma por medio de un diagrama de Gantt:

Figura 8. Cronograma de actividades de pasantía en la UARIV

| ITEM | ACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MESES Y SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|----|----|----|------------|--------|----|----|---------|----|----|----|-----------|--------|----|----|-----------|----|----|----|
| | | | Meses del año 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1 | Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | █ | | | | | | | | █ | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 33,33% | | | | | 33,33% | | | | | | | | 33,34% | | | | | | |
| 3 | Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | █ | | | | | | | | █ | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | 50% | | | | | | | | 50% | | | | | | | |
| 6 | Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia

9. RESULTADOS OBTENIDOS

9.1 Primer informe parcial de práctica

La siguiente tabla corresponde a los productos entregados como resultado de las actividades realizadas al cabo del primer mes de la pasantía. El primer informe parcial corresponde al ANEXO No. 5. Los productos entregados son los ANEXOS 6, 7, 8 y 9 del presente trabajo.

Tabla 2. Actividades y productos entregados del primer informe parcial de pasantía

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|---|
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 25 % | Estudio de normativa y guías de procesos de reparación colectiva de la entidad | ANEXO 1 |
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | Revisar hojas de observaciones técnicas de ANEXOS 2 y 3 |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXOS 2 y 3 |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria, y formato para el registro consolidado de fechas y costos definitivos de proyectos con Aval de ejecución | ANEXOS 2, 3 y 4 |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXOS 2 y 3 |

Fuente: Elaboración propia

9.2 Segundo informe parcial de práctica

La siguiente tabla corresponde a los productos entregados como resultado de las actividades realizadas al cabo del segundo mes de la pasantía. El segundo informe parcial corresponde al ANEXO No. 10. Los productos entregados son los ANEXOS 11, 12, 13, 14 y 15 del presente trabajo.

Tabla 3. Actividades y productos entregados del segundo informe parcial de pasantía

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|---------------|
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 50 % | Asistencia a reunión de equipo de trabajo con objeto de establecer acciones de mejora continua | ANEXO 1 |
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 36,84 % | Archivo .xlsx con la determinación de localización geográfica (coordenadas geográficas) de Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas de Colombia | ANEXO 2 |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 36,84 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval de ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXO 3 |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 36,84 % | Formato para la evaluación de oferentes de proceso contractual en concurso de méritos y formato para el registro del consolidado histórico de costos definitivos de proyectos con Aval de ejecución (vigencias 2013 a 2019) | ANEXO 4 |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 36,84% | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval de ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXO 3 |
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 50% | Asistencia a capacitación sobre Modelo de Reparación Colectiva | ANEXO 5 |

Fuente: Elaboración propia

9.3 Tercer informe parcial de práctica

La siguiente tabla corresponde a los productos entregados como resultado de las actividades realizadas al cabo del tercer mes de la pasantía. El tercer informe parcial corresponde al ANEXO No. 16. Los productos entregados son los ANEXOS 17, 18, 19 y 20 del presente trabajo.

Tabla 4. Actividades y productos entregados del tercer informe parcial de pasantía

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|---|
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 57,89 % | Archivo .xlsx con la determinación de cantidades de pintura requerida para el desarrollo de proyecto de reparación colectiva en escuelas de San Basilio de Palenque, Bolívar | ANEXO 1 |
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 66,66 % | No se generó producto para el mes de octubre, dado que en este mes no se contempló el desarrollo de esta actividad | Se informan las modificaciones a las que está sujeta la programación de esta actividad en el plan de practica |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 57,89 % | Carpetas de archivos .xlsx con organización documental de "formatos de coordinación de entrega" y "actas de entrega" a satisfacción de proyectos de reparación colectiva implementados en el año 2019. Carpetas de archivos .xlsx con organización documental de soportes jurídicos y técnicos que sustentan la viabilidad para ejecución de proyectos de reparación colectiva desarrollados en el año 2019. Carpetas de archivos .xlsx con organización documental de proyectos del año 2018 | ANEXO 2 |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 57,89 % | Archivo .xlsx con complementación de la matriz "Estado de remisión proyectos de Infraestructura". Informe en archivo .xlsx con el resumen de estado documental de proyectos de infraestructura del año 2019. | ANEXO 3 |
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 50% | No se generó producto para el mes de octubre, dado que en este mes no se contempló el desarrollo de esta actividad | Se informó en el plan de practica |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 57,89 % | Archivo .xlsx con la determinación de cantidades de materiales de obra requeridos para la construcción de baterías sanitarias en escuela de Kanalitojo, Vichada | ANEXO 4 |

Fuente: Elaboración propia

9.4 Cuarto informe parcial de práctica

La siguiente tabla corresponde a los productos entregados como resultado de las actividades realizadas al cabo del cuarto mes de la pasantía. El cuarto informe parcial corresponde al ANEXO No. 21. Los productos entregados son los ANEXOS 22, 23, 24, 25 y 26 del presente trabajo.

Tabla 5. Actividades y productos entregados del cuarto informe parcial de pasantía

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|---------------|
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 78,95 % | Archivo .xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de medidas de reparación colectiva en las áreas de infraestructura, mobiliario e insumos agrícolas para el año 2017. | ANEXO 1 |
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 100 % | Acta de asistencia a reunión de equipo de proyectos para la implementación de estrategias de mejora continua en la gestión de la información financiera. | ANEXO 2 |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 78,95 % | Archivo .xlsx con la construcción de matriz financiera de inversiones históricas en implementación de medidas de reparación colectiva entre los años 2017 a 2019. | ANEXO 3 |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 78,95 % | Archivo .xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de medidas de reparación colectiva en las áreas de infraestructura, mobiliario e insumos agrícolas para el año 2017. | ANEXO 1 |
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 100 % | Lista de asistencia a reunión de equipo del área de proyectos para la socialización de estrategias de mejora continua en la gestión financiera. | ANEXO 4 |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 78,95 % | Archivos .xlsx con la determinación de inversión del año 2019 (con corte a octubre) en operaciones logísticas en el territorio nacional como apoyo a la ejecución de medidas de reparación colectiva. | ANEXO 5 |

Fuente: Elaboración propia

9.5 Quinto informe parcial de práctica

La siguiente tabla corresponde a los productos entregados como resultado de las actividades realizadas al cabo del quinto mes de la pasantía. El quinto informe parcial corresponde al ANEXO No. 27. Los productos entregados son los ANEXOS 28, 29, 30 y 31 del presente trabajo.

Tabla 6. Actividades y productos entregados del quinto informe parcial de pasantía

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|--|
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 89,47 % | Archivos .xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de medidas de reparación colectiva con recursos del Banco Mundial en el año 2019. | ANEXO 1 |
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 100 % | No se generó producto para esta actividad en el mes de Diciembre, dado que se programó solo hasta el mes de Noviembre | Se ejecutó en el 100% en el mes de Noviembre como consta en los informes precedentes |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 89,47 % | Archivo .xlsx con la actualización de rubros en la matriz financiera de inversiones históricas en implementación de medidas de reparación colectiva entre los años 2017 a 2019. | ANEXO 2 |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 89,47 % | Archivos .xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de eventos para el cierre de medidas de reparación colectiva en las áreas de infraestructura, mobiliario e insumos agrícolas para el mes de Noviembre del año 2019. | ANEXO 3 |
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 100 % | No se generó producto para esta actividad en el mes de Diciembre, dado que se programó solo hasta el mes de Noviembre | Se ejecutó en el 100% en el mes de Noviembre como consta en los informes precedentes |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 89,47 % | Archivos .xlsx con la determinación de inversión histórica por sujeto de las vigencias 2018 y 2019 (con corte a Noviembre) en operaciones logísticas en el territorio nacional como apoyo a la ejecución de medidas de reparación colectiva. | ANEXO 4 |

Fuente: Elaboración propia

9.6 Informe final de práctica

El informe final de la pasantía da cuenta de la culminación en un 100% del plan de practica contemplado para el desarrollo de la misma, corresponde al **ANEXO No. 32** del presente trabajo. Este informe cuenta con las observaciones finales, visto de paz y salvo con la entidad estatal y visto bueno del tutor y el supervisor delegados para el acompañamiento del proceso.

Tabla 7. Informe final de practica en la Unidad para las Victimas

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|--------------|--|
| VINCULACIÓN FORMATIVA: | | RESOLUCIÓN NÚMERO 02183 DEL 24 DE JULIO DE 2019 | | | |
| NOMBRE DEL PRACTICANTE: | | Jairo Alonso Segura Pulido | | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | 1023917216 | CORREO ELECTRÓNICO: jairosegura61@gmail.com | | | |
| DIRECCIÓN: | CLL 48 J sur N.º 5 H 16 | TELÉFONO: | 312 4703781 | | |
| NOMBRE DEL TUTOR: | Juanita Ibañez Santamaria | CORREO ELECTRÓNICO: juanita.ibanez@unidadvictimas.gov.co | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | Alexandra Morales | CORREO ELECTRÓNICO: coordinador.ingenieria.civil@uan.edu.co | | | |
| OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad. | | | | | |
| DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: | | Cinco (5) meses | | | |
| Fecha de Inicio: | 01/08/2019 | Fecha terminación inicial: | 31/12/2019 | | |
| INTERRUPCIÓN: | | | | | |
| NO APLICA | | | | | |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA: | | | | | |
| NO APLICA | | | | | |
| CONCEPTO DE TUTORA Y SUPERVISORA | | | | | |
| La tutora y la supervisora de práctica hacen constar que el practicante CUMPLIO (X) INCUMPLIO (___) con el objeto de la práctica y demás obligaciones de la vinculación formativa, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del <u>100 %</u> | | | | | |
| CONSTANCIA DE ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS POR PARTE DEL PRACTICANTE: | | | | | |
| Tenía Bienes a cargo | | Devolución | | Verificación | |
| SI | | SI | | Tutor | Firma:  |
| NO | X | NO | N. A. | | |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Visto bueno de supervisora y tutora de práctica en informe final

| | |
|--|---|
| OBSERVACIONES NO APLICA | |
| FIRMA RESPONSABLES | |
|  JUANITA IBÁÑEZ SANTAMARÍA TUTOR DE PRÁCTICA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS |  ALEXANDRA MORALES SUPERVISOR DE PRÁCTICA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
| FECHA: 31 de Diciembre de 2019 | |

Fuente: Elaboración propia

10. CONCLUSIONES

1. El proceso de apoyo realizado a la implementación de proyectos de infraestructura social y comunitaria es un determinante significativo para el logro de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
2. Un profesional en ingeniería civil debe estar en capacidad de articular el ejercicio de su quehacer en asociación con profesionales de otras áreas del conocimiento integrando sus conocimientos técnicos para el logro de los objetivos propuestos en grupos de trabajo interdisciplinarios.
3. La resolución de problemas técnicos en ingeniería civil responde a las necesidades propias de la vida civil, es decir, obedece a necesidades que surgen de la vida en sociedad.
4. Para el logro de la paz en Colombia es necesaria la reparación integral a las víctimas del conflicto, puesto que a partir de estos procesos de reparación se da el paso hacia la superación de odios y la recuperación de la confianza en el estado proporcionando a las comunidades victimizadas por el conflicto herramientas para la recuperación de su tejido social y la construcción de un mejor futuro.
5. Fue un acierto del gobierno nacional la prórroga de la Ley de víctimas y restitución de Tierras del año 2011 por diez años más dando continuidad a los proyectos de reparación de reparación integral a las comunidades que así lo requieren, este es un gesto de interés por la construcción de paz en Colombia.

11. RECOMENDACIONES

1. Es necesario mantener la difusión de las convocatorias del programa gubernamental “Estado Joven” para los estudiantes del proyecto curricular a través de los medios y canales de comunicación de los que se dispone, dado que es una importante experiencia para afianzar los conocimientos adquiridos en la academia y un medio de inserción en el mundo laboral. Por falta de conocimiento de este programa muchos estudiantes pierden la oportunidad que representa participar del mismo.
2. El área técnica de proyectos de infraestructura social y comunitaria de la subdirección de reparación colectiva de la unidad para las víctimas cuenta únicamente con un ingeniero civil y un arquitecto, quienes se encargan del análisis de viabilidad y acompañamiento en los procesos de ejecución de los proyectos de reparación para todos los sujetos colectivos, este trabajo es dispendioso, y es grande el número de medidas de reparación que demandan de la atención de estos profesionales, por tanto la contratación de más profesionales en el área técnica de infraestructura y obras dinamizaría los procesos de ejecución de los proyectos logrando satisfacer la demanda de los mismos en espera de ser realizados.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, E. (2018). *Revisión crítica de la obra de Esposito, R., Communitas: Origen y destino de la comunidad*. Consultado el 20 de febrero de 2021. <https://ojs.ehu.eus/index.php/papelesCEIC/article/view/19352>
- Burbano, M., García, R. (2016). La reparación de víctimas de conflictos armados: experiencias internacionales. *Inciso*, 18 (2). <https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/467>
- Caicedo, E., Enciso, M., Solano, C. (2020). *La reparación a las víctimas en Colombia: un análisis desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el derecho penal internacional*. SciElo. Consultado el 20 de marzo de 2021. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-182X2020000200071&lang=es
- Cardona, N., Arroyave, O. (2019). Procesos de reparación, entre la reparación estatal y la recuperación comunitaria. SciElo. Consultado el 25 de marzo de 2021. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312019000200387&lang=es
- Corte Constitucional de Colombia (2016). *Constitución Política de Colombia edición especial*. Corte constitucional. Consultado el 11 de marzo de 2021. <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf>
- Gobierno de Colombia (2011). *Ley 1448 de 2011*. Consultado el 18 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf>
- Gobierno de Colombia (2011). *Decreto 4633 Por el cual se establece medidas específicas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales para las comunidades y grupos indígenas*. Consultado el 20 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/decreto-4633-de-2011/425>

- Gobierno de Colombia (2011). *Decreto 4634 Por el cual se dictan medidas de Asistencia, Atención, Reparación Integral y Restitución de Tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano*. Consultado el 20 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/decreto-4634-de-2011/426>
- Gobierno de Colombia (2011). *Decreto 4635 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras*. Consultado el 20 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/decreto-4635-de-2011/427>
- Gobierno de Colombia (2011). *Decreto 4802 Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*. Consultado el 20 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/decreto-4802-de-2011/13631>
- Gobierno de Colombia (2016). *Ley 1780 de 2016, “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”*. Consultado el 13 de febrero de 2021. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=69573>
- Gobierno de Colombia (2021). *Ley 2078, por medio de la cual se modifica la ley 1448 de 2011 y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia*. Consultado el 15 de marzo de 2021. <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202078%20DEL%208%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf>
- Martínez, C. (2018). *La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la justicia transicional*. UCM. Consultado el 15 de marzo de 2021. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/49477/1/T40329.pdf>
- Ministerio del Interior, república de Colombia (2012). *Ley de víctimas y restitución de tierras y decretos reglamentarios*. Consultado el 19 de febrero de 2021. <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/ley1448.pdf>

Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2014). *Guía práctica de reparación colectiva*. Consultado el 18 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/carrepolv2.pdf>

Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2014). *¿Quiénes somos?* Consultado el 18 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/espquienessomos2015.pdf>

Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2019). *Modelo de reparación colectiva*. Consultado el 19 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/libromrcdigital.pdf>

Unidad para las Víctimas (2017). *Resolución 01449 del 11 de diciembre de 2017; Por la cual se establecen los criterios para la determinación de la indemnización por vía administrativa para sujetos colectivos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas Rrom Negras Palenqueras y Raizales*. Consultado el 20 de febrero de 2021. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/resolucion-01449-del-11-de-diciembre-de-2017/59575>

Villa, J., Londoño, D., Barrera, D. (2014). *Reparación a las víctimas de dictaduras, conflictos armados y violencia política Parte I*. SciElo. Consultado el 11 de marzo de 2021. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312014000200003

Villa, J., Londoño, D., Barrera, D. (2015). *Reparación a las víctimas de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición*. SciElo. Consultado el 11 de marzo de 2021. <http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v15n1/v15n1a12.pdf>

13. LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. Carta de aceptación de la práctica laboral

ANEXO 2. Resolución de vinculación formativa en la Unidad para las Víctimas

ANEXO 3. Acta de inicio de práctica en la Unidad para las Víctimas

ANEXO 4. Plan de práctica en la Unidad para las Víctimas

ANEXO 5. Primer informe parcial de práctica

ANEXO 6. Anexo 1 de primer informe parcial de práctica

ANEXO 7. Anexo 2 de primer informe parcial de práctica

ANEXO 8. Anexo 3 de primer informe parcial de práctica

ANEXO 9. Anexo 4 de primer informe parcial de práctica

ANEXO 10. Segundo informe parcial de práctica

ANEXO 11. Anexo 1 de segundo informe parcial de práctica

ANEXO 12. Anexo 2 de segundo informe parcial de práctica

ANEXO 13. Anexo 3 de segundo informe parcial de práctica

ANEXO 14. Anexo 4 de segundo informe parcial de práctica

ANEXO 15. Anexo 5 de segundo informe parcial de práctica

ANEXO 16. Tercer informe parcial de práctica

ANEXO 17. Anexo 1 de tercer informe parcial de práctica

ANEXO 18. Anexo 2 de tercer informe parcial de práctica

ANEXO 19. Anexo 3 de tercer informe parcial de práctica

ANEXO 20. Anexo 4 de tercer informe parcial de práctica

ANEXO 21. Cuarto informe parcial de práctica

ANEXO 22. Anexo 1 de cuarto informe parcial de práctica

ANEXO 23. Anexo 2 de cuarto informe parcial de práctica

ANEXO 24. Anexo 3 de cuarto informe parcial de práctica

ANEXO 25. Anexo 4 de cuarto informe parcial de práctica

ANEXO 26. Anexo 5 de cuarto informe parcial de práctica

ANEXO 27. Quinto informe parcial de práctica

ANEXO 28. Anexo 1 de quinto informe parcial de práctica

ANEXO 29. Anexo 2 de quinto informe parcial de práctica

ANEXO 30. Anexo 3 de quinto informe parcial de práctica

ANEXO 31. Anexo 4 de quinto informe parcial de práctica

ANEXO 32. Informe final de práctica laboral en la Unidad para las Víctimas

ANEXO 1. Carta de aceptación de la práctica laboral

ANEXO 6. FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PRÁCTICA LABORAL

Bogotá D.C., 09 de julio de 2019

Señores

ESTADO JOVEN: PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

REF: aceptación de práctica del estudiante JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO – Programa de incentivos para las prácticas laborales “Estado Joven”.

El/la estudiante JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO con C.C. No. 1023917216 de Bogotá, cursa 8° semestre del programa académico Ingeniería Civil (registro SNIES 2891), del nivel de formación Universitario.

El/la estudiante se postuló a la plaza de práctica N° 1626001537-36 en UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA y fue seleccionado, por lo tanto la Universidad Antonio Nariño certifica que:

- Las actividades contempladas en la plaza de práctica No. 1626001537-36 están acordes a los requerimientos del programa académico.
- Se avala la realización de la práctica en la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA por un periodo de (5) meses.

En virtud de lo anterior, la Universidad Antonio Nariño se compromete a:

- El supervisor de esta práctica es **Alexandra Morales** identificado con C.C. N° 52119211 de Bogotá D.C. teléfono de contacto 3013154125 y correo electrónico coordinador.ingenieria.civil@uan.edu.co, quien se encargará de: i) acompañar el desarrollo de la práctica laboral en la entidad pública, ii) revisar y aprobar el plan de práctica laboral elaborado por el practicante, iii) avalar los informes presentados por el practicante para el reconocimiento del auxilio de práctica y iv) informar a la Institución de Educación Superior y la Caja de Compensación Familiar, cualquier situación que afecte el normal desarrollo de la práctica laboral.

Firma y sello



EDWIN GONZALEZ ANATOLIA
DECANO INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
Tel: 315 2980 ext. 1524
e-mail: decano.civil@uan.edu.co

ANEXO 2. Resolución de vinculación formativa en la Unidad para
las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS

RESOLUCIÓN NÚMERO (02183) DE 24 JUL 2019

Por la cual se hace una vinculación formativa

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el parágrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, la sección 7 del capítulo 1° del Título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 54 de la Constitución Política de 1991, dispone que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. También señala que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar.

Que el artículo 13 de la Ley 1780 de 2016 dispone que *"El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que jóvenes sin experiencia puedan realizar prácticas laborales, judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud, en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia para el acceso al servicio público (...)"*.

Que el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, dicta que *"En caso de realizar en el sector público la práctica laboral, judicatura o relación docencia de servicio en el área de la salud, las entidades públicas podrán realizar la vinculación formativa del practicante y no será obligatorio celebrar convenios con la Institución Educativa, salvo en los casos en que la Institución Educativa lo solicite en el marco de la autonomía universitaria."*

Que el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, señala que *"A través del Mecanismo de Protección al Cesante y con cargo al FOSFEC, podrá financiarse práctica laboral, judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud como mecanismo para que los jóvenes adquieran experiencia laboral relacionada a su campo de estudio"*.

Que el inciso 2 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, consagra que *"por tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral no constituye relación de trabajo"*.

Que el Sección 7 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, reglamenta: (i) los lineamientos que permiten hacer uso de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante – FOSFEC para financiar práctica laboral, judicatura y relación docente de servicio en el área de la salud, y (ii) la seguridad social de los estudiantes que hagan parte de los programas de incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público.

Que mediante Resolución 4566 de 2016, el Ministerio del Trabajo reguló la operación del programa de incentivos para las prácticas laborales en el sector público.

Que la entidad **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA**, cuenta con una plaza de **PRACTICA LABORAL ORDINARIA No 1626001537-36** con las siguientes actividades principales:

1. Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva.
2. Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
3. Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad.
4. Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva.
5. Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva.
6. Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva.

Que la entidad **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA**, se presentó para participar como escenario de práctica, del programa de prácticas laborales en el sector público- Estado Joven, liderado por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, registrando la plaza de práctica antes mencionada.

Que en el marco de este programa, se realizó un proceso de publicación de la plaza de práctica **No 1626001537-36**, de preselección y selección del practicante, producto del cual fue escogido el estudiante **JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO** identificado con cédula de ciudadanía **No 1.023. 917.216** expedida en Bogotá.



Que **JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO** es estudiante del programa de **INGENIERIA CIVIL** de la Institución de Educación Superior **UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**.

Que para el programa de incentivos de las prácticas laborales en el sector público, la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR** y con cargo a los recursos del **FOSFEC**, será la encargada del pago del auxilio formativo y de la afiliación y cotización a los subsistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales del practicante.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Vincular formativamente al estudiante **JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.023.917.216** en la práctica laboral ordinaria **1626001537-30 ESTADO JOVEN PRÁCTICA LABORAL ORDINARIA** en **INGENIERIA CIVIL** ubicada en la **SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA** de esta entidad pública, de conformidad con lo previsto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Designar como tutor de la práctica laboral ordinaria a la que se refiere la presente Resolución, a **JUANITA IBAÑEZ SANTAMARIA**, quien deberá cumplir con todas las obligaciones que le correspondan, en el marco de lo estipulado por el programa "Estado Joven: prácticas laborales en el sector público".

ARTÍCULO TERCERO. - La duración de la práctica laboral ordinaria y por lo tanto de la vinculación formativa, es de **CINCO** meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ARTÍCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., **24 JUL 2019**

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
DIRECTOR GENERAL

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS**

Aprobó: **CAROLINA MARIA MONCADA ZAPATA** - Secretaria General
Revisó: **EDGAR PINZÓN PÁEZ** - Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano
Proyectó: **NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA** Grupo de Gestión de Talento Humano
Revisó: **JUAN CAMILO LLANOS** - Secretaria General

ANEXO 10. REPORTE DE INFORMACIÓN PARA AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

| | |
|--|---|
| Número de la plaza de práctica | 1626001537-36 |
| Nombre de la entidad pública | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS |
| NIT de la entidad pública | 900490473-6 |
| ARL de la entidad pública | ARL POSITIVA |
| Ciudad | BOGOTA |
| Nombres y apellidos del practicante | JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO |
| Documento de identidad del practicante | C.C No 1.023. 917.216 |
| Objetivo de la práctica | Prestar sus servicios a la Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, en el marco del programa de reparación colectiva de la Unidad. |
| Actividades que ejecutará el practicante | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. 2. Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 3. Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad. 4. Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva. 5. Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva. |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 6. Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | | | | | |
| Lugar de desarrollo de la práctica (dirección) | Carrera 85D No 46A-65 Piso 3 Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C | | | | | |
| Riesgo que corresponde a las actividades de la práctica | UNO (1) | | | | | |
| Horario de la práctica | Día | Hora inicio | Hora salida | Día | Hora inicio | Hora salida |
| | Lunes | 8.00 am | 5.00 p m | Viernes | 8.00 am | 5.00 pm |
| | Martes | 8.00 am | 5.00 p m | Sábado | N/A | N/A |
| | Miercoles | 8.00 am | 5.00 p m | Domingo | N/A | N/A |
| | Jueves | 8.00 am | 5.00 p m | Total horal semanales | | 38 |

(Para prácticas laborales ordinarias la intensidad horaria para tiempo completo será máximo de 38 horas semanales y para medio tiempo máximo 19 horas)

Edgar Pinzón Páez

EDGAR PINZÓN PÁEZ
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
 A LAS VÍCTIMAS

Revisó: EDGAR PINZÓN PÁEZ – Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano
 Proyectó: NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA Grupo de Gestión de Talento Humano

ANEXO 3. Acta de inicio de práctica en la Unidad para las
Victimas


ACTA DE INICIO DE PRÁCTICA

| VINCULACIÓN FORMATIVA - PROGRAMA ESTADO JOVEN: PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO | | | |
|---|--|----------|------|
| Número de Resolución: | RESOLUCION NO. 02183 DEL 24 DE JULIO DE 2019 | Del Año: | 2019 |
| Entidad pública: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | | |
| Nombre del practicante: | JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO | | |
| Institución de Educación Superior | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | | |
| Objetivo de la práctica | PRESTAR SUS SEVICIOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RERPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL AVANCE Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA RUTA DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA ENTIDAD | | |
| Duración | (5) MESES | | |
| Tutor de práctica: | JUANITA IBAÑEZ SANTAMARIA | | |

EL 26 DE AGOSTO DE 2019, se reunieron en la ciudad de BOGOTA, los suscritos, a saber: **JUANITA IBAÑEZ SANTAMARIA**, en su condición de tutor del practicante, **ENRIQUE ARDILA FRANCO**, Director de Reparación Colectiva de la Entidad y **JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO**, identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** No. 1023917216 en su calidad de estudiante vinculado formativamente en el marco del programa de incentivo a las prácticas laborales en el sector publico “ESTADO JOVEN”, con el fin de certificar el inicio de ejecución de la vinculación formativa.

La ejecución de la vinculación formativa tuvo inicio **EL 1 DE AGOSTO DE 2019**, con motivo de periodo vacacional del tutor asignado, la supervisión de las actividades realizadas por el practicante hasta el día **23 DE AGOSTO** estuvo a cargo de **ENRIQUE ARDILA FRANCO**, con **CEDULA DE CIUDADANIA** No. **16927163** quien desempeña el cargo de **DIRECTOR DE REPARACIÓN COLECTIVA** en la Entidad.


Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de BOGOTA el 26 DE AGOSTO DE 2019.



Firma

JUANITA IBAÑEZ SANTAMARIA


UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS



Firma

ENRIQUE ARDILA FRANCO

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS



Firma

JAIRO ALONSO SÉGURA PULIDO

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1023917216

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ANEXO 4. Plan de práctica en la Unidad para las Víctimas

PLAN DE PRÁCTICA EN LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Nombres completos del practicante | Jairo Alonso Segura Pulido | | |
| Documento de identidad del practicante | 1023917216 | Email del practicante | jairosegura61@gmail.com |
| Institución de Educación Superior | Universidad Antonio Nariño | Programa académico | Ingeniería Civil |
| Nombre del supervisor | Alexandra Morales | Email del supervisor | coordinador.ingenieria.civil@uan.edu.co |
| Entidad pública escenario de práctica | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Municipio | Bogotá |
| Nombre del tutor | Juanita Ibañez Santamaria | Email del tutor | juanita.ibanez@unidadvictimas.gov.co |
| Caja de Compensación Familiar | Compensar | | |
| Modalidad de práctica | Práctica laboral ordinaria | <input checked="" type="checkbox"/> | Judicatura |
| Duración de la práctica | 5 meses | Fecha de inicio | 01/08/2019 |

Objetivo general de la práctica: Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad.

Actividades y cronograma para el desarrollo de la práctica:

| ITEM | ACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MESES Y SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|
| | | | Meses del año 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1 | Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. | PROGRAMADO | [Shaded] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | PROGRAMADO | [Shaded] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | [Shaded] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | [Shaded] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Las fechas programadas para las capacitaciones y conferencias correspondientes a las actividades contempladas en los ÍTEM 2 y 5 están sujetas a modificación con respecto a lo programado en el presente cronograma debido a contingencias o imprevistos propios en la Dirección de Reparación de Sujetos Colectivos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Firma



JUANITA IBAÑEZ SANTAMARIA
 C.C. No. 63561490
 UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Firma



ALEXANDRA MORALES
 C.C. No. 52119211
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Firma




JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO
 C.C. No. 1023917216
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ANEXO 5. Primer informe parcial de práctica

PRIMER INFORME PARCIAL DE PASANTÍA EN LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

| | |
|---|--|
| Nombres completo del practicante | Jairo Alonso Segura Pulido |
| Documento de identidad del practicante | 1023917216 |
| Institución de Educación Superior | Universidad Antonio Nariño |
| Programa académico | Ingeniería Civil |
| Entidad pública donde desarrolla la práctica | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas |
| Caja de Compensación Familiar | Compensar |
| Objetivo general de la práctica | Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad |
| Duración de la práctica | (5) meses |
| Número de informe | 1 |

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|--------------------------|---|---|
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 25 % | Estudio de normativa y guías de procesos de reparación colectiva de la entidad | ANEXO 1 |
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | Revisar hojas de observaciones técnicas de ANEXOS 2 y 3 |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXOS 2 y 3 |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria, y formato para el registro consolidado de fechas y costos definitivos de proyectos con Aval de ejecución | ANEXOS 2, 3 y 4 |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 15.8 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval a ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXOS 2 y 3 |



SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA

| ITEM | ACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MESES Y SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|
| | | | Meses del año 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1 | Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 15,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 15,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 15,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 15,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

APRUEBAN


 JUANITA IBÁÑEZ SANTAMARÍA
TUTOR DE PRÁCTICA
 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
 INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS


 ALEXANDRA MORALES
SUPERVISOR DE PRÁCTICA
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO


 JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO
PRACTICANTE
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ANEXO 6. Anexo 1 de primer informe parcial de práctica

LEY 1448 DE 2011

(Junio 10)

Reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011, Reglamentada por el Decreto Nacional 3011 de 2013

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ver Decretos Nacionales 4155, 4633, 4634 y 4635 de 2011

DECRETA:

TÍTULO. I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO. I

Objeto, ámbito y definición de víctima

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE LA LEY. La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3° de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía.

Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley.

ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, *ocurridas con ocasión del conflicto armado interno*.

NOTA: El texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250 de 2012.

NOTA: El texto en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

Parágrafo 4°. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

Parágrafo 5°. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3°) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.

CAPÍTULO. II

Principios generales

ARTÍCULO 4°. DIGNIDAD. El fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio de la dignidad.

El Estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y reparación establecidas en la presente ley, contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes.

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio

legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.

En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas.

En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley.

ARTÍCULO 6°. IGUALDAD. Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.

ARTÍCULO 7°. GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO. El Estado a través de los órganos competentes debe garantizar un proceso justo y eficaz, enmarcado en las condiciones que fija el artículo 29 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 8°. JUSTICIA TRANSICIONAL. Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible.

ARTÍCULO 9°. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS TRANSICIONALES. El Estado reconoce que todo individuo que sea considerado víctima en los términos en la presente ley, tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y a que las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley, no se vuelvan a repetir, con independencia de quién sea el responsable de los delitos.

Las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el Estado, tendrán la finalidad de contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Estas medidas se entenderán como herramientas transicionales para responder y superar las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.

Por lo tanto, las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado, derivada del daño antijurídico imputable a este en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes.

El hecho que el Estado reconozca la calidad de víctima en los términos de la presente ley, no podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial o disciplinaria como prueba de la responsabilidad del Estado o de sus agentes. Tal reconocimiento no revivirá los términos de caducidad de la acción de reparación directa.

En el marco de la justicia transicional las autoridades judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus actuaciones al objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable. Para estos efectos se deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, y la naturaleza de las mismas.

NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-581 de 2013.

En los eventos en que las víctimas acudan a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de la acción de reparación directa, al momento de tasar el monto de la reparación, la autoridad judicial deberá valorar y tener en cuenta el monto de la reparación que en favor de las víctimas se haya adoptado por el Estado, en aras de que sea contemplado el carácter transicional de las medidas que serán implementadas en virtud de la presente ley.

NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencias C-581 y C-912 de 2013.

ARTÍCULO 10. CONDENAS EN SUBSIDIARIEDAD. Las condenas judiciales que ordenen al Estado reparar económicamente y de forma subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneció, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de sus agentes.

En los procesos penales en los que sea condenado el victimario, si el Estado debe concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que este deberá reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa de que trata la presente ley en el artículo 132, sin perjuicio de la obligación en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada dentro del proceso judicial.

ARTÍCULO 11. COHERENCIA EXTERNA. Lo dispuesto en esta ley procura complementar y armonizar los distintos esfuerzos del Estado para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, y allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional.

ARTÍCULO 12. COHERENCIA INTERNA. Lo dispuesto en esta ley, procura complementar y armonizar las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, con miras a allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional.

ARTÍCULO 13. ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.

El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.

Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales.

Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

ARTÍCULO 14. PARTICIPACIÓN CONJUNTA. La superación de vulnerabilidad manifiesta de las víctimas implica la realización de una serie de acciones que comprende:

El deber del Estado de implementar las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas.

El deber de solidaridad y respeto de la sociedad civil y el sector privado con las víctimas, y el apoyo a las autoridades en los procesos de reparación; y

La participación activa de las víctimas.

ARTÍCULO 15. RESPETO MUTUO. Las actuaciones de los funcionarios y las solicitudes elevadas por las víctimas en el marco de los procedimientos derivados de esta ley, se regirán siempre por el respeto mutuo y la cordialidad.

El Estado deberá remover los obstáculos administrativos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas de atención, asistencia y reparación.

ARTÍCULO 16. OBLIGACIÓN DE SANCIONAR A LOS RES- PONSABLES. Las disposiciones descritas en la presente ley, no eximen al Estado de su responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.

ARTÍCULO 17. PROGRESIVIDAD. El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente. **NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 438 de 2013.**

ARTÍCULO 18. GRADUALIDAD. El principio de gradualidad implica la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional de igualdad.

ARTÍCULO 19. SOSTENIBILIDAD. Para efectos de cumplir con las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación dispuestas en el presente marco, el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley, creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley, y tomará las medidas necesarias para garantizar de manera preferente la persecución efectiva de los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de Reparaciones de que trata el artículo 54 de la Ley 975 de 2005.

El desarrollo de las medidas a que se refiere la presente ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-753 de 2013.

ARTÍCULO 20. PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE DOBLE REPARACIÓN Y DE COMPENSACIÓN. La indemnización recibida por vía administrativa se descontará a la reparación que se defina por vía judicial. Nadie podrá recibir doble reparación por el mismo concepto.

ARTÍCULO 21. PRINCIPIO COMPLEMENTARIEDAD. Todas las medidas de atención, asistencia y reparación deben establecerse de forma armónica y propender por la protección de los derechos de las víctimas.

Tanto las reparaciones individuales, ya sean administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas o a los colectivos, deben ser complementarias para alcanzar la integralidad.

ARTÍCULO 22. ACCIÓN DE REPETICIÓN Y SUBROGACIÓN. El Estado deberá ejercer las acciones de repetición y aquellas en las que se subroga de conformidad con la ley, contra el

directamente responsable del delito según se determine en el proceso judicial correspondiente.

ARTÍCULO 23. DERECHO A LA VERDAD. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas.

El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial.

ARTÍCULO 24. DERECHO A LA JUSTICIA. Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción.

Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley.

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

Parágrafo 1º. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley propenden por la reparación integral de las víctimas y se consideran complementarias a las medidas de reparación al aumentar su impacto en la población beneficiaria. Por lo tanto, se reconoce el efecto reparador de las medidas de asistencia establecidas en la presente ley, en la medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización, así como características y elementos particulares que responden a las necesidades específicas de las víctimas.

No obstante este efecto reparador de las medidas de asistencia, estas no sustituyen o reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.

Parágrafo 2º. La ayuda humanitaria definida en los términos de la presente ley no constituye reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.

ARTÍCULO 26. COLABORACIÓN ARMÓNICA. Las entidades del Estado deberán trabajar de manera armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, sin perjuicio de su autonomía.

ARTÍCULO 27. APLICACIÓN NORMATIVA. En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. En los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas en la presente ley se

encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de persona humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas. **NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

ARTÍCULO 28. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, tendrán entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.
2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.
4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.
6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial.
7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar.
8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.
9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente Ley. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C- 715 de 2012**
10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente Ley.
11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes. **NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**
12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012.

ARTÍCULO 29. DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. En virtud del principio de participación conjunta establecido en la presente ley, las víctimas deberán:

Brindar información veraz y completa a las autoridades encargadas de hacer el registro y el seguimiento de su situación o la de su hogar, por lo menos una vez al año, salvo que existan razones justificadas que impidan suministrar esta información. Las autoridades garantizarán la confidencialidad de la información suministrada por las víctimas y de manera excepcional podrá ser conocida por las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas para lo cual suscribirán un acuerdo de confidencialidad respecto del uso y manejo de la información.

Hacer uso de los mecanismos de atención y reparación de acuerdo con los objetivos para los cuales fueron otorgados.

ARTÍCULO 30. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. El Estado a través de las diferentes entidades a las cuales se asignan responsabilidades en relación con las medidas contempladas en esta ley, deberá promover mecanismos de publicidad eficaces, los cuales estarán dirigidos a las víctimas. A través de estos deberán brindar información y orientar a las víctimas acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuenta, al igual que sobre los medios y rutas judiciales y administrativas a través de las cuales podrán acceder para el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 31. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN. Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras, a través de los cuales las víctimas reclaman sus derechos, cuando ello sea necesario según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular, y en la medida en que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, atendiendo a la jurisprudencia y normatividad existente sobre la materia.

Estas medidas podrán extenderse al núcleo familiar, siempre que ello sea necesario según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular, exista amenaza contra los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal del núcleo familiar y se demuestre parentesco con la víctima. El estudio técnico de nivel de riesgo gozará de carácter reservado y confidencial.

Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el presente artículo, remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente designada de acuerdo a los programas de protección, para que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, de acuerdo a la evaluación de riesgo a la que se refiere el presente artículo.

Parágrafo 1º. Los programas de protección contemplados en la presente Ley, se desarrollarán en el marco de los programas existentes en la materia, al momento de expedición de la presente Ley, y garantizando su coherencia con las políticas de seguridad y defensa nacional.

Parágrafo 2º. Teniendo en cuenta que los procesos de reparación judicial y administrativo pueden representar un riesgo especial para las víctimas y los funcionarios públicos que intervienen en estas actuaciones, se deberán establecer medidas de prevención suficientes para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías deberán formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, sus representantes, así como de los funcionarios.

Lo anterior sin perjuicio de las medidas de protección contempladas en esta ley de acuerdo al análisis de riesgo.

Parágrafo 3º. La definición de las medidas de protección para las mujeres víctimas deberán tener en cuenta las modalidades de agresión, las características de los riesgos que enfrentan, las dificultades para protegerse de sus agresores y la vulnerabilidad ante ellos.

ARTÍCULO 32. CRITERIOS Y ELEMENTOS PARA LA REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL. Los programas de protección deberán incluir en su revisión e implementación un carácter integral que incluya los siguientes criterios:

1. Los programas de protección deben contemplar medidas proporcionales al nivel de riesgo de la víctima antes, durante y después de su participación en procesos judiciales o administrativos contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas.

2. Los criterios para evaluación del riesgo fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la decisión de la medida de protección, deben ser conocidos previamente por la víctima o testigo.

3. El riesgo y los factores que lo generan deben ser identificados y valorados de acuerdo con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha fijado al respecto. El riesgo debe ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha evaluación, de conformidad con la normatividad vigente.

4. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima o testigo. Una vez decidida la medida de protección por parte del órgano competente, la víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a la decidida si considera que esta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso. El órgano competente determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad. Lo anterior se realizará en el marco de la oferta institucional de protección existente.

5. Los programas de protección deberán amparar sin discriminación alguna a las víctimas y testigos cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo con ocasión a su participación en procesos judiciales o administrativos contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas. Por consiguiente, los programas establecerán las medidas sin perjuicio del tipo de delito que se investiga o juzga, del presunto responsable del hecho, de la fecha de ocurrencia del delito o del procedimiento judicial o administrativo para el reclamo de los derechos, siempre y cuando exista un claro nexo causal entre las amenazas y la participación de la víctima o testigo en algún proceso judicial o administrativo o su impedimento para participar en el mismo.

6. Los programas de protección, los criterios para la evolución de riesgo y las decisiones sobre las medidas deberán atender y tomar en consideración criterios diferenciales por género, capacidad, cultura y ciclo vital, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

7. Los programas de protección deberán estar en coordinación permanente con los programas de atención a víctimas con el fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante y la situación de riesgo generada.

8. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa de protección deberán efectuarse en sitios seguros y confidenciales, en particular cuando involucran mujeres, niñas, niños y adolescentes.

9. Se deberá dar información permanente a las autoridades judiciales y administrativas que adelantan los procesos de investigación que ocasionaron o agravaron el riesgo, con la finalidad que en el transcurso del mismo se tenga en cuenta la situación de la víctima y testigo. En particular, se tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la participación de la víctima o testigo en las diligencias y se adoptarán correctivos para propiciar que su participación no se vea obstaculizada.

Parágrafo 1°. Además de los criterios señalados en el presente artículo, para la revisión, diseño e implementación de los programas de protección integral se deberán tener en cuenta los siguientes elementos:

El Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los procesos de restitución antes, durante y después de que se lleven a cabo.

Las organizaciones comunitarias y de víctimas con presencia en las áreas donde se lleven a cabo procesos de restitución y reparación colectiva, podrán entregar insumos a los órganos competentes para la determinación y análisis de riesgo.

Las autoridades competentes pondrán en marcha una campaña sostenida de comunicación en prevención, garantía y defensa de los derechos de las víctimas que fomente la solidaridad social a nivel local y nacional.

Parágrafo 2°. La revisión y adecuación a los criterios establecidos en el presente artículo de los programas de protección existentes, deberán ser realizadas en un plazo no mayor de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 33. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA EMPRESA PRIVADA. La presente ley reconoce que los esfuerzos transicionales que propenden por la materialización de los derechos de las víctimas, especialmente a la reparación, involucran al Estado, la sociedad civil y el sector privado. Para el efecto, el Gobierno Nacional diseñará e implementará programas, planes, proyectos y políticas que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y la empresa privada en la consecución de la reconciliación nacional y la materialización de los derechos de las víctimas.

ARTÍCULO 34. COMPROMISOS DEL ESTADO. El Estado colombiano reitera su compromiso real y efectivo de respetar y hacer respetar los principios constitucionales, tratados y convenios e instrumentos que forman parte del bloque de constitucionalidad impidiendo que de un acto suyo o de sus agentes, sin importar su origen ideológico o electoral, se cause violación alguna a cualquiera de los habitantes de su territorio, en particular dentro de las circunstancias que inspiraron la presente ley.

TÍTULO. II

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES

ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN DE ASESORÍA Y APOYO. La víctima y/o su representante deberán ser informados de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde el inicio de la actuación. Para tales efectos, las autoridades que intervengan en las diligencias iniciales, los funcionarios de policía judicial, los defensores de familia y comisarios de familia en el caso de los niños, niñas y adolescentes, los Fiscales, Jueces o integrantes del Ministerio Público deberán suministrar la siguiente información:

1. Las entidades u organizaciones a las que puede dirigirse para obtener asesoría y apoyo.
2. Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede encontrar en las distintas entidades y organizaciones.
3. El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para presentar una denuncia.
4. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y mecanismos que como víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las autoridades deben informar a las mujeres sobre derecho a no ser confrontadas con el agresor o sus agresores.
5. Las autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los requisitos y condiciones mínimos que debe acreditar para acceder a los programas correspondientes.
6. Las entidades y/o autoridades que pueden brindarle orientación, asesoría jurídica o servicios de representación judicial gratuitos.
7. Las instituciones competentes y los derechos de los familiares de las víctimas en la búsqueda, exhumación e identificación en casos de desaparición forzada y de las medidas de prevención para la recuperación de las víctimas.
8. Los trámites y requisitos para hacer efectivos los derechos que le asisten como víctima.

Parágrafo 1°. Frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así como los delitos contra la libertad e integridad personal como la desaparición forzada y el secuestro, las autoridades que intervienen en las diligencias iniciales deberán brindar garantías de

información reforzadas, mediante personal especializado en atención psicosocial, sobre las instituciones a las que deben dirigirse para obtener asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la ruta jurídica que debe seguir.

Parágrafo 2º. En cada una de las entidades públicas en las que se brinde atención y/o asistencia a víctimas, se dispondrá de personal capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y género, que asesore y asista a las víctimas.

ARTÍCULO 36. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. A fin de hacer efectivos sus derechos dentro de la actuación penal o en el marco de los procesos de justicia y paz, las víctimas deberán ser informadas del inicio, desarrollo y terminación del proceso, de las instancias en que pueden participar, de los recursos judiciales a su disposición y de la posibilidad de presentar pruebas, entre otras garantías previstas en las disposiciones legales vigentes. En especial, el Fiscal, Juez o Magistrado competente comunicará a la víctima sobre lo siguiente:

1. Del curso o trámite dado a su denuncia.
2. Del inicio de la investigación formal y de la posibilidad de constituirse en parte dentro de la actuación.
3. De la captura del presunto o presuntos responsables.
4. De la decisión adoptada sobre la detención preventiva o libertad provisional de los presuntos responsables.
5. Del mérito con que fue calificado el sumario o de la audiencia de imputación de cargos.
6. Del inicio del juicio.
7. De la celebración de las audiencias públicas preparatorias y de juzgamiento y de la posibilidad de participar en ellas.
8. De la sentencia proferida por el Juez o Magistrado.
9. De los recursos que cabe interponer en contra de la sentencia.
10. De la exhumación de restos o cadáveres que pudieran corresponder a un familiar desaparecido, de la identificación de posibles lugares de inhumación y del procedimiento en el que tienen que participar las víctimas para lograr la identificación de los restos.
11. De las medidas vigentes para la protección de las víctimas y testigos y los mecanismos para acceder a ellas.
12. De las decisiones sobre medidas cautelares que recaigan sobre bienes destinados a la reparación.
13. De las demás actuaciones judiciales que afecten los derechos de las víctimas.

Parágrafo 1º. Las comunicaciones se harán por escrito, por medio electrónico o por cualquier medio idóneo para la víctima, y el funcionario deberá dejar constancia o registro de ellas en su despacho.

Parágrafo 2º. La comunicación sobre la realización de las diligencias judiciales en las que la víctima pueda participar, deberá efectuarse en un término razonable, y de conformidad con el respectivo proceso.

ARTÍCULO 37. AUDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS. La víctima tendrá derecho, siempre que lo solicite, a ser oída dentro de la actuación penal, a pedir pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder.

La autoridad competente podrá interrogar a la víctima en la medida estrictamente necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados, con pleno respeto a sus derechos, en especial, su dignidad y su integridad moral y procurando en todo caso utilizar un lenguaje y una actitud adecuados que impidan su revictimización. **NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

ARTÍCULO 38. PRINCIPIOS DE LA PRUEBA EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL. En los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia sexual contra las víctimas, el Juez o Magistrado aplicará las siguientes reglas:

1. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre;
2. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando esta sea incapaz de dar un consentimiento voluntario y libre;
3. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual;
4. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo;
5. El Juez o Magistrado no admitirá pruebas sobre el comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación, contando con los aportes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, organismos internacionales y organizaciones que trabajen en la materia, creará un protocolo para la investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en el que se contemplen medidas jurídicas y psicosociales y aspectos como el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios para la investigación, el trato, la atención y la asistencia a las víctimas durante todas las etapas del procedimiento, y acciones específicas para la atención de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas.

ARTÍCULO 39. DECLARACIÓN A PUERTA CERRADA. Cuando por razones de seguridad, o porque la entidad del delito dificulta la descripción de los hechos en audiencia pública o cuando la presencia del inculpado genere alteraciones en el estado de ánimo de las víctimas, el Juez o Magistrado de la causa decretará, de oficio o a petición de parte, que la declaración se rinda en un recinto cerrado, en presencia sólo del fiscal, de la defensa, del Ministerio Público y del propio Juez o Magistrado. En este caso, la víctima deberá ser informada que su declaración será grabada por medio de audio o video.

ARTÍCULO 40. TESTIMONIO POR MEDIO DE AUDIO O VIDEO. El Juez o Magistrado podrá permitir que un testigo rinda testimonio oralmente o por medio de audio o video, con la condición que este procedimiento le permita al testigo ser interrogado por el Fiscal, por la Defensa y por el funcionario del conocimiento, en el momento de rendir su testimonio.

La autoridad competente deberá cerciorarse que el lugar escogido para rendir el testimonio por medio de audio o video, garantice la veracidad, la privacidad, la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la privacidad del testigo. La autoridad tendrá la obligación de garantizar la seguridad y los medios necesarios para rendir testimonio cuando se trate de un niño, niña o adolescente.

Parágrafo. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas, el Juez o Magistrado tendrá la obligación de protegerles y garantizar todos los medios necesarios para facilitar su participación en los procesos judiciales.

ARTÍCULO 41. MODALIDAD ESPECIAL DE TESTIMONIO. El Juez o Magistrado podrá decretar, de oficio o por solicitud del Fiscal, de la Defensa, del Ministerio Público o de la

víctima, medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio de la víctima, un niño o niña, adolescente, un adulto mayor o una víctima de violencia sexual. El funcionario competente, tendrá en cuenta la integridad de las personas y tomando en consideración que la violación de la privacidad de un testigo o una víctima puede entrañar un riesgo para su seguridad, controlará diligentemente la forma de interrogarlo a fin de evitar cualquier tipo de hostigamiento o intimidación y prestando especial atención al caso de víctimas de delitos de violencia sexual. **NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

ARTÍCULO 42. PRESENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO. Cuando el Juez o Magistrado lo estime conveniente, de oficio o a petición de parte, podrá decretar que el testimonio de la víctima sea recibido con acompañamiento de personal experto en situaciones traumáticas, tales como psicólogos, trabajadores sociales, siquiátras o terapeutas, entre otros. La víctima también tendrá derecho a elegir el sexo de la persona ante la cual desea rendir declaración. Esta norma se aplicará especialmente en los casos en que la víctima sea mujer o adulto mayor, o haya sido objeto de violencia sexual, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y será obligatoria en los casos en que la víctima sea un niño, niña o adolescente.

Parágrafo. Cuando las víctimas no se expresen en castellano, se dispondrá la presencia de traductores o intérpretes para recabar su declaración, presentar solicitudes y adelantar las actuaciones en las que hayan de intervenir.

ARTÍCULO 43. ASISTENCIA JUDICIAL. La Defensoría del Pueblo prestará los servicios de orientación, asesoría y representación judicial a las víctimas a que se refiere la presente ley. Para tal efecto, el Defensor del Pueblo efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarios para adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato.

Parágrafo 1°. El Defensor del Pueblo, en el término de seis (6) meses, reorganizará la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley.

Parágrafo 2°. La Defensoría del Pueblo prestará los servicios de representación judicial a las víctimas que lo soliciten mediante el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Para ello, designará representantes judiciales que se dedicarán exclusivamente a la asistencia judicial de las víctimas a través de un programa especial que cumpla tal cometido, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres víctimas.

ARTÍCULO 44. GASTOS DE LA VÍCTIMA EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALES. Las víctimas respecto de las cuales se compruebe de manera sumaria y expedita la falta de disponibilidad de recursos para cubrir los gastos en la actuación judicial, serán objeto de medidas tendientes a facilitar el acceso legítimo al proceso penal.

De manera preferente y en atención a los recursos monetarios y no monetarios disponibles, podrán ser objeto de medidas tales como el acceso a audiencias a través de teleconferencias o cualquier otro medio tecnológico que permita adelantar las respectivas etapas procesales.

Parágrafo 1°. Cuando las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela o acudir a la justicia contencioso administrativa, para obtener una reparación o indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las representen en el proceso no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el caso de las acciones de tutela, o de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el caso de las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, incluyendo la suma que sea acordada como cuota de éxito, *cuota litis*, o porcentaje del monto decretado a favor de la víctima por la autoridad judicial. Lo anterior tendrá aplicación independientemente de que se trate de uno o varios apoderados e independientemente de que un proceso reúna a varias víctimas.

NOTA: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-609 de 2012.

Parágrafo 2°. Lo previsto en este artículo será reglamentado por el Gobierno Nacional, en un término no mayor a un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 45. Los organismos con funciones permanentes de Policía Judicial destinarán, de su planta actual de personal, a un grupo especializado de sus agentes para desarrollar labores de identificación de bienes y activos que hayan ocultado las personas sindicadas de menoscabar los derechos de las víctimas de las que trata la presente ley.

ARTÍCULO 46. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o demás evidencia recaudada durante una investigación penal por el daño de los derechos de las víctimas de las que trata la presente ley, se pueda inferir razonablemente que la estructura u organización ilegal a la que perteneció el investigado recibió apoyo económico, de manera voluntaria, de una persona natural o jurídica nacional o extranjera, con filial o subsidiaria en el territorio nacional, o que servidores públicos dispusieron de la función pública para promover acciones de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la respectiva estructura ilegal, el fiscal deberá remitir el expediente y las pruebas recaudadas a un Fiscal ordinario, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y las normas que regulan la materia.

En los eventos en que durante el procedimiento regulado en la Ley 975 de 2005, el Fiscal de Justicia y Paz advierta alguna de las circunstancias mencionadas en el inciso anterior, este deberá remitir el expediente y las pruebas recaudadas a un Fiscal ordinario, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y las normas que regulan la materia.

En los eventos en que se declare la responsabilidad penal de la persona natural o del representante de la persona jurídica nacional o extranjera con filial o subsidiaria en el territorio nacional o del servidor público, según sea el caso, el Juez de conocimiento, previa solicitud del fiscal o del Ministerio Público, abrirá inmediatamente un incidente de reparación especial, que se surtirá de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, sin necesidad de que se individualicen las víctimas, comoquiera que el Juez o Magistrado de conocimiento tendrá en consideración el daño de derechos causado por el grupo armado al margen de la ley que hubiere sido apoyado. **NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

Al decidir el incidente de reparación el Juez o Magistrado de conocimiento ordenará, a título de reparación a las víctimas, que la misma suma de dinero con que el condenado o los condenados contribuyó o contribuyeron a la financiación de la estructura u organización ilegal, o su equivalente en dinero si el apoyo fue en especie, o la suma que el Juez o Magistrado estime pertinente en caso de que la misma no esté determinada dentro del proceso, sea consignada a favor del Fondo de Reparación a las Víctimas de la Violencia. **NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

El Juez o Magistrado también podrá ordenar al condenado la ejecución de medidas de satisfacción, las cuales deberán ser realizadas directamente por este. Esta disposición no tendrá efectos para la responsabilidad subsidiaria del Estado la cual se regirá por lo establecido en el artículo 10 de la presente Ley.

Parágrafo 1°. Cuando en el transcurso del proceso penal el juez de conocimiento advierta razones fundadas para pensar que la estructura u organización ilegal a la que perteneció el acusado recibió apoyo económico, de manera voluntaria, de una persona natural o jurídica nacional o extranjera, con filial o subsidiaria en el territorio nacional, deberá remitir el expediente y las pruebas recaudadas a un Fiscal ordinario, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y las normas que regulan la materia.

Parágrafo 2°. La persona jurídica cuyo representante legal sea condenado en los términos del presente artículo, deberá concurrir como tercero civilmente responsable al incidente de reparación en los términos del Código de Procedimiento Penal. Así mismo, el Juez o Magistrado también podrá ordenar la ejecución de medidas de satisfacción a favor de las víctimas por parte de las personas jurídicas a las que se refiere este artículo.

Parágrafo 3°. En ningún caso, en los términos del presente artículo, el Juez o Magistrado podrá ordenar a una persona jurídica, a título de reparación, consignar a favor del Fondo de Reparación a las Víctimas de la violencia en más de una ocasión por los mismos hechos.

TÍTULO. III

AYUDA HUMANITARIA, ATENCIÓN Y ASISTENCIA

CAPÍTULO. I

Ayuda humanitaria a las víctimas

ARTÍCULO 47. AYUDA HUMANITARIA. Las víctimas de que trata el artículo 3° de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma. **NOTA: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, recibirán asistencia médica y psicológica especializada de emergencia.

Parágrafo 1°. Modificado por el art. 122, Ley 1753 de 2015. Las entidades territoriales en primera instancia, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar subsidiariamente, deberán prestar el alojamiento y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata a la violación de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la misma.

Parágrafo 2°. Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión, cuando estas lo requieran en razón a una violación a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley.

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación, deberá adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas para garantizar la ayuda humanitaria. De igual manera, y de acuerdo a lo contemplado en el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas correspondientes, **prestará por una sola vez**, a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite, y de acuerdo a su competencia, la ayuda humanitaria. **NOTA: Texto en negrilla declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

Parágrafo 4°. En lo que respecta a la atención humanitaria para la población víctima del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en el Capítulo III del presente Título.

ARTÍCULO 48. CENSO. En el evento en que se presenten atentados terroristas y desplazamientos masivos la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Gobierno, dependencia, funcionario o autoridad que corresponda, con el acompañamiento de la Personería Municipal, deberá elaborar el censo de las personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de domicilio, residencia, y bienes.

Dicho censo deberá contener como mínimo la identificación de la víctima, su ubicación y la descripción del hecho, y remitirlo a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en un término no mayor a ocho (8) días hábiles contados a partir de la ocurrencia del mismo.

La información se consignará en un formato único de uso obligatorio, que para tales efectos expedirá la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y hará parte del Registro Único de Víctimas, y reemplazará la declaración a la que hace referencia el artículo 155 en lo que respecta a los hechos victimizantes registrados en el censo.

Parágrafo. En el caso de los desplazamientos masivos, el censo procederá conforme al artículo 13 del Decreto 2569 de 2000, en cuanto exime a las personas que conforman el desplazamiento masivo de rendir una declaración individual para solicitar su inscripción en el Registro Único de Víctimas.

CAPÍTULO. II

Medidas de Asistencia y Atención a las Víctimas

ARTÍCULO 49. ASISTENCIA Y ATENCIÓN. Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.

Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

ARTÍCULO 50. ASISTENCIA FUNERARIA. En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, las entidades territoriales, en concordancia con las disposiciones legales de los artículos 268 y 269 del Decreto-ley 1333 de 1986, pagarán con cargo a sus presupuestos y sin intermediarios, a las víctimas a que se refiere la presente ley, los gastos funerarios de las mismas, siempre y cuando no cuenten con recursos para sufragarlos.

Parágrafo. Los costos funerarios y de traslado, en caso de que la víctima fallezca en un municipio distinto a su lugar habitual de residencia, serán sufragados por los municipios donde ocurrió el deceso y aquel en el que la víctima residía.

ARTÍCULO 51. MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Las distintas autoridades educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media a las víctimas señaladas en la presente ley, siempre y cuando estas no cuenten con los recursos para su pago. De no ser posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el servicio educativo con instituciones privadas.

NOTA: El texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.

NOTA: La expresión en negrilla fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-462 de 2013.

En educación superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública, en el marco de su autonomía, establecerán los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos de la presente ley, puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en condición de discapacidad.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la presente ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX.

Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso a las víctimas de que trata la presente ley.

ARTÍCULO 52. MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD. El Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas de la presente ley, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Toda persona que sea incluida en el Registro Único de Víctimas de que trata la presente Ley, accederá por ese hecho a la afiliación contemplada en el artículo 32.2 de la Ley 1438 de 2011, y se considerará elegible para el subsidio en salud, salvo en los casos en que se demuestre capacidad de pago de la víctima.

Parágrafo 1º. Con el fin de garantizar la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas de que trata la presente ley, priorizando y atendiendo a las necesidades particulares de esta población, se realizará la actualización del Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los términos de la Ley 1438 de 2011.

Parágrafo 2º. Las víctimas que se encuentren registradas en el Sisbén 1 y 2 quedarán exentas de cualquier cobro de copago o cuota moderadora, en todo tipo de atención en salud que requieran. En caso de no hallarse afiliadas a ningún régimen, tendrán que ser afiliadas en forma inmediata al régimen subsidiado.

ARTÍCULO 53. ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN SALUD. Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión.

ARTÍCULO 54. SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD. Los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

1. Hospitalización.
2. Material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, conforme con los criterios técnicos que fije el Ministerio de la Protección Social.
3. Medicamentos.
4. Honorarios Médicos.
5. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas.
6. Transporte.
7. Examen del VIH sida y de ETS, en los casos en que la persona haya sido víctima de acceso carnal violento.
8. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y/o la ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima.
9. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

Parágrafo. El reconocimiento y pago de los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a que se refiere este capítulo, se hará por conducto del Ministerio de la Protección Social con cargo a los recursos del Fosyga, subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, únicamente en los casos en que se deban prestar los servicios de asistencia para atender lesiones transitorias permanentes y las demás afectaciones de la salud que tengan

relación causal directa con acciones violentas que produzcan un daño en los términos del artículo 3º de la presente ley, salvo que estén cubiertos por planes voluntarios de salud.

ARTÍCULO 55. REMISIONES. Los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que resultaren víctimas de acuerdo a la presente ley, serán atendidos por las instituciones prestadoras de salud y una vez se les preste la atención de urgencias y se logre su estabilización, si estas instituciones no contaren con disponibilidad o capacidad para continuar prestando el servicio, serán remitidos a las instituciones hospitalarias que definan las entidades de aseguramiento para que allí se continúe el tratamiento requerido. La admisión y atención de las víctimas en tales instituciones hospitalarias es de aceptación inmediata y obligatoria por parte de estas, en cualquier parte del territorio nacional, y estas instituciones deberán notificar inmediatamente al Fosyga sobre la admisión y atención prestada.

Parágrafo. Aquellas personas que se encuentren en la situación prevista en la presente norma y que no se encuentren afiliados al régimen contributivo de seguridad social en salud o a un régimen de excepción, accederán a los beneficios contemplados en el artículo 158 de la Ley 100 de 1993 mientras no se afilien al régimen contributivo en virtud de relación de contrato de trabajo o deban estar afiliados a dicho régimen.

ARTÍCULO 56. PÓLIZAS DE SALUD. Los gastos que demande la atención de las víctimas amparadas con pólizas de compañías de seguros de salud o contratos con empresas de medicina prepagada, serán cubiertos por el Estado de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo, cuando no estén cubiertos o estén cubiertos de manera insuficiente por el respectivo seguro o contrato.

ARTÍCULO 57. EVALUACIÓN Y CONTROL. El Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud, según el caso, ejercerá la evaluación y control sobre los aspectos relativos a:

1. Número de pacientes atendidos.
2. Acciones médico-quirúrgicas.
3. Suministros e insumos hospitalarios gastados.
4. Causa de egreso y pronóstico.
5. Condición del paciente frente al ente hospitalario.
6. El efectivo pago al prestador.
7. Negación de atención oportuna por parte de prestadores o aseguradores.
8. Las condiciones de calidad en la atención por parte de IPS, EPS o regímenes exceptuados.
9. Los demás factores que constituyen costos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 58. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, será para las entidades prestadoras de los servicios de salud, para las EPS, regímenes especiales y para los empleados responsables, causal de sanción por las autoridades competentes en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley 10 de 1990, y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 59. ASISTENCIA POR LOS MISMOS HECHOS. Las víctimas que hayan sido beneficiadas con alguna de las anteriores medidas, no serán asistidas nuevamente por el mismo hecho victimizante, salvo que se compruebe que es requerida la asistencia por un hecho sobreviniente.

CAPÍTULO. III

De la atención a las víctimas del desplazamiento forzado

ARTÍCULO 60. NORMATIVIDAD APLICABLE Y DEFINICIÓN. La atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten.

Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, que no contraríen la presente ley, continuarán vigentes.

NOTA: El texto subrayado declarado **INEXEQUIBLE** por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013, el resto de texto de este inciso declarado **EXEQUIBLE** por la misma Sentencia.

Parágrafo 1º. El costo en el que incurra el Estado en la prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, en ningún caso será descontado del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho esta población.

Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto reparador, exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición.

NOTA: Inciso segundo de este parágrafo declarado **EXEQUIBLE** por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.

Parágrafo 2º. Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de la presente Ley.

NOTA: Parágrafo declarado **EXEQUIBLE** por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.

ARTÍCULO 61. LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO. La persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1º de enero de 1985, y no se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada.

La declaración hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 155 de la presente Ley. La valoración que realice el funcionario encargado de recibir la solicitud de registro debe respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.

Parágrafo 1º. Se establece un plazo de dos (2) años para la reducción del subregistro, periodo en el cual las víctimas del desplazamiento de años anteriores podrán declarar los hechos con el fin de que se decida su inclusión o no en el Registro.

Para este efecto, el Gobierno Nacional adelantará una campaña de divulgación a nivel nacional a fin de que las víctimas de desplazamiento forzado que no han declarado se acerquen al Ministerio Público para rendir su declaración.

Parágrafo 2º. En las declaraciones presentadas dos años después de la ocurrencia del hecho que dio lugar al desplazamiento forzado, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad dicha

declaración, con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o impidan la accesibilidad de las víctimas a la protección del Estado.

En cualquier caso, se deberá preguntar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron su desplazamiento para contar con información precisa que permita decidir sobre la inclusión o no del declarante al Registro.

Parágrafo 3°. En evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima del desplazamiento forzado rendir la declaración en el término establecido en el presente artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento.

La víctima de desplazamiento forzado deberá informar al funcionario del Ministerio Público, quien indagará por dichas circunstancias y enviará la diligencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que realice las acciones pertinentes de acuerdo a los eventos aquí mencionados.

ARTÍCULO 62. ETAPAS DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA. Reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014. Se establecen tres fases o etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado:

1. Atención Inmediata;
2. Atención Humanitaria de Emergencia; y
3. Atención Humanitaria de Transición.

Parágrafo. Las etapas aquí establecidas varían según su temporalidad y el contenido de dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que se realice por la entidad competente para ello.

ARTÍCULO 63. ATENCIÓN INMEDIATA. Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria.

Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población en situación de desplazamiento. Se atenderá de manera inmediata desde el momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de Víctimas.

Parágrafo 1°. Podrán acceder a esta ayuda humanitaria las personas que presenten la declaración de que trata el artículo 61 de esta Ley, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro de los tres (3) meses previos a la solicitud.

Cuando se presenten casos de fuerza mayor que le impidan a la víctima del desplazamiento forzado presentar su declaración en el término que este parágrafo establece, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento, frente a lo cual, el funcionario del Ministerio Público indagará por dichas circunstancias e informará a la Entidad competente para que realicen las acciones pertinentes.

Parágrafo 2°. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 de la presente Ley.

Ver Resolución UARIV 2348 de 2012.

ARTÍCULO 64. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014. Es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto

administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima.

NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.

Realizado el registro se enviará copia de la información relativa a los hechos delictivos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias.

Parágrafo 1º. La atención humanitaria de emergencia seguirá siendo entregada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional hasta tanto se le garanticen los recursos de operación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite, y que los beneficiarios la reciban en su totalidad y de manera oportuna.

Parágrafo 2º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley.

ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. Reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014. Es la ayuda humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.

Parágrafo 1º. Modificado por el art. 122, Ley 1753 de 2015. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en situación de desplazamiento. De igual forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los entes territoriales adoptarán las medidas conducentes para garantizar el alojamiento temporal de la población en situación de desplazamiento.

Parágrafo 2º. Los programas de empleo dirigidos a las víctimas de que trata la presente ley, se considerarán parte de la ayuda humanitaria de transición.

Parágrafo 3º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley.

ARTÍCULO 66. RETORNOS Y REUBICACIONES. Reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014. *Con el propósito de garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables, estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento.*

NOTA: El texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.

NOTA: El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-462 de 2013.

Cuando no existan las condiciones de seguridad para permanecer en el lugar elegido, las víctimas deberán acercarse al Ministerio Público y declarar los hechos que generen o puedan generar su desplazamiento.

NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013, bajo el entendido de que lo allí establecido no afectará el goce de los derechos reconocidos por la ley a las personas víctimas de desplazamiento forzado, entre ellos, la posibilidad de ser nuevamente reubicado.

Parágrafo 1º. Modificado por el art. 122, Ley 1753 de 2015. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para garantizar la efectiva atención integral a la población retornada o reubicada, especialmente en lo relacionado con los derechos mínimos de identificación a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, salud a cargo del Ministerio de la Protección Social, educación a cargo del Ministerio de Educación Nacional, alimentación y reunificación familiar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vivienda digna a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando se trate de vivienda urbana, y a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuando se trate de vivienda rural y orientación ocupacional a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Parágrafo 2º. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará el procedimiento para garantizar que las personas víctimas de desplazamiento forzado que se encuentren fuera del territorio nacional con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de la presente Ley, sean incluidas en los programas de retorno y reubicación de que trata el presente artículo.

ARTÍCULO 67. CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y DEBILIDAD MANIFIESTA. Reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente Ley.

NOTA: El texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional establecerá los criterios para determinar la cesación de la situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta a causa del hecho mismo del desplazamiento, de acuerdo con los indicadores de goce efectivo de derechos de la atención integral definidos jurisprudencialmente.

Parágrafo 2º. Una vez cese la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, se modificará el Registro Único de Víctimas, para dejar constancia de la cesación a la que se ha hecho referencia en este artículo.

En todo caso, la persona cesada mantendrá su condición de víctima, y por ende, conservará los derechos adicionales que se desprenden de tal situación.

Parágrafo 3º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley.

ARTÍCULO 68. EVALUACIÓN DE LA CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y DEBILIDAD MANIFIESTA. Reglamentado por el Decreto Nacional 2569 de 2014. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los alcaldes municipales o distritales del lugar donde reside la persona en situación de desplazamiento, evaluarán cada dos años las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento.

Esta evaluación se realizará a través de los mecanismos existentes para hacer seguimiento a los hogares, y aquellos para declarar cesada la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de acuerdo al artículo anterior.

Las entidades del orden nacional, regional o local deberán enfocar su oferta institucional para lograr la satisfacción de las necesidades asociadas al desplazamiento, de conformidad con los resultados de la evaluación de cesación.

TÍTULO. IV

REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

CAPÍTULO. I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 69. MEDIDAS DE REPARACIÓN. Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

ARTÍCULO 70. El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012.**

CAPÍTULO. II

Disposiciones generales de restitución

ARTÍCULO 71. RESTITUCIÓN. Se entiende por restitución, la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.

CAPÍTULO. III

Restitución de tierras. Disposiciones Generales

Reglamentado por el Decreto Nacional 4829 de 2011

ARTÍCULO 72. ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DES-POJADOS. El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente.

Las acciones de reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C- 715 de 2012**

En el caso de bienes baldíos se procederá con la adjudicación del derecho de propiedad del baldío a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la adjudicación.

La restitución jurídica del inmueble despojado se realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, según el caso. El restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el registro de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del derecho de posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de pertenencia, en los términos señalados en la ley. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C- 715 de 2012**

En los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa consulta con el afectado. La compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de restitución. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C- 715 de 2012**

El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición de la presente ley.

ARTÍCULO 73. PRINCIPIOS DE LA RESTITUCIÓN. La restitución de que trata la presente ley estará regida por los siguientes principios:

1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos-restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas; **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012.**

2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese derecho; **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012.**

3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas;

4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad;

5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o compensación;

6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas;

7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la comunidad contará con la plena participación de las víctimas;

8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.

ARTÍCULO 74. DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE TIERRAS. Se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia.

Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer

la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75.

La perturbación de la posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo de la situación de violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75, no interrumpirá el término de prescripción a su favor.

El despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término de usucapión exigido por la normativa. En el caso de haberse completado el plazo de posesión exigido por la normativa, en el mismo proceso, se podrá presentar la acción de declaración de pertenencia a favor del restablecido poseedor.

Si el despojo o el desplazamiento forzado perturbaron la explotación económica de un baldío, para la adjudicación de su derecho de dominio a favor del despojado no se tendrá en cuenta la duración de dicha explotación. En estos casos el Magistrado deberá acoger el criterio sobre la Unidad Agrícola Familiar como extensión máxima a titular y será ineficaz cualquier adjudicación que exceda de esta extensión.

El propietario o poseedor de tierras o explotador económico de un baldío, informará del hecho del desplazamiento a cualquiera de las siguientes entidades: la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar.

Parágrafo. La configuración del despojo es independiente de la responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria, o civil, tanto de la persona que priva del derecho de propiedad, posesión, ocupación o tenencia del inmueble, como de quien realiza las amenazas o los actos de violencia, según fuere el caso.

ARTÍCULO 75. TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente, en los términos establecidos en este capítulo.
NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012, Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250 de 2012.

PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS

ARTÍCULO 76. REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE. Créase el "*Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente*" como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio.

El registro se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. La conformación y administración del registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que se crea por esta Ley.

La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso.

Una vez recibida la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de buena fe, conforme a la ley. Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a partir del momento en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este artículo, para decidir sobre su inclusión en el Registro. Este término podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012**

La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este Capítulo. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012 por los cargos analizados**

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá acceso a todas las bases de datos sobre las víctimas de despojo o abandono forzado, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de los catastros descentralizados, de las notarías, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, de la Superintendencia de Notariado y Registro, de las oficinas de registro de instrumentos públicos, entre otros.

Para estos efectos, las entidades dispondrán de servicios de intercambio de información en tiempo real con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con base en los estándares de seguridad y políticas definidas en el Decreto 1151 de 2008 sobre la estrategia de Gobierno en Línea.

En los casos en que la infraestructura tecnológica no permita el intercambio de información en tiempo real, los servidores públicos de las entidades y organizaciones respectivas, deberán entregar la información en el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la solicitud. Los servidores públicos que obstruyan el acceso a la información o incumplan con esta obligación incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Parágrafo 1°. Las autoridades que reciban información acerca del abandono forzado y de despojo de tierras deben remitir a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al día hábil siguiente a su recibo, toda la información correspondiente con el objetivo de agilizar la inscripción en el registro y los procesos de restitución.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas deberá permitir el acceso a la información por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en aras de garantizar la integridad e interoperatividad de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ARTÍCULO 77. PRESUNCIONES DE DESPOJO EN RELACIÓN CON LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. En relación con los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta las siguientes presunciones:

1. *Presunciones de derecho en relación con ciertos contratos.* Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume de derecho que existe ausencia de consentimiento, o causa ilícita, en los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se

transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, celebrados durante el periodo previsto en el artículo 75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. La ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en este numeral genera la inexistencia del acto o negocio de que se trate y la nulidad absoluta de todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o una parte del bien.

2. *Presunciones legales en relación con ciertos contratos.* Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos:

a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la época en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes.

b. Sobre inmuebles colindantes de aquellos en los que, con posterioridad o en forma concomitante a las amenazas, se cometieron los hechos de violencia o el despojo se hubiera producido un fenómeno de concentración de la propiedad de la tierra en una o más personas, directa o indirectamente; sobre inmuebles vecinos de aquellos donde se hubieran producido alteraciones significativas de los usos de la tierra como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería industrial, con posterioridad a la época en que ocurrieron las amenazas, los hechos de violencia o el despojo.

c. Con personas que hayan sido extraditadas por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros.

d. En los casos en los que el valor formalmente consagrado en el contrato, o el valor efectivamente pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya titularidad se traslada en el momento de la transacción.

e. Cuando no se logre desvirtuar la ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en alguno de los literales del presente artículo, el acto o negocio de que se trate será reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o parte del bien estarán viciados de nulidad absoluta.

f. Frente a propiedad adjudicada de conformidad con la Ley 135 de 1961 y el Decreto 561 de 1989, a empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, cuando con posterioridad al desplazamiento forzado se haya dado una transformación en los socios integrantes de la empresa.

3. *Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos.* Cuando la parte opositora hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá negársele su restitución con fundamento en que un acto administrativo posterior legalizó una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima. Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume legalmente que tales actos son nulos. Por lo tanto, el juez o Magistrado podrá decretar la nulidad de tales actos. La nulidad de dichos actos produce el decaimiento de todos los actos administrativos posteriores y la nulidad de todos los

actos y negocios jurídicos privados que recaigan sobre la totalidad del bien o sobre parte del mismo.

NOTA: La palabra "opositora" fue declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012, en tanto que la palabra "parte" fue declarada EXEQUIBLE, en el entendido de que se refiere a los solicitantes víctimas de despojo o abandono forzado de bienes, NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012

4. *Presunción del debido proceso en decisiones judiciales.* Cuando el solicitante hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá negársele su restitución con fundamento en que una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada otorgó, transfirió, expropió, extinguió o declaró la propiedad a favor de un tercero, o que dicho bien fue objeto de diligencia de remate, si el respectivo proceso judicial fue iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el proceso de que trata esta ley. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012**

Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que los hechos de violencia le impidieron al despojado ejercer su derecho fundamental de defensa dentro del proceso a través del cual se legalizó una situación contraria a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el juez o Magistrado podrá revocar las decisiones judiciales a través de las cuales se vulneraron los derechos de la víctima y a ordenar los ajustes tendientes a implementar y hacer eficaz la decisión favorable a la víctima del despojo.

5. *Presunción de inexistencia de la posesión.* Cuando se hubiera iniciado una posesión sobre el bien objeto de restitución, durante el periodo previsto en el artículo 75 y la sentencia que pone fin al proceso de que trata la presente ley, se presumirá que dicha posesión nunca ocurrió.

ARTÍCULO 78. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012**

ARTÍCULO 79. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. Así mismo, conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras.

Los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, conocerán y decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso.

En los procesos en que se reconozca personería a opositores, los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Las sentencias proferidas por los Jueces Civiles del Circuito especializados en restitución de tierras que no decreten la restitución a favor del despojado serán objeto de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos y garantías de los despojados.

Parágrafo 1º. Los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras, podrán decretar de oficio las pruebas adicionales que consideren necesarias, las que se practicarán en un término no mayor de veinte (20) días.

Parágrafo 2º. Donde no exista Juez civil del Circuito especializado en restitución de tierras, podrá presentarse la demanda de restitución ante cualquier juez civil municipal, del circuito o promiscuo, quien dentro de los dos (2) días siguientes deberá remitirla al funcionario competente.

ARTÍCULO 80. COMPETENCIA TERRITORIAL. Serán competentes de modo privativo los jueces y Magistrados del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos se encuentran en varios municipios con distintas jurisdicciones, serán competentes el juez y los magistrados del municipio de la respectiva jurisdicción donde se presente la demanda.

ARTÍCULO 81. LEGITIMACIÓN. Serán titulares de la acción regulada en esta ley:

Las personas a que hace referencia el artículo 75.

Su cónyuge o compañero o compañera permanente con quien se conviva al momento en que ocurrieron los hechos o amenazas que llevaron al despojo o al abandono forzado, según el caso.

Cuando el despojado, o su cónyuge o compañero o compañera permanente hubieran fallecido, o estuvieren desaparecidos podrán iniciar la acción los llamados a sucederlos, de conformidad con el Código Civil, y en relación con el cónyuge o el compañero o compañera permanente se tendrá en cuenta la convivencia marital o de hecho al momento en que ocurrieron los hechos.

En los casos contemplados en el numeral anterior, cuando los llamados a sucederlos sean menores de edad o personas incapaces, o estos vivieran con el despojado y dependieran económicamente de este, al momento de la victimización, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actuará en su nombre y a su favor.

Los titulares de la acción podrán solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas que ejerza la acción en su nombre y a su favor.

ARTÍCULO 82. SOLICITUD DE RESTITUCIÓN O FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas podrá solicitar al Juez o Magistrado la titulación y entrega del respectivo predio incluido en el registro de tierras despojadas a favor del titular de la acción y representarlo en el proceso.

Parágrafo. Los titulares de la acción pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución o formalización de predios registrados en la Unidad, en las cuales se dé uniformidad con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados, el tiempo y la causa del desplazamiento.

ARTÍCULO 83. SOLICITUD DE RESTITUCIÓN O FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LA VÍCTIMA. Cumplido el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 76, el despojado podrá dirigirse directamente al Juez o Magistrado, según lo dispuesto en el artículo 79, mediante la presentación de demanda escrita u oral, por sí misma o a través de apoderado.

ARTÍCULO 84. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. La solicitud de restitución o formalización deberá contener:

a). La identificación del predio que deberá contener como mínimo los siguientes datos: la ubicación, el departamento, municipio, corregimiento o vereda, la identificación registral, número de la matrícula inmobiliaria e identificación catastral, número de la cédula catastral.

b). La constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas.

- c). Los fundamentos de hecho y de derecho de la solicitud.
- d). Nombre, edad, identificación y domicilio del despojado y de su núcleo familiar, o del grupo de personas solicitantes, según el caso.
- e). El certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique registralmente el predio.
- f). La certificación del valor del avalúo catastral del predio.

Parágrafo 1º. Se garantizará la gratuidad a favor de las víctimas, de los trámites de que trata el presente artículo, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010.

Parágrafo 2º. En los casos en que no sea posible allegar con la solicitud los documentos contenidos a literales e) y f) del presente artículo, se podrán acreditar por cualquiera de los medios de prueba admisibles señalados en el Código de Procedimiento Civil su calidad de propietario, poseedor u ocupante de las tierras objeto de restitución. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012**

ARTÍCULO 85. TRÁMITE DE LA SOLICITUD. La sustanciación de la solicitud estará a cargo del Juez o Magistrado según el caso, a quien corresponderá por reparto que será efectuado por el Presidente de la Sala el mismo día, o a más tardar el siguiente día hábil. El Juez o Magistrado tendrá en consideración la situación de vulnerabilidad manifiesta de las víctimas para considerar la tramitación preferente de sus reclamaciones.

ARTÍCULO 86. ADMISIÓN DE LA SOLICITUD. El auto que admita la solicitud deberá disponer:

- a). La inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos indicando el folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de inscripción por el registrador al Magistrado, junto con el certificado sobre la situación jurídica del bien, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la orden de inscripción.
- b). La sustracción provisional del comercio del predio o de los predios cuya restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia.
- c). La suspensión de los procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restitución se solicita, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio cuya restitución se solicita, así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepción de los procesos de expropiación.
- d). La notificación del inicio del proceso al representante legal del municipio a donde esté ubicado el predio, y al Ministerio Público.
- e). La publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y los nombres e identificación de la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio cuya restitución se solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio, así como las personas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos. **NOTA: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

Parágrafo. Adicionalmente el Juez o Magistrado en este auto o en cualquier estado del proceso podrá decretar las medidas cautelares que considere pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se estuviere causando sobre el inmueble.

ARTÍCULO 87. TRASLADO DE LA SOLICITUD. El traslado de la solicitud se surtirá a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención.

Con la publicación a que se refiere el literal e) del artículo anterior se entenderá surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y a quienes se consideren afectados por el proceso de restitución.

Cumplidas las anteriores formalidades sin que los terceros determinados se presenten, se les designará un representante judicial para el proceso en el término de cinco (5) días.

ARTÍCULO 88. OPOSICIONES. Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser valorada y tenida en cuenta por el Juez o Magistrado. **NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013.**

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando no haya actuado como solicitante podrá presentar oposición a la solicitud de restitución.

Al escrito de oposición se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta de culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de restitución o formalización.

Cuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en este capítulo y no se presenten opositores, el Juez o Magistrado procederá a dictar sentencia con base en el acervo probatorio presentado con la solicitud.

ARTÍCULO 89. PRUEBAS. Son pruebas admisibles todas las reconocidas por la ley. En particular el Juez o Magistrado tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas con la solicitud, evitará la duplicidad de pruebas y la dilación del proceso con la práctica de pruebas que no considere pertinentes y conducentes. Tan pronto el Juez o Magistrado llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo sin necesidad de decretar o practicar las pruebas solicitadas.

El valor del predio lo podrá acreditar el opositor mediante el avalúo comercial del predio elaborado por una Lonja de Propiedad Raíz de las calidades que determine el Gobierno Nacional. Si no se presenta controversia sobre el precio, se tendrá como valor total del predio el avalúo presentado por la autoridad catastral competente.

Se presumen fidedignas las pruebas provenientes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente a que se refiere esta ley.

ARTÍCULO 90. PERIODO PROBATORIO. El período probatorio será de treinta (30) días, dentro del cual serán practicadas las pruebas que se hubieren decretado en el proceso.

ARTÍCULO 91. CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y

decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012**

La sentencia deberá referirse a los siguientes aspectos, de manera explícita y suficientemente motivada, según el caso:

- a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de opositores y las solicitudes de los terceros;
- b. La identificación, individualización, deslinde de los inmuebles que se restituyan, indicando su ubicación, extensión, características generales y especiales, linderos, coordenadas geográficas, identificación catastral y registral y el número de matrícula inmobiliaria.
- c. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que inscriba la sentencia, en la oficina en donde por circunscripción territorial corresponda el registro del predio restituido o formalizado.
- d. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que cancele todo antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales;
- e. Las órdenes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los términos de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les restituya el bien estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de protección;
- f. En el caso de que procediera la declaración de pertenencia, si se hubiese sumado el término de posesión exigido para usucapir previsto por la normativa, las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que inscriba dicha declaración de pertenencia;
- g. En el caso de la explotación de baldíos, se ordenará al Incoder la realización de las adjudicaciones de baldíos a que haya lugar.
- h. Las órdenes necesarias para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia dentro del proceso de restitución, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva providencia;
- i. Las órdenes necesarias para que se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el inmueble a restituir sea parte de uno de mayor extensión. El Juez o Magistrado también ordenará que los predios se engloben cuando el inmueble a restituir incluya varios predios de menor extensión;
- j. Las órdenes pertinentes para que se haga efectivo cumplimiento de las compensaciones de que trata la ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en relación con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución;
- k. Las órdenes necesarias para que la persona compensada transfiera al Fondo de la Unidad Administrativa el bien que le fue despojado y que fue imposible restituirle.
- l. La declaratoria de nulidad de las decisiones judiciales que por los efectos de su sentencia, pierdan validez jurídica, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
- m. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas, debatidos en el proceso, si existiera mérito para ello, de conformidad con lo establecido en esta ley, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio respectivo;

n. La orden de cancelar la inscripción de cualquier derecho real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución, en virtud de cualesquiera obligaciones civiles, comerciales, administrativas o tributarias contraídas, de conformidad con lo debatido en el proceso;

o. Las órdenes pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de entrega material de los bienes a restituir;

p. Las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas;

q. Las órdenes y condenas exigibles de quienes hayan sido llamados en garantía dentro del proceso a favor de los demandantes y/o de los demandados de buena fe derrotados en el proceso;

r. Las órdenes necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso sean compensadas cuando fuera del caso, en los términos establecidos por la presente ley;

s. La condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso de restitución de que trata la presente ley cuando se acredite su dolo, temeridad o mala fe;

t. La remisión de oficios a la Fiscalía General de la Nación en caso de que como resultado del proceso se perciba la posible ocurrencia de un hecho punible.

Parágrafo 1º. Una vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se hará de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecución de la sentencia, aplicándose, en lo procedente, el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendrá hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso.

Parágrafo 2º. El Juez o Magistrado dictará el fallo dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud. El incumplimiento de los términos aplicables en el proceso constituirá falta gravísima.

Parágrafo 3º. Incurrirá en falta gravísima el funcionario que omita o retarde injustificadamente el cumplimiento de las órdenes contenidas en el fallo o no brinde al Juez o al Magistrado el apoyo requerido por este para la ejecución de la sentencia.

Parágrafo 4º. El título del bien deberá entregarse a nombre de los dos cónyuges o compañeros permanentes, que al momento del desplazamiento, abandono o despojo, cohabitaban, así al momento de la entrega del título no están unidos por ley.

ARTÍCULO 92. RECURSO DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA. Contra la sentencia se podrá interponer el recurso de revisión ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los términos de los artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La Corte Suprema de Justicia proferirá los autos interlocutorios en un término no mayor de diez (10) días y decisión en un término máximo de dos (2) meses.

ARTÍCULO 93. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán por el medio que el Juez o Magistrado considere más eficaz.

ARTÍCULO 94. ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvencción, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno.

ARTÍCULO 95. ACUMULACIÓN PROCESAL. Para efectos del proceso de restitución de que trata la presente ley, se entenderá por acumulación procesal, el ejercicio de concentración en este trámite especial de todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades públicas o notariales en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acción. También serán objeto de acumulación las demandas en las que varios sujetos reclamen inmuebles colindantes, o inmuebles que estén ubicados en la misma vecindad, así como las impugnaciones de los registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente.

Con el fin de hacer efectiva esta acumulación, desde el momento en que los funcionarios mencionados sean informados sobre la iniciación del procedimiento de restitución por el magistrado que conoce del asunto, perderán competencia sobre los trámites respectivos y procederán a remitírselos en el término que este señale.

La acumulación procesal está dirigida a obtener una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos. Además, en el caso de predios vecinos o colindantes, la acumulación está dirigida a criterios de economía procesal y a procurar los retornos con carácter colectivo dirigidos a restablecer las comunidades de manera integral bajo criterios de justicia restaurativa.

Parágrafo 1º. En los casos de acumulación procesal de que trata el presente artículo, los términos se ampliarán por un tiempo igual al establecido para dichos procesos.

Parágrafo 2º. En todo caso, durante el trámite del proceso, los notarios, registradores y demás autoridades se abstendrán de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier actuación que por razón de sus competencias afecte los predios objeto de la acción descrita en la presente ley incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio respectivo.

ARTÍCULO 96. INFORMACIÓN PARA LA RESTITUCIÓN. Con el fin de facilitar la acumulación procesal, el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o el catastro descentralizado competente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural o quien haga sus veces, deberán poner al tanto a los Jueces, a los Magistrados, a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, a las Notarías y a sus dependencias u oficinas territoriales, sobre las actuaciones o requerimientos del proceso de restitución.

Para facilitar las comunicaciones, los intercambios de información, el aporte de pruebas, el cumplimiento de las órdenes judiciales en el ámbito de la acción de restitución, las instituciones anteriormente señaladas integrarán, a partir de protocolos previamente establecidos y estandarizados, sus sistemas de información con el de la Rama Judicial.

Además de la agilidad en las comunicaciones entre las instituciones y los Jueces y los Magistrados, las instituciones deberán realizar los ajustes técnicos y humanos necesarios para facilitar el flujo interno de información que permita cumplir este propósito.

Parágrafo. Mientras se implementa la articulación de los sistemas de información, las entidades cumplirán los objetivos del presente artículo por los medios más idóneos.

ARTÍCULO 97. COMPENSACIONES EN ESPECIE Y REUBICACIÓN. Como pretensión subsidiaria, el solicitante podrá pedir al Juez o Magistrado que como compensación y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, le entregue un bien inmueble de similares características al despojado, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea imposible por alguna de las siguientes razones:

a. Por tratarse de un inmueble ubicado en una zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe, u otro desastre natural, conforme lo establecido por las autoridades estatales en la materia;

b. Por tratarse de un inmueble sobre el cual se presentaron despojos sucesivos, y este hubiese sido restituido a otra víctima despojada de ese mismo bien;

c. Cuando dentro del proceso repose prueba que acredite que la restitución jurídica y/o material del bien implicaría un riesgo para la vida o la integridad personal del despojado o restituido, o de su familia.

d. Cuando se trate de un bien inmueble que haya sido destruido parcial o totalmente y sea imposible su reconstrucción en condiciones similares a las que tenía antes del despojo.

ARTÍCULO 98. PAGO DE COMPENSACIONES. El valor de las compensaciones que decrete la sentencia a favor de los opositores que probaron la buena fe exenta de culpa dentro del proceso, será pagado por el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. En ningún caso el valor de la compensación o compensaciones excederá el valor del predio acreditado en el proceso.

En los casos en que no sea procedente adelantar el proceso, y cuando de conformidad con el artículo 97 proceda la compensación en especie u otras compensaciones ordenadas en la sentencia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá competencia para acordar y pagar la compensación económica correspondiente, con cargo a los recursos del fondo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

El valor de las compensaciones monetarias deberá ser pagado en dinero.

ARTÍCULO 99. CONTRATOS PARA EL USO DEL PREDIO RESTITUIDO. Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en forma completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar, mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe exenta de culpa en el proceso. **NOTA: Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional por el cargo analizado, mediante Sentencia C-715 de 2012, NOTA: Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional por los cargos analizados, mediante Sentencia C-820 de 2012**

Cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución.

El Magistrado velará por la protección de los derechos de las partes y que estos obtengan una retribución económica adecuada. **NOTA: Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional por el cargo analizado, mediante Sentencia C-715 de 2012**

ARTÍCULO 100. ENTREGA DEL PREDIO RESTITUIDO. La entrega del predio objeto de restitución se hará al despojado en forma directa cuando este sea el solicitante, o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a favor del despojado, dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiera lugar a ello, o dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-795 de 2014.

Para la entrega del inmueble el Juez o Magistrado de conocimiento practicará la respectiva diligencia de desalojo en un término perentorio de cinco (5) días y para ello podrá comisionar al Juez Municipal, quien tendrá el mismo término para cumplir con la comisión. Las autoridades de policía prestarán su concurso inmediato para el desalojo del predio. De la diligencia se levantará un acta y en ella no procederá oposición alguna.

Si en el predio no se hallaran habitantes al momento de la diligencia de desalojo se procederá a practicar el allanamiento, de conformidad con los artículos 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil. En este caso se realizará un inventario de los bienes, dejándolos al cuidado de un depositario.

ARTÍCULO 101. PROTECCIÓN DE LA RESTITUCIÓN. Para proteger al restituido en su derecho y garantizar el interés social de la actuación estatal, el derecho a obtener la restitución no será transferible por acto entre vivos a ningún título durante los siguientes dos años contados a partir de la entrega del predio, salvo que se trate de un acto entre el despojado y el Estado.

Asimismo, una vez obtenida la restitución, cualquier negociación entre vivos de las tierras restituidas al despojado dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión de restitución, o de entrega, si esta fuera posterior, será ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, a menos que se obtenga la autorización previa, expresa y motivada del Juez o Tribunal que ordenó la restitución.

Parágrafo. La autorización de que trata el segundo inciso de este artículo no será necesaria cuando se trate de respaldar créditos a nombre del restituido otorgados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

ARTÍCULO 102. MANTENIMIENTO DE COMPETENCIA DESPUÉS DEL FALLO. Después de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendrá su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ARTÍCULO 103. CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por el término de diez (10) años, como una entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con el número plural de dependencias que el Gobierno Nacional disponga, según lo requieran las necesidades del servicio.

ARTÍCULO 104. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá como objetivo fundamental servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados a que se refiere la presente ley.

ARTÍCULO 105. FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. Serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas las siguientes:

Ver Resolución del Min. Agricultura 240 de 2011

1. Diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de conformidad con esta ley y el reglamento.
2. Incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de oficio o a solicitud de parte y certificar su inscripción en el registro.
3. Acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados sobre los predios para presentarlas en los procesos de restitución a que se refiere el presente capítulo.
4. Identificar física y jurídicamente, los predios que no cuenten con información catastral o registral y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la consecuente apertura

de folio de matrícula a nombre de la Nación y que se les asigne un número de matrícula inmobiliaria.

5. Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley.

6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa.

7. Pagar a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya lugar cuando, en casos particulares, no sea posible restituirles los predios, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

8. Formular y ejecutar programas de alivios de pasivos asociados a los predios restituidos y formalizados.

9. Crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de quienes se les formalicen los predios de conformidad con este capítulo, para la cancelación de los impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente con los predios restituidos y el alivio de créditos asociados al predio restituido o formalizado.

10. Las demás funciones afines con sus objetivos y funciones que le señale la ley.

Parágrafo 1°. La Fiscalía General de la Nación, y las autoridades militares y de policía prestarán el apoyo y colaboración que le sea requerido por el Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas para el desarrollo de las funciones previstas en los numerales 2° y 3° de este artículo.

Parágrafo 2°. Hasta tanto entre en funcionamiento la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, las funciones de este organismo podrán ser ejercidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ARTÍCULO 106. DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas estará dirigida por su Consejo Directivo y por el Director Ejecutivo de la Unidad, quien será su representante legal.

ARTÍCULO 107. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. El Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas estará integrado de la siguiente manera:

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá.

El Ministro del Interior y de Justicia, o su delegado.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

El Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.

El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

El Director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

El Presidente del Banco Agrario.

El Presidente del Fondo para el Financiamiento Agropecuario (Finagro).

El Defensor del Pueblo o su Delegado.

Dos representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas de acuerdo al Título VIII.

El Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas asistirá con voz a las sesiones del Consejo.

ARTÍCULO 108. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD. El Director Ejecutivo de la Unidad será su representante legal, funcionario de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.

ARTÍCULO 109. ESTRUCTURA INTERNA. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional, establecerá la estructura interna y el régimen de vinculación de personal de la Unidad, considerando el conocimiento y experiencia de los candidatos en los temas propios del presente capítulo, de tal forma que se mantenga la coordinación interinstitucional y se cumplan los objetivos propuestos en materia de restitución a los despojados.

ARTÍCULO 110. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. El régimen jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas será el contemplado en esta Ley, y en lo no previsto en ella tendrá el régimen de los establecimientos públicos del orden nacional.

ARTÍCULO 111. DEL FONDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. Créase el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas como un fondo sin personería jurídica, adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El Fondo tendrá como objetivo principal servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados y el pago de compensaciones.

ARTÍCULO 112. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO. Los recursos del Fondo se administrarán a través de una fiducia comercial de administración, contratada con una o más sociedades fiduciarias, cuyo constituyente y beneficiario será la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. La administración de los recursos del Fondo estará sometida al régimen de la sociedad fiduciaria administradora del Fondo. El Gobierno reglamentará la materia.

ARTÍCULO 113. RECURSOS DEL FONDO. Al Fondo ingresarán los siguientes recursos:

1. Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
2. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
3. Los aportes de cualquier clase, provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
4. Los bienes y recursos que le transfieran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y las demás entidades, de conformidad con las normas vigentes.
5. Las demás propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con los recursos del Fondo y las sumas que reciba en caso de enajenación de estos.
6. Los ingresos y los rendimientos producto de la administración de los recursos y bienes del Fondo.

7. Los demás bienes y recursos que adquiriera o se le transfieran a cualquier título.

8. Las propiedades rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio y que se encuentren actualmente bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes, lo mismo que aquellas de las que adquiriera la propiedad en el futuro, en las cuantías y porcentajes que determine el Gobierno Nacional.

9. Los predios rurales que sean cedidos por los restituidos al Fondo.

Parágrafo. La Central de Inversiones S. A. – CISA S. A. podrá entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas los bienes que esta requiera para sus sedes. Así mismo la SAE y la DNE podrán entregar bienes a la Unidad para el desarrollo de su objeto y cumplimiento de sus funciones al menor valor posible, sin que este exceda del costo de adquisición de esos bienes.

NORMAS PARA LAS MUJERES EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN

ARTÍCULO 114. ATENCIÓN PREFERENCIAL PARA LAS MUJERES EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN. Las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado, gozarán de especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales relacionados en esta ley. Para ello la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá de un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos contemplados para la restitución, mediante ventanillas de atención preferencial, personal capacitado en temas de género, medidas para favorecer el acceso de las organizaciones o redes de mujeres a procesos de reparación, así como de áreas de atención a los niños, niñas y adolescentes y discapacitados que conformen su grupo familiar, entre otras medidas que se consideren pertinentes.

La tramitación de las solicitudes de mujeres despojadas cabezas de familia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas se atenderá con prelación sobre las demás solicitudes.

ARTÍCULO 115. ATENCIÓN PREFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN. Las solicitudes de restitución adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en favor de las madres cabeza de familia y de las mujeres despojadas, al igual que las solicitudes que sean presentadas ante el Juez o Magistrado por mujeres que pretendan la restitución de tierras de conformidad con los mandatos de esta ley, serán sustanciadas con prelación, para lo cual se pospondrá la atención de otras solicitudes.

ARTÍCULO 116. ENTREGA DE PREDIOS. Una vez la sentencia ordene la entrega de un predio a una mujer despojada, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y las autoridades de policía o militares deberán prestar su especial colaboración para velar por la entrega oportuna del predio y para procurar mantener las condiciones de seguridad que le permitan usufructuar su propiedad, siempre y cuando medie consentimiento previo de las mujeres víctimas y se garantice la decisión concertada de la adopción y ejecución de estas medidas.

ARTÍCULO 117. PRIORIDAD EN LOS BENEFICIOS CONSAGRADOS EN LA LEY 731 DE 2002. Las mujeres a quienes se les restituya o formalice predios en los términos de la presente ley tendrán prioridad en la aplicación de los beneficios a que se refiere la Ley 731 de 2002, en materia de crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación, y jornadas de cedulación.

ARTÍCULO 118. TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. En desarrollo de las disposiciones contenidas en este capítulo, en todos los casos en que el demandante y su cónyuge, o compañero o compañera permanente, hubieran sido víctimas de abandono forzado y/o despojo del bien inmueble cuya restitución se reclama, el juez o magistrado en la sentencia ordenará que la restitución y/o la compensación se efectúen a

favor de los dos, y cuando como consecuencia de la sentencia se otorgue el dominio sobre el bien, también ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que efectúe el respectivo registro a nombre de los dos, aun cuando el cónyuge o compañero o compañera permanente no hubiera comparecido al proceso.

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 119. CREACIÓN DE CARGOS. El Consejo Superior de la Judicatura, creará los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, de conformidad con el numeral 5 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y normas concordantes. El Consejo Superior de la Judicatura creará los cargos de otros funcionarios que sean requeridos para el cumplimiento de esta Ley. La creación de los cargos a que se refiere este artículo se hará en forma gradual y progresiva, acorde con las necesidades del servicio.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional creará en la Superintendencia de Notariado y Registro y con carácter transitorio, la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras y los cargos de coordinadores regionales de tierras y demás personal, profesional, técnico y operativo que se requiera para atender las disposiciones judiciales y administrativas relacionadas con los trámites registrales a que se refiere la presente ley.

Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación deberán asignar un número suficiente e idóneo de personal que el Gobierno Nacional proveerá conforme a las facultades extraordinarias previstas en el numeral 2° del artículo 10 de la Ley 1424 de 2010, para cumplir con sus deberes constitucionales y legales, principalmente para atender e intervenir en los procesos de restitución de tierras ante los jueces y Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

ARTÍCULO 120. RÉGIMEN PENAL. El que obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años. De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

Las mismas penas se impondrán al que presente ante el Tribunal solicitud de restitución de tierras en desarrollo de las disposiciones de esta ley, sin tener la calidad de despojado, o a quien presente oposición a una solicitud de restitución, a través de medios fraudulentos o documentos falsos y a quien emplee en el proceso pruebas que no correspondan con la realidad.

Quienes acudan al proceso y confiesen la ilegalidad de los títulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el proceso se harán beneficiarios al principio de oportunidad previsto en el Código de Procedimiento Penal. **NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012**

ARTÍCULO 121. MECANISMOS REPARATIVOS EN RELACIÓN CON LOS PASIVOS. En relación con los pasivos de las víctimas, generados durante la época del despojo o el desplazamiento, las autoridades deberán tener en cuenta como medidas con efecto reparador, las siguientes:

1. Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal o distrital relacionadas con el predio restituido o formalizado. Para estos efectos las entidades territoriales establecerán mecanismos de alivio y/o exoneración de estos pasivos a favor de las víctimas del despojo o abandono forzado.

2. La cartera morosa de servicios públicos domiciliarios relacionada con la prestación de servicios y las deudas crediticias del sector financiero existentes al momento de los hechos a

los predios restituidos o formalizados deberá ser objeto de un programa de condonación de cartera que podrá estar a cargo del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ARTÍCULO 122. NORMAS ESPECIALES. Las disposiciones contenidas en este capítulo reglamentan de manera general la restitución de tierras en el contexto de la presente ley y prevalecerán y servirán para complementar e interpretar las normas especiales que se dicten en esta materia. En caso de conflicto con otras disposiciones de la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones de este capítulo, siempre que sean más favorables a la víctima.

CAPÍTULO. IV

Restitución de vivienda

ARTÍCULO 123. MEDIDAS DE RESTITUCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA. Las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o indemnización.

Las víctimas podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y a los mecanismos especiales previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la prorrogan, modifican o adicionan.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la entidad que haga sus veces, o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que haga sus veces, según corresponda, ejercerá las funciones que le otorga la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan sido víctimas en los términos de la presente ley.

El Gobierno Nacional realizará las gestiones necesarias para generar oferta de vivienda con el fin de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente artículo, tengan aplicación efectiva en soluciones habitacionales.

Parágrafo 1º. La población víctima del desplazamiento forzado, accederá a los programas y proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población discapacitada desplazada.

Parágrafo 2º. Se priorizará el acceso a programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan retornar a los predios afectados, previa verificación de condiciones de seguridad por parte de la autoridad competente.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-912 de 2013.

ARTÍCULO 124. POSTULACIONES AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. Los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo Nacional de Vivienda o la entidad que haga sus veces, o por el Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-912 de 2013.

ARTÍCULO 125. CUANTÍA MÁXIMA. La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo será el que se otorgue en el momento de la solicitud a los beneficiarios de viviendas de interés social.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-912 de 2013.

ARTÍCULO 126. ENTIDAD ENCARGADA DE TRAMITAR POSTULACIONES. Las postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este capítulo, serán atendidas por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial si el predio es urbano, o por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural si el predio es rural, con cargo a los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el Subsidio de Vivienda de Interés Social.

ARTÍCULO 127. NORMATIVIDAD APLICABLE. Se aplicará al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este capítulo, lo establecido en la normatividad vigente que regula la materia, en cuanto no sea contraria a lo que aquí se dispone.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-912 de 2013.

CAPÍTULO. V

Crédito y pasivos

ARTÍCULO 128. MEDIDAS EN MATERIA DE CRÉDITO. En materia de asistencia crediticia las víctimas de que trata la presente ley, tendrán acceso a los beneficios contemplados en el parágrafo 4° de los artículos 16, 32, 33 y 38 de la Ley 418 de 1997, en los términos en que tal normatividad establece.

Los créditos otorgados por parte de los establecimientos de crédito a las víctimas de que trata la presente ley, y que como consecuencia de los hechos victimizantes hayan entrado en mora o hayan sido objeto de refinanciación, reestructuración o consolidación, quedarán clasificados en una categoría de riesgo especial de acuerdo con la reglamentación que expida la Superintendencia Financiera. Las operaciones financieras descritas en el presente artículo no serán consideradas como reestructuración.

Parágrafo. Se presume que aquellos créditos que hayan entrado en mora o hayan sido objeto de refinanciación, reestructuración o consolidación, con posterioridad al momento en que ocurrió el daño, son consecuencia de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley.

ARTÍCULO 129. TASA DE REDESCUENTO. Finagro y Bancoldex, o las entidades que hagan sus veces, establecerán líneas de redescuento en condiciones preferenciales dirigidas a financiar los créditos que otorguen los establecimientos de crédito a las víctimas de que trata la presente ley, para financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo previsto en la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010.

Parágrafo. Las entidades de redescuento de que trata este artículo, deberán asegurar que los establecimientos de crédito redescotantes realicen una transferencia proporcional de los beneficios en la tasa de redescuento a los beneficiarios finales de dichos créditos.

CAPÍTULO. VI

Formación, generación de empleo y carrera administrativa

ARTÍCULO 130. CAPACITACIÓN Y PLANES DE EMPLEO URBANO Y RURAL. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y adultos víctimas, en los términos de la presente ley, a sus programas de formación y capacitación técnica.

El Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, a través del Ministerio de la Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), diseñará programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano con el fin de apoyar el autosostenimiento de las víctimas, el cual se implementará a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-912 de 2013.

ARTÍCULO 131. DERECHO PREFERENCIAL DE ACCESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA. La calidad de víctima será criterio de desempate, en favor de las víctimas, en los concursos pertenecientes a los sistemas de carrera general y carreras especiales para acceder al servicio público.

Parágrafo. El derecho consagrado en el presente artículo prevalecerá sobre el beneficio previsto en el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 403 de 1997.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-912 de 2013.

CAPÍTULO. VII

Indemnización por vía administrativa

ARTÍCULO 132. REGLAMENTACIÓN. Ver Resolución UARIV 64 de 2012, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2014. El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley.

Inciso derogado por el art. 132, Ley 1753 de 2015. La víctima podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entienda realizada en el marco de un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás medidas de reparación consagradas en la presente ley, de los derechos no patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva al victimario de su obligación de reparar a la víctima según sea establecido en el marco de un proceso judicial de cualquier naturaleza.

Inciso derogado por el art. 132, Ley 1753 de 2015. En el evento que la víctima acepte que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entienda realizada en el marco de un contrato de transacción, el monto de esta indemnización será superior al valor que le entregaría a la víctima por este mismo concepto, según el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional. Los funcionarios o personal encargado de asesorar a las víctimas deberán manifestarle, de forma clara, sencilla y explicativa, las implicaciones y diferencias de aceptar o no que la indemnización sea realizada en el marco de un contrato de transacción.

Parágrafo 1°. El presente artículo surtirá efectos para las indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de expedición de la presente ley, así la solicitud fuese hecha con anterioridad. Así mismo, las víctimas que al momento de la expedición de la presente ley hubiesen recibido indemnización administrativa por parte del Estado, contarán con un (1) año contado a partir de la expedición de la presente ley para manifestarle por

escrito, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas si ya estuviese en funcionamiento, si desean aceptar de forma expresa y voluntaria que la indemnización administrativa fue entregada en el marco de un contrato de transacción en los términos del presente artículo. En este evento, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas según sea el caso, deberá volver a examinar el monto de la indemnización entregado a la víctima y comunicarle el procedimiento que debe surtir, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional establezca para el efecto, para entregar las sumas adicionales a que haya lugar.

NOTA: El texto subrayado fue derogado por el art. 132, Ley 1753 de 2015.

Parágrafo 2º. El Comité Ejecutivo de que trata los artículos 164 y 165 de la presente ley será el encargado de revisar, por solicitud debidamente sustentada del Ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, las decisiones que conceden la indemnización por vía administrativa. Esta solicitud de revisión procederá por las causales y en el marco del procedimiento que determine el Gobierno Nacional.

En este sentido, el Comité Ejecutivo cumplirá las funciones de una instancia de revisión de las indemnizaciones administrativas que se otorguen y establecerá criterios y lineamientos que deberán seguir las demás autoridades administrativas a la hora de decidir acerca de una solicitud de indemnización. La decisión que adopte el Comité Ejecutivo será definitiva y mientras ejerce la función de revisión no se suspenderá el acceso por parte de la víctima a las medidas de asistencia, atención y reparación de que trata la presente ley.

Parágrafo 3º. La indemnización administrativa para la población en situación de desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional:

I. Subsidio integral de tierras;

II. Permuta de predios;

III. Adquisición y adjudicación de tierras;

IV. Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada;

V. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico, o

VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva.

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-462 de 2013, en el entendido que tales mecanismos son adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero.

La suma que sea adicional al monto que para la población no desplazada se encuentra establecido en otras normas para los mecanismos señalados en este parágrafo, se entenderá que es entregada en forma de indemnización administrativa.

NOTA: El texto en cursiva fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-462 de 2013.

Parágrafo 4º. El monto de los 40 salarios mínimos legales vigentes del año de ocurrencia del hecho, que hayan sido otorgados en virtud del artículo 15 de la Ley 418 de 1997 por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional con motivo de hechos victimizantes que causan muerte o desaparición forzada, o el monto de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes otorgados por la incapacidad permanente al afectado por la violencia, constituyen indemnización por vía administrativa.

ARTÍCULO 133. INDEMNIZACIÓN JUDICIAL, RESTITUCIÓN E INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. En los eventos en que la víctima no acepte de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entienda realizada en el marco de un contrato de transacción en los términos del artículo anterior, y el Estado sea condenado judicialmente a repararla, se descontarán de dicha condena la suma de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constituyan reparación. De igual forma, de la condena judicial se descontará el valor monetario de los predios que sean restituidos, de conformidad con la tasación monetaria que se realice de los mismos.

NOTA: El texto subrayado fue derogado por el art. 132, Ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO 134. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, implementará un programa de acompañamiento para promover una inversión adecuada de los recursos que la víctima reciba a título de indemnización administrativa a fin de reconstruir su proyecto de vida, orientado principalmente a:

1. Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de estas.
2. Creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos.
3. Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada.
4. Adquisición de inmuebles rurales.

CAPÍTULO. VIII

Medidas de Rehabilitación

ARTÍCULO 135. REHABILITACIÓN. La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los términos de la presente ley.

ARTÍCULO 136. El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, deberá implementar un programa de rehabilitación que deberá incluir tanto las medidas individuales y colectivas que permitan a las víctimas desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual y colectiva.

El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los familiares y de ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos.

ARTÍCULO 137. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, creará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, el cual se implementará a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, comenzando en las zonas con mayor presencia de víctimas.

El Programa deberá incluir lo siguiente:

1. **Pro-actividad.** Los servicios de atención deben propender por la detección y acercamiento a las víctimas.
2. **Atención individual, familiar y comunitaria.** Se deberá garantizar una atención de calidad por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con

un componente de atención psicosocial para atención de mujeres víctimas. Se deberá incluir entre sus prestaciones la terapia individual, familiar y acciones comunitarias según protocolos de atención que deberán diseñarse e implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco cultural de las víctimas.

3. **Gratuidad.** Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.

4. **Atención preferencial.** Se otorgará prioridad en aquellos servicios que no estén contemplados en el programa.

5. **Duración.** La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y afectados, y al concepto emitido por el equipo de profesionales.

6. **Ingreso.** Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y permita el acceso a los servicios de atención.

7. **Interdisciplinarietà.** Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.

Parágrafo. Los gastos derivados de la atención brindada por el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas serán reconocidos y pagados por conducto del Ministerio de la Protección Social con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Fosyga), Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, salvo que estén cubiertos por otro ente asegurador en salud.

Parágrafo 2. Adicionado por el art. 120, Ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO 138. DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONES Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS. El Gobierno Nacional, de acuerdo a lo contemplado en el artículo anterior, reglamentará la estructura, funciones y la forma en que operará el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas.

De la misma forma, deberá establecer la articulación con las entidades territoriales de acuerdo a los artículos 172 y 173 de la presente Ley, para su cumplimiento en el nivel territorial, especialmente, para el desarrollo de la estrategia del Modelo Único de Atención Integral a Víctimas.

CAPÍTULO. IX

Medidas de satisfacción

ARTÍCULO 139. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN. El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a los objetivos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.

Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima.

Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras:

- a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor;
- b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior.
- c. Realización de actos conmemorativos;
- d. Realización de reconocimientos públicos;
- e. Realización de homenajes públicos;
- f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación;
- g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas, especialmente de las mujeres.
- h. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad;
- i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin;
- j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los victimarios;
- k. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
- l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las violaciones de derechos humanos.

Parágrafo. Para la adopción de cualquiera de las medidas señaladas anteriormente, así como aquellas que constituyen otras medidas de satisfacción no contempladas en la presente ley, deberá contarse con la participación de las víctimas de acuerdo a los mecanismos de participación previstos en la Constitución y la ley, así como el principio de enfoque diferencial establecido en el artículo 13.

ARTÍCULO 140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra exterior, las víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de compensación militar.

ARTÍCULO 141. REPARACIÓN SIMBÓLICA. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

ARTÍCULO 142. DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS. El 9 de abril de cada año, se celebrará el Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas.

El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente.

ARTÍCULO 143. DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO. El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través

de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Parágrafo. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política.

ARTÍCULO 144. DE LOS ARCHIVOS SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO OCURRIDAS CON OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.

Ver Nral. 2, art. 5, Decreto Nacional 4803 de 2011

Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales.

Parágrafo 1°. En ningún caso se obstaculizarán o interferirán experiencias, proyectos, programas o cualquier otra iniciativa que sobre reconstrucción de memoria histórica avancen entidades u organismos públicos o privados. Los entes territoriales, en desarrollo de los principios de autonomía y descentralización, pueden desarrollar iniciativas sobre la materia y crear espacios dedicados a esta labor.

Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación deberá garantizar la no destrucción, alteración, falsificación, sustracción o modificación de los archivos administrativos en todas las instituciones oficiales, del nivel regional y nacional. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes, y de los documentos que tengan carácter reservado.

Parágrafo 3°. Para efectos de la aplicación del presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y en el Capítulo X sobre conservación de archivos contenido en la Ley 975 de 2005.

Parágrafo 4°. Los documentos que no tengan carácter reservado y reposen en archivos privados y públicos en los que consten las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, serán constitutivos del patrimonio documental bibliográfico.

Parágrafo 5°. La obtención de las copias que se soliciten, serán con cargo al solicitante.

ARTÍCULO 145. ACCIONES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA. Dentro de las acciones en materia de memoria histórica se entenderán comprendidas, bien sean desarrolladas por iniciativa privada o por el Centro de Memoria Histórica, las siguientes:

1. Integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de todos los hechos victimizantes a los que hace referencia la presente ley, así como la documentación sobre procesos similares en otros países, que reposen en sitios como museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado.

2. Recopilar los testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus familiares de que trata la presente ley, a través de las organizaciones sociales de derechos humanos y remitirlos al archivo de que trata el numeral anterior, para lo cual se podrá incorporar lo obrado en las audiencias públicas realizadas en el marco de la Ley 975 de 2005, siempre y cuando no obste reserva legal para que esta información sea pública, y no constituya revictimización.

3. Poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios de los que tratan los numerales 1 y 2 del presente artículo, siempre que los documentos o testimonios no contengan información confidencial o sujeta a reserva.

4. Fomentar a través de los programas y entidades existentes, la investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia y contribuir a la difusión de sus resultados.

5. Promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, con enfoque diferencial.

6. Realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el valor de los derechos humanos.

7. El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación de calidad y pertinente para toda la población, en especial para poblaciones en condición de vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde un enfoque de derechos, diferencial, territorial y reparatorio, el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país; y propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten contra su integridad o violen sus derechos.

Parágrafo. En estas acciones el Estado deberá garantizar la participación de las organizaciones de víctimas y sociales y promoverá y reconocerá las iniciativas de la sociedad civil para adelantar ejercicios de memoria histórica, con un enfoque diferencial. Adicionalmente las actividades de memoria histórica a las que se refiere este artículo harán especial énfasis sobre las modalidades de violencia contra la mujer en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente.

Parágrafo 2°. Adicionado por el art. 29, Ley 1719 de 2014.

ARTÍCULO 146. CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA. Créase el Centro de la Memoria Histórica, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, el Centro de Memoria Histórica tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C.

Ver Decreto Nacional 4803 de 2011

ARTÍCULO 147. OBJETO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. El Centro de Memoria Histórica tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia. Los investigadores y funcionarios del Centro de Memoria Histórica no podrán ser demandados civilmente ni investigados penalmente por las afirmaciones realizadas en sus informes.

El Gobierno Nacional determinará la estructura, el funcionamiento y alcances del Centro de Memoria Histórica.

ARTÍCULO 148. FUNCIONES DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA. Son funciones generales del Centro de Memoria Histórica, sin perjuicio de las que se determinen en el Decreto que fije su estructura y funcionamiento: Diseñar, crear y administrar un Museo de la

Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia.

Administrar el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica de que trata el artículo 144 de la presente Ley.

Desarrollar e implementar las acciones en materia de memoria histórica de que trata el artículo 145 de la presente Ley.

Inciso 3 adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 2244 de 2011

Inciso 4 adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 2244 de 2011

Inciso 4 adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 2244 de 2011

Ver art. 5, Decreto Nacional 4803 de 2011

CAPÍTULO. X

Garantías de No Repetición

ARTÍCULO 149. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. El Estado colombiano adoptará, entre otras, las siguientes garantías de no repetición:

- a). La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la Ley;
- b). La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad;
- c). La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley.
- d). La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado, que propendan superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado;
- e). La creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos en la verdad histórica;
- f). Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario, el cual estará en cabeza del Programa para la Atención Integral contra Minas Antipersonal;
- g). Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual debe incluir un enfoque diferencial;
- h). Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como a los miembros de la Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política de tolerancia cero a la violencia sexual en las entidades del Estado;
- i). Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y/o vulnerables, en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales;
- j). Difusión de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el exterior;

- k). El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas.
- l). La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los grupos armados al margen de la ley;
- m). Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 975, tanto a nivel social como en el plano individual;
- n). El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre la Fuerza Pública (sic);
- o). La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los funcionarios públicos condenados en violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.
- p). La promoción de mecanismos destinados a prevenir y resolver los conflictos sociales;
- q). Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento legal para las víctimas;
- r). La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya permitido o permita la ocurrencia de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, de conformidad con los procedimientos contencioso-administrativos respectivos.
- s). Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, por los hechos ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará las garantías de no repetición que correspondan mediante el fortalecimiento de los diferentes planes y programas que conforman la política pública de prevención y protección de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley.

ARTÍCULO 150. DESMANTELAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS. El Estado Colombiano adoptará las medidas conducentes a lograr el desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados al margen de la ley, con el fin de asegurar la realización de las garantías de no repetición de las que trata el artículo anterior.

CAPÍTULO. XI

Otras medidas de reparación

ARTÍCULO 151. REPARACIÓN COLECTIVA. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos:

- a). El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos;
- b). La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos;
- c). El impacto colectivo de la violación de derechos individuales.

ARTÍCULO 152. SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA. Para efectos de la presente ley, serán sujetos de la reparación colectiva de que trata el artículo anterior:

1. Grupos y organizaciones sociales y políticos;

2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común.

TÍTULO. V

DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

CAPÍTULO. I

Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas

ARTÍCULO 153. DE LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas será la responsable de la operación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas.

La Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas una rápida y eficaz información nacional y regional sobre las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, permitirá la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que ocasionaron y ocasionan el daño a las víctimas.

Evaluará la magnitud del problema, y permitirá al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptar las medidas para la atención inmediata, elaborar planes para la atención y reparación integral de las víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas.

De la misma forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, deberá garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de registro, atención y reparación a víctimas, para lo cual se soportará en la Red Nacional que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para la atención a la población en situación de desplazamiento, y que será trasladada a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley.

CAPÍTULO. II

Registro Único de Víctimas

ARTÍCULO 154. REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable del funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para la atención a la población en situación de desplazamiento, y que será trasladado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley.

Parágrafo. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional deberá operar los registros de población víctima a su cargo y existentes a la fecha de vigencia de la presente Ley, incluido el Registro Único de Población Desplazada, mientras se logra la interoperabilidad de la totalidad de estos registros y entre en funcionamiento el Registro Único de Víctimas garantizando la integridad de los registros actuales de la información.

ARTÍCULO 155. SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, el cual será de uso obligatorio por las entidades que conforman el Ministerio Público.

En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el término establecido en este artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo cual deberá informar de ello al Ministerio Público quien remitirá tal información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La valoración que realice el funcionario encargado de realizar el proceso de valoración debe respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.

Parágrafo. Las personas que se encuentren actualmente registradas como víctimas, luego de un proceso de valoración, no tendrán que presentar una declaración adicional por los mismos hechos victimizantes. Para efectos de determinar si la persona ya se encuentra registrada, se tendrán en cuenta las bases de datos existentes al momento de la expedición de la presente Ley.

En los eventos en que la persona refiera hechos victimizantes adicionales a los contenidos en las bases de datos existentes, deberá presentar la declaración a la que se refiere el presente artículo.

ARTÍCULO 156. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO. Una vez presentada la solicitud de registro ante el Ministerio Público, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará la verificación de los hechos victimizantes contenidos en la misma, para lo cual consultará las bases de datos que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas.

Con fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, así como la información recaudada en el proceso de verificación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles.

Una vez la víctima sea registrada, accederá a las medidas de asistencia y reparación previstas en la presente ley dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante, salvo las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, a las cuales se podrá acceder desde el momento mismo de la victimización. El registro no confiere la calidad de víctima, y la inclusión de la persona en el Registro Único de Víctimas, bastará para que las entidades presten las medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas que correspondan según el caso.

Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política, y con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las víctimas y su seguridad, toda la información suministrada por la víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter reservado.

Parágrafo 2°. En el evento en que la víctima mencione el o los nombres del potencial perpetrador del daño que alega haber sufrido para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación previstas en la presente ley, este nombre o nombres, en ningún caso, serán incluidos en el acto administrativo mediante el cual se concede o se niegue el registro.

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica, conforme a los artículos 139, 143, 144 y 145 de la presente Ley, y se deberán articular con los mecanismos vigentes.

Parágrafo 4°. En lo que respecta al registro, seguimiento y administración de la información de la población víctima del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en el Título III, Capítulo III de la presente ley.

Parágrafo 5°. La información de que trata el artículo 48 de la presente Ley, se tendrá en cuenta en el proceso de registro.

Parágrafo 6°. La víctima podrá allegar documentos adicionales al momento de presentar su declaración ante el Ministerio Público, quien lo remitirá a la entidad encargada del Registro Único de Víctimas para que sean tenidos en cuenta al momento de realizar el proceso de verificación.

ARTÍCULO 157. RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DEL REGISTRO. Contra la decisión que deniegue el registro, el solicitante podrá interponer el recurso de reposición ante el funcionario que tomó la decisión dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. El solicitante podrá interponer el recurso de apelación ante el Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la presente Ley contra la decisión que resuelve el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión.

Las entidades que componen el Ministerio Público podrán interponer los recursos de reposición ante el funcionario que tomó la decisión y en subsidio el de apelación ante el Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la presente ley contra la decisión que concede el registro, dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de su comunicación. Igualmente, si el acto hubiere sido obtenido por medios ilegales, tales autoridades podrán solicitar, en cualquier tiempo, la revocatoria directa del acto para cuyo trámite no es necesario obtener el consentimiento del particular registrado.

ARTÍCULO 158. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las actuaciones que se adelanten en relación con el registro de las víctimas se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. En particular, se deberá garantizar el principio constitucional del debido proceso, buena fe y favorabilidad. Las pruebas requeridas serán sumarias.

Deberá garantizarse que una solicitud de registro sea decidida en el menor tiempo posible, en el marco de un trámite administrativo ágil y expedito, en el cual el Estado tendrá la carga de la prueba.

En toda actuación administrativa en la cual tengan interés las víctimas tienen derecho a obtener respuesta oportuna y eficaz en los plazos establecidos para el efecto, a aportar documentos u otros elementos de prueba, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir.

CAPÍTULO. III

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

ARTÍCULO 159. CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. Créase el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual estará constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas de que trata la presente ley.

ARTÍCULO 160. DE LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. El Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas estará conformado por las siguientes entidades y programas:

En el orden nacional, por:

1. El Ministerio del Interior y de Justicia
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores
3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público

4. El Ministerio de Defensa Nacional
5. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
6. El Ministerio de la Protección Social
7. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
8. El Ministerio de Educación Nacional
9. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
11. El Ministerio de Cultura
12. El Departamento Nacional de Planeación
13. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
14. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
15. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
16. La Fiscalía General de la Nación
17. La Defensoría del Pueblo
18. La Registraduría Nacional del Estado Civil
19. El Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa (sic)
20. La Policía Nacional
21. El Servicio Nacional de Aprendizaje
22. El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior
23. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
24. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
25. El Archivo General de la Nación
26. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
27. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi
28. La Superintendencia de Notariado y Registro
29. El Banco de Comercio Exterior
30. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
31. Las demás organizaciones públicas o privadas que participen en las diferentes acciones de atención y reparación en el marco de la presente ley.
32. La Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional, de acuerdo al Título VIII.

En el orden territorial, por:

1. Por los Departamentos, Distritos y Municipios.
2. Por las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios con funciones y competencias para la atención y reparación a las víctimas a que se refiere esta ley.
3. Por la Mesa de Participación de Víctimas del respectivo nivel, de acuerdo al Título VIII.

Y los siguientes programas:

1. Programa Presidencial de Atención Integral contra minas antipersonal.
2. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

ARTÍCULO 161. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Los objetivos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como parte de dicho Sistema, serán los siguientes:

1. Participar en la formulación e implementación de la política integral de atención, asistencia y reparación a las víctimas de que trata esta ley.
2. Adoptar las medidas de atención que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
3. Adoptar las medidas de asistencia que contribuyan a restablecer los derechos de las víctimas de que trata la presente ley, brindando condiciones para llevar una vida digna.
4. Adoptar las medidas que contribuyan a garantizar la reparación efectiva y eficaz de las víctimas que hubieren sufrido daño como consecuencia de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.
5. Adoptar los planes y programas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas y la implementación de las medidas de que trata la presente ley.
6. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral y garantía de los derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario que les asisten a las víctimas.
7. Garantizar la canalización de manera oportuna y eficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para el cumplimiento de los planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas en sus niveles nacional y territorial.
8. Garantizar la coordinación interinstitucional, la articulación de su oferta y programas, al igual que la programación de recursos, asignación, focalización y ejecución de manera integral y articulada la provisión de bienes y servicios públicos prestados de acuerdo con las soluciones brindadas.
9. Garantizar la flexibilización de la oferta de las entidades responsables de las diferentes medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
10. Realizar los esfuerzos institucionales y apoyar la implementación de una plataforma de información que permita integrar, desarrollar y consolidar la información de las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las responsabilidades atribuidas en el marco de la presente ley.
11. Apoyar los esfuerzos de las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañan y hacen seguimiento al proceso de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

12. Garantizar la adecuada coordinación entre la nación y las entidades territoriales y entre estas, para el ejercicio de sus competencias y funciones al interior del Sistema, de acuerdo con los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de delegación.

Parágrafo. Para el logro de los anteriores objetivos se elaborará el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Ver Decreto Distrital 657 de 2011

ARTÍCULO 162. DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. El Sistema contará con dos instancias en el orden nacional: El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas el cual diseñará y adoptará la política pública en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas en coordinación con el organismo a que se refiere el artículo siguiente y una Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que coordinará la ejecución de esta política pública.

En el orden territorial el Sistema contará con los Comités Territoriales de Justicia Transicional, creados por los gobernadores y alcaldes distritales y municipales.

ARTÍCULO 163. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Para la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica, se creará una institución de primer nivel de la Administración Pública, del sector central, de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

ARTÍCULO 164. COMITÉ EJECUTIVO PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Confórmase el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas, el cual estará integrado de la siguiente manera:

1. El Presidente de la República, o su representante, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior y de Justicia, o quien este delegue.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o quien este delegue.
4. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o quien este delegue.
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o quien este delegue.
6. El Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, o quien este delegue.
7. El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Parágrafo 1º. La Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas será ejercida por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Parágrafo 2º. Los Ministros y Directores que conforman el Comité únicamente podrán delegar su participación en los viceministros, subdirectores, en los Secretarios Generales o en los Directores Técnicos.

ARTÍCULO 165. FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas, es la máxima instancia de decisión del Sistema Nacional de Atención y Reparación

a las Víctimas, con el objeto de materializar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. En desarrollo de este mandato tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar y adoptar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
2. Diseñar, adoptar y aprobar el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de que trata la presente Ley.
3. Disponer que las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas garanticen la consecución de recursos presupuestales, y gestionar la consecución de los recursos financieros provenientes de fuentes de financiación diferentes al Presupuesto General de la Nación, para garantizar la adecuada y oportuna prestación de los servicios.
4. Apoyar y gestionar la consecución de recursos presupuestales para la ejecución de las políticas, estrategias, planes, proyectos y programas.
5. Aprobar las bases y criterios de la inversión pública en materia de atención, asistencia y reparación integral a las Víctimas.
6. Determinar los instrumentos de coordinación en materia presupuestal de planeación, ejecución y evaluación, para el adecuado desarrollo de su mandato.
7. Realizar el seguimiento a la implementación de la presente Ley, teniendo en cuenta la contribución efectiva a los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, de acuerdo a las obligaciones contempladas en la presente Ley.
8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que le sean asignadas por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1º. El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas se reunirá por lo menos una vez cada seis (6) meses, y de manera extraordinaria cuando se considere necesario. El Comité Ejecutivo contará además, con los subcomités técnicos que se requieran para el diseño de la política pública de atención y reparación integral.

Parágrafo 2º. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas podrá convocar como invitados a representantes o delegados de otras entidades que estime pertinente, así como a dos representantes de la Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional de acuerdo a lo establecido en el título VIII de la presente ley.

ARTÍCULO 166. DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Créase la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La Unidad tendrá su sede en Bogotá D. C., y su patrimonio estará constituido por los aportes del Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfiera la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título reciba.

ARTÍCULO 167. DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas tendrá un Director de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República, y contará con la estructura interna y la planta de personal que el Gobierno Nacional le fije, según las necesidades del servicio.

ARTÍCULO 168. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas coordinará de

manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Además, le corresponde cumplir las siguientes funciones:

1. Aportar los insumos necesarios para el diseño, adopción y evaluación de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas.
2. Garantizar la operación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, incluyendo la interoperabilidad de los distintos sistemas de información para la atención y reparación a víctimas.
3. Implementar y administrar el Registro Único de Víctimas, garantizando la integridad de los registros actuales de la información.
4. Aplicar instrumentos de certificación a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, respecto a su contribución en el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, de acuerdo con las obligaciones contempladas en la presente ley. 5. Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, la asignación y transferencia a las entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución de los planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley.
6. Ejercer la coordinación nación-territorio, para lo cual participará en los comités territoriales de justicia transicional.
7. Administrar los recursos necesarios y hacer entrega a las víctimas de la indemnización por vía administrativa de que trata la presente ley.
8. Administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas y pagar las indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975 de 2005.
9. Coordinar los lineamientos de la defensa jurídica de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y asumir directamente la defensa jurídica en relación con los programas que ejecuta de conformidad con la presente ley.
10. Garantizar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas con enfoque diferencial en el diseño de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y reparación integral.
11. Coordinar la creación, fortalecimiento e implementación, así como gerenciar los Centros Regionales de Atención y Reparación que considere pertinentes para el desarrollo de sus funciones.
12. Definir los criterios y suministrar los insumos necesarios para diseñar las medidas de reparación colectiva de acuerdo a los artículos 151 y 152, e implementar las medidas de reparación colectiva adoptadas por el Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las víctimas.
13. Desarrollar estrategias en el manejo, acompañamiento, orientación, y seguimiento de las emergencias humanitarias y atentados terroristas.
14. Implementar acciones para garantizar la atención oportuna e integral en la emergencia de los desplazamientos masivos.
15. Coordinar los retornos y/o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66.

16. Entregar la asistencia humanitaria a las víctimas de que trata el artículo 47 de la presente ley, al igual que la ayuda humanitaria de emergencia de que trata el artículo 64, la cual podrá ser entregada directamente o a través de las entidades territoriales. Realizar la valoración de que trata el artículo 65 para determinar la atención humanitaria de transición a la población desplazada.

17. Realizar esquemas especiales de acompañamiento y seguimiento a los hogares víctimas.

18. Apoyar la implementación de los mecanismos necesarios para la rehabilitación comunitaria y social.

19. Contribuir a la inclusión de los hogares víctimas en los distintos programas sociales que desarrolle el Gobierno Nacional.

20. Implementar acciones para generar condiciones adecuadas de habitabilidad en caso de atentados terroristas donde las viviendas han sido afectadas.

21. Las demás que señale el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Los Centros Regionales de Atención y Reparación de que trata el presente artículo, unificarán y reunirán toda la oferta institucional para la atención de las víctimas, de tal forma que las mismas solo tengan que acudir a estos Centros para ser informadas acerca de sus derechos y remitidas para acceder de manera efectiva e inmediata a las medidas de asistencia y reparación consagradas en la presente ley, así como para efectos del Registro Único de Víctimas. Para este fin, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales o el Ministerio Público, y en general celebrar cualquier tipo de acuerdo que garantice la unificación en la atención a las víctimas de que trata la presente ley. Estos centros regionales de atención y reparación se soportarán en la infraestructura que actualmente atienden víctimas, para lo cual se coordinará con el organismo a que se refiere el artículo 163 de la presente Ley.

ARTÍCULO 169. DESCONCENTRACIÓN. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas cumplirá sus funciones de forma desconcentrada, a través de las unidades o dependencias territoriales con las que hoy cuenta la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o la entidad que cumpla sus funciones, para lo cual suscribirá los convenios correspondientes.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación podrá suscribir los convenios que se requieran para la buena prestación del servicio con las entidades u organismos del orden territorial.

ARTÍCULO 170. TRANSICIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD. Durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá hacer los ajustes institucionales que se requieran en las entidades y organismos que actualmente cumplen funciones relacionadas con los temas objeto de la presente Ley, con el fin de evitar duplicidad de funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que en ningún momento se afecte la atención a las víctimas.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se transformará en un departamento administrativo que se encargará de fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica.

Parágrafo. Hasta tanto se adopte la estructura y la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, y se transforme la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en Departamento Administrativo, esta entidad, así como las demás que vienen cumpliendo estas funciones, continuarán ejecutando las políticas de atención y reparación a las víctimas de que trata la presente ley.

Los empleos de carrera administrativa que se creen como resultado de las reformas institucionales que deben implementarse en la presente ley, serán provistos a través de una convocatoria especial que deberá adelantar la Comisión Nacional de Servicio Civil, para tales propósitos.

ARTÍCULO 171. TRANSICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, asumirá las funciones y responsabilidades de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR, establecidas en la Ley 975 de 2005 y las demás normas y decretos que la reglamentan, modifican o adicionan, dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley. Igualmente, integrará para su funcionamiento toda la documentación, experiencia y conocimientos acumulados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR, para lo cual, el Gobierno Nacional, en los términos del artículo anterior, garantizará la transición hacia la nueva institucionalidad de forma eficiente, coordinada y articulada.

De igual forma, las funciones de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes a que se refieren los artículos 52 y 53 de la Ley 975 de 2005, serán asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

ARTÍCULO 172. COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN NACIÓN-TERRITORIO. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá diseñar con base en los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la Constitución Política, una estrategia que permita articular la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral, teniendo en cuenta lo siguiente:

Las condiciones diferenciales de las entidades territoriales en función de factores tales como su capacidad fiscal, índice de necesidades básicas insatisfechas e índice de presión, entendido este último como la relación existente entre la población víctima por atender de un municipio, distrito o departamento y su población total, teniendo en cuenta además las especiales necesidades del ente territorial en relación con la atención de víctimas.

Articulación de la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, municipales y distritales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación a víctimas.

La estructuración de un sistema de corresponsabilidad a través del cual sea posible:

3.1. Efectuar el acompañamiento técnico de las instancias del nivel departamental y local, para la formulación de los programas de atención y reparación integral de víctimas.

3.2. Prestar la asistencia técnica, administrativa y financiera en los términos señalados en la presente ley.

3.3. Realizar comunicaciones e información oportuna sobre los requerimientos y decisiones tomadas al interior del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas.

3.4. Delegar mediante convenios procesos de atención oportuna como lo es respecto de la caracterización de la condición de víctima y de la identificación integral del núcleo familiar.

3.5. Proveer a las entidades territoriales la información que requieran para adecuar sus planes de atención y reparación a las víctimas y asignar eficientemente los recursos.

3.6. Establecer el sistema de monitoreo y seguimiento de las inversiones realizadas y la atención prestada para optimizar la atención.

3.7. Realizar una muestra periódica y sistemática representativa que permita medir las condiciones de los hogares atendidos por los programas de atención y reparación integral en la encuesta de goce efectivo de derechos.

3.8. Considerar esquemas de atención flexibles, en armonía con las autoridades territoriales y las condiciones particulares y diferenciadas existentes en cada región.

3.9. Establecer esquemas de complementación de los esfuerzos seccionales y locales para atender las prioridades territoriales frente a las víctimas en los términos establecidos en la presente ley.

3.10. Prestar asistencia técnica para el diseño de planes, proyectos y programas de acuerdo a lo dispuesto en la presente en el nivel departamental, municipal y distrital, para lo cual contará con la participación de dichos entes territoriales, el Departamento de Planeación Nacional y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ARTÍCULO 173. DE LOS COMITÉS TERRITORIALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, promoverá la creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, encargados de elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración.

Ver el Decreto Distrital 083 de 2012

Estos comités estarán conformados por:

1. El Gobernador o el alcalde quien lo presidirá, según el caso.
2. El Secretario de Gobierno departamental o municipal, según el caso.
3. El Secretario de Planeación departamental o municipal, según el caso.
4. El Secretario de Salud departamental o municipal, según el caso.
5. El Secretario de educación departamental o municipal, según el caso.
6. El Comandante de División o el comandante de Brigada, que tenga jurisdicción en la zona.
7. El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción.
8. El Director Regional o Coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
9. El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
10. Un representante del Ministerio Público.
11. Dos representantes de las Mesas de Participación de Víctimas de acuerdo al nivel territorial según lo dispuesto en el Título VIII de la presente Ley.
12. Un delegado del Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Parágrafo 1°. Los comités de que trata el presente artículo, podrán convocar a representantes o delegados de otras entidades que en el marco de la presente ley contribuyan a garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, y en general a organizaciones cívicas o a las personas o representantes que considere convenientes.

Parágrafo 2°. El Gobernador o alcalde, realizarán la secretaría técnica de los comités territoriales de justicia transicional, para lo cual diseñarán un instrumento que les permita hacer seguimiento a los compromisos de las entidades que hacen parte del Comité.

Parágrafo 3°. Las autoridades que componen el Comité a que se refiere el presente artículo, no podrán delegar, en ningún caso, su participación en el mismo o en cualquiera de sus reuniones.

ARTÍCULO 174. DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Con miras al cumplimiento de los objetivos trazados en el artículo 161, y en concordancia con los artículos 172 y 173, y dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, las entidades territoriales procederán a diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Ver el Decreto Distrital 083 de 2012

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones especiales para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas:

1. Con cargo a los recursos del presupuesto departamental, distrital o municipal, con sujeción a las directrices fijadas en sus respectivos Planes de Desarrollo Departamental, Distrital y Municipal y en concordancia con el Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, deberán prestarles asistencia de urgencia, asistencia de gastos funerarios, complementar las medidas de atención y reparación integral y gestionar la presencia y respuesta oportuna de las autoridades nacionales respectivas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

2. Con cargo a los recursos que reciban del Sistema General de Participaciones y con sujeción a las reglas constitucionales y legales correspondientes, garantizarles la prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

3. Con sujeción a las órdenes y directrices que imparta el Presidente de la República para el mantenimiento, conservación y restablecimiento del orden público, garantizar la seguridad y protección personal de las víctimas con el apoyo de la Policía Nacional de la cual deben disponer a través de los Gobernadores y Alcaldes como primeras autoridades de policía administrativa en los órdenes departamental, distrital y municipal. Para tal efecto, el Ministerio del Interior y de Justicia coordinará con las autoridades territoriales la implementación de estas medidas.

4. Elaborar y ejecutar los planes de acción para garantizar la aplicación y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas en sus respectivos territorios, que respondan a los distintos hechos victimizantes generados por las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.

Parágrafo 1°. Los planes y programas que adopten las entidades territoriales deben garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y tendrán en cuenta el enfoque diferencial.

Parágrafo 2°. La actuación de los departamentos, distritos y municipios corresponde a la que en cumplimiento de los mandatos constitucional y legal deben prestar a favor de la población, sin perjuicio de la actuación que deban cumplir esas y las demás autoridades públicas con sujeción a los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.

Parágrafo 3°. Los alcaldes y los Consejos Distritales y Municipales respectivamente garantizarán a las Personerías Distritales y Municipales los medios y los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación de la presente Ley.

Ver Decreto Distrital 657 de 2011

CAPÍTULO. IV

Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

ARTÍCULO 175. DISEÑO Y OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. El Gobierno Nacional, dentro del año siguiente a la expedición de la presente Ley, adoptará mediante decreto reglamentario, el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual establecerá los mecanismos necesarios para la implementación de todas las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en la presente Ley.

Para tal efecto, el Gobierno Nacional deberá elaborar un documento CONPES el cual contendrá el plan de ejecución de metas, presupuesto y el mecanismo de seguimiento, y determinará anualmente, la destinación, los mecanismos de transferencia y ejecución, el monto de los recursos y las entidades, de acuerdo a las obligaciones contempladas en esta ley, para la siguiente vigencia fiscal.

Parágrafo. El Gobierno Nacional propenderá por incluir a las víctimas en el proceso de diseño y seguimiento del Plan de Atención y Reparación a las Víctimas.

ARTÍCULO 176. DE LOS OBJETIVOS. Los objetivos del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas serán los siguientes, entre otros:

1. Adoptar las medidas de asistencia y atención señaladas en la presente ley, en disposiciones vigentes y en pronunciamiento de las altas cortes sobre la materia.
2. Implementar las medidas de reparación integral que sirvan a los programas que debe diseñar el Estado Colombiano en procura de garantizar la reparación a las víctimas, teniendo en cuenta los principios del Derecho Internacional Humanitario, normas Internacionales de Derechos Humanos, normas constitucionales y demás vigentes sobre la materia, así como los criterios de reparación enunciados por la jurisprudencia y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
3. Adoptar mecanismos que faciliten la asistencia legal a las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la restitución de los derechos vulnerados y de sus bienes patrimoniales así como el derecho a la reparación integral.
4. Diseñar y adoptar medidas que garanticen a las víctimas su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para la reparación del daño sufrido, evitando procesos de revictimización.
5. Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.
6. Diseñar una estrategia de atención integral a las víctimas para articular la atención que brinden las instituciones estatales a fin de garantizar la eficacia y eficiencia que se brinde a las víctimas, procurando además la plena articulación entre el nivel central y el territorial.
7. Programar las herramientas necesarias para ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo al Sistema de Información que permita el manejo e intercambio de la información sobre las víctimas, entre las diferentes instituciones del Estado que las atiendan, con el fin de garantizar una rápida y eficaz información nacional y regional.

Parágrafo. Para el cumplimiento del Plan Nacional se requiere de la implementación del diseño institucional a nivel nacional y territorial, y que los programas satisfagan las necesidades de atención y el derecho a la reparación de las víctimas.

CAPÍTULO. IV (SIC)

Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia

ARTÍCULO 177. FONDO DE REPARACIÓN. El artículo 54 de la Ley 975 de 2005 será adicionado con el siguiente inciso:

Adicionalmente este Fondo estará conformado por las siguientes fuentes:

- a). El producto de las multas impuestas a los individuos o a los grupos armados al margen de la ley en el marco de procesos judiciales y administrativos;
- b). Las contribuciones voluntarias efectuadas por gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades;
- c). Las sumas recaudadas por entidades financieras como resultado de la opción de donación voluntaria al finalizar las transacciones en cajeros electrónicos y transacciones por Internet;
- d). Las sumas recaudadas por almacenes de cadena y grandes supermercados por concepto de donación voluntaria de la suma requerida para el redondeo de las vueltas;
- e). El monto de la condena económica de quienes han sido condenados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley.
- f). El monto establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo brindado por las empresas que han financiado a grupos armados organizados al margen de la ley.
- g). Los recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio que se surtan en virtud de la Ley 793 de 2002, en las cuantías o porcentajes que determine el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1º. Los bienes inmuebles rurales que han ingresado al Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, serán trasladados a petición de la Unidad Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en los términos y mediante el procedimiento que el Gobierno Nacional establecerá para el efecto. A partir de la expedición de la presente ley, los bienes inmuebles entregados en el marco del proceso de la Ley 975 de 2005, serán transferidos directamente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas a su solicitud, y siempre que ello no afecte destinaciones específicas de reparación según lo establecido en la Ley 975 de 2005 y demás normas que regulan la materia.

Parágrafo 2º. Las entidades financieras podrán disponer las medidas necesarias para informar a sus usuarios y clientes de cajeros electrónicos y portales de internet, sobre la opción de contribuir al Fondo de Reparación del que trata el presente artículo, mediante la donación de una suma no menor del 1% del salario mínimo diario vigente, por cada transacción realizada.

Parágrafo 3º. Los almacenes de cadena y grandes supermercados dispondrán las medidas necesarias para informar a sus clientes acerca de la opción de contribuir voluntariamente al Fondo de Reparación del que trata el presente artículo mediante la donación de la suma requerida para el redondeo de las vueltas. Dichas sumas serán transferidas cada mes vencido al Fondo de Reparaciones y los costos de la transferencia serán directamente asumidos por los almacenes y grandes supermercados.

Parágrafo 4º. La disposición de los bienes que integran el Fondo para la Reparación de las Víctimas a que se refiere el artículo 54 de la Ley 975 de 2005 se realizará a través del derecho privado. Para su conservación podrán ser objeto de comercialización, enajenación o disposición a través de cualquier negocio jurídico, salvo en los casos, en que exista solicitud de restitución, radicada formalmente en el proceso judicial, al cual están vinculados los bienes por orden judicial.

La enajenación o cualquier negocio jurídico sobre los bienes del Fondo se realizará mediante acto administrativo que se registra en la Oficina de Registro correspondiente, cuando la naturaleza jurídica del bien lo exija.

CAPÍTULO. V

Régimen disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas

ARTÍCULO 178. DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Son deberes de los funcionarios públicos frente a las víctimas:

1. Respetar y asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
2. Investigar las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley, de forma eficaz, rápida, completa e imparcial.
3. Tratar a las víctimas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos.
4. Adoptar o solicitar a la autoridad competente en forma inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias, de acuerdo con los programas de protección existentes.
5. Tratar a las víctimas con consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.
6. Velar por el acceso igual y efectivo a la justicia; la reparación adecuada y efectiva del derecho menoscabado y el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación, con independencia de quien resulte ser en definitiva el responsable de la violación.
7. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata, las medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones.
8. Verificar los hechos y su revelación pública y completa, en la medida en que no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones.
9. Adelantar todas las acciones tendientes a la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, incluidas las personas no identificadas inhumadas como N. N. así como prestar la ayuda para establecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y comunidad. La aplicación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es obligatoria.

Parágrafo 1°. Los deberes mencionados en los numerales 6, 8, y 9 serán predicables frente a las autoridades competentes.

Parágrafo 2°. El Ministerio Público vigilará el cumplimiento de los deberes aquí consagrados, especialmente, el deber legal de búsqueda de las víctimas incorporadas al Registro Nacional de Desaparecidos. La omisión del deber legal de búsqueda e identificación de personas desaparecidas por parte de los funcionarios públicos será sancionada disciplinariamente.

ARTÍCULO 179. FALTAS DISCIPLINARIAS. Incurrirá en falta disciplinaria gravísima el funcionario público que:

1. Estando obligado a ello se niegue a dar una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

2. Estando obligado a ello se niegue a dar una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

3. Impida u obstaculice el acceso de las víctimas y sus representantes a la información, no sujeta a reserva legal, sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones.

4. Proporcione información falsa a las víctimas o sobre los hechos que produjeron la victimización.

5. Discrimine por razón de la victimización.

ARTÍCULO 180. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que hubiere lugar, los funcionarios públicos que en el ejercicio del proceso penal o cualquier otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa afecten derechos de las víctimas, responderán ante los Tribunales y Juzgados competentes por dichas infracciones.

TÍTULO. VII

PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS

ARTÍCULO 181. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS. Para efectos de la presente ley se entenderá por niño, niña y adolescente toda persona menor de 18 años. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, gozarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con el carácter de preferente y adicionalmente tendrán derecho, entre otros:

1. A la verdad, la justicia y la reparación integral.

2. Al restablecimiento de sus derechos prevalentes.

3. A la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las minas antipersonal y las municiones sin explotar y todo tipo de violencia sexual.

Parágrafo. Para los efectos del presente Título serán considerados también víctimas, los niños, niñas y adolescentes concebidos como consecuencia de una violación sexual con ocasión del conflicto armado interno.

ARTÍCULO 182. REPARACIÓN INTEGRAL. Los niños, niñas y adolescentes víctimas en los términos de la presente ley, tienen derecho a la reparación integral. Este derecho incluye las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.

Parágrafo 1°. La reparación integral prevista en este artículo será asumida por el Estado en su conjunto a través de las entidades competentes, en particular las que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Parágrafo 2°. El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, deberá diseñar con fundamento en la presente ley los lineamientos específicos para garantizar un proceso de reparación integral para los niños, niñas y adolescentes víctimas, el cual deberá estar contenido en el documento Conpes de que trata la presente ley.

ARTÍCULO 183. RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS. Los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, deberán ser restablecidos mediante los procesos y

mecanismos que la Constitución y las leyes, y en particular, el Código de Infancia y Adolescencia, disponen para tal fin.

ARTÍCULO 184. DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. Los niños, niñas y adolescentes víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización. Los padres, o en su defecto, el defensor de familia, podrán elevar la solicitud, como representantes legales del niño, niña o adolescente, de la indemnización a la que estos tengan derecho.

Cuando los niños, niñas o adolescentes hubieren sido víctimas del reclutamiento ilícito, deben haber sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad para acceder a la indemnización.

ARTÍCULO 185. CONSTITUCIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. La entidad judicial o administrativa que reconozca la indemnización a favor de un niño, niña o adolescente, ordenará, en todos los casos, la constitución de un encargo fiduciario a favor de los mismos, asegurándose que se trate del que haya obtenido en promedio los mayores rendimientos financieros en los últimos seis meses. La suma de dinero les será entregada una vez alcancen la mayoría de edad.

ARTÍCULO 186. ACCESO A LA JUSTICIA. Es obligación del Estado, investigar y sancionar a los autores y partícipes de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, de las que sean víctimas los niños, niñas y adolescentes.

Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñarán conjuntamente los mecanismos para garantizar su participación, con miras a la efectiva realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

ARTÍCULO 187. RECONCILIACIÓN. Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a que el Estado en su conjunto, garantice un proceso de construcción de convivencia y de restauración de las relaciones de confianza entre los diferentes segmentos de la sociedad.

Para el efecto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, impartirá las directrices de una política de Reconciliación para que sean adoptadas por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

ARTÍCULO 188. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HUÉRFANOS. Todos los niños, niñas y adolescentes huérfanos tanto de padre y madre, o de solo uno de ellos, como consecuencia de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley, tendrán derecho a la reparación integral. Cualquier autoridad del orden departamental, regional o local, y cualquier servidor público que tenga conocimiento de esta situación, deberá comunicar tal situación de manera inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que a través del Defensor de Familia, se inicien los trámites judiciales y administrativos orientados a la reparación integral de sus derechos.

ARTÍCULO 189. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONALES, MUNICIONES SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS. Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados tendrán derecho a la reparación integral. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados tendrán derecho a recibir de manera gratuita y por el tiempo definido según criterio técnico-científico tratamiento médico, prótesis, órtesis y asistencia psicológica, que garanticen su plena rehabilitación.

Parágrafo. El reconocimiento y pago del tratamiento de que trata el presente artículo, se hará por conducto del Ministerio de la Protección Social con cargo a los recursos al Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en salud, FOSYGA, subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, salvo que estén cubiertos por otro ente asegurador en salud y dando cabal cumplimiento y desarrollo al Título III de la Ley 1438 de 2011.

ARTÍCULO 190. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL RECLUTAMIENTO ILÍCITO. Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, tendrán derecho a la reparación integral en los términos de la presente ley. Los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de reclutamiento ilícito podrán reclamar la reparación del daño, de acuerdo con la prescripción del delito consagrada en el artículo 83 del Código Penal.

La restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una vez los niños, niñas y adolescentes cumplan la mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas.

ARTÍCULO 191. NORMA MÁS FAVORABLE. Las normas del presente título se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de esta ley. En caso de duda, en los procesos de reparación administrativa, se aplicará la disposición que sea más favorable para el niño, niña o adolescente, en consonancia con el interés superior del niño.

TÍTULO. VIII

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 192. Es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la ley, para lo cual deberá, entre otros:

Garantizar la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles nacional, departamental y municipal.

Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta ley y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política. Estos ejercicios deberán contar con la participación de las organizaciones de víctimas.

ARTÍCULO 193. MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS. Se garantizará la participación oportuna y efectiva de las víctimas de las que trata la presente ley, en los espacios de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital. Para tal fin, se deberán conformar las Mesas de Participación de Víctimas, propiciando la participación efectiva de mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores víctimas, a fin de reflejar sus agendas.

Se garantizará la participación en estos espacios de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y de las organizaciones de víctimas, con el fin de garantizar la efectiva participación de las víctimas en la elección de sus representantes en las distintas instancias de decisión y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen en virtud de la misma, participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables y llevar a cabo ejercicios de veeduría ciudadana, sin perjuicio del control social que otras organizaciones al margen de este espacio puedan hacer.

Parágrafo 1º. Para la conformación de las mesas a nivel municipal, departamental y nacional, las organizaciones de las que trata el presente artículo interesadas en participar en ese espacio, deberán inscribirse ante la Personería en el caso del nivel municipal o distrital, o ante la Defensoría del Pueblo en el caso departamental y nacional, quienes a su vez ejercerán la Secretaría técnica en el respectivo nivel.

Será requisito indispensable para hacer parte de la Mesa de Participación de Víctimas a nivel departamental, pertenecer a la Mesa de Participación de Víctimas en el nivel municipal correspondiente, y para la Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional, pertenecer a la mesa en el nivel departamental correspondiente.

Parágrafo 2º. Estas mesas se deberán conformar dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley. El Gobierno Nacional deberá garantizar los medios para la efectiva participación, a través de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Parágrafo 3º. La Mesa de Participación de Víctimas a nivel nacional, será la encargada de la elección de los representantes de las víctimas que harán parte del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, los representantes ante el Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las Víctimas de acuerdo al artículo 164, así como los representantes del Comité de Seguimiento y Monitoreo que establece la presente Ley. Representantes que serán elegidos de los integrantes de la mesa.

Las Mesas de Participación de Víctimas a nivel territorial serán las encargadas de la elección de los representantes de las víctimas que integren los Comités Territoriales de Justicia Transicional de que trata el artículo 173.

Parágrafo 4º. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá establecer el procedimiento para que las instancias de organización y participación de la población desplazada, existentes al momento de expedición de la presente ley, queden incorporadas dentro de las mesas de que trata el presente artículo.

ARTÍCULO 194. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN. Para garantizar la participación efectiva de que trata el presente Título, los alcaldes, gobernadores y el Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las víctimas, contarán con un protocolo de participación efectiva a fin de que se brinden las condiciones necesarias para el derecho a la participación.

Ese protocolo de participación efectiva deberá garantizar que las entidades públicas encargadas de tomar decisiones en el diseño, implementación y ejecución de los planes y programas de atención y reparación remitan con anticipación a las Mesas de Participación de Víctimas del nivel municipal, distrital, departamental y nacional, según corresponda, las decisiones proyectadas otorgándoles a los miembros de las respectivas mesas la posibilidad de presentar observaciones.

Las entidades públicas encargadas de la toma de decisiones deberán valorar las observaciones realizadas por las Mesas de Participación de Víctimas, de tal forma que exista una respuesta institucional respecto de cada observación. Las observaciones que una vez valoradas, sean rechazadas, deben ser dadas a conocer a las respectivas mesas con la justificación correspondiente.

TÍTULO. IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 195. EXTRADITADOS. En virtud del principio de coherencia externa establecido en el artículo 12, para contribuir a la efectividad del derecho a la justicia, el Estado Colombiano adoptará las medidas conducentes a garantizar la participación efectiva de las víctimas en las investigaciones, procesos y procedimientos judiciales de los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley o desmovilizados de estos grupos que hubieren sido condenados por las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de la presente Ley, y que se encuentran en jurisdicción extranjera por efecto de extradición concedida por el Estado colombiano. De la misma manera el Estado procurará adoptar medidas conducentes para su colaboración con la administración de justicia, a través de testimonios dirigidos a esclarecer hechos y conductas, relacionadas con las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente Ley.

Para contribuir a la efectividad del derecho a la verdad adoptará las medidas conducentes para que las personas a las que se refiere el presente artículo, revelen los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones y en caso de fallecimiento o desaparición, la suerte que corrió la víctima.

Para contribuir a la efectividad del derecho a la reparación adoptará las medidas tendientes a garantizar que los bienes de los extraditados sean entregados o incautados con destino al fondo de reparación para las víctimas establecido en el artículo 54 de la Ley 975 de 2005.

ARTÍCULO 196. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y REPARACIÓN SIMBÓLICA POR PARTE DE ALGUNOS ACTORES. Los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley, que en desarrollo de procesos de paz adelantados con el Gobierno Nacional, se hayan beneficiado con las medidas de indulto, amnistía, auto inhibitorio, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento, en los términos previstos en las Leyes 77 de 1989, 104 de 1993 y 418 de 1997 y los Decretos 206 de 1990, 213 de 1991 y 1943 de 1991 y la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), estarán obligados a enaltecer la memoria de sus víctimas a través de la ejecución de las medidas de satisfacción y de reparación simbólica previstas en esta ley.

Para tal efecto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia tendrá un término máximo de cuatro (4) meses para realizar un informe de los miembros de dichas organizaciones que obtuvieron beneficios penales por parte del Estado.

Esta información será remitida al coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, quien en el término de doce (12) meses, deberá imponer las medidas que resulten necesarias para que las personas relacionadas en el informe presentado por el Gobierno Nacional, procedan individual o colectivamente, a ejecutar las medidas de satisfacción o compensación moral necesarias y de reparación simbólica previstas en esta ley.

La valoración acerca de la pertinencia, suficiencia y proporcionalidad de las medidas a imponer se somete a la decisión del coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.

Quienes hayan pertenecido a las organizaciones armadas al margen de la ley, podrán acudir directamente al Ministerio del Interior y de Justicia, en el término máximo de tres (3) meses, para poner de presente su intención de enaltecer a las víctimas, en desarrollo del procedimiento consagrado en esta disposición.

Como resultado del trámite aquí previsto, el director del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas procederá, con la colaboración de los organismos competentes, a la elaboración y divulgación de un documental, con cargo al Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, en el que se reavive la memoria de las víctimas y se haga público el perdón de los victimarios por los hechos cometidos. Todas las entidades del Estado estarán obligadas a otorgar los medios dispuestos a su alcance para garantizar la realización de este documental, el cual deberá ser transmitido por el Canal Institucional y por los canales regionales y privados, en los términos en que se establezca por la Comisión Nacional de Televisión, o la entidad que haga sus veces.

ARTÍCULO 197. FINANCIACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, CON OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. Las medidas que impliquen un aumento de las funciones de las instituciones del Estado, deben ser asumidas con el espacio presupuestal establecido para cada una en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. De igual forma los programas o proyectos estructurados en desarrollo de esta ley deben priorizarse por las entidades dentro de su oferta institucional y su espacio fiscal, sin perjuicio de las demás funciones constitucionales y legales que les han sido asignadas a los demás organismos y entidades estatales, que también tienen carácter prioritario.

ARTÍCULO 198. INSCRIPCIÓN FRAUDULENTO DE VÍCTIMAS. Si con posterioridad al reconocimiento de la indemnización administrativa se demostrare que la persona no tenía la

calidad de víctima o de beneficiario, o lo hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas de indemnización otorgadas, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y se compulsarán copias a la autoridad competente para la investigación a que haya lugar.

ARTÍCULO 199. FRAUDE EN EL REGISTRO DE VÍCTIMAS. El que obtenga el registro como víctima, alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años. De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de las víctimas, incurrirá en la misma pena e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

ARTÍCULO 200. INFORMES DE EJECUCIÓN DE LA LEY. El Presidente de la República deberá presentar un informe anual sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la presente ley, el cual deberá ser presentado al Congreso de la República dentro del mes siguiente a cada inicio de legislatura.

La presentación de este informe se transmitirá por el canal institucional y los canales regionales. De igual manera, deberá ser publicado en los portales de internet de todas las entidades que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y serán distribuidas las copias impresas que se consideren convenientes para que las víctimas y sus organizaciones, así como la sociedad civil en general accedan a él.

ARTÍCULO 201. MECANISMO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Confórmese la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, la cual tendrá como función primordial hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en esta ley.

Estará conformada por:

1. El Procurador General de la Nación o su delegado, quien la presidirá.
2. El Defensor del Pueblo o su delegado, quien llevará la secretaría técnica.
3. El Contralor General de la Nación o su delegado.
4. Tres representantes de las víctimas de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título VIII, los cuales deberán ser rotados cada dos años.

Parágrafo 1°. La comisión deberá reunirse por lo menos una vez cada seis (6) meses y rendir un informe al Congreso de la República dentro del mes siguiente a cada inicio de legislatura de cada año.

Parágrafo 2°. Las funciones de seguimiento y monitoreo por parte de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República se ejercerán sin perjuicio de las funciones constitucionales y legales que ejercen como organismos de control.

De igual manera deberán compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación cuando en el ejercicio de las funciones atribuidas a esta comisión evidencien la ocurrencia de un ilícito.

ARTÍCULO 202. Las Mesas Directivas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara conformarán una comisión en la que tendrán asiento todos los partidos y movimientos políticos representados en las respectivas comisiones, encargada de efectuar el seguimiento de la aplicación de esta ley, recibir las quejas que se susciten en ocasión de la misma y revisar los informes que se soliciten al Gobierno Nacional.

El Gobierno deberá presentar informes dentro de los primeros diez (10) días de cada periodo legislativo a las comisiones de que trata este artículo, referidos a la utilización de las atribuciones que se le confieren mediante la presente ley, así como sobre las medidas

tendientes a mejorar las condiciones sociales, psicológicas y económicas de las víctimas. Estas comisiones designarán un coordinador respectivamente.

ARTÍCULO 203. RUTAS Y MEDIOS DE ACCESO. El Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las Víctimas en el marco de sus funciones, deberá elaborar la ruta única de acceso a las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación contempladas en la presente Ley, a través de las cuales las víctimas podrán ejercer sus derechos.

De igual manera, y de acuerdo al artículo 30 de la presente Ley, el Ministerio Público deberá velar, para que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hagan uso de la ruta única.

ARTÍCULO 204. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, garantizará que las víctimas de que trata la presente ley que se encuentren fuera del país sean informadas y orientadas adecuadamente acerca de sus derechos, medidas y recursos.

ARTÍCULO 205. De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Nacional, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, para expedir por medio de decretos con fuerza de ley, la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en lo relativo a:

a). Generar el marco legal de la política pública de atención, reparación integral y de restitución de tierras de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de conformidad con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

b). En la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen la política pública diferencial para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el Gobierno Nacional consultará a los pueblos étnicos a través de las autoridades y organizaciones representativas bajo los parámetros de la jurisprudencia constitucional, la ley y el derecho propio, con el fin de dar cabal cumplimiento al derecho fundamental de la consulta previa. La metodología de la consulta previa para la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen la política pública diferencial para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, será concertada entre el Gobierno Nacional y los pueblos étnicos a través de las autoridades y organizaciones representativas.

Parágrafo 1°. Hasta la aprobación de las normas con fuerza de ley que desarrollen la política pública diferencial para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, las normas que puedan afectar a estas comunidades quedarán condicionadas a la realización de la consulta previa de todo proyecto, programa o presupuesto que pueda llegar a afectarlas.

Parágrafo 2°. Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el presente artículo para desarrollar la política pública diferencial para la atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, serán ejercidas con el fin de respetar la cultura y existencia material de estos pueblos tradicionales, así, como para incluir diferencialmente sus derechos en tanto a víctimas de violaciones graves y manifiestas de Normas Internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Parágrafo 3°. Las facultades conferidas al Presidente de la República comprenderán en el mismo término la de modificar la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo creando, suprimiendo o fusionando cargos, con el fin de garantizar el cumplimiento y desarrollo de las funciones y competencias asignadas a la institución en esta ley.

ARTÍCULO 206. DESARROLLO RURAL. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá presentar en un término de seis (6) meses a partir de la expedición de la presente Ley, la iniciativa que regule el desarrollo rural del país, donde se prioricen las víctimas de despojo y abandono forzado, en el acceso a créditos, asistencia técnica, adecuación predial, programas de comercialización de productos, entre otros, que contribuyan a la reparación de las víctimas.

ARTÍCULO 207. Cualquier persona que demande la condición de víctima en los términos del artículo 3º de la presente ley, que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora, sin que su situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente haya sido resuelta en los términos de los artículos 91, 92 y siguientes de la presente ley, o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, perderá los beneficios establecidos en el Capítulo III del Título IV de esta ley.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las demás normas vigentes que sancionen dicha conducta.

NOTA: Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012.

ARTÍCULO 208. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de diez (10) años, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 975 de 2005.

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional presentará un informe anual al Congreso de la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas.

Parágrafo 2º. Un año antes del vencimiento de la vigencia de esta ley, el Congreso de la República deberá pronunciarse frente a la ejecución y cumplimiento de la misma.

Dada en Bogotá D.C., a 10 de junio de 2011.

El Presidente del Honorable Senado de la República,

Armando Benedetti Villaneda.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

Carlos Alberto Zuluaga Díaz.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de junio de 2011.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Carlos Echeverry Garzón.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Juan Camilo Restrepo Salazar.

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 48096 de junio 10 de 2011.



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



GUIA PARA LA EJECUCIÓN DEL APOYO SUBSIDIARIO A ENTIDADES TERRITORIALES

MECANISMO INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA – DGSH

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - SPAE

2017

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 · Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:    



Contenido

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS..... | 3 |
| 3. ASPECTOS PREVIOS PARA APOYO A PISC..... | 5 |
| 3.1 PROYECTOS OBJETOS DE APOYO..... | 5 |
| 3.2 TIPOS DE APOYO PARA LOS PISC..... | 5 |
| 3.3 RECOMENDACIONES Y VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS..... | 6 |
| 4. FORMALIZACIÓN DE APOYO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA..... | 7 |
| 4.1 DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE APOYO EN PISC..... | 7 |
| 4.2 REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE APOYO EN PISC..... | 10 |
| 4.3 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE LOS APOYOS EN PISC..... | 10 |
| 4.4 RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE APOYO A PISC... .. | 10 |
| 4.5 COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TENER EN CUENTA PARA EL TRÁMITE DE APOYO EN PISC..... | 11 |
| 4.6 CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL APOYO EN PISC..... | 12 |
| 4.7 SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL APOYO EN PISC..... | 13 |
| 5. ASPECTOS RELEVANTES..... | 14 |
| 5.1 DURACIÓN DEL APOYO..... | 14 |
| ANEXO 1. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA..... | 15 |
| ANEXO 2. REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA..... | 20 |
| ANEXO 3. CARTA DE PRESENTACIÓN PROYECTO ISC..... | 24 |
| ANEXO 4. OFERTA DOTACION MOBILIARIO VIGENCIA 2017..... | 26 |
| ANEXO 5. FORMATO INFORME DE AVANCE DE OBRA..... | 28 |
| ANEXO 6. FORMATO INFORME ENTREGA DE DOTACIÓN..... | 31 |



1. INTRODUCCIÓN

La Unidad para las Víctimas busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional de los entes territoriales para el desarrollo de acciones de prevención, ayuda y atención inmediata en emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado interno.

Esta actividad se realiza, en el marco de los principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación, mediante el suministro de materiales y/o mobiliario en físico para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria local.

Este apoyo no implica la entrega ni transferencia de recursos a las entidades territoriales, sólo serán suministrados en físico materiales de construcción y/o mobiliario para proyectos de infraestructura social y comunitaria.

Esta guía busca brindar un soporte didáctico a las entidades territoriales que han sido focalizadas en la presente vigencia y se interesan en obtener el apoyo a través del mecanismo de infraestructura social y comunitaria.

Este documento, dirigido a los municipios o Distritos, contiene elementos encaminados a la implementación del apoyo, la presentación de las propuestas y fortalecer el papel de las entidades territoriales en la articulación de los esfuerzos institucionales que se dispone para tal fin.

En primer lugar, se abordan aspectos relacionados con las líneas de acción en las que pueden encaminarse las iniciativas de proyectos de infraestructura social y comunitaria, en segundo lugar, se relacionan los tipos de apoyo que brinda la Unidad y sus requisitos documentales, y posteriormente se enuncia el proceso de evaluación de las propuestas. Finalmente se resaltan las recomendaciones y compromisos a asumir por las entidades territoriales a quienes se les viabilicen los proyectos y algunos aspectos que contribuyen a la ejecución del apoyo.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación, se relaciona una lista de términos comunes y de interés que pueden ayudar a entender mejor el proceso y los conceptos que se incorporan en la presente guía:

PISC: Sigla de Proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria.

CEPISC: Sigla Comité de Evaluación de Proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria.

Certificado de disponibilidad presupuestal (sigla CDP): Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. En el caso específico de los



PISC, se refiere a la existencia de los recursos para el aporte de la contrapartida (mano de obra, asistencia, etc.)

Concurrencia: Definido en el Artículo 12 de la Ley 1448 de 2011, “las entidades nacionales y territoriales deben actuar oportuna y conjuntamente, en busca de un objetivo común. Las entidades involucradas ejercerán acciones de manera conjunta, respetando siempre el ámbito de competencias propio y el ámbito de competencias de las demás.”

Coordinación: Definido en el Artículo 11 de la Ley 1448 de 2011, “Las entidades nacionales y territoriales deberán trabajar armónicamente para realizar los fines del Estado y en particular, para garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.”

CTJT: Sigla de Comité Territorial de Justicia Transicional.

Enlace de la Dirección Territorial: Es el profesional designado por la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas, como contacto con la Entidad Territorial para adelantar las gestiones necesarias en la implementación del apoyo.

EOT: Esquema de ordenamiento territorial.

Especificaciones de los materiales y/o mobiliario: Detalle sobre la totalidad de las características de cada uno de los insumos requeridos para el desarrollo de la obra o la entrega de la dotación, entre ellos: medidas, color, unidad de medida, presentación, uso, etc.

Estudios y diseños para PISC: Refiere a la documentación de carácter técnico que requieren las obras de infraestructura y entre ellos están: Planos y/o diseños, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios (APU).

Formato de estructura técnica (sigla FET): Formato único para la presentación de las propuestas para solicitudes de apoyo en PISC, tanto para materiales de construcción como para dotación con mobiliario.

ISC: Sigla mecanismo Infraestructura Social y Comunitaria.

Líneas de acción PISC: Establece los dos enfoques en los que deben encaminarse los PISC de acuerdo con su objetivo: Prevención de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario y Ayuda y Atención inmediata a población víctima.

Mano de obra calificada (sigla MOC): Trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución requiere estudios previos o amplia experiencia.

Mano de obra no calificada (MONC): Trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa.



Municipios y/o distritos focalizados para proyectos ISC: Representa el listado de municipios resultado del estudio de criterios y priorización, los cuales son potenciales de recibir apoyo con PISC.

PBOT: Plan básico de ordenamiento territorial.

POT: Plan de ordenamiento territorial.

Subsidiariedad: Apoyo a los municipios que presenten menor capacidad institucional, técnica y/o financiera para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y responsabilidades que se deriven de la Ley 1448 de 2011.

UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

3. ASPECTOS PREVIOS PARA APOYO A PISC

3.1 PROYECTOS OBJETOS DE APOYO

Se apoyarán únicamente proyectos – PISC - que estén encaminados a las siguientes líneas de acción:

- a) **Prevención de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario.** Son proyectos que buscan fortalecer capacidades comunitarias, impactan positivamente el tejido social, potencian el trabajo comunitario y colectivo mediante el despliegue de acciones o intervenciones para la prevención y/o se constituyen en respuestas concretas frente a posibles violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
- b) **Ayuda y Atención inmediata a población víctima.** Son proyectos que buscan fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades territoriales para atender y asistir a la población víctima del conflicto armado satisfaciendo las necesidades básicas en la fase de la inmediatez.

3.2 TIPOS DE APOYO PARA LOS PISC

La Unidad para las Víctimas realiza apoyo a las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria - PISC, mediante el suministro en físico de materiales de construcción y/o mobiliario.



Tener en cuenta que este apoyo no implica la entrega ni transferencia de recursos a las entidades territoriales, sólo serán suministrados en físico materiales de construcción y/o mobiliario para proyectos de infraestructura social y comunitaria y no se incluyen actividades de instalación y/o construcción. La entidad territorial debe tener en cuenta lo anterior desde la etapa de planeación de los proyectos ya que deberá asumir o gestionar ante otras entidades costos como la mano de obra, costos asociados seguimientos, instalación mobiliario (en los casos que aplique), etc.

- a) **Apoyo con materiales de construcción:** Este apoyo se refiere a la entrega en físico de los materiales de construcción requeridos para la ejecución del proyecto y debe obedecer a los cálculos realizados por la entidad territorial en la etapa de diseño y presupuesto de la propuesta.
- b) **Apoyo con dotación de mobiliario:** Este apoyo se refiere a la entrega física de mobiliario para la puesta en marcha o complemento de proyectos de infraestructura social y comunitaria – PISC. La Unidad brinda apoyo con entrega de mobiliario a espacios en donde se realicen procesos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades comunitarias, donde se potencie el trabajo colectivo y donde se busque complementar acciones o intervenciones para la prevención de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de estos espacios son las aulas escolares, los restaurantes comunitarios, las casetas o salones comunales, centros multifuncionales etc.

3.3 RECOMENDACIONES Y VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS

Previo a la presentación del proyecto la entidad territorial debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) El proyecto tiene plenamente identificada la necesidad y el origen de la misma.
- b) Se encuentra definida la finalidad del proyecto.
- c) El proyecto se adapta a las condiciones sociales donde se ubica esta necesidad.
- d) El proyecto responde a las líneas de prevención de violaciones de derechos humanos y/o de ayuda o atención inmediata a la población víctima.
- e) Durante la formulación del proyecto ha identificado restricciones geográficas, financieras, legales, técnicas, u otras que pueden limitar la implementación del proyecto. De ser así, incluya en la presentación del proyecto los mecanismos que usaría para contrarrestar estos impactos.
- f) El proyecto cuenta con un método para medir el cumplimiento de sus objetivos.
- g) El proyecto a realizar atenúa o evita impactos negativos en las comunidades, en el ambiente y en el contexto social en general.
- h) El proyecto anticipa impactos positivos más allá de la intervención. Estos están calculados y son esperados con la intervención a realizar.



- i) El proyecto es coherente con el plan de desarrollo del municipio y el plan de acción territorial para la atención integral a las víctimas.
- j) El proyecto contempla enfoque diferencial, es decir, respeta las costumbres, tradiciones, cultura de los diferentes grupos poblacionales de la zona, de igual manera es sensible ante las características, sociales y religiosas.
- k) Se han tenido en cuenta en el proyecto las condiciones mínimas en cuanto a acceso, movilidad adecuada y seguridad para personas en condición de discapacidad.
- l) El proyecto evita las frustraciones o falsas esperanzas a las comunidades. No generará acción con daño.
- m) El proyecto contempla flexibilidad en la infraestructura para adaptarse a un posible cambio en el contexto social.
- n) El proyecto se integra al entorno institucional referido, se coordina con otras acciones existentes.
- o) Se exploran y aprovechan las oportunidades de cooperación con otras organizaciones.
- p) La cobertura planteada es la mejor posible.
- q) Para formular este proyecto la entidad tuvo en cuenta lecciones aprendidas de experiencias previas.

4. FORMALIZACIÓN DE APOYO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

4.1 DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE APOYO EN PISC

Para formalizar el apoyo en PISC frente a la Unidad, la entidad territorial debe estar focalizada y el proyecto planeado debe estar encaminado en alguna de las líneas de acción de acuerdo con lo informado en los numerales 3.1 y 3.2 de la presente guía.

La persona encargada del municipio o distrito debe diligenciar el siguiente instrumento:

- ✓ **Formato de Estructura Técnica – FET** (archivo Excel establecido por la Unidad). En este debe diligenciarse la totalidad de la información solicitada en las 5 hojas que componen el mismo. Para mayor información remitirse al **Anexo 2 Instructivo de diligenciamiento de Formato de Estructura Técnica**.

Dependiendo del tipo de apoyo (ver numeral 3.3) se deberán remitir los siguientes documentos:

Para realizar la solicitud de **apoyo con materiales de construcción**, las entidades territoriales deben presentar a la Unidad en **medio físico y magnético** la totalidad de los



siguientes documentos (ver **Anexo Tabla 02 Requisitos para acceder al apoyo en infraestructura social y comunitaria**):

- 1) Formato de estructura técnica – FET completamente diligenciado y sin modificación en la estructura del mismo.
- 2) Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. (ver anexo 3. Carta de presentación proyecto ISC)
- 3) Certificado de tradición y libertad y/o copia de la escritura del lote donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio.
- 4) Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales, expedido por la Oficina de Planeación Municipal.
- 5) Certificado de disponibilidad de servicios públicos, emitido por el municipio o la empresa de servicios respectiva.
- 6) Certificación de viabilidad del proyecto, emitida por el municipio.
- 7) Compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio.
- 8) Acta de socialización firmada por personas y/o líderes de la comunidad o de las juntas de acción comunal que certifiquen estar de acuerdo con la ejecución del proyecto en las condiciones acordadas y en donde manifiestan su interés de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y mantenimiento periódico de los proyectos según, sea el caso.
- 9) Censo de población a beneficiar, de acuerdo con el Formato único de Censo, deberá incluir la totalidad de la información solicitada.
- 10) Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), como soporte de la contrapartida por parte del municipio para la contratación de la totalidad de mano de obra requerida para la ejecución del proyecto.
- 11) Certificación de que los estudios y diseños que se remiten con el proyecto cumplen con las normas vigentes de construcción (NSR-10 sismo resistencia, agua potable y saneamiento básico, código colombiano de fontanería, instalaciones eléctricas RETIE) y las demás que se consideren.

Adjunta a dicha certificación se debe remitir: Planos de localización geográfica del proyecto, diseño arquitectónico y detalles constructivos debidamente firmados, diseños y estudios técnicos que apliquen (estructural, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, ambientales) debidamente firmados, especificaciones técnicas de la construcción, presupuesto detallado debidamente firmado, análisis de precios unitarios de todos los ítems del proyecto.

Nota: La solicitud de los materiales y/o mobiliario debe detallarse en la Hoja N° 3 del Formato de Estructura Técnica – FET, allí se debe incluir la totalidad de las especificaciones (referencia, color, dimensión, etc), unidades de medida y las cantidades requeridas. No se trata del presupuesto de obra si no el listado de materiales requerido para la ejecución del proyecto.



En los casos en los que se requiera realizar la entrega de materiales de construcción y sea necesario contar con transportes adicionales (interveredales y/o fluviales), la entidad territorial deberá presentar un compromiso y/o certificado de disponibilidad presupuestal – CDP - donde se evidencie que se contará con dicho apoyo.

Para realizar la solicitud de **apoyo con dotación de mobiliario**¹, presentar a la Unidad en **medio físico y magnético la totalidad** de los siguientes documentos (ver **Anexo Tabla 02 Requisitos para acceder al apoyo en infraestructura social y comunitaria**):

- 1) Formato de estructura técnica – FET debidamente diligenciado y sin modificación en la estructura del mismo.
- 2) Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal (**ver anexo 3. Carta de presentación proyecto ISC**).
- 3) Compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio o por la comunidad que estará a cargo del uso y mantenimiento.
- 4) Acta de socialización firmada por personas y/o líderes de la comunidad o de las juntas de acción comunal que certifiquen estar de acuerdo con las condiciones acordadas y en donde manifiestan su interés de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y mantenimiento periódico de la dotación.
- 5) En los casos donde para realizar la entrega de mobiliario se requiera contar con transportes adicionales (interveredales y/o fluviales) y/o instalación, la entidad territorial deberá presentar un compromiso y/o certificado de disponibilidad presupuestal – CDP donde se evidencie que se contará con dicho apoyo.
- 6) Certificación emitida por la Secretaria de Educación municipal o departamental, en donde se manifieste que la solicitud no ha sido apoyada o no ha sido presentada ante ninguna otra entidad gubernamental.
- 7) Cuando se solicite apoyo para la dotación con mobiliario para instituciones educativas, se deberá remitir censo de estudiantes con matrícula vigente en formato Excel. En el caso de la solicitud de dotación de mobiliario sea para un espacio donde se desarrollen actividades comunitarias, se deberá remitir certificación de uso y capacidad en número de personas.

Nota: En el caso que se requieran para un mismo proyecto los dos tipos de apoyo, la dotación con mobiliario se adelantará al finalizar la etapa constructiva y la documentación deberá permitir suplir los requisitos legales, técnicos y financieros de los dos tipos de apoyo.

¹ La solicitud de dotación con mobiliario debe relacionarse en la Hoja N° 3 del Formato de Estructura Técnica – FET. La oferta de mobiliario se describe en el **Anexo Tabla 04 Oferta dotación mobiliario**. No se apoyará la entrega de elementos que no hagan parte de la oferta descrita en dicho anexo.



4.2 REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE APOYO EN PISC

La remisión de la totalidad de la documentación deberá realizarse a la Dirección Territorial con jurisdicción en la entidad territorial tanto en **medio físico como magnético** en los plazos establecidos. La presentación de documentación parcial o incompleta o fuera de los plazos establecidos podrá generar la devolución de la misma y el no trámite del apoyo por parte de la Unidad.

La documentación debe dirigirse como se presenta a continuación:

Señor,
ALAN JARA
DIRECTOR GENERAL UNIDAD DE VICTIMAS
DIRECCION DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS
Carrera 8 # 15 – 73 piso 3
Bogotá D.C

4.3 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE LOS APOYOS EN PISC

De acuerdo con las fechas establecidas para la presentación de la documentación de los proyectos por parte de las entidades territoriales, está programada la evaluación de los proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria, y se emitirán los conceptos finales de viabilidad sobre los proyectos a apoyar.

4.4 RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE APOYO A PISC

Resultado de la evaluación de las propuestas, se establecen los conceptos de viabilidad o inviabilidad, los cuales se notificarán a la entidad territorial de la siguiente manera:

- a) En caso que el proyecto no cumpla con los requisitos establecidos y/o el concepto sea de inviabilidad, se remitirá oficio de respuesta a la entidad territorial en medio físico y vía correo electrónico a la dirección email del contacto designado en la carta de presentación del proyecto.
- b) En caso que el concepto sea viable o sea necesario aclarar algunos elementos del proyecto, se remitirá oficio a la entidad territorial vía correo electrónico a la dirección email del contacto designado en la carta de presentación del proyecto.

Los ajustes deberán ser enviados a la Unidad vía correo electrónico a más tardar 5 días hábiles después de haber sido notificado y preferiblemente por el correo



histórico de la retroalimentación de las observaciones, guardando así la trazabilidad y así poder dar un trámite más ágil y oportuno.

4.5 COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TENER EN CUENTA PARA EL TRÁMITE DE APOYO EN PISC

El municipio y/o distrito deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes compromisos en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional previo a la ejecución del proyecto:

- ✓ Coordinar y planificar las actividades.
- ✓ Mantener informados a los beneficiarios y a la Unidad sobre la programación y planificación de todas las actividades a desarrollar.
- ✓ Participar con una contrapartida a través de apoyo técnico, administrativo y financiero, que permita la ejecución total de los proyectos.
- ✓ Realizar la selección, contratación y pago de la mano de obra calificada y no calificada para realizar la construcción correspondiente al proyecto propuesto (en los casos que aplique).
- ✓ Establecer y aclarar durante el proceso de selección y contratación de la mano de obra calificada y no calificada, que la Unidad no tiene ningún tipo de vínculo contractual.
- ✓ Aportar la totalidad de los recursos necesarios para la contratación de la mano de obra (en los casos que aplique).
- ✓ Delegar un representante encargado de la interlocución con La Unidad y un correo electrónico para la remisión de respuestas o ajustes en caso de requerirse.
- ✓ Designar un representante que será el encargado de almacenar, recibir, revisar, organizar, y controlar las salidas del material entregado por parte de la Unidad.
- ✓ Realizar el acompañamiento a las entregas de materiales y/o mobiliario.
- ✓ Una vez se realice la entrega de materiales y/o mobiliario por parte de la Unidad, es responsabilidad de la entidad territorial la custodia de los mismos, por tanto serán los responsables en caso de daño, pérdida o robo y deberán asumir los costos que de estas condiciones se generen.
- ✓ Proporcionar un lugar seguro y en buenas condiciones de almacenamiento de (aireación, aislamiento del suelo, etc.) para los materiales de construcción entregados por la Unidad.
- ✓ Brindar seguridad a los materiales durante el tiempo que estos se encuentren almacenados.
- ✓ Hacer seguimiento al proceso de construcción y al uso posterior a la terminación de la obra.
- ✓ En los casos donde se apoyen con materiales de construcción, la entidad territorial debe enviar los informes de avance de obra mensuales a la Dirección Territorial de



acuerdo con el formato establecido, lo cual permitirá realizar la programación en los casos que aplique de las entregas de materiales pendientes.

- ✓ En los casos donde se realice apoyo con dotación de mobiliario, las entidades territoriales deberán enviar un informe de entrega y disposición final del mobiliario a la Dirección Territorial que corresponda, de acuerdo con el formato establecido.
- ✓ Entregar la obra en buenas condiciones para su uso.
- ✓ Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura y definir el o los responsables de su administración.
- ✓ Cubrir los gastos que se generen a partir de las anteriores responsabilidades.

Las entidades territoriales deben tener en cuenta que la Unidad puede suspender el apoyo o la ejecución total del monto de apoyo, por incumplimiento a los compromisos adquiridos por la entidad territorial.

4.6 CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL APOYO EN PISC

Cuando se haya evaluado la viabilidad del proyecto y se cuente con concepto favorable, se deberá proceder en territorio con lo siguiente:

- ✓ Realización del Comité Territorial de Justicia Transicional para el cumplimiento de compromisos que las entidades cumplirán durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto deberá asistir al menos un delegado de cada una de dichas entidades. Dicha acta debe ser firmada y una copia remitida a la Unidad para las víctimas.
- ✓ Producto de la realización del CTJT y teniendo en cuenta que la Unidad para las Víctimas brinda apoyo únicamente con la entrega de los materiales de construcción y/o dotación con mobiliario, se solicitará que la entidad territorial realice el proceso de contratación de la mano de obra (en los casos que aplique) como formalización de su aporte con todas las condiciones legales y procedimentales del caso. A dicho proceso se le realizará el debido seguimiento por parte de la Unidad para las Víctimas en la página del SECOP.
- ✓ El municipio y/o distrito deberá remitir copia del contrato de mano de obra debidamente suscrito y legalizado a la Unidad para las Víctimas.
- ✓ Se deberá remitir por parte del municipio y/o distrito la información sobre el espacio dispuesto para la recepción de los materiales y/o el mobiliario y los datos de la persona designada como Almacenista.
El espacio debe ser apropiado y seguro para su almacenamiento, tal como se mencionó en el numeral 4.2.



La persona designada como Almacenista deberá hacer parte integral de la ejecución del proyecto y estará a cargo de recibir, revisar, almacenar, verificar, clasificar, organizar y llevar el control de las entradas y salidas de los materiales entregados por la Unidad de víctimas.

Una vez se realice la entrega de materiales y/o mobiliario por parte de la Unidad, es responsabilidad de la entidad territorial su custodia, por tanto serán los responsables en caso de daño, pérdida o robo y deberán asumir los costos que de estas condiciones se generen.

- ✓ Mediante el correo electrónico a la dirección email del contacto designado en la carta de presentación del proyecto, la Unidad informará la fecha del inicio de las entregas de materiales y/o dotación a la cual deberá asistir los delegados de la entidad territorial.

4.7 SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL APOYO EN PISC

Hace parte integral de la documentación del proyecto el **Cronograma de Obra**, formato incluido en la Hoja 4 del Formato de Estructura Técnica, el cual deberá ser debidamente diligenciado en la etapa de planeación y presentación del proyecto y será objeto de evaluación mensual de acuerdo con los reportes remitidos por los municipios.

Los municipios o distritos deberán presentar los informes de seguimiento mensual, los cuales deben ser remitidos en el formato creado por la SPAE (**ver Anexo 5. Informe de Avance de Obra**) informando la totalidad de los datos allí solicitados.

La Unidad para las Víctimas realizará entregas parciales de materiales cuando así lo considere pertinente, de acuerdo con la revisión y valoración del proyecto. Después de la primera entrega, las siguientes dependerán de los informes de avance de la obra.

En los casos donde se realice apoyo con dotación de mobiliario, las entidades territoriales deberán enviar un informe de entrega y disposición final del mobiliario a la Dirección Territorial que corresponda, mediante el Formato creado por la SPAE (**ver Anexo 6. Informe entrega de dotación**).

Adicionalmente, la Unidad realizará visitas a las obras para el seguimiento y monitoreo de los proyectos, para ello debe haber disponibilidad y disposición por parte del ente territorial.



Una vez se culmine la ejecución de la obra civil y/o la entrega del mobiliario, se deberá convocar un Comité Territorial de Justicia Transicional en donde se deberá presentar el tipo de apoyo entregado por la Unidad de Víctimas, las entidades aportantes, la participación de la comunidad, la culminación de los trabajos de obra y/o disposición de la dotación y la entrega oficial del proyecto. Con lo cual, se deberá contar con acta formal de este espacio como soporte de entrega a la entidad territorial de la intervención.

5. ASPECTOS RELEVANTES

5.1 DURACIÓN DEL APOYO

Por el mecanismo infraestructura social y comunitaria, el apoyo a los municipios focalizados por cada vigencia presupuestal, se adelantará hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, siempre y cuando se cuente con presupuesto para dichos apoyos.

La Unidad para las Víctimas podrá de manera unilateral, suspender el apoyo cuando se verifiquen los siguientes hechos:

- a) En el caso que los municipios o distritos incumplan con los compromisos adquiridos en el Comité Territorial de Justicia Transicional Municipal o Distrital.
- b) Cuando se evidencie que no se cumple adecuadamente con el cronograma del proyecto sin la debida justificación.
- c) Cuando se verifique el uso inadecuado de los materiales de construcción y/o dotación entregada.



ANEXO 1. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA.

HOJA 1:

- 1 - Identificar la línea de acción del proyecto: Prevención, Ayuda y atención inmediata.
- 2 - Grupo étnico de hogares o familias que se beneficiaran con el proyecto (identificar el grupo étnico o grupos étnicos). Es importante que desde la administración municipal quede claro la identificación de los grupos étnicos a los que beneficiara el proyecto.
- 3 – Localización del proyecto (Departamento, municipio, corregimiento, vereda, dirección exacta para la entrega de materiales). Se requieren estos datos para que no se presenten contratiempos en la entrega.
- 4 – Información del proyecto:
 - a) Objetivo del proyecto (descripción general, alcance, que población beneficiara, como beneficiara a las familias, es una estrategia de prevención etc.).
 - b) Número de personas en condición de vulnerabilidad beneficiadas (informar cifras reales, no generar confusiones).
 - c) Número de hogares vulnerables beneficiados con el proyecto (establecer el número de hogares a través de los planes de contingencia, indicadores).
 - d) Impacto social y comunitario (realizar una descripción general de como el proyecto beneficia a la población).
- 5 – Verificación de condiciones estructura general del proyecto.
 - a). Requisitos para apoyo con materiales de construcción para proyectos de infraestructura social y comunitaria (PISC)

Diligenciar la información por cada documento adjunto.

| ACTIVIDAD | CUMPLE (Si / No) | NO APLICA | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | OBSERVACIONES (informar fecha de expedición del documento) |
|--|---------------------|--------------|-----------------------------|---|
| 1. Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. | | | | |
| 2. Certificado de tradición y libertad y/o copia de la escritura del lote donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3. Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales. | | | | |
| 4. Certificado de disponibilidad de servicios públicos | | | | |
| 5. Certificación de viabilidad del proyecto | | | | |
| 6. Compromiso de sostenibilidad | | | | |
| 7. Acta de socialización | | | | |
| 8. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) | | | | |
| * 9. Estudios y diseños. | | | | |

*Los estudios y diseños solicitados deben ser acordes con el alcance técnico del proyecto. No toda la información aplicaría para obras locativas menores (reparaciones menores).

b) Requisitos para apoyo con dotación de mobiliario para proyectos de infraestructura social y comunitaria (PISC)

| ACTIVIDAD | CUMPLE (Si / No) | NO APLICA | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | OBSERVACIONES (informar fecha de expedición del documento) |
|---|---------------------|--------------|-----------------------------|---|
| 1. Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. | | | | |
| 2. Compromiso de sostenibilidad | | | | |
| 3. Acta de socialización | | | | |
| 4. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) | | | | |
| 5. Censo y/o certificación de uso y capacidad en número de personas | | | | |

HOJA 2:

5. Aportes y fuentes de financiación:

Se expone un ejemplo del diligenciamiento de la hoja No. 2

| ENTIDAD | TIPO DE APORTE | DESCRIPCION DEL APORTE | VALOR ESTIMADO |
|-------------|---------------------------------|---|----------------|
| a) UARIV | MAT. Materiales de construcción | Agregados, arena, cemento, aceros, carpintería metálica, cubiertas etc. | 50.000.000,00 |
| b) ALCALDIA | A.T. Asistencia Técnica | Contratación de personal | 2.000.000,00 |



| | | | | |
|----|----------|------------------------|--|---------------|
| c) | ALCALDIA | D.O. Dirección de Obra | La Dirección de obra la asumirá secretaria de obras. | 5.000.000,00 |
| d) | ALCALDIA | LOT. Lote del Terreno | Se adquirió el terreno en la vereda xxx. | 9.000.000,00 |
| e) | ALCALDIA | INT. Interventoría | La interventoría la contratara el municipio xxxx | 7.000.000,00 |
| | | | TOTAL PROYECTO | 73.000.000,00 |

Los aportes también pueden asumirse a través de la financiación con entidades de cooperación internacional, Fundaciones, trabajo por parte de la comunidad etc.

7. Responsable Del Proyecto - Ejecutor

La responsabilidad de la ejecución la asume el municipio que va a realizar lo obra de infraestructura y como tal debe firmar el anexo la hoja no. 2.

HOJA 3.

8. Consolidado Aporte por la Unidad.

Se expone un ejemplo del diligenciamiento de la hoja No. 3

| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ESTIMADO | |
|------|----------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | LADRILLO | UNIDAD | 2000 | BLOQUE O LADRILLO | 1400 | 2.800.000,00 |
| 2 | CEMENTO | UNIDAD | 200 | CEMENTO BOYACA BULTO 42 KILOS | 22000 | 4.400.000,00 |
| 3 | VARILLA | UNIDAD | 100 | CABILLA 1/2 | 14000 | 1.400.000,00 |
| 4 | VARILLA | UNIDAD | 20 | CABILLA 3/8 | 8500 | 170.000,00 |
| 5 | CHIPA | KG. | 180 | CHIPA 1/4 | 2500 | 450.000,00 |
| 7 | PUNTILLA | KG | 2 | PUNTILLA 2 1/2 | 5000 | 10.000,00 |
| 9 | ARENA | METRO CUBICO | 12 | ARENA X 12 METROS CUBICOS | 28000 | 336.000,00 |

El listado de materiales debe contener la totalidad de los materiales requeridos para la construcción del proyecto, no las actividades del presupuesto, de manera que se pueda realizar la verificación de estas cantidades de acuerdo con los planos, APU y presupuesto.

La recomendación general es incluir la especificación completa (medida, calibre, color, material, referencia en lo posible, tamiz si se trata de un material como el triturado, etc.)

El listado de materiales debe estar debidamente firmado por la alcaldía y comunidad solicitante.



HOJA 4

9. Cronograma de ejecución.

Se expone un ejemplo del diligenciamiento de la hoja No. 4

| Nº | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ESTADO DE EJECUCIÓN |
|----|------------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 940 | 1.870.916 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 2 | DESCAPOTE Y NIVELACIÓN Y LIMPIEZA | M2 | 940 | 2.220.750 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA Y CONG | M3 | 92,4 | 2.182.950 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 4 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE EA | M3 | 12,8 | 103.292.20 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 5 | BASE DE PISO EN RECEBO COMPACTADO | M3 | 533 | 1.648.128.70 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 6 | CEMENTACION | M3 | 69,30 | 48.433.995 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 7 | PLACA DE PISO E=0,08CONCRETO 2500 | M2 | 571 | 23.756.633 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 8 | ARMADO Y FUNDIDO DE ESTRUCTURA | M3 | 55,63 | 69.048.471 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 9 | MAMPOSTERIA | M2 | 320 | 20.456.728 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 10 | MUROS EN PREFABRICADO | M2 | 631 | 29.892.240 | | PROGRAMADO EJECUTADO NAVANCE |
| 11 | PLACA MACIZA PARA BAÑOS | M3 | 2,5 | 1.217.620 | | PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO |

El cronograma de ejecución de obra es necesario lo elabore y lo firme quien ejecutara la obra, para este caso la mayoría de obras serán ejecutadas por las alcaldías por lo que lo más indicado será que lo firme el secretario de planeación y obras.

A través del cronograma tanto la alcaldía la comunidad y la UARIV podrán hacer seguimiento de la ejecución.

HOJA 5

La hoja 5 del formato inicialmente su objetivo es el seguimiento de la ejecución de la obra, pero también este formato puede utilizarse para elaborar un registro fotográfico de las condiciones actuales de la infraestructura a intervenir, a continuación un ejemplo:



Como resultado parcial () final () del contrato de Prestación de Servicios No. _____ se presenta el siguiente registro fotográfico:

| ITEM | FOTOGRAFÍA | ITEM | FOTOGRAFÍA |
|------|------------|------|-------------------|
| 1 | PAÑETE | 2 | FACHADA PRINCIPAL |
| 3 | CERCHAS | 4 | FACHADA POSTERIOR |
| 5 | ANDÉN | 6 | CORREAS |

Para evitar que la documentación sea devuelta para complementar información, se hace énfasis en el diligenciamiento de todo el formato y se adjunte la documentación relacionada.

Adicional al formato el proyecto debe presentarse con los diseños completos (arquitectónicos, estructurales, redes hidrosanitarias y eléctricas, cortes y detalles), que permitan realizar la evaluación del mismo y verificar las solicitudes de materiales. Como corresponde, debe presentarse el presupuesto y los análisis de precios unitarios.



ANEXO 2. REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

| TABLA 1. REQUISITOS | | |
|---------------------|---|---|
| Ítem | Requisitos | Descripción |
| 01 | <p>Carta de intención o presentación del proyecto Firmada por los representantes legales de las entidades territoriales o cooperantes, donde se informe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nombre del proyecto ()- Población objetivo del proyecto ()- Línea de acción del proyecto ()- Valor total del proyecto ()- Manifiestar que el proyecto no ha sido presentado en ninguna otra entidad, ni al ente territorial le han asignado recursos para su ejecución, ni si se viene adelantando ningún tipo de obra ()- Municipios y/o distritos beneficiados ()- Aporte realizado por cada entidad ()- Recursos de cofinanciación solicitados ()- Entidad ejecutora ()- Tiempo de ejecución ()- Servidor público a cargo del proyecto con información de contacto () | <p>La carta debe estar firmada por los respectivos representantes legales de las entidades territoriales beneficiadas por el proyecto, o por la entidad cooperante que presente el proyecto, y debe especificar la solicitud de los recursos de cofinanciación, desagregar si es el caso los aportes de los departamentos, distritos y/o municipios y/o las demás fuentes de financiación.</p> <p>Es importante contar con la información de contacto del servidor público o encargado que estará a cargo del proyecto, ya que este será el interlocutor con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.</p> |
| 02 | <p>Certificado de tradición y libertad y/o copia de la escritura del lote donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio:</p> <p>Se debe aportar copia de la escritura del lote donde se llevara a cabo el proyecto y/o el certificado de tradición y libertad, este último con máximo 3 meses de expedición. Esta documentación permitirá identificar que la propiedad corresponde al ente territorial, ya que no se apoyan proyectos sobre propiedades particulares.</p> | <p>Para resguardos indígenas se puede acreditar con acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo gobernador, indicando que el predio se encuentra en su jurisdicción. En el caso de comunidades afrocolombianas, el documento de titularización expedido por el INCODER con aval del consejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades afrocolombianas cuando aplique.</p> <p>Para los casos donde la intervención corresponda al mejoramiento y/o adecuación de vías de acceso o pasos peatonales, se podrá acreditar con la certificación emitida desde la Oficina de Planeación Municipal o quien haga sus veces, en donde se manifieste que el tramo a intervenir corresponde a una vía ya reconocida por el municipio y la zona de servidumbre del proyecto es de carácter público. Adicionalmente la intervención debe estar</p> |



| | | |
|----|--|--|
| | | contemplada en los planes de POT, EOT, PBOT y en el Plan de Desarrollo. |
| 03 | Certificación Zona libre de riesgo o afectación por desastres naturales y uso y tratamientos del suelo: Certificación firmada por los secretarios de planeación o quienes hagan sus veces, en la que conste que el terreno en el cual se desarrollará el proyecto no es una zona de riesgo o afectación y en la que conste que el proyecto está acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT) y/o esquemas de ordenamiento territorial (EOT). | Este requisito aplicará para proyectos en los que se vaya a realizar una intervención en infraestructura, construcción de edificaciones, entre otros, en los que es necesario validar el uso del suelo que se haya establecido en el POT, PBOT o EOT. |
| 04 | Certificación de viabilidad del proyecto: Certificación firmada por los representantes legales de las entidades territoriales o cooperantes, donde se manifieste que el proyecto que se presenta es viable social, técnica y económicamente. | Este requisito aplicará para proyectos en los que se vaya a realizar una intervención en infraestructura. La entidad territorial expedirá la certificación informando que el proyecto cumple con las normas de construcción vigentes que apliquen, y se evidencia la pertinencia de la intervención. |
| 05 | Certificado de disponibilidad de servicios: Documento expedido por la entidad prestadora de servicios públicos en el municipio, donde conste que en el lote previsto cuenta actualmente con la prestación de los servicios públicos. | Certificación firmada por el representante legal de la entidad prestadora de los servicios (agua, alcantarillado y energía). En los casos en que el lote o donde se espera realizar el proyecto, no cuente con disponibilidad de servicios o se cuente con otras alternativas de suministro, se deberá remitir la certificación manifestando dicha condición. |
| 06 | Certificado de Sostenibilidad: El ente territorial deberá emitir una certificación en donde garantice la operación, funcionamiento y mantenimiento del proyecto luego de terminada la adecuación y/o construcción. Esta debe estar firmada por los representantes legales de las entidades territoriales, de acuerdo con la | Esta certificación debe ser firmada por los representantes legales de las entidades territoriales beneficiadas por el proyecto. |



| | | |
|----|--|--|
| | responsabilidad que estos asuman según la carta de presentación del proyecto. | |
| 07 | <p>Acta y/o certificación de socialización con las comunidades</p> <p>Se debe garantizar mediante la presentación de una certificación o un acta firmada por la comunidad o sus representantes, que se haya surtido como mínimo un proceso socialización de la iniciativa, en donde se ha puesto en conocimiento la ubicación, alcance e impacto esperado con la intervención.</p> <p>Cuenta también que el proyecto esté integrado en los instrumentos de protección y garantía de derechos de estos pueblos y comunidades, consagrados en los autos de seguimiento expedidos por la Corte Constitucional.</p> | De existir podría presentarse también: el programa de garantía de derechos, planes de vida; plan de salvaguarda, plan prioritario de emergencia para comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, planes específicos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. |
| 08 | <p>Certificado Disponibilidad Presupuestal – CDP.</p> <p>El proyecto se debe presentar con los soportes de certificado de disponibilidad presupuestal, cartas de intención (entidades no gubernamentales).</p> <p>En el Certificado de disponibilidad presupuestal así como el resto de las certificaciones, se debe incluir claramente la destinación del recurso mencionando el proyecto.</p> | <p>Para el caso de los aportes del departamento, los municipios y/o distritos beneficiados por el proyecto se deben remitir los certificados de disponibilidad presupuestal.</p> <p>En el caso de aportes de entidades privadas se debe hacer entrega de la carta de intención de los aportes con su desagregación.</p> <p>Para el caso de los recursos del Sistema General de Regalías - SGR debe remitirse carta de compromiso para presentar el proyecto al OCAD respectivo, firmada por cada uno de los representantes legales de las entidades territoriales que dispondrán de recursos del SGR.</p> <p>Es de mencionar que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no realizará el suministro de los materiales hasta tanto no se tenga la documentación que garantice la disponibilidad de los recursos de cofinanciación del proyecto.</p> |
| 09 | <p>Planimetría y Presupuesto con soportes del Proyecto:</p> <p>Se deben presentar los diseños completos del proyecto en formato AutoCad: Planos arquitectónicos, estructurales con cortes y</p> | La solicitud de materiales (hoja 3 del formato de estructura técnica) debe corresponder a las cantidades de materiales que se calculen con los planos y los análisis de precios unitarios, por tanto la elaboración de los análisis (APU), deben contener |



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| | | |
|--|--|--|
| | <p>detalles, de redes hidrosanitarias y eléctricas, y zonas comunes si aplica.</p> <p>Presentar el presupuesto detallado acompañado de los análisis de precios unitarios, teniendo en cuenta los precios acordes a la región y los materiales utilizados en la zona y para el tipo de proyecto planeado.</p> | <p>los datos de desperdicios y consideraciones asumidas.</p> |
|--|--|--|





ANEXO 3. CARTA DE PRESENTACIÓN PROYECTO ISC

Ciudad., XXX de XXX de 2017

Señor,
ALAN JARA
DIRECTOR GENERAL UNIDAD DE VICTIMAS
DIRECCION DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS
Carrera 8 # 15 – 73 piso 3
Bogotá D.C

Asunto: Carta de presentación e intención del proyecto: XXXXXXX MUNICIPIO XXXXXX DEPARTAMENTO XXXXX

Respetados señores,

Por medio del presente oficio, hoy (fecha) certifico con relación al proyecto _____ ubicado en (vereda, _____ corregimiento, _____ dirección) _____, lo siguiente:

Que el número de personas víctimas a beneficiar con el proyecto es de _____ personas.

Que el número de personas vulnerables a beneficiar con el proyecto es de _____ personas.

Que las personas beneficiadas por el proyecto se discriminan de acuerdo a los siguientes grupos poblacionales:

| Grupo Étnico | |
|--------------------------|---|
| Población Indígena | % |
| Población Afrocolombiana | % |
| Población Raizal | % |
| Población ROM | % |
| Población Campesina | % |

Que el valor total estimado del proyecto es _____ (\$) xxxxxx), representados en los siguientes aportes:

| ENTIDAD | APORTE |
|---------|----------|
| | \$ xxxxx |



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Que el proyecto () SI () NO, ha sido presentado en ninguna otra entidad, ni del ente territorial, no le han asignado recursos, ni si se viene adelantando ningún tipo de obra y/o suministro de mobiliario del aquí solicitado.

Que el proyecto () SI () NO, cuenta con recursos de cofinanciación por parte de _____ por un valor de _____
(\$ xxxxxxx)

La entidad ejecutora del proyecto es _____.

El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de _____ de acuerdo con el cronograma presentado en el formato de estructura técnica.

El representante de la entidad ejecutora quien realizará la interlocución con la Unidad de Víctimas es:

Nombre: _____

Entidad: _____

Cargo: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

Correo Electrónico: _____

Cordialmente,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alcalde Municipal de XXXX

Departamento de XXXXXXXXX



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ANEXO 4. OFERTA DOTACION MOBILIARIO VIGENCIA 2017

| DESCRIPCION DEL BIEN Y/O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|------------------|
| Archivador dimensión 1,36 x0,47 x 0,70m, estructura en lámina de acero ColdRolled, contiene cuatro (4) entrepaños modulares | Unidad |
| Armario cajonero dimensión Largo: 45.0cm, Ancho: 65.0cm, Alto: 93.2cm. De cuatro cajones, en material de plástico | Unidad |
| Bancas de concreto con espaldar | Unidad |
| Bancas de concreto sin espaldar | Unidad |
| Biblioteca dimensión Largo 1,15 x ancho 0,38 alto 1,60. Estructura en lámina de acero coldrolled contiene cuatro (4) entrepaños modulares. | Unidad |
| Biombo de tres bastidores en tubo redondo de 7/8 en cold-rolled, con rodachines, acabado en pintura electrostática o cromado. | Unidad |
| Camarotes elaborado en tubo redondo de 3" coll roll, pintura electrostática en polvo, color negro, ángulo de 1,1/2x1/8, tornillo zincado de 5/16/x3/4 con tuerca, dimensiones de 100x190 cama baja y 100x190 cama alta, con tablado de 12 piezas en madera seca, con colchoneta | Unidad |
| Campana extractora industrial Largo: 1 m. Ancho: 0.60 m, Calibre 20, fabricada en acero inox cl 20 con dos filtros y recolector de grasa | Unidad |
| Cocina Industrial: Largo: 0.90 m, Ancho: 0.60 m, Alto: 0.87 m, Cuatro puestos medianos, Parrilla en hierro, Mueble y entrepaño en acero inoxidable, fabricada en acero inox cl 18, piloto de encendido válvula de seguridad y rueda fuerte | Unidad |
| Comedor de cuatro (4) puestos infantil plástico con silla infantil sin brazos de cualquier color. | Unidad |
| Comedor de cuatro (4) puestos plástico con silla lisa sin brazos de cualquier color. | Unidad |
| Comedor de seis (6) puestos plástico con silla lisa sin brazos de cualquier color. | Unidad |
| Escritorio de trabajo sencillo de ,73 x 1.02 x .54m (Escritorio para profesor) superficie recta en madera aglomerada de 19 mm con recubrimiento melamínico, canto en PVC rígido y balance; estructura en acero CR con acabado en pintura electrostática y niveladores, cualquier color | Unidad |
| Escritorio estructura en C.R, con retorno. Superficie en aglomerado recubierto de melanina, Cajonera tipo Meridian Dim: 0,70 x 1,40 x ,72 | Unidad |
| Estante en lámina de acero C.R de cinco bandejas modulares graduables enganche tipo uña, de 2,00 x ,90 x .48m. Altura mínima libre de 30cm y un máximo de 40cm. | Unidad |
| Lavaplatos industrial en acero inoxidable 150 x 60 x 85 cm entrepaño en acero con escurridero y grifería | Unidad |
| Mesa plástica de cuatro (4) puestos cualquier color | Unidad |
| Mesa plástica de seis (6) puestos cualquier color | Unidad |
| Mesa plástica infantil de cuatro (4) puestos cualquier color | Unidad |
| Pórtico Multifuncional tablero en fibra de vidrio (Juego de Basketball con arco para microfútbol) | Par |
| Pórtico Multifuncional, tablero metálico (Juego de Basketball con arco para microfútbol) | Par |
| Pupitre unipersonal con descansa brazo fijo en tubería calibre 18, asiento y espaldar en carcasa plástica, con parilla, y tuercas de seguridad | Unidad |
| Silla en polipropileno y estructura de acero C.R. pintura epoxi Poliéster. Asiento sin tapizado. Cualquier color | Unidad |
| Silla en polipropileno y estructura de acero C.R. pintura epoxi Poliéster. asiento tapizado. Cualquier color | Unidad |

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 · Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:    



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| | |
|---|--------|
| Silla plástica con brazos cualquier color | Unidad |
| Silla plástica con brazos infantil cualquier color | Unidad |
| Silla plástica sin brazos cualquier color | Unidad |
| Silla plástica sin brazos infantil cualquier color | Unidad |
| Silla tipo operativa gama media incluye brazos fijos o graduables cualquier color | Unidad |
| Tablero de formica Acrílico de 1.20 x 2.20 metros | Unidad |
| Tablero de formica Acrílico de 1.20 x 2.40 metros | Unidad |
| Tablero de formica Acrílico de 1.80 x 2.40 metros | Unidad |
| Ventiladores de pared | Unidad |
| Ventiladores de Techo | Unidad |

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 · Bogotá: 426 1111

Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:





UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



ANEXO 5. FORMATO INFORME DE AVANCE DE OBRA

| | | |
|---|----------------|----|
| FECHA DE ELABORACIÓN | PERIODO DEL | AL |
| 1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO: Objeto del proyecto (descripción general) - Impacto social y comunitario del proyecto (descripción general) | | |
| | | |
| Contrato No. | | |
| Objeto | | |
| Localización | | |
| Valor del Contrato | | |
| Plazo del Contrato | | |
| Fecha de Inicio Obra | | |
| Fecha de Terminación Obra | | |
| 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE EL PERIODO | | |
| | | |
| 3. ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA EL PROXIMO EL PERIODO | | |
| | | |
| 4. OBSERVACIONES | | |



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ELABORÓ: (nombre y cargo)

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto No. 1. (Descripción)

Foto No. 2. (Descripción)



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| | |
| Foto No. 3. (Descripción) | Foto No. 4. (Descripción) |
| | |
| Foto No. 5. (Descripción) | Foto No. 6. (Descripción) |



ANEXO 6. FORMATO INFORME ENTREGA DE DOTACIÓN

| FECHA DE INFORME _____ | | | |
|---|--------|--------------------|---------------|
| 1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Objeto del proyecto (descripción general) - Impacto social y comunitario del proyecto (descripción general) | | | |
| | | | |
| Localización | | | |
| Fecha de Inicio Entrega | | | |
| Fecha de Terminación Entrega | | | |
| Elaboró (nombre y cargo) | | | |
| 2. DISPOSICIÓN FINAL MOBILIARIO ENTREGADO | | | |
| | | | |
| 3. DOTACION MOBILIARIO VIGENCIA 2015 | | | |
| DESCRIPCION DEL BIEN Y/O PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD ENTREGADA | OBSERVACIONES |
| Archivador dimensión 1,36 x0 ,47 x 0,70m, estructura en lámina de acero ColdRolled, contiene cuatro (4) entrepañes modulares | Unidad | | |
| Armario cajonero dimensión Largo: 45.0cm, Ancho: 65.0cm, Alto: 93.2cm. De cuatro cajones, en material de plástico | Unidad | | |
| Bancas de concreto con espaldar | Unidad | | |



| | | | |
|--|--------|--|--|
| Bancas de concreto sin espaldar | Unidad | | |
| Biblioteca dimensión Largo 1,15 x ancho 0,38 alto 1,60. Estructura en lámina de acero coldrolled contiene cuatro (4) entrepaños modulares. | Unidad | | |
| Biombo de tres bastidores en tubo redondo de 7/8 en cold-rolled, con rodachines, acabado en pintura electrostática o cromado. | Unidad | | |
| Camarotes elaborado en tubo redondo de 3" coll roll, pintura electrostática en polvo, color negro, ángulo de 1,1/2x1/8, tornillo zincado de 5/16/x3/4 con tuerca, dimensiones de 100x190 cama baja y 100x190 cama alta, con tablado de 12 piezas en madera seca, con colchoneta | Unidad | | |
| Campana extractora industrial Largo: 1 m. Ancho: 0.60 m, Calibre 20, fabricada en acero inox cl 20 con dos filtros y recolector de grasa | Unidad | | |
| Cocina Industrial: Largo: 0.90 m, Ancho: 0.60 m, Alto: 0.87 m, Cuatro puestos medianos, Parrilla en hierro, Mueble y entrepaño en acero inoxidable, fabricada en acero inox cl 18, piloto de encendido válvula de seguridad y rueda fuerte | Unidad | | |
| Comedor de cuatro (4) puestos infantil plástico con silla infantil sin brazos de cualquier color. | Unidad | | |
| Comedor de cuatro (4) puestos plástico con silla lisa sin brazos de cualquier color. | Unidad | | |
| Comedor de seis (6) puestos plástico con silla lisa sin brazos de cualquier color. | Unidad | | |
| Escritorio de trabajo sencillo de ,73 x 1.02 x .54m (Escritorio para profesor) superficie recta en madera aglomerada de 19 mm con recubrimiento melamínico, canto en PVC rígido y balance; estructura en acero CR con acabado en pintura electrostática y niveladores, cualquier color | Unidad | | |
| Escritorio estructura en C.R, con retorno. Superficie en aglomerado recubierto de melanina, Cajonera tipo Meridian Dim: 0,70 x 1,40 x ,72 | Unidad | | |
| Estante en lámina de acero C.R de cinco bandejas modulares graduables enganche tipo uña, de 2,00 x ,90 x .48m. | Unidad | | |



| | | | |
|--|--------|--|--|
| Altura mínima libre de 30cm y un máximo de 40cm. | | | |
| Lavaplatos industrial en acero inoxidable 150 x 60 x 85 cm entrepaño en acero con escurridor y grifería | Unidad | | |
| Mesa plástica de cuatro (4) puestos cualquier color | Unidad | | |
| Mesa plástica de seis (6) puestos cualquier color | Unidad | | |
| Mesa plástica infantil de cuatro (4) puestos cualquier color | Unidad | | |
| Pórtico Multifuncional tablero en fibra de vidrio (Juego de Basketball con arco para microfútbol) | Par | | |
| Pórtico Multifuncional, tablero metálico (Juego de Basketball con arco para microfútbol) | Par | | |
| Pupitre unipersonal con descansa brazo fijo en tubería calibre 18, asiento y espaldar en carcasa plástica, con parilla, y tuercas de seguridad | Unidad | | |
| Silla en polipropileno y estructura de acero C.R. pintura epoxi Poliéster. Asiento sin tapizado. Cualquier color | Unidad | | |
| Silla en polipropileno y estructura de acero C.R. pintura epoxi Poliéster. asiento tapizado. Cualquier color | Unidad | | |
| Silla plástica con brazos cualquier color | Unidad | | |
| Silla plástica con brazos infantil cualquier color | Unidad | | |
| Silla plástica sin brazos cualquier color | Unidad | | |
| Silla plástica sin brazos infantil cualquier color | Unidad | | |
| Silla tipo operativa gama media incluye brazos fijos o graduables cualquier color | Unidad | | |
| Tablero de formica Acrílico de 1.20 x 2.20 metros | Unidad | | |
| Tablero de formica Acrílico de 1.20 x 2.40 metros | Unidad | | |
| Tablero de formica Acrílico de 1.80 x 2.40 metros | Unidad | | |
| Ventiladores de pared | Unidad | | |
| Ventiladores de Techo | Unidad | | |

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| | |
| Foto No. 1. (Descripción) | Foto No. 2. (Descripción) |
| | |
| Foto No. 3. (Descripción) | Foto No. 4. (Descripción) |



ANEXO 7. Anexo 2 de primer informe parcial de práctica



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Alcaldía de Suratá
NIT: 890205051-6



Departamento de Santander, SURATA, 11 de Julio de 2019

Doctor,
RAMON ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL UNIDAD DE VICTIMAS
DIRECCION DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS
Carrera 8 # 15 – 73 piso 3
Bogotá D.C

Asunto: *Carta de presentación e intención del proyecto: ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL MUNICIPIO SURATA DEPARTAMENTO SANTANDER*

Respetados señores,

Por medio del presente oficio, hoy (fecha) certifico con relación al proyecto ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO ubicado en EL CORREGIMIENTO DEL MOHAN DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER, lo siguiente:

Que el número de personas víctimas a beneficiar con el proyecto es de (450 Cuatrocientos cincuenta cincuenta personas). Que el número de personas vulnerables a beneficiar con el proyecto es (450 Cuatrocientos cincuenta cincuenta personas).

Que las personas beneficiadas por el proyecto se discriminan de acuerdo a los siguientes grupos poblacionales:

| Grupo Étnico | |
|--------------------------|-------|
| Población Indígena | % |
| Población Afrocolombiana | % |
| Población Raizal | % |
| Población ROM | % |
| Población Campesina | 99.9% |

Que el valor total estimado del proyecto es de NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$90.530.452,00), representados en los siguientes aportes:

| ENTIDAD | APORTE |
|--------------------------|--------------------|
| UNIDAD PARA LAS VICTIMAS | \$ 87.056.692,00 |
| ALCALDIA DE SURATA | \$ \$ 2.778.588,00 |
| | |
| | |

Que el proyecto () SI (x) NO, ha sido presentado en ninguna otra entidad, ni del ente territorial, no le han asignado recursos, ni si se viene adelantando ningún tipo de obra y/o suministro de mobiliario del aquí solicitado.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Alcaldía de Suratá
NIT: 890205051-6



Que el proyecto () SI () NO, cuenta con recursos de cofinanciación por parte de La Alcaldía de Surata por un valor de dos millones setecientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho pesos moneda corriente (\$ 2.778.588,00)

La entidad ejecutora del proyecto es la ALCALDIA MUNICIPAL DE SURATA SANTANDER.

El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de noventa días calendario (90) de acuerdo con el cronograma presentado en el formato de estructura técnica.

El representante de la entidad ejecutora quien realizará la interlocución con la Unidad de Víctimas es:

Nombre: ELBERT PORTILLA
Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL
Cargo: APOYO A VICTIMAS SURATA SANTANDER
Celular: 3213929015
Correo Electrónico: VICTIMAS@SURATA-SANTANDER.GOV.CO

Cordialmente,

IGNACIO DIAZ MEDINA

Alcalde Municipal de Surata



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Alcaldía de Suratá
NIT: 890205051-6





UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

FORMATO UNICO DE CENSO

PROCESO DE GESTION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

| Nº FAMILIA | NOMBRES | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | Nº DE DOCUMENTO | SEXO | FECHA DE NACIMIENTO | ETNIA | COMUNIDAD |
|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | FERMIN | MANTILLA | ROZO | 2196382 | M | 23/09/1934 | NO APLICA | MOHAN |
| 2 | CELEDONIO | MANTILLA | GUERRERO | 991999706,8 | M | 11/02/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 3 | GIOVANNY | BAEZ | ESTEBAN | 1005565664 | M | 4/01/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 4 | ARGENIS | BAEZ | ESTEBAN | 1005565520 | M | 20/07/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 5 | ELKIN | ESTEBAN | VARGAS | 1098687847 | M | 26/03/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 6 | ANGELA | ESTEBAN | VARGAS | 28443870 | F | 5/02/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 7 | ELIAS | ESTEBAN | VARGAS | 1102774295 | M | 9/02/1989 | NO APLICA | MOHAN |
| 8 | EFRAIN | BAEZ | ESTEBAN | 1095929217 | M | 23/04/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 9 | FERNEY | ESTEBAN | VARGAS | 1102774025 | M | 13/04/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 10 | WILSON | PABON | ORTEGA | 91464455 | M | 12/05/1972 | NO APLICA | MOHAN |
| 11 | DELKIN | PABON | MANTILLA | 13564126 | M | 27/11/1984 | NO APLICA | MOHAN |
| 12 | ALEXIS | PABON | PABON | 1097303774 | M | 9/10/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 13 | JUAN | PABON | PABON | 1102774547 | M | 30/08/2010 | NO APLICA | MOHAN |
| 14 | YANID | PABON | GUERRERO | 37667788 | M | 16/09/1981 | NO APLICA | MOHAN |
| 15 | BRAYAN | PABON | PABON | 1097303367 | M | 3/11/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 16 | LAURA | PABON | PABON | 1005248606 | F | 23/06/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 17 | YEISON | PABON | PABON | 1097302869 | M | 16/09/2005 | NO APLICA | MOHAN |
| 18 | DEINER | PABON | PABON | 1102774451 | M | 1/03/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 19 | ZAIRA | PABON | ORTEGA | 0 | F | 16/06/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 20 | LEONEL | MANTILLA | PABON | 91470741 | M | 26/02/1972 | NO APLICA | MOHAN |
| 21 | CARLOS | MANTILLA | GONZALEZ | 1005565673 | M | 27/09/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 22 | ALEXIS | MANTILLA | GONZALEZ | 1102774372 | M | 12/03/2008 | NO APLICA | MOHAN |
| 23 | BREYNER | MANTILLA | GONZALEZ | 1096065718 | M | 25/08/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 24 | YEIDY | GONZALEZ | ORTIZ | 37651895 | F | 20/04/1980 | NO APLICA | MOHAN |
| 25 | MARILI | PABON | MANTILLA | 94092932111 | F | 29/09/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 26 | SNEIDER | GELVEZ | PABON | 1097804334 | M | 4/07/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 27 | GIOVANNY | GELVEZ | MANTILLA | 0 | M | 24/10/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 28 | DORIS | HERNANDEZ | PABON | 1102774294 | F | 1/04/1989 | NO APLICA | MOHAN |
| 29 | BRENDA | SIERRA | HERNANDEZ | 1097127909 | F | 19/01/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 30 | BRANDON | HERNANDEZ | HERNANDEZ | 1098701944 | M | 11/03/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 31 | GERMAN | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 88171223 | M | 11/10/1972 | NO APLICA | MOHAN |
| 32 | FEMERIDES | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 1102774613 | M | 22/05/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 33 | RAMON | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 88171160 | M | 21/05/1971 | NO APLICA | MOHAN |
| 34 | REINEL | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 91513825 | M | 15/08/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 35 | ESMERIDA | RODRIGUEZ | BAUTISTA | 37830166 | F | 26/08/1951 | NO APLICA | MOHAN |
| 36 | EDUARDO | HERNANDEZ | MORA | 5422855 | M | 26/09/1946 | NO APLICA | MOHAN |
| 37 | YAZMIN | HERNANDEZ | PABON | 1005565684 | F | 14/09/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 38 | NAYIBE | ARENIZ | HERNANDEZ | 93092962951 | F | 29/04/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 39 | CELINA | HERNANDEZ | GUERRERO | 28443688 | F | 29/03/1969 | NO APLICA | MOHAN |
| 40 | GILBERTO | ARENIS | ARENIS | 5726685 | M | 16/03/1963 | NO APLICA | MOHAN |
| 41 | MARTHA | ARENIZ | HERNANDEZ | 1098714604 | F | 18/10/1991 | NO APLICA | MOHAN |
| 42 | DEINER | HERNANDEZ | PABON | 1102774087 | M | 7/08/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 43 | NEMECIO | PABON | CARRILLO | 5723788 | M | 7/05/1955 | NO APLICA | MOHAN |
| 44 | ANA | CARRILLO | JAIMES | 37710703 | F | 1/08/1958 | NO APLICA | MOHAN |
| 45 | ELEDYS | PABON | CARRILLO | 37667799 | F | 13/05/1980 | NO APLICA | MOHAN |
| 46 | MEILEN | HERNANDEZ | PABON | 1102774297 | F | 23/12/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 47 | NANCY | PABON | CARRILLO | 37667800 | F | 9/01/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 48 | CALIXTO | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 5774158 | M | 14/03/1975 | NO APLICA | MOHAN |
| 49 | JULIETH | MORENO | PABON | 1096064902 | F | 27/12/2005 | NO APLICA | MOHAN |
| 50 | YON | MORENO | PABON | 1030180921 | M | 18/02/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 51 | ELIECER | MORENO | GELVEZ | 13564072 | M | 4/09/1984 | NO APLICA | MOHAN |
| 52 | NANCY | PABON | HERNANDEZ | 63527544 | F | 16/01/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 53 | FREDDY | PABON | MORENO | 1098692259 | M | 23/07/2008 | NO APLICA | MOHAN |
| 54 | JUAN | MORENO | PABON | 1102774077 | M | 26/05/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 55 | ANDRI | MORENO | PABON | 1030194361 | F | 15/07/2014 | NO APLICA | MOHAN |
| 56 | DIEGO | MORENO | PABON | 1007643777 | M | 31/08/2002 | NO APLICA | MOHAN |
| 57 | ADNNY | CARDENAS | PARADA | 1097097785 | F | 4/02/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 58 | JOHAN | HERNANDEZ | CARDENAS | 1097111671 | M | 10/03/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 59 | OSCAR | HERNANDEZ | CARDENAS | 1139125945 | M | 17/10/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 60 | ANNY | CARDENAS | PARADA | 63563340 | F | 20/08/1985 | NO APLICA | MOHAN |
| 61 | EDGAR | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 91509588 | M | 20/10/1980 | NO APLICA | MOHAN |
| 62 | AMALIO | HERNANDEZ | HERNANDEZ | 2195583 | M | 10/02/1947 | NO APLICA | MOHAN |
| 63 | ROSA | VEGA | PABON | 28450333 | M | 23/07/1941 | NO APLICA | MOHAN |
| 64 | HILDA | MANTILLA | DE PABON | 28339315 | M | 18/01/1945 | NO APLICA | MOHAN |
| 65 | GUSTAVO | BLANCO | | 5773539 | M | 21/12/1956 | NO APLICA | MOHAN |
| 66 | MARIELA | HERNANDEZ | BLANCO | 28335519 | F | 13/11/1962 | NO APLICA | MOHAN |
| 67 | EDINSON | BLANCO | HERNANDEZ | 1098605219 | M | 16/07/1985 | NO APLICA | MOHAN |
| 68 | ALEJANDRO | BLANCO | HERNANDEZ | 1098710717 | M | 25/10/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 69 | EDINSON | BLANCO | HERNANDEZ | 0 | M | 13/07/1985 | NO APLICA | MOHAN |
| 70 | GREDIS | GELVES | ORTEGA | 28443652 | F | 14/11/1971 | NO APLICA | MOHAN |
| 71 | EYLEN | GUERRERO | GELVES | 1095309958 | F | 1/08/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 72 | SOLANGEL | GUERRERO | GELVES | 91470372 | F | 15/08/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 73 | DEIVER | GUERRERO | GELVES | 1095811606 | M | 13/01/1972 | NO APLICA | MOHAN |
| 74 | FERNEY | GUERRERO | GELVES | 1098695565 | M | 18/11/1990 | NO APLICA | MOHAN |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|---------------|-------------|---|------------|-----------|-------|
| 75 | CAROLINA | GUERRERO | GELVEZ | 1100895129 | F | 29/05/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 76 | JIMENA | GUERRERO | GELVEZ | 1005565503 | F | 9/05/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 77 | PAULA | GUERRERO | GELVEZ | 1102774914 | F | 19/04/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 78 | DIEGO | GUERRERO | GELVEZ | 1005565609 | M | 20/02/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 79 | HERNAN | GUERRERO | GELVES | 1102774103 | M | 15/12/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 80 | ANGIE | GUERRERO | GUERRERO | 1102774682 | F | 2/07/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 81 | EDITH | BAEZ | ESTEBAN | 28443654 | F | 24/06/1969 | NO APLICA | MOHAN |
| 82 | JOSE | CHAVES | ACEROS | 5776903 | M | 28/01/1963 | NO APLICA | MOHAN |
| 83 | ANA | CHAVES | BAEZ | 1102774588 | F | 13/09/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 84 | OLMEDES | MARQUEZ | ESTEBAN | 5774059 | M | 5/07/1972 | NO APLICA | MOHAN |
| 85 | VICTOR | MARQUEZ | CHAVEZ | 1102774391 | M | 3/08/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 86 | LUZ | CHAVES | ACEROS | 28443685 | F | 28/03/1975 | NO APLICA | MOHAN |
| 87 | DINAEL | ESTEBAN | VARGAS | 90122166549 | M | 21/12/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 88 | ANA | BAEZ | ESTEBAN | 95041119730 | F | 11/04/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 89 | MARIA | VARGAS | ROJAS | 28443080 | F | 18/01/1951 | NO APLICA | MOHAN |
| 90 | SAMUEL | ESTEBAN | VARGAS | 1102774768 | M | 15/02/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 91 | JOSE | ESTEBAN | CASTRILLON | 2196431 | M | 14/12/1950 | NO APLICA | MOHAN |
| 92 | YOLEIMAR | BARON | GUERRERO | 1102774756 | M | 14/02/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 93 | ANA | GUERRERO | GUERRERO | 27651222 | F | 24/09/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 94 | WILDER | BARON | GUERRERO | 97112015225 | M | 20/11/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 95 | WREYDY | BARON | GUERRERO | 1005565422 | M | 14/05/1999 | NO APLICA | MOHAN |
| 96 | JOSE | BARON | GUERRERO | 5723601 | M | 24/07/1956 | NO APLICA | MOHAN |
| 97 | ROSA | GUERRERO | GUERRERO | 270620304 | F | 27/06/1960 | NO APLICA | MOHAN |
| 98 | EVELIO | ORTEGA | ORTEGA | 0 | M | 30/08/1959 | NO APLICA | MOHAN |
| 99 | FLOR | GUERRERO | DE GUERRERO | 28448546 | F | 19/03/1942 | NO APLICA | MOHAN |
| 100 | ARCADIO | GUERRERO | ORTEGA | 2196393 | M | 16/01/1942 | NO APLICA | MOHAN |
| 101 | PAULA | MARQUES | TOLOZA | 1102774428 | F | 2/01/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 102 | MEUDY | MARQUEZ | TOLOZA | 1102774671 | F | 13/03/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 103 | JAIRO | MARQUEZ | TOLOZA | 1005565514 | M | 27/03/1991 | NO APLICA | MOHAN |
| 104 | ELENA | TOLOZA | ARIAS | 1102774429 | F | 19/03/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 105 | JHON | MARQUEZ | TOLOZA | 1102774321 | M | 9/07/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 106 | DIANA | SOCHA | MARQUEZ | 97112209178 | F | 22/11/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 107 | DERWIN | SOCHA | MARQUEZ | 96062320726 | M | 23/06/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 108 | MARLON | VEGA | SOCHA | 1102774897 | M | 1/02/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 109 | HUBER | SOCHA | DURAN | 5774097 | M | 15/07/1974 | NO APLICA | MOHAN |
| 110 | DEYSON | SOCHA | MARQUEZ | 1005565516 | M | 14/02/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 111 | MAURICIO | SOCHA | MARQUEZ | 1102774555 | M | 28/09/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 112 | DELICY | MARQUEZ | ESTEBAN | 28443721 | F | 16/07/1976 | NO APLICA | MOHAN |
| 113 | ALICIA | GUERRERO | GUERRERO | 28443845 | F | 17/05/1969 | NO APLICA | MOHAN |
| 114 | ALEXIS | ARIAS | GUERRERO | 1005565450 | M | 3/03/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 115 | MAYERLY | GUERRERO | CALDERON | 1102774096 | F | 9/05/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 116 | MAURO | GUERRERO | PABON | 1102774040 | M | 27/07/1986 | NO APLICA | MOHAN |
| 117 | SONIA | GUERRERO | CALDERON | 1102774095 | F | 12/12/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 118 | JOHANA | GUERRERO | CALDERON | 1102774291 | F | 20/04/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 119 | MARIA | CALDERON | LIZCANO | 1092644231 | F | 1/03/1986 | NO APLICA | MOHAN |
| 120 | HERMOGENES | VILLAMIZAR | SIERRA | 5776710 | M | 19/04/1940 | NO APLICA | MOHAN |
| 121 | LUCRECIA | VEGA | DE VILLAMIZAR | 28240905 | F | 14/11/1940 | NO APLICA | MOHAN |
| 122 | ODILIO | GELVEZ | ORTEGA | 1095786694 | M | 27/08/1985 | NO APLICA | MOHAN |
| 123 | AUDREY | VILLAMIZAR | VEGA | 1007918064 | M | 3/11/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 124 | MARICEL | VILLAMIZAR | VEGA | 52692995 | F | 20/05/1979 | NO APLICA | MOHAN |
| 125 | DAVINSON | GELVEZ | VILLAMIZAR | 1030180922 | M | 17/02/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 126 | LIBARDO | GELVEZ | ORTEGA | 2196422 | M | 21/04/1946 | NO APLICA | MOHAN |
| 127 | DAIRON | GELVEZ | VILLAMIZAR | 1097124006 | M | 17/03/2014 | NO APLICA | MOHAN |
| 128 | DOMINGO | HERNANDEZ | ARENIZ | 1102774497 | M | 31/03/1963 | NO APLICA | MOHAN |
| 129 | JAIME | MARQUEZ | ESTEBAN | 5774079 | M | 27/05/1974 | NO APLICA | MOHAN |
| 130 | ANGEL | MARQUEZ | TOLOZA | 96030623042 | M | 6/03/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 131 | EMERITA | TOLOZA | ARIAS | 28443655 | F | 16/09/1974 | NO APLICA | MOHAN |
| 132 | EZEQUIEL | MARQUEZ | TOLOZA | 1102774636 | M | 6/07/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 133 | JUAN | BAEZ | PABON | 2195826 | M | 23/10/1927 | NO APLICA | MOHAN |
| 134 | MILENA | BAEZ | CARRILLO | 1102774305 | F | 25/05/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 135 | MATILDE | CARRILLO | DE BAEZ | 28450043 | F | 14/03/1937 | NO APLICA | MOHAN |
| 136 | EUCLIDES | BAEZ | CARRILLO | 5776891 | M | 8/05/1962 | NO APLICA | MOHAN |
| 137 | TATIANA | SANDOVAL | BAEZ | 98042657271 | F | 26/04/1998 | NO APLICA | MOHAN |
| 138 | MARLIN | SANDOVAL | BAEZ | 1005565682 | F | 17/05/2002 | NO APLICA | MOHAN |
| 139 | LUIS | SANDOVAL | BAEZ | 1102774167 | M | 2/02/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 140 | EFRAIN | SANDOVAL | BAEZ | 1005565622 | M | 1/09/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 141 | EFRAIN | SANDOVAL | DUARTE | 91295469 | M | 22/01/1974 | NO APLICA | MOHAN |
| 142 | MARTHA | SANDOVAL | BAEZ | 93031016132 | F | 10/03/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 143 | OLGA | BAEZ | ARIAS | 28157386 | F | 3/03/1976 | NO APLICA | MOHAN |
| 144 | DIANA | ARIAS | GUERRERO | 91092229411 | F | 22/09/1991 | NO APLICA | MOHAN |
| 145 | LUZ | ARIAS | GUERRERO | 94032718692 | F | 27/03/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 146 | SMITH | GUERRERO | MANTILLA | 28443782 | F | 17/07/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 147 | SILBERIO | ARIAS | | 91236737 | M | 9/06/1963 | NO APLICA | MOHAN |
| 148 | JAMES | MARQUEZ | PABON | 1102774869 | M | 9/09/2014 | NO APLICA | MOHAN |
| 149 | ERVIN | PABON | TOLOZA | 1102774622 | M | 4/07/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 150 | ROSANA | PABON | TOLOZA | 1102774289 | F | 7/09/1985 | NO APLICA | MOHAN |
| 151 | WILLIAM | PABON | TOLOZA | 1102774007 | M | 6/10/1984 | NO APLICA | MOHAN |
| 152 | LUVIN | MARQUEZ | CANCINO | 1098641101 | M | 4/08/1987 | NO APLICA | MOHAN |
| 153 | CENOVIA | TOLOZA | ARIAS | 28443565 | F | 16/05/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 154 | RAMIRO | PABON | PABON | 5776873 | M | 15/08/1957 | NO APLICA | MOHAN |
| 155 | EDWIN | MARQUEZ | PABON | 1102774663 | M | 3/03/2012 | NO APLICA | MOHAN |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|--------------|-------------|---|------------|-----------|-------|
| 156 | ZAIAN | PABON | TOLOZA | 1102774492 | M | 19/10/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 157 | JIMENA | PABON | TOLOZA | 1102774477 | F | 30/08/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 158 | VICTOR | PABON | TOLOZA | 1102774302 | M | 24/03/1989 | NO APLICA | MOHAN |
| 159 | FERLEY | PABON | TOLOZA | 95030217986 | M | 2/03/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 160 | NAYIBE | PABON | TOLOZA | 1102774290 | F | 7/02/1987 | NO APLICA | MOHAN |
| 161 | YURI | TOLOZA | ARIAS | 94032120614 | F | 21/03/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 162 | LUIS | TOLOZA | ARIAS | 92051669543 | M | 16/03/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 163 | JAIME | TOLOZA | ARIAS | 5774279 | M | 8/10/1979 | NO APLICA | MOHAN |
| 164 | ALBEY | TOLOZA | BLANCO | 1005565739 | M | 14/07/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 165 | IVAN | TOLOZA | ARIAS | 1005565426 | M | 1/08/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 166 | JERSON | TOLOZA | ARIAS | 1005565598 | M | 20/03/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 167 | ANA | TOLOZA | PABON | 1102774661 | F | 6/02/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 168 | ELIAN | TOLOZA | BLANCO | 1005565691 | M | 26/06/1999 | NO APLICA | MOHAN |
| 169 | LUZ | CANCINO | VARGAS | 28334537 | F | 5/09/1966 | NO APLICA | MOHAN |
| 170 | LUZ | MARQUEZ | CACINO | 1005565570 | F | 18/04/2002 | NO APLICA | MOHAN |
| 171 | YEIMY | MARQUEZ | CACINO | 1098629319 | F | 27/01/2005 | NO APLICA | MOHAN |
| 172 | ERLIN | MARQUEZ | CACINO | 94072023140 | M | 20/07/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 173 | HERMES | MARQUEZ | ESTEBAN | 91462358 | M | 31/08/1967 | NO APLICA | MOHAN |
| 174 | SEBASTIAN | MARQUEZ | BLANCO | 1095315439 | M | 19/07/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 175 | MAGDA | MARQUEZ | CACINO | 1005321209 | F | 6/10/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 176 | HERNANDO | MARQUEZ | CANCINO | 1098673312 | M | 24/05/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 177 | YEVEY | MARQUEZ | CANCINO | 1102774573 | F | 3/10/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 178 | MARILU | BLANCO | SUAREZ | 1098286617 | F | 24/01/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 179 | JEFFERSON | MARQUEZ | CANCINO | 1005565446 | M | 16/04/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 180 | YERLY | VEGA | LEAL | 1005565434 | F | 11/06/1998 | NO APLICA | MOHAN |
| 181 | MADEO | VEGA | LEAL | 1102774701 | M | 16/08/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 182 | RUTH | LEAL | GOMEZ | 28443883 | F | 1/01/1960 | NO APLICA | MOHAN |
| 183 | LISSETH | SIERRA | LEAL | 1005541195 | F | 8/07/2002 | NO APLICA | MOHAN |
| 184 | DAVID | VEGA | BAEZ | 13815237 | M | 10/07/1943 | NO APLICA | MOHAN |
| 185 | OCLIDES | CARRILLO | HERNANDEZ | 91470129 | M | 31/10/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 186 | WILMER | CARRILLO | HERNANDEZ | 92040178726 | M | 1/04/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 187 | VIDAL | ARIAS | ORTEGA | 5774215 | M | 7/09/1971 | NO APLICA | MOHAN |
| 188 | ROSA | ARIAS | GONZALEZ | 1102774363 | F | 11/01/2008 | NO APLICA | MOHAN |
| 189 | VIDAL | ARIAS | GONZALEZ | 1005565535 | M | 22/09/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 190 | ANDRES | ARIAS | GONZALEZ | 1102774567 | M | 18/11/2010 | NO APLICA | MOHAN |
| 191 | FABIO | ARIAS | GONZALEZ | 1102774068 | M | 27/08/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 192 | JUAN | ARIAS | GONZALEZ | 1102774184 | M | 26/03/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 193 | BLACINA | ARIAS | GONZALEZ | 1005565413 | F | 28/11/1998 | NO APLICA | MOHAN |
| 194 | NILSON | GUTIERREZ | VILLAMIZAR | 91464568 | M | 9/11/1972 | NO APLICA | MOHAN |
| 195 | DUBAN | VERGEL | GUTIERREZ | 1097119602 | M | 25/03/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 196 | ROSA | BLANCO | BLANCO | 63489090 | F | 12/01/1974 | NO APLICA | MOHAN |
| 197 | OSCAR | BLANCO | BLANCO | 1005565630 | M | 14/06/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 198 | YULY | GUTIERREZ | BLANCO | 1102774086 | F | 16/11/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 199 | URIEL | GUTIERREZ | BLANCO | 1098763414 | M | 12/06/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 200 | NILSON | PABON | SOCHA | 1102774390 | M | 2/08/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 201 | ADRIANA | AREVALO | BARCO | 98060657939 | F | 6/06/1998 | NO APLICA | MOHAN |
| 202 | JOSE | AREVALO | RINCON | 3102757 | M | 27/12/1964 | NO APLICA | MOHAN |
| 203 | RILLESVI | CARRILLO | GUTIERREZ | 1098656098 | F | 9/01/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 204 | NANCY | GUTIERREZ | VILLAMIZAR | 28336271 | F | 23/03/1968 | NO APLICA | MOHAN |
| 205 | SMERLHY | ARIAS | ARIAS | 1102774787 | M | 16/05/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 206 | BALBINO | ARIAS | GUERRERO | 1102774585 | M | 16/11/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 207 | ELEDYS | ARIAS | HERNANDEZ | 1005565469 | F | 25/05/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 208 | LUCIA | VILLAMIZAR | DE GUTIERREZ | 37790817 | F | 7/03/1942 | NO APLICA | MOHAN |
| 209 | YORGUIN | LEAL | GOMEZ | 1005565435 | M | 21/07/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 210 | ANA | SOCHA | MARQUEZ | 1102774732 | F | 25/10/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 211 | YORGUIN | LEAL | SOCHA | 1157963327 | M | 28/12/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 212 | ANGEL | LEAL | SOCHA | 1102774612 | M | 22/04/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 213 | MATILDE | ARENIZ | HERNANDEZ | 21011969 | F | 11/01/1969 | NO APLICA | MOHAN |
| 214 | RENE | VILLAMIZAR | VEGA | 91289327 | M | 13/08/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 215 | LUIS | ARENIZ | VILLAMIZAR | 1102774486 | M | 13/05/1991 | NO APLICA | MOHAN |
| 216 | ESMERALDA | VILLAMIZAR | ARENIZ | 1098731499 | F | 30/07/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 217 | MARIBEL | HERNANDEZ | VILLAMIZAR | 1102774393 | F | 29/01/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 218 | SHIRLEY | VILLAMIZAR | ARENIZ | 99031317394 | F | 13/03/1999 | NO APLICA | MOHAN |
| 219 | ANA | OYOLA | | 27651278 | F | 2/03/1959 | NO APLICA | MOHAN |
| 220 | ANIBAL | TOLOZA | ARIAS | 5773939 | M | 4/02/1968 | NO APLICA | MOHAN |
| 221 | ALEJANDRA | SIERRA | BLANCO | 1102774934 | F | 17/07/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 222 | ALCIRA | BLANCO | LEON | 1102774928 | F | 13/06/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 223 | ERBUIN | SIERRA | DURAN | 1102774587 | M | 1/02/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 224 | LUIS | DIAZ | ARENIZ | 91536256 | M | 12/03/1983 | NO APLICA | MOHAN |
| 225 | ANDERSON | DIAZ | BLANCO | 1005565480 | M | 23/01/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 226 | NOEMI | BLANCO | PABON | 37667852 | F | 30/11/1979 | NO APLICA | MOHAN |
| 227 | ALFRES | DIAZ | BLANCO | 1102774329 | M | 14/08/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 228 | LUIS | DIAZ | BLANCO | 1102774418 | M | 25/12/2008 | NO APLICA | MOHAN |
| 229 | LUIS | DIAZ | JAIMES | 2195865 | M | 25/10/1933 | NO APLICA | MOHAN |
| 230 | WILMER | SIERRA | SOCHA | 5774303 | M | 11/07/1980 | NO APLICA | MOHAN |
| 231 | ALFREDO | VEGA | ESTEBAN | 13870048 | M | 25/03/1981 | NO APLICA | MOHAN |
| 232 | WILFRAN | VEGA | ESTEBAN | 1102774071 | M | 22/09/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 233 | WILKIN | VEGA | ESTEBAN | 98032266509 | M | 22/03/1998 | NO APLICA | MOHAN |
| 234 | CAMPO | VEGA | PABON | 2155766 | M | 29/07/1944 | NO APLICA | MOHAN |
| 235 | GRACIELA | ESTEBAN | VARGAS | 28443105 | F | 16/05/1951 | NO APLICA | MOHAN |
| 236 | ISRAEL | FUENTES | NIÑO | 1102774493 | M | 30/09/1991 | NO APLICA | MOHAN |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|-------------|---|------------|-----------|-------|
| 237 | APOLINAR | FUENTES | | 91258745 | M | 9/01/1968 | NO APLICA | MOHAN |
| 238 | OFELIA | NIÑO | ARENIS | 63311811 | F | 14/10/1959 | NO APLICA | MOHAN |
| 239 | CARLOS | BLANCO | BLANCO | 95020919265 | M | 9/02/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 240 | HECTOR | DIAZ | ARENIZ | 91461727 | M | 30/08/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 241 | NELSA | BLANCO | ARENIZ | 28450409 | F | 10/05/1940 | NO APLICA | MOHAN |
| 242 | JHON | DIAZ | PABON | 1102774032 | M | 2/04/2004 | NO APLICA | MOHAN |
| 243 | MARIA | DIAZ | PABON | 1098707879 | F | 12/07/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 244 | BIANIDES | MARTINEZ | SUAREZ | 1098758724 | F | 13/08/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 245 | YARY | MARTINEZ | SUAREZ | 1005565536 | F | 28/06/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 246 | ELIAS | MARTINEZ | BLANCO | 91462558 | M | 19/09/1969 | NO APLICA | MOHAN |
| 247 | MARIA | SUAREZ | CAMARON | 28334871 | F | 19/03/1967 | NO APLICA | MOHAN |
| 248 | SHAIRITH | MARTINEZ | SUAREZ | 1102774850 | F | 9/06/2014 | NO APLICA | MOHAN |
| 249 | ISNEYDER | DURAN | ARENIS | 1097104346 | M | 12/04/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 250 | CRUZ | DURAN | ARENIS | 1102774866 | F | 16/08/2014 | NO APLICA | MOHAN |
| 251 | ALFONSO | DURAN | SIERRA | 91253567 | M | 12/08/1967 | NO APLICA | MOHAN |
| 252 | ROVIN | DURAN | VARGAS | 91535409 | M | 30/05/1984 | NO APLICA | MOHAN |
| 253 | MARIA | SIERRA | DE DURAN | 28450253 | F | 12/07/1937 | NO APLICA | MOHAN |
| 254 | YEINER | DURAN | ARENIS | 1102774653 | M | 11/01/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 255 | MARCELIANO | DURAN | SIERRA | 5776897 | M | 6/04/1959 | NO APLICA | MOHAN |
| 256 | DIANA | ARENIS | DURAN | 1102774581 | F | 13/04/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 257 | GONZALO | BLANCO | | 5776573 | M | 25/11/1937 | NO APLICA | MOHAN |
| 258 | HECTOR | SIERRA | JAIMES | 5776853 | M | 12/01/1956 | NO APLICA | MOHAN |
| 259 | MABEL | SIERRA | DURAN | 1097099902 | F | 1/11/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 260 | ELSIDA | DURAN | SIERRA | 28443657 | F | 1/01/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 261 | JESUS | PORTILLA | GUARIN | NXL02500196 | M | 28/02/2002 | NO APLICA | MOHAN |
| 262 | NISME | BAEZ | VEGA | 63359992 | F | 27/02/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 263 | HORTENCIA | VEGA | DE BAEZ | 28450237 | M | 31/12/1936 | NO APLICA | MOHAN |
| 264 | JUVENAL | BAEZ | ORTEGA | 5776609 | M | 3/05/1928 | NO APLICA | MOHAN |
| 265 | ANIBAL | PABON | ARENIS | 91461958 | M | 9/10/1967 | NO APLICA | MOHAN |
| 266 | ROSALBINA | ARENIZ | ARENIZ | 63333334 | F | 15/07/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 267 | LEYDI | PABON | ARENIZ | 97102517850 | F | 25/10/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 268 | MARCELA | PABON | ARENIZ | 95100420938 | F | 4/10/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 269 | JOHAN | PABON | ARENIZ | 1095304076 | M | 15/09/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 270 | PEDRO | SIERRA | | 0 | M | 14/07/1945 | NO APLICA | MOHAN |
| 271 | LUIS | PABON | ARENIS | 1102774423 | M | 10/01/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 272 | DEISY | VEGA | ESTEBAN | 1102351073 | F | 4/11/1986 | NO APLICA | MOHAN |
| 273 | LAURA | PABON | VEGA | 1098077183 | F | 14/03/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 274 | FERMIN | GOMEZ | PABON | 1101206459 | M | 24/09/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 275 | JORGE | DIAZ | VEGA | 91508449 | M | 2/11/1981 | NO APLICA | MOHAN |
| 276 | CAROLINA | VARGAS | ISIDRO | 1102774251 | F | 20/01/1989 | NO APLICA | MOHAN |
| 277 | CARLOS | DIAZ | VARGAS | 1096072418 | M | 15/07/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 278 | PEDRO | SIERRA | BLANCO | 1102774602 | M | 29/06/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 279 | LEIDY | CASTRILLON | BLANCO | 96031109814 | F | 11/03/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 280 | DARWIN | SIERRA | CASTRILLON | 1102774687 | M | 4/07/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 281 | DILAN | DELGADO | ARENIZ | 1097124889 | M | 3/06/2014 | NO APLICA | MOHAN |
| 282 | MARIA | ARENIZ | NIÑO | 1102774278 | F | 16/05/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 283 | DIEGO | SIERRA | SUAREZ | 1142722583 | M | 8/11/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 284 | DARI | SIERRA | SUAREZ | 1098759613 | F | 28/08/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 285 | JENIERSON | SIERRA | SUAREZ | 1005565522 | M | 23/04/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 286 | ZARAI | SUAREZ | VEGA | 28335684 | F | 12/05/1969 | NO APLICA | MOHAN |
| 287 | OLIVO | SIERRA | PABON | 96185919 | M | 9/12/1967 | NO APLICA | MOHAN |
| 288 | EDELMIRO | HERNANDEZ | MEJIA | 13883098 | M | 29/01/1953 | NO APLICA | MOHAN |
| 289 | LUZ | PABON | CASTRILLON | 96012711570 | F | 27/01/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 290 | OCLIDES | PABON | PABON | 91290572 | M | 13/12/1971 | NO APLICA | MOHAN |
| 291 | ESAU | GUERRERO | GUERRERO | 13740778 | M | 17/07/1979 | NO APLICA | MOHAN |
| 292 | ANGIE | SANCHEZ | GUERRERO | 98020154012 | F | 1/02/1998 | NO APLICA | MOHAN |
| 293 | YOLANDA | GUERRERO | ISIDRO | 37713770 | F | 17/09/1978 | NO APLICA | MOHAN |
| 294 | JOSE | CASTILLO | HERNANDEZ | 13838942 | M | 5/05/1956 | NO APLICA | MOHAN |
| 295 | DIANA | CASTILLO | BAEZ | 1102774563 | F | 11/06/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 296 | OLINTO | CASTILLO | BAEZ | 1007785016 | M | 18/01/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 297 | CARMELITA | BAEZ | ROJAS | 28450389 | F | 27/08/1958 | NO APLICA | MOHAN |
| 298 | BRIANA | CASTILLO | BAEZ | 1102774889 | F | 7/01/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 299 | GABRIEL | RUEDA | RUEDA | 91042900 | M | 28/07/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 300 | ADRIANA | SUAREZ | SIERRA | 1102774674 | F | 29/03/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 301 | RICARDO | PABON | SOCHA | 1102774504 | M | 6/01/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 302 | SAVURY | PABON | SUAREZ | 1102774643 | F | 27/11/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 303 | JULIAN | HERNANDEZ | BLANCO | 1030180882 | M | 10/02/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 304 | NINI | BLANCO | PABON | 63547736 | F | 23/09/1983 | NO APLICA | MOHAN |
| 305 | JAVIER | HERNANDEZ | PABON | 13749683 | M | 18/08/1980 | NO APLICA | MOHAN |
| 306 | LUIS | PABON | MORENO | 2195872 | M | 16/01/1930 | NO APLICA | MOHAN |
| 307 | YANIRA | MORENO | GELVEZ | 1102774100 | F | 4/09/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 308 | ALEXANDER | GUERRERO | VILLAMIZAR | 5774327 | M | 18/09/1983 | NO APLICA | MOHAN |
| 309 | JHON | GUERRERO | MORENO | 1095810992 | M | 11/01/2010 | NO APLICA | MOHAN |
| 310 | YURI | GUERRERO | MORENO | 1102774176 | F | 13/01/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 311 | NORELY | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1005565427 | F | 7/06/1999 | NO APLICA | MOHAN |
| 312 | MAYRA | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1098644911 | F | 31/10/2005 | NO APLICA | MOHAN |
| 313 | BLADIMIR | GUERRERO | VILLAMIZAR | 94112525887 | M | 25/11/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 314 | LUDWING | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1095803922 | M | 8/02/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 315 | NUVIA | VILLAMIZAR | TARAZONA | 63306374 | F | 21/08/1963 | NO APLICA | MOHAN |
| 316 | ANTONIO | GUERRERO | HERNANDEZ | 2196435 | M | 20/07/1957 | NO APLICA | MOHAN |
| 317 | DANNA | ORTEGA | GUERRERO | 1102774752 | F | 21/02/2013 | NO APLICA | MOHAN |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------|
| 318 | DINA | GUERRERO | DIAZ | 1102774593 | F | 17/12/1992 | NO APLICA | MOHAN |
| 319 | YEISON | DIAZ | COLLANTES | 95052818886 | M | 18/05/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 320 | JESUS | VARGAS | ROJAS | 2195606 | M | 25/05/1945 | NO APLICA | MOHAN |
| 321 | CRISPULO | VARGAS | ESTEBAN | 1102774048 | M | 1/06/1969 | NO APLICA | MOHAN |
| 322 | EDILBERTO | VARGAS | ESTEBAN | 1102774047 | M | 31/10/1983 | NO APLICA | MOHAN |
| 323 | NELLY | ESTEBAN | CASTRILLON | 28443561 | F | 18/08/1953 | NO APLICA | MOHAN |
| 324 | CRISTIAN | VARGAS | ESTEBAN | 1102774046 | M | 14/03/1977 | NO APLICA | MOHAN |
| 325 | GERMAN | ESTEVAN | HERNANDEZ | 1005565731 | M | 3/12/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 326 | YURLEY | ESTEBAN | HERNANDEZ | 1102774109 | F | 23/02/2005 | NO APLICA | MOHAN |
| 327 | AQUILINO | ESTEVAN | VARGAS | 13562578 | M | 10/02/1973 | NO APLICA | MOHAN |
| 328 | MEUDY | ESTEVAN | HERNANDEZ | 1005565685 | F | 26/02/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 329 | ISVELIA | HERNANDEZ | ACEROS | 28338192 | F | 29/11/1975 | NO APLICA | MOHAN |
| 330 | FREDY | RODRIGUEZ | MORENO | 1097850105 | M | 16/07/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 331 | LEYDI | ESTEVAN | HERNANDEZ | 1005565513 | F | 14/04/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 332 | RICARDO | ESTEVAN | HERNANDEZ | 1193127917 | M | 21/09/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 333 | KAROL | SOCHA | VILLAMIZAR | 1102774343 | F | 4/11/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 334 | YENNI | VILLAMIZAR | LIZCANO | 1005565518 | F | 1/03/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 335 | HUGO | SOCHA | DURAN | 5774154 | M | 15/12/1976 | NO APLICA | MOHAN |
| 336 | AYDE | VILLAMIZAR | LIZCANO | 27651821 | F | 23/06/1978 | NO APLICA | MOHAN |
| 337 | ESEQUIEL | SOCHA | ORTEGA | 25069977 | M | 1/02/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 338 | KAREN | ORTIZ | SOCHA | 1095314154 | F | 28/04/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 339 | ELICEO | SOCHA | BAEZ | 5727350 | M | 14/06/1964 | NO APLICA | MOHAN |
| 340 | MARIA | ORTEGA | ORTEGA | 37876961 | F | 20/03/1964 | NO APLICA | MOHAN |
| 341 | LUZ | SOCHA | ORTEGA | 29948607 | F | 15/06/1999 | NO APLICA | MOHAN |
| 342 | DEVANIRA | SOCHA | ORTEGA | 1097850308 | F | 2/03/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 343 | ELISEO | SOCHA | ORTEGA | 29948606 | M | 25/09/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 344 | JUSTO | SOCHA | ORTEGA | 30749810 | M | 20/04/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 345 | IRENE | SOCHA | ORTEGA | 94101822375 | F | 18/10/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 346 | JEISSON | VILLAMIZAR | LIZCANO | 96082622788 | M | 26/08/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 347 | ANALEXIS | VILLAMIZAR | LIZCANO | 1102774333 | M | 22/10/1989 | NO APLICA | MOHAN |
| 348 | LUIS | VILLAMIZAR | TARAZONA | 2195639 | M | 28/07/1951 | NO APLICA | MOHAN |
| 349 | MIRIAN | LIZCANO | GONZALEZ | 28448574 | F | 26/02/1953 | NO APLICA | MOHAN |
| 350 | DEINY | MARQUEZ | BAUTISTA | 1102774712 | M | 25/07/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 351 | EUDES | MARQUEZ | BAUTISTA | 1102774931 | M | 12/07/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 352 | EUDES | MARQUEZ | CHAVEZ | 1102774166 | M | 21/10/1987 | NO APLICA | MOHAN |
| 353 | ERCILIA | BAUTISTA | GUERRERO | 1005083349 | F | 11/07/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 354 | YULIETH | MARQUEZ | BAUTISTA | 1102774405 | F | 11/09/2008 | NO APLICA | MOHAN |
| 355 | YORMAN | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1005565553 | M | 30/10/2001 | NO APLICA | MOHAN |
| 356 | JHOAN | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1097789332 | M | 5/10/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 357 | OMAR | GUERRERO | VILLAMIZAR | 5774107 | M | 20/05/1975 | NO APLICA | MOHAN |
| 358 | ANNY | VILLAMIZAR | LIZCANO | 28443831 | F | 5/05/1980 | NO APLICA | MOHAN |
| 359 | JONATHAN | GUERRERO | VILLAMIZAR | 95110515007 | M | 5/11/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 360 | EXPEDITO | GUERRERO | GUERRERO | 88170874 | M | 1/04/1971 | NO APLICA | MOHAN |
| 361 | YOLANDA | VILLAMIZAR | GUERRERO | 37711443 | F | 10/03/1977 | NO APLICA | MOHAN |
| 362 | MARIA | CABALLERO | DE LIZCANO | 27652139 | F | 13/09/1937 | NO APLICA | MOHAN |
| 363 | EDWIN | VILLAMIZAR | RAMIREZ | 5774146 | M | 1/07/1976 | NO APLICA | MOHAN |
| 364 | NEYLA | VILLAMIZAR | GUERRERO | 1005565428 | F | 16/03/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 365 | YOLEIDER | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1005210096 | M | 24/04/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 366 | YOREINY | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1102774177 | F | 10/02/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 367 | NEIDER | GUERRERO | VILLAMIZAR | 99040410488 | M | 4/04/1999 | NO APLICA | MOHAN |
| 368 | NARLY | VILLAMIZAR | GUERRERO | 28443896 | F | 18/03/1984 | NO APLICA | MOHAN |
| 369 | YORLEBINSON | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1096702687 | M | 23/09/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 370 | YERNEY | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1096701719 | M | 6/07/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 371 | JOVENO | GUERRERO | GUERRERO | 13563801 | M | 29/10/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 372 | MARCO | GELVEZ | BAUTISTA | 1935030 | M | 9/03/1945 | NO APLICA | MOHAN |
| 373 | ELISA | BAUTISTA | LIZARAZO | 28448571 | F | 9/02/1957 | NO APLICA | MOHAN |
| 374 | NELSY | VILLAMIZAR | RAMIREZ | 63507253 | F | 1/05/1974 | NO APLICA | MOHAN |
| 375 | YESSIKA | GUERRERO | VILLAMIZAR | 0 | F | 19/04/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 376 | LAURA | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1005565638 | F | 24/06/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 377 | LUIS | GUERRERO | GELVEZ | 5774056 | M | 28/08/1973 | NO APLICA | MOHAN |
| 378 | LEYDI | GUERRERO | VILLAMIZAR | 91052811916 | F | 28/05/1991 | NO APLICA | MOHAN |
| 379 | BIEN | CELIS | ESTEBAN | 5774103 | M | 21/05/1958 | NO APLICA | MOHAN |
| 380 | RODOLFO | VILLAMIZAR | ZAFRA | 5421062 | M | 16/01/1945 | NO APLICA | MOHAN |
| 381 | LISENID | GUERRERO | PARADA | 1005565479 | F | 20/08/2000 | NO APLICA | MOHAN |
| 382 | NERMELIDE | GUERRERO | PARADA | 1102774136 | F | 2/08/2005 | NO APLICA | MOHAN |
| 383 | RAMIRO | GUERRERO | GUERRERO | 2196437 | M | 4/03/1963 | NO APLICA | MOHAN |
| 384 | DEIMER | GUERRERO | PARADA | 1102774825 | M | 2/05/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 385 | DULIAN | GUERRERO | PARADA | 1102774915 | M | 20/03/1997 | NO APLICA | MOHAN |
| 386 | ENERMILDE | PARADA | BAUTISTA | 27650891 | F | 5/12/1966 | NO APLICA | MOHAN |
| 387 | LUZ | VILLAMIZAR | LIZCANO | 63515835 | F | 16/11/1976 | NO APLICA | MOHAN |
| 388 | ARNULFO | GUERRERO | PABON | 5774299 | M | 1/12/1981 | NO APLICA | MOHAN |
| 389 | JUAN | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1098071869 | M | 30/03/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 390 | EDIER | GUERRERO | VILLAMIZAR | 1098075887 | M | 21/07/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 391 | DIANA | BAEZ | CARRILLO | 1005565631 | F | 17/12/1991 | NO APLICA | MOHAN |
| 392 | DINAEL | ESTEBAN | VARGAS | 1098706147 | M | 21/12/1990 | NO APLICA | MOHAN |
| 393 | MARIANA | ESTEBAN | BAEZ | 1102774552 | F | 18/09/2010 | NO APLICA | MOHAN |
| 394 | KELY | ESTEBAN | BAEZ | 1102774758 | F | 1/03/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 395 | ELBA | VILLAMIZAR | TARAZONA | 63475286 | F | 22/03/1970 | NO APLICA | MOHAN |
| 396 | MIGUEL | GUERRERO | ORTEGA | 2196438 | M | 18/10/1962 | NO APLICA | MOHAN |
| 397 | LUIS | GUERRERO | HERNANDEZ | 2196426 | M | 13/10/1952 | NO APLICA | MOHAN |
| 398 | CARLINA | VILLAMIZAR | DE GUERRERO | 28448568 | F | 22/07/1957 | NO APLICA | MOHAN |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-----------------|-------------|---|------------|-----------|-------|
| 399 | JENIP | VEGA | CARRILLO | 1102774582 | F | 15/09/1993 | NO APLICA | MOHAN |
| 400 | RAUL | VEGA | BLANCO | 17529120 | M | 23/02/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 401 | ANA | CARRILLO | HERNANDEZ | 28334859 | F | 19/08/1963 | NO APLICA | MOHAN |
| 402 | LIVANIEL | VEGA | CARRILLO | 1102774328 | M | 26/06/1989 | NO APLICA | MOHAN |
| 403 | OMAR | VEGA | CARRILLO | 1100889743 | M | 25/09/1986 | NO APLICA | MOHAN |
| 404 | MARIA | SIERRA | SOCHA | 28443779 | F | 22/08/1978 | NO APLICA | MOHAN |
| 405 | FERMIN | SIERRA | NIÑO | 5776824 | M | 11/10/1947 | NO APLICA | MOHAN |
| 406 | MARIA | SOCHA | BAEZ | 28450383 | F | 29/07/1955 | NO APLICA | MOHAN |
| 407 | AMADO | ISIDRO | HERNANDEZ | 91205580 | M | 29/11/1956 | NO APLICA | MOHAN |
| 408 | ANA | SUAREZ | ORTEGA | 37831352 | F | 9/01/1957 | NO APLICA | MOHAN |
| 409 | EDUAR | BLANCO | HERNANDEZ | 5774250 | M | 22/11/1979 | NO APLICA | MOHAN |
| 410 | ESTHER | HERNANDEZ | HERNANDEZ | 63493783 | M | 22/02/1974 | NO APLICA | MOHAN |
| 411 | SANTIAGO | ARENIZ | HERNANDEZ | 1098735059 | M | 26/02/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 412 | JESSICA | JAIMES | HERNANDEZ | 1098754224 | F | 11/02/1994 | NO APLICA | MOHAN |
| 413 | DEICY | ARENIZ | HERNANDEZ | 1005565658 | F | 18/10/1998 | NO APLICA | MOHAN |
| 414 | MIGUEL | VILLAMIZAR | VEGA | 13716073 | M | 10/10/1977 | NO APLICA | MOHAN |
| 415 | ANGEL | VILLAMIZAR | SIERRA | 1102774782 | M | 20/06/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 416 | EDDY | SIERRA | SOCHA | 1102774049 | F | 15/05/1986 | NO APLICA | MOHAN |
| 417 | FIDEL | DELGADO | PABON | 5774313 | M | 2/11/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 418 | DANIEL | DELGADO | CASTRILLON | 1030193093 | M | 10/07/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 419 | ISOLINA | CASTRILLON | BLANCO | 1098708867 | F | 19/05/1991 | NO APLICA | MOHAN |
| 420 | VALENTINA | DELGADO | CASTRILLON | 1030193094 | F | 10/07/2013 | NO APLICA | MOHAN |
| 421 | TATIANA | TORRES | DELGADO | 1097096924 | F | 20/09/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 422 | ESPERANZA | DELGADO | PABON | 1102774092 | F | 18/12/1986 | NO APLICA | MOHAN |
| 423 | CRISTINA | TORRES | DELGADO | 1098708339 | F | 23/07/2009 | NO APLICA | MOHAN |
| 424 | NATALIA | SIERRA | DELGADO | 1102774577 | F | 15/05/2003 | NO APLICA | MOHAN |
| 425 | EVELIO | PORTILLA | SEPULVEDA | 5776732 | M | 18/09/1936 | NO APLICA | MOHAN |
| 426 | MARIANA | BAEZ | PABON | 1119183974 | F | 20/06/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 427 | JOAN | BAEZ | PABON | 1119181949 | M | 29/08/2006 | NO APLICA | MOHAN |
| 428 | MARIA | PABON | PABON | 1119181948 | F | 12/12/1987 | NO APLICA | MOHAN |
| 429 | ABELARDO | BAEZ | SEPULVEDA | 91184600 | M | 14/05/1979 | NO APLICA | MOHAN |
| 430 | BELKIS | HERNANDEZ | PABON | 37844613 | F | 16/11/1979 | NO APLICA | MOHAN |
| 431 | ENITH | BLANCO | HERNANDEZ | 1096541395 | F | 7/06/2011 | NO APLICA | MOHAN |
| 432 | WUILZON | BLANCO | PABON | 91541749 | M | 29/05/1985 | NO APLICA | MOHAN |
| 433 | RUBI | BAEZ | CARRILLO | 37556282 | F | 3/01/1976 | NO APLICA | MOHAN |
| 434 | YEFFERSON | CASTILLO | BAEZ | 1005333377 | M | 29/09/1996 | NO APLICA | MOHAN |
| 435 | YERITZA | BLANCO | BAEZ | 1098013075 | F | 3/08/2007 | NO APLICA | MOHAN |
| 436 | WILLIAN | BLANCO | | 91184139 | M | 31/01/1982 | NO APLICA | MOHAN |
| 437 | MARIA | CARRILLO | DE BAEZ | 28450111 | F | 29/04/1934 | NO APLICA | MOHAN |
| 438 | MATIAS | CERRO | BAEZ | 1096227896 | M | 19/05/2012 | NO APLICA | MOHAN |
| 439 | RUBIELA | BAEZ | SEPULVEDA | 1102774180 | F | 4/02/1988 | NO APLICA | MOHAN |
| 440 | ALLISON | CERRO | BAEZ | 1102774377 | F | 27/05/2008 | NO APLICA | MOHAN |
| 441 | EGNA | LOPEZ | MENDOZA | 63319844 | F | 21/10/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 442 | GUILLERMINA | MENDOZA | VIUDA DE SUAREZ | 27941776 | F | 21/02/1941 | NO APLICA | MOHAN |
| 443 | DANIEL | HERNANDEZ | | 1092174529 | M | 20/01/1976 | NO APLICA | MOHAN |
| 444 | LUIS | GRAJALEZ | JIMENEZ | 10754016 | M | 4/08/1977 | NO APLICA | MOHAN |
| 445 | JUAN | GRAJALES | VEGA | 1131124614 | M | 12/10/2015 | NO APLICA | MOHAN |
| 446 | MASLY | VEGA | BLANCO | 1102774105 | F | 18/01/1987 | NO APLICA | MOHAN |
| 447 | HERMELINDA | TARAZONA | DE VILLAMIZAR | 27648071 | F | 31/12/1929 | NO APLICA | MOHAN |
| 448 | MARTHA | MARQUEZ | CHAVEZ | 94032920211 | F | 29/03/1995 | NO APLICA | MOHAN |
| 449 | REINALDO | MARQUEZ | ESTEBAN | 5773884 | M | 21/11/1965 | NO APLICA | MOHAN |
| 450 | ROSMIRA | CHAVEZ | ACEROS | 28443562 | F | 9/11/1968 | NO APLICA | MOHAN |



**MUNICIPIO
SURATA**

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE

OBJETO:

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL
MUNICIPIO DE
SURATA-SANTANDER

ELABORADO POR:


ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL

CONTENIDO:

ILUMINACIÓN
PLANTA GENERAL

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

| | |
|-----------|-----------------|
| Escala: | - |
| PLANO No. | 02 DE 07 |

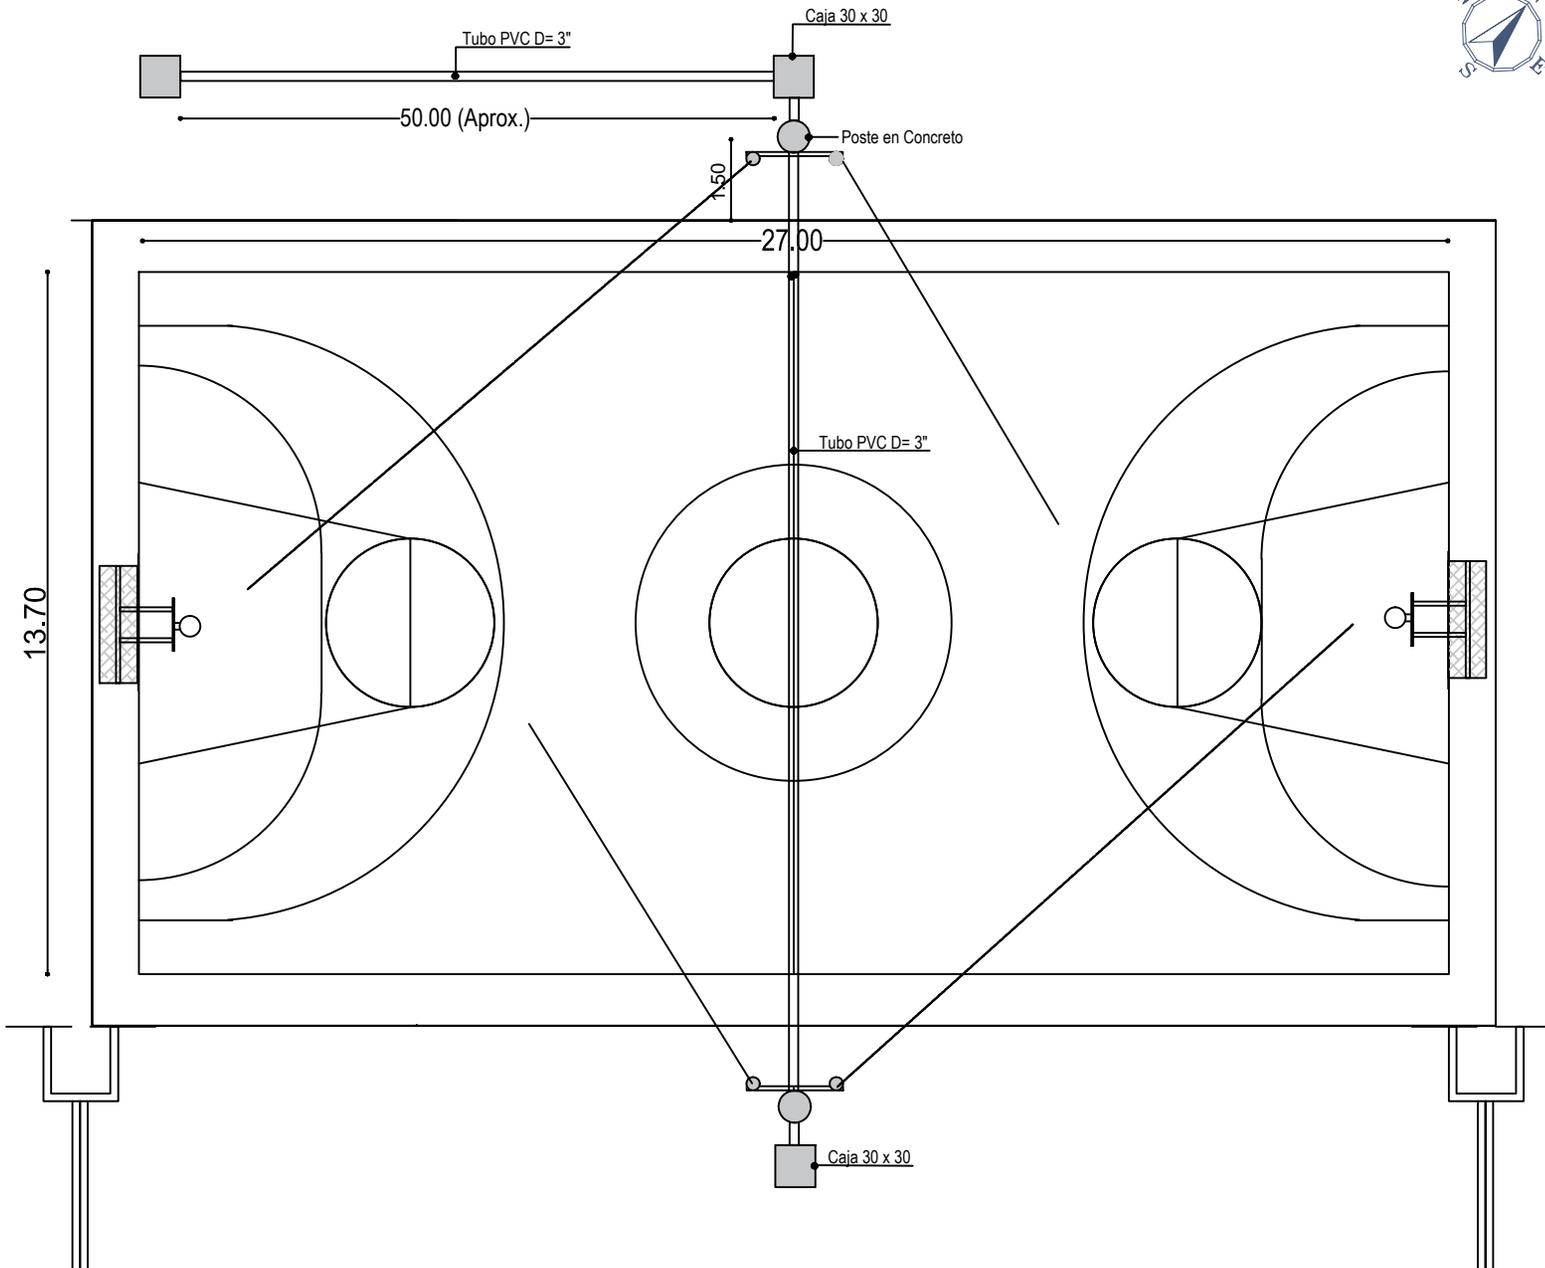



**MUNICIPIO
SURATA**

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE

OBJETO:

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL
MUNICIPIO DE
SURATA-SANTANDER

ELABORADO POR:

ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL


CONTENIDO:









ILUMINACIÓN
PLANTA GENERAL

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

Escala: -

PLANO No. **03 DE 07**

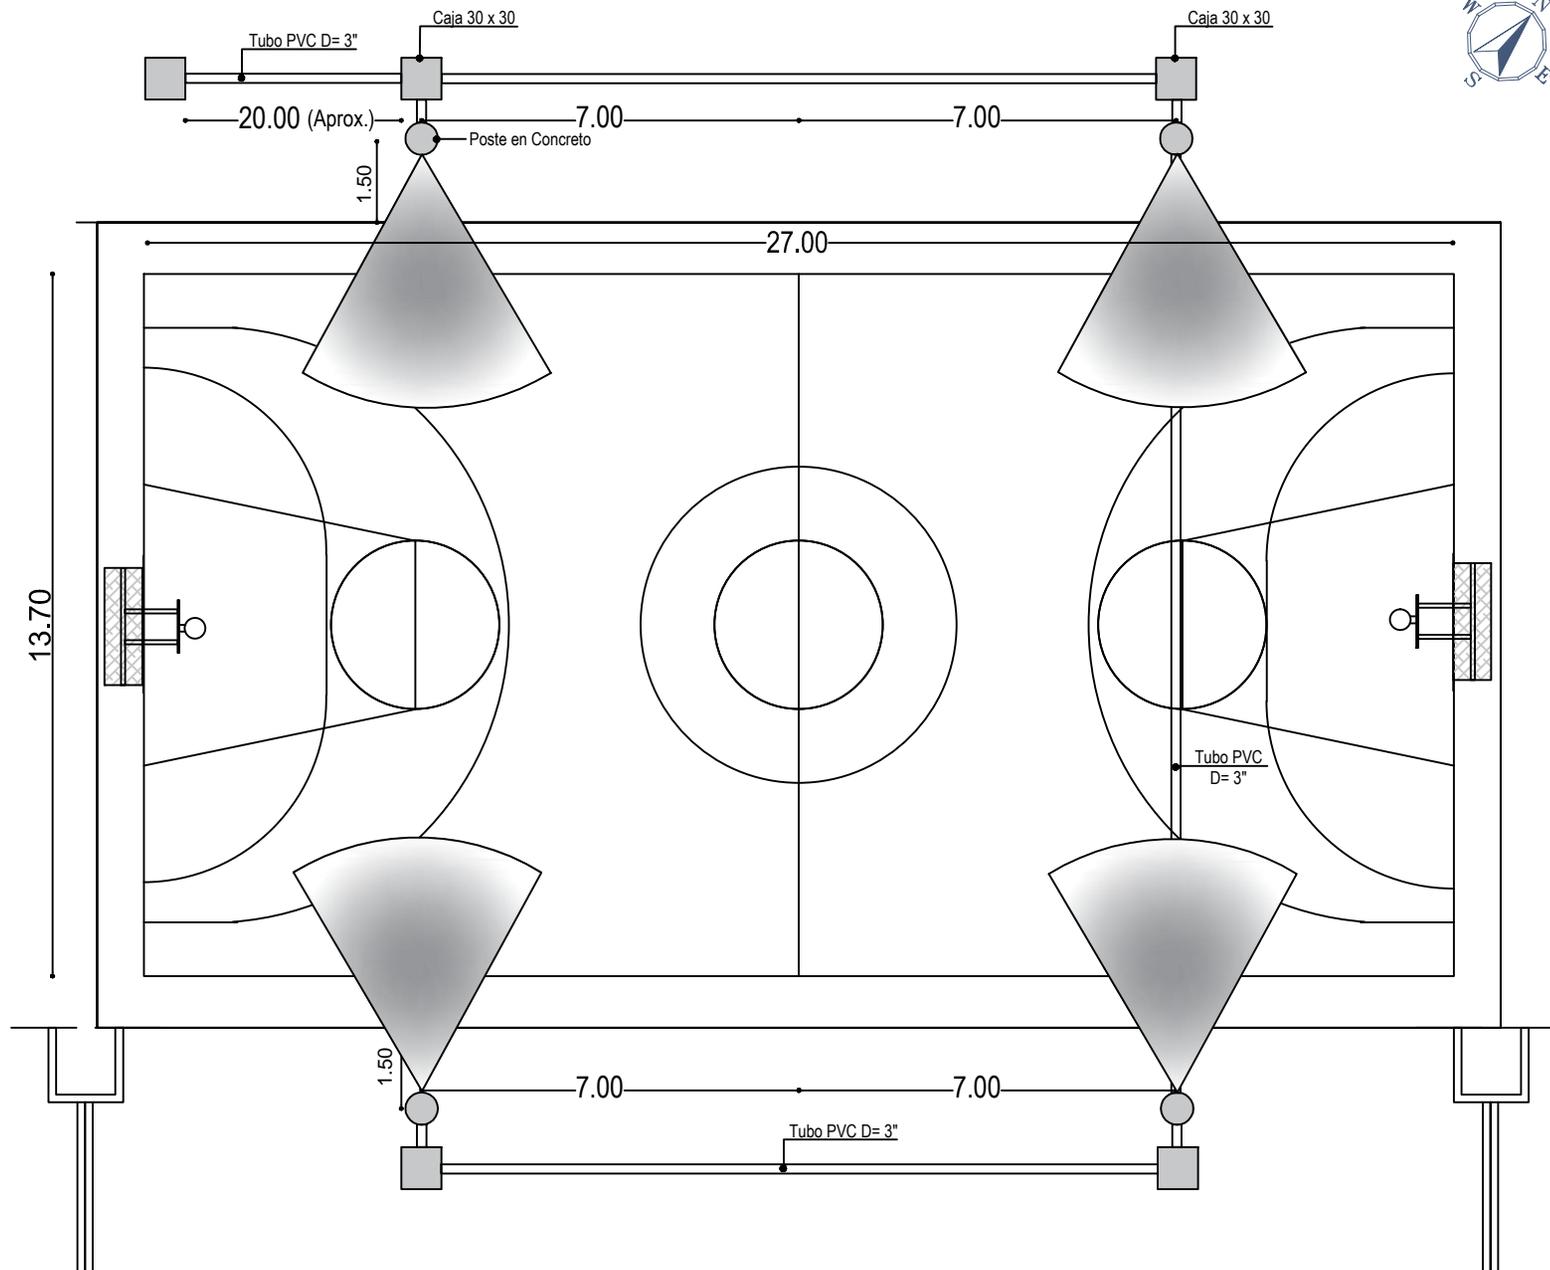

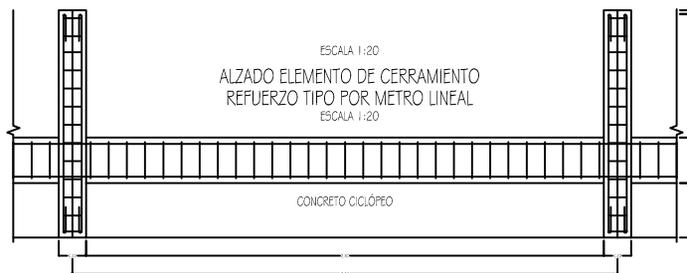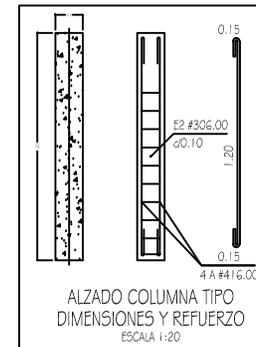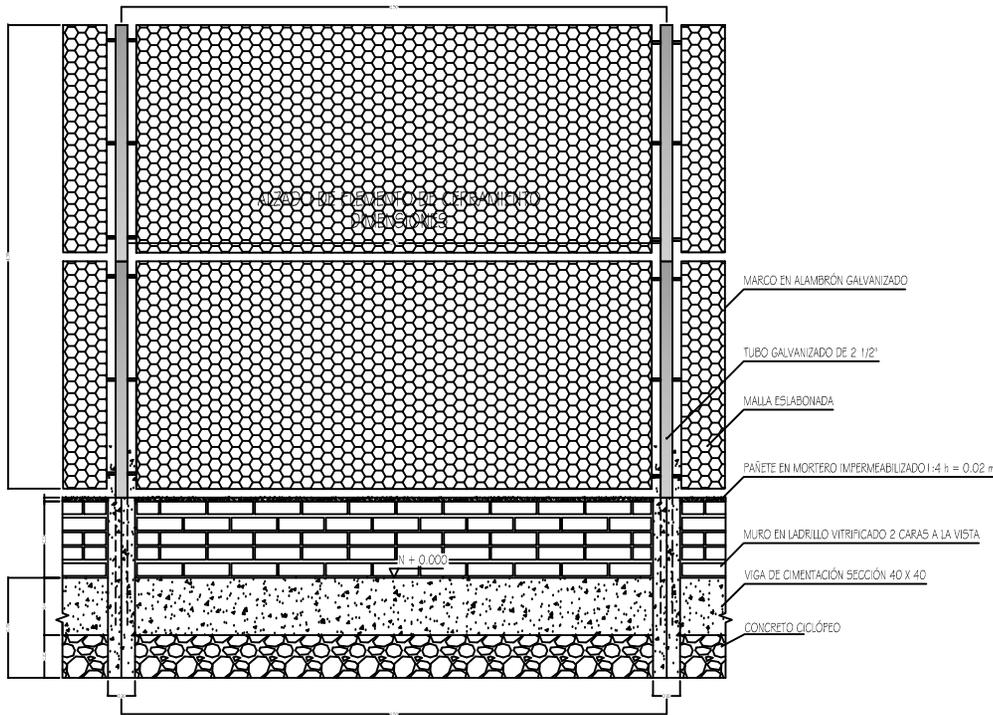

MUNICIPIO SURATA

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE

OBJETO:

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL MUNICIPIO DE SURATA-SANTANDER

ELABORADO POR:

ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL




CONTENIDO:

PLANTA GENERAL
DETALLES ESTRUCTURAL
CERRAMIENTO

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

Escala: -

PLANO No. **04 DE 07**

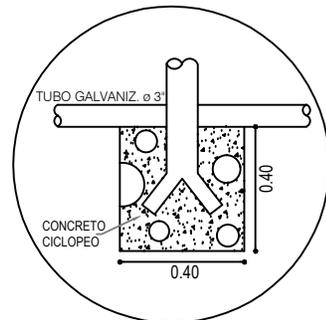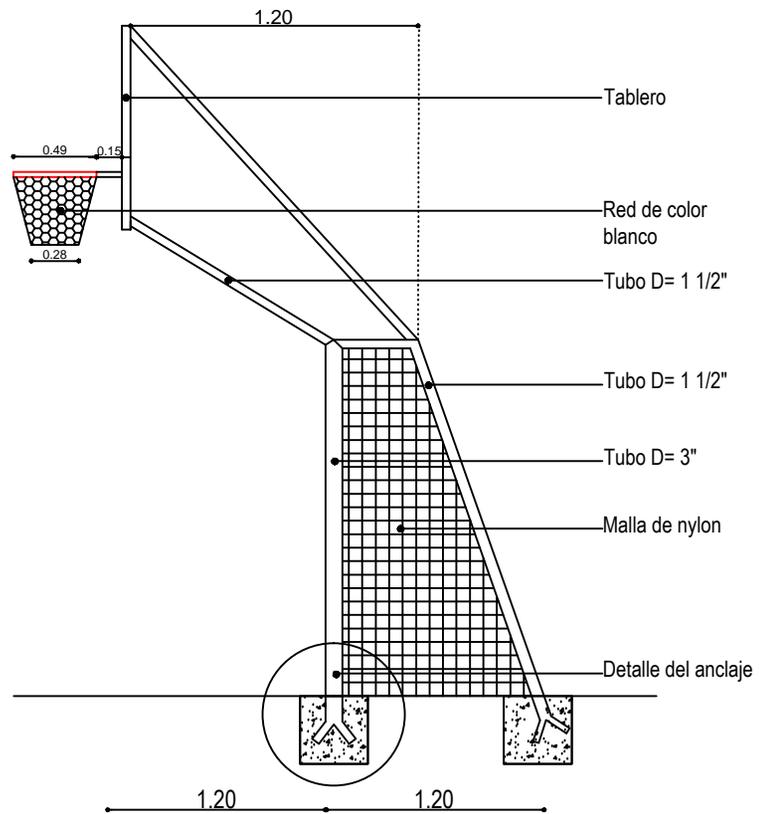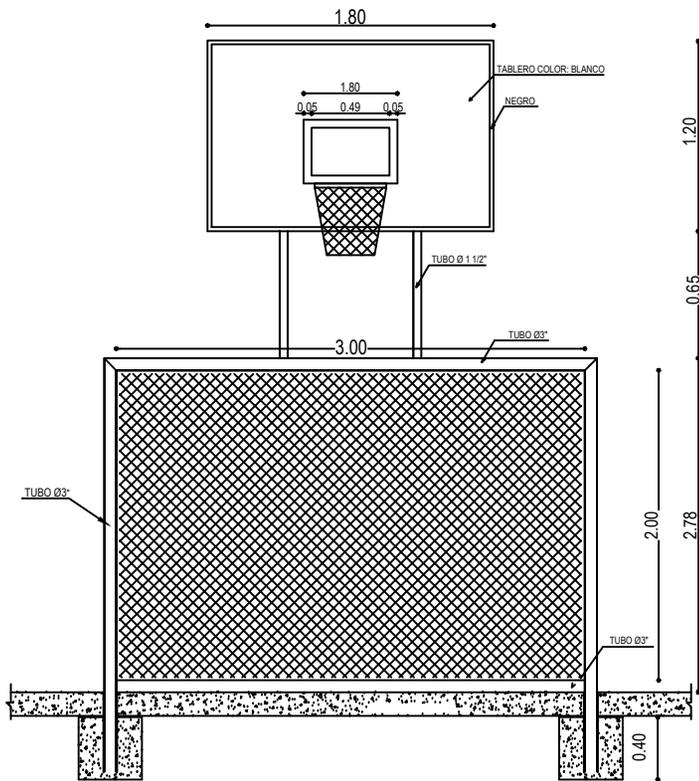

DETALLE DEL ANCLAJE

**MUNICIPIO
SURATA**

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE

OBJETO:

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL
MUNICIPIO DE
SURATA-SANTANDER

ELABORADO POR:

ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL
LOCALIZACIÓN
DEMARCACIÓN



INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

Escala:

-

PLANO No.

05 DE 07

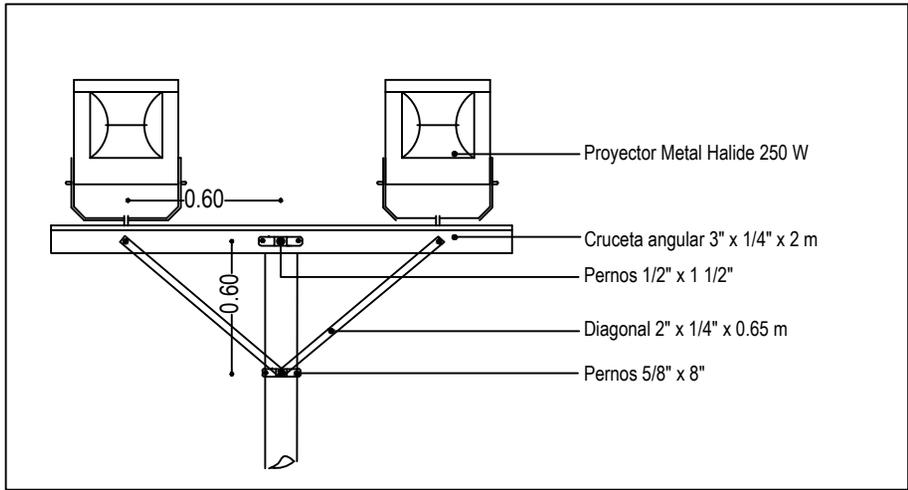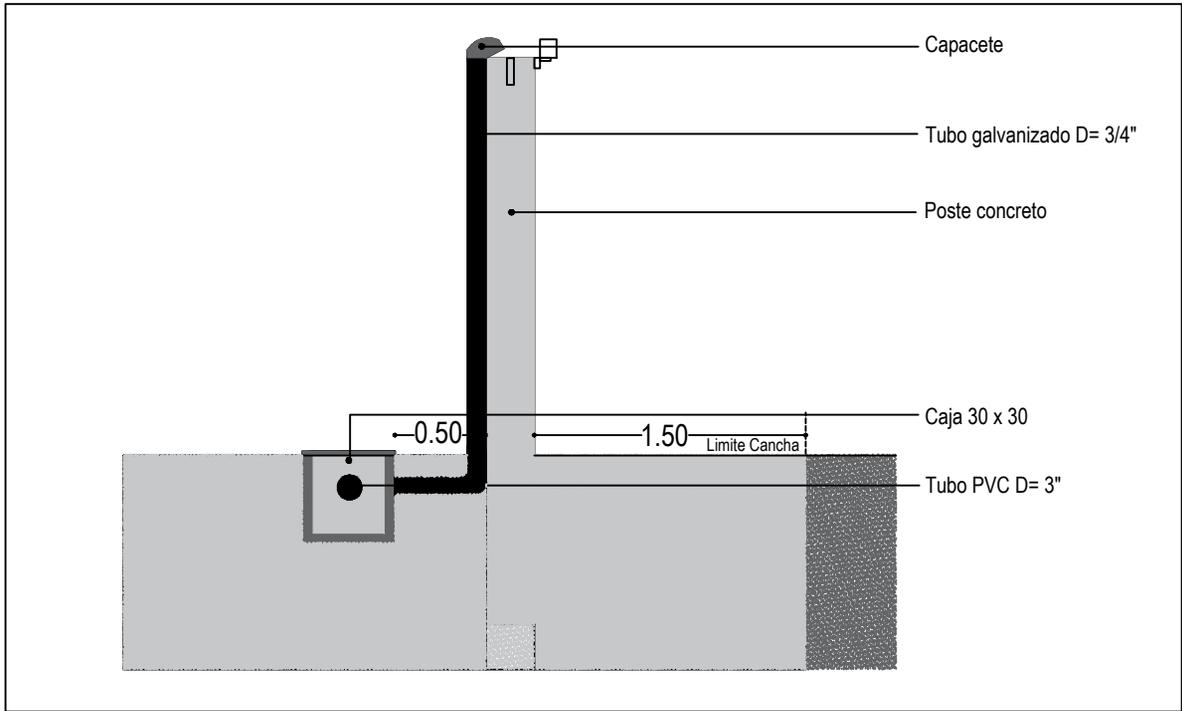

**MUNICIPIO
SURATA**

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE

OBJETO:

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL
MUNICIPIO DE
SURATA-SANTANDER

ELABORADO POR:

ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL

CONTENIDO:

ILUMINACIÓN
DETALLES POSTE
DETALLE PROYECTORES

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

Escala:

-

PLANO No.

06 DE 07

**MUNICIPIO
SURATA**

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE

OBJETO:

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL
MUNICIPIO DE
SURATA-SANTANDER

ELABORADO POR:


ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL

CONTENIDO:


ILUMINACIÓN
DETALLE REFUERZO PLACA PISO
DETALLE CUNETETA
DETALLE CAJA DE INSPECCIÓN


INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

| | |
|-----------|-----------------|
| Escala: | - |
| PLANO No. | 07 DE 07 |

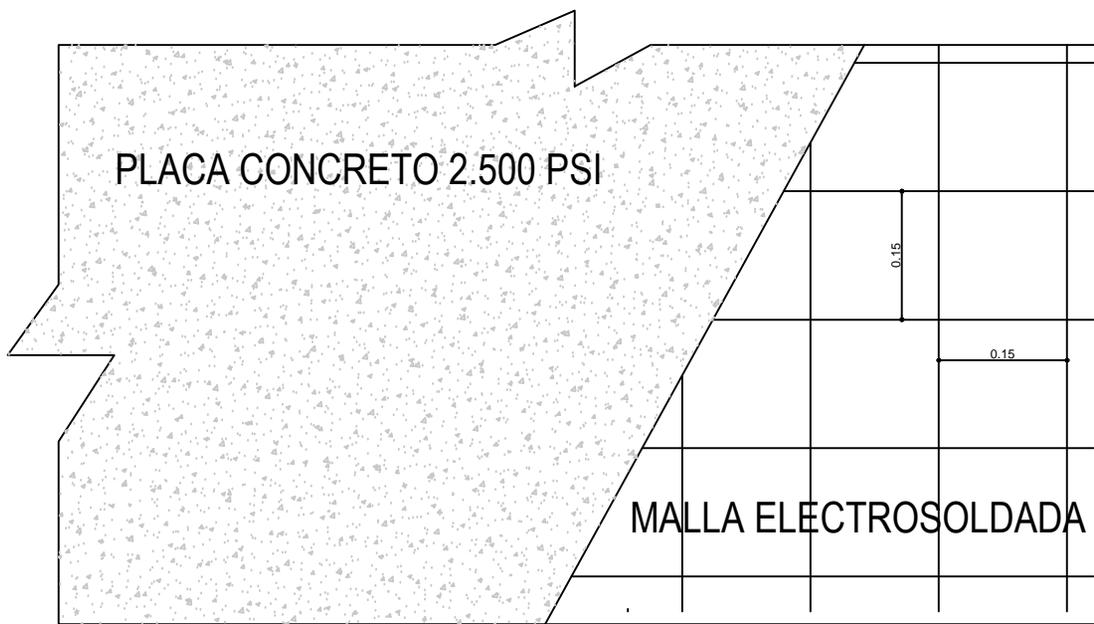

**SECCIÓN
TRANSVERSAL CUNETETA**

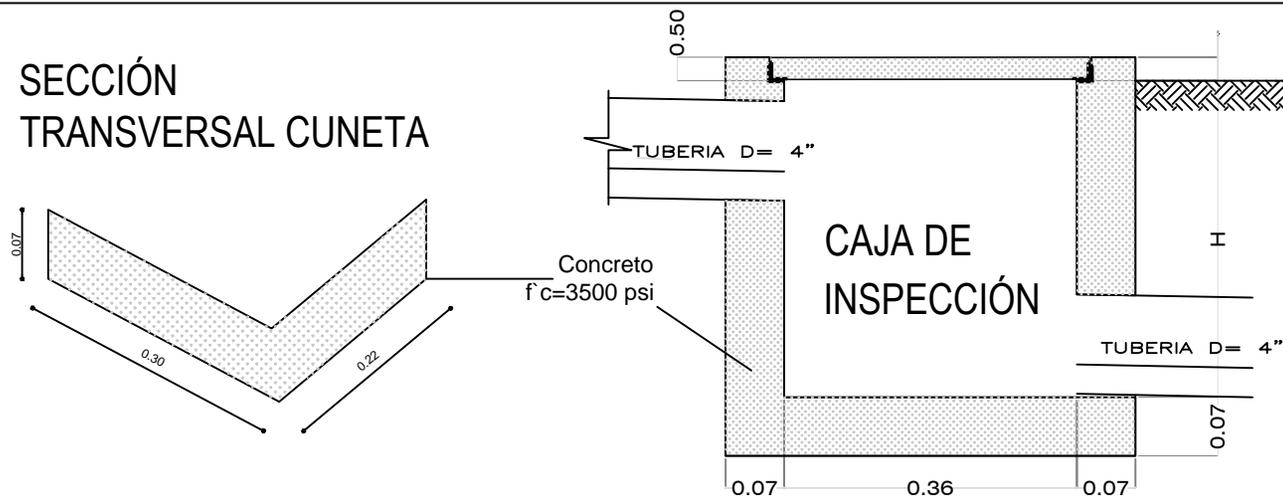

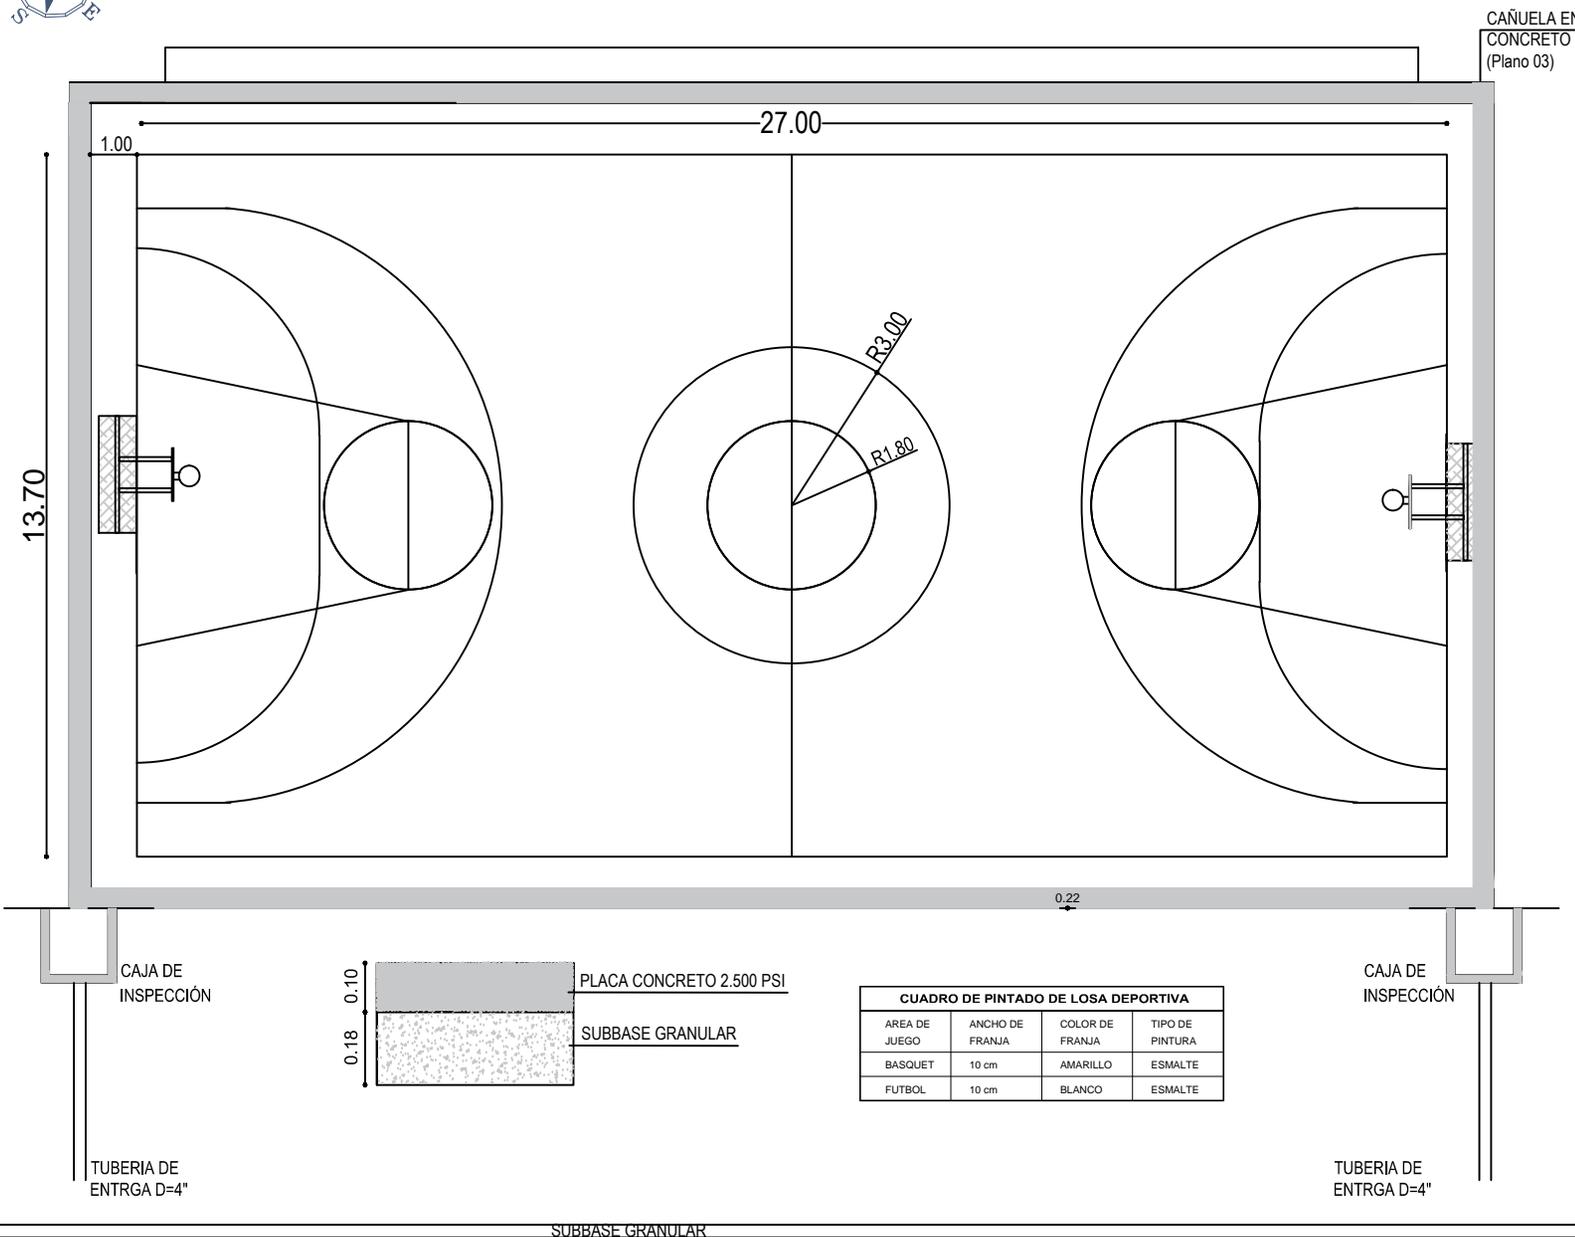

CAÑUELA EN
CONCRETO
(Plano 03)

**MUNICIPIO
SURATA**

IGNACIO DIAZ MEDINA
ALCALDE

ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETO:

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL
MUNICIPIO DE
SURATA-SANTANDER

ELABORADO POR:

ING DANIEL MORENO LÓPEZ
PLANEACIÓN MUNICIPAL

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL
LOCALIZACIÓN
DEMARCACIÓN

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

Escala: -

PLANO No. **01 DE 07**

| CUADRO DE PINTADO DE LOSA DEPORTIVA | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AREA DE JUEGO | ANCHO DE FRANJA | COLOR DE FRANJA | TIPO DE PINTURA |
| BASQUET | 10 cm | AMARILLO | ESMALTE |
| FUTBOL | 10 cm | BLANCO | ESMALTE |

SUBBASE GRANULAR



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DIRECCIÓN DE REPARACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN O DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA ISC A TRAVÉS DEL OPERADOR SPAE
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|---|
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER |
| TIPO DE INVERSIÓN: | Suministro de materiales de construcción para infraestructura social comunitaria |
| SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA | Comunidad campesina del corregimiento El Mohan |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL: | Alcaldía de Surata |
| DEPARTAMENTO: | Santander |
| MUNICIPIO: | Surata |
| VEREDA: | Crucecitas, Abejas, Pantanito y Cartagena |
| FECHA DE ENTREGA: | 5/08/2019 |
| FECHA DE REVISIÓN: | 8/08/2019 |
| REVISÓ: | Jairo Alonso Segura Pulido |
| ESTADO DEL PROYECTO: | En revisión |

El equipo técnico de la Subdirección de Reparación Colectiva a nivel nacional, procedió a realizar la revisión de la información predial, administrativa y técnica del proyecto entregado por el municipio a la dirección territorial de SANTANDER, del proyecto cuyo objeto es: "EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO EL MOHAN DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER".

| CONDICIONES ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO. (Certificaciones entregadas). | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--|
| SOPORTE | APLICA (SÍ / N.A.) | CUMPLE (SÍ / NO) | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | FECHA DE EXPEDICIÓN | OBSERVACIONES | |
| 1 | Formato de estructura técnica - FET completamente diligenciado y suscrito por las partes; sin modificación en la estructura del mismo. | SÍ | NO | Alcaldía de Surata | 6/10/2015 | Se presentan inconsistencias en las cantidades de obra solicitadas, en el caso del acero para refuerzo, no es posible calcular el consolidado total ya que falta información en planos. Revisar observaciones específicas |
| 2 | Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. (ver Anexo - Carta de presentación proyecto ISC) | SÍ | NO | Alcaldía de Surata | 11/07/2019 | El valor del monto total del proyecto en la carta no corresponde con el monto especificado en el formato FET. Estos valores deben coincidir |
| 3 | Certificado de tradición y libertad, copia de la escritura del lote y certificado de usos del suelo donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 4 | Título colectivo para SRC Étnicos | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 5 | Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales, expedido por la Oficina de Planeación Municipal. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 6 | Certificado de disponibilidad de servicios públicos, emitido por el municipio o la empresa de servicios respectiva. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 7 | Certificación de viabilidad del proyecto, emitida por el municipio. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 8 | Compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 9 | Acta de socialización firmada por personas y/o líderes de la comunidad o de las juntas de acción comunal que certifiquen estar de acuerdo con la ejecución del proyecto en las condiciones acordadas y en donde manifiestan su interés de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y mantenimiento periódico de los proyectos según, sea el caso. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 10 | Censo de población a beneficiar, de acuerdo con el Formato único de Censo, deberá incluir la totalidad de la información solicitada. | SI | SI | Alcaldía de Surata | | |
| 11 | Certificación de la capacidad del número de personas en función al área (m2) efectiva de uso, la cual debe ser acorde con las cantidades de mobiliario solicitado. | N.A. | | Alcaldía de Surata | | |
| 12 | Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), como soporte de la contrapartida por parte del municipio para la contratación de la totalidad de mano de obra requerida para la ejecución del proyecto. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 13 | Certificado de ejecución y supervisión de obra para los SRC Étnicos | N.A. | | Alcaldía de Surata | | |
| 14 | Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), para los casos en los que se requiera realizar la entrega de materiales de construcción y sea necesario contar con transportes adicionales (Inter veredales y/o fluviales); soporte adicional por parte del municipio. | N.A. | | Alcaldía de Surata | | |
| 15 | Certificación de transportes adicionales para los SRC Étnicos. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos. Adicionalmente, se recomienda hacer una revisión del diseño de cimentación del proyecto. La cimentación debe contar con zapatas |
| 16 | Certificación de que los estudios y diseños que se remiten con el proyecto cumplen con las normas vigentes de construcción (INSR-10 sismo resistencia, agua potable y saneamiento básico, código colombiano de fontanería, instalaciones eléctricas RETIE) y las demás que se consideren. Suscrita por el responsable de los diseños (Entre territorial o diseñadores contratados) | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos. Adicionalmente, se recomienda hacer una revisión del diseño de cimentación del proyecto. La cimentación debe contar con zapatas |
| 17 | Planos de localización geográfica del proyecto, diseño arquitectónico y detalles constructivos debidamente firmados, diseños y estudios técnicos que apliquen (estructural, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, ambientales) debidamente firmados, especificaciones técnicas de la construcción, LISTA COMPLETA DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO CONFORME A LA LISTA SPAE 2019, MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES DE OBRA SOLICITADOS, presupuesto detallado debidamente firmado, Análisis de Precios Unitarios - A.P.U. de todos los ítems del proyecto. Los estudios y diseños solicitados deben ser acordes con el alcance técnico del proyecto. | SI | NO | Alcaldía de Surata | | No fue enviado plano de localización geográfica del proyecto. La información contenida en planos de diseño no concuerda con cantidades solicitadas. Los planos eléctricos correspondientes a iluminación no dejan claro si se requieren 2 o 4 postes. Los planos de acero de refuerzo no cuentan con información suficiente para determinar la cantidad de acero solicitado. Hace falta plano de detalle de las cajas de inspección para el manejo de aguas, no son suficientes las dimensiones acotadas para verificar cantidades de obra. Se debe enviar los planos en formato .dwg para poder hacer su análisis en Software CAD. Revisar observaciones específicas |
| 18 | Para las intervenciones correspondientes a reparaciones o mejoras locativas (obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas). Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas, como mínimo se debe contar con: LISTA COMPLETA DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO CONFORME A LA LISTA SPAE 2019 y las MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES DE OBRA SOLICITADOS. | N.A. | | Alcaldía de Surata | | |
| 19 | CONTRATO DE MANO DE OBRA (Posterior a la aprobación del proyecto por parte de la UARIV) | SI | NO | Alcaldía de Surata | | PENDIENTE. No hace parte de la documentación enviada |

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS.

ESTUDIOS Y DISEÑOS: SE RECOMIENDA HACER UNA REVISIÓN RIGUROSA DEL DISEÑO DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO, LA CIMENTACIÓN DEBE CONTAR CON ZAPATAS
CANTIDADES SUB-BASE GRANULAR: NO SE ADJUNTA LIBRO DE ESPECIFICACIONES CON FACTOR DE COMPACTACION (PARA DETERMINAR MATERIAL SUELTO), NO ES CLARO EN LOS PLANOS ENTREGADOS SI LA LONGITUD DE LA CAÑUELA ES EQUIVALENTE AL PERÍMETRO TOTAL DE LA CANCHA
CANTIDADES CONCRETO CICLOPEO: EN EL CASO DE CICLOPEO PARA ANLAJE DE PORTICOS DE FUTBOL-BALONCESTO (LAS DIMENSIONES SON 10.4X0.4X0.4) M². HACE FALTA ACOTAR EN PLANOS UNA DIMENSION
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE: EXCESO DE MATERIAL SOLICITADO, ACLARAR A QUE DISTANCIA DE LA PLACA DE CANCHA SE VA A INSTALAR EL CERRAMIENTO (¿DONDE TERMINA LA CUNETAS?)
CONCRETO PARA COLUMNETAS: SEGUN EL ESPACIAMIENTO ENTRE COLUMNETAS, ACOTADO EN PLANOS (2.5 M), SE DIFIERE EN EL NUMERO DE COLUMNETAS DE FONFINAMIENTO EN MURO (38 SEGUN INFORMACION ACOTADA EN PLANOS), ADEMAS SEGUN PLANO. LAS COLUMNETAS TIENEN UNA ALTURA DE 1,20 (NO 0,50). SE SOLICITA MATERIAL EN EXCESO
MODULO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12: SE DIFIERE EN EL NUMERO DE MALLAS DE DIMENSION (2X2.5) M. EL PERIMETRO DEL CERRAMIENTO, SEGUN INFO. EN PLANOS SERIA DE (30X17) M. SE DEBE ESPECIFICAR EN PLANOS LAS LONGITUDES DEL PERIMETRO DE CERRAMIENTO
ACERO DE REFUERZO: NO ES POSIBLE DETERMINAR LA CANTIDAD DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION, NO HAY INFORMACION REFERENTE AL CALIBRE DE LAS VARILLAS EN VIGAS
CAJAS DE INSPECCION (0.50X0.50) M: NO ES POSIBLE HACER EL CUBICAJE DE MATERIAL PARA LAS CAJAS DE INSPECCION, LA INFORMACION EN LOS PLANOS ES INSUFICIENTE (NO ESTA ACOTADA LA PROFUNDIDAD O ALTURA DE LAS CAJAS). ADICIONALMENTE, NO SE ESPECIFICA EN PLANO EL ACERO DE REFUERZO PARA CAJAS DE INSPECCION O LA MAMPOSTERIA A EMPLEAR (QUE SI SE CUANTIFICA EN A.P.U.s)
CAJAS DE INSPECCION (0.30X0.30X0.40) M: NO ES POSIBLE DETERMINAR LA CANTIDAD DE CAJAS PREFABRICADAS, EXISTEN 2 PLANOS DE ILUMINACION, UNO CON DOS POSTES PARA ILUMINACION (3 CAJAS), OTRO CON CUATRO POSTES (5 CAJAS).
REVISAR HOJA DE VERIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Aprobado

No Aprobado

En Revisión

AVAL DE REVISIÓN

Nombres y Apellidos: Christian Soto Nuñez
 CARGO: ING. COORDINADOR
 Firma: _____

Table with columns: ITEM, ESPECIFICACION, M, A (H), A (H), A (H), V (m³), Ø, Cost, Elemento, M, n, w, u, Bq. Rows include items like 'Ocupación y limpieza', 'Ejecución en material concreto consolidado', 'Barridos, Estalado y Compensación de Subbase', etc.

VOLUMEN COMPACTO 20% ADICIONAL (SUELO) 66.862 13.3194 2.718 0.5436 75.0364 0.5436

Table for 'TOTAL CILINDRO' with columns for concrete types and volumes. Includes text: 'CICLOPEO PARA ANCLAJE DE PORTICOS DE FUTBOL BALANCESTO...'

Table for 'TOTAL CONCRETO' with columns for concrete types and volumes. Includes text: 'EXCESO DE MATERIAL SOLICITADO...'

Table for 'AREA MAMPOSTERIA' with columns for area, height, and volume. Includes text: 'SE DIFIERE EN EL NUMERO DE COLUMNETAS...'

Table for 'VOL. PLACA' with columns for plate area and volume. Includes text: 'SE DIFIERE EN EL NUMERO DE MALLAS...'

Table for 'VOL. CARRELA' with columns for concrete and volume. Includes text: 'NO ESTA ACOTADA EN PLANOS...'

Table for 'VOL. TUBO' with columns for tube length and volume. Includes text: 'SE DIFIERE EN EL NUMERO DE COLUMNETAS...'

Table for 'VOL. PLACA' with columns for plate area and volume. Includes text: 'SE DIFIERE EN EL NUMERO DE MALLAS...'

Table for 'VOL. CARRELA' with columns for concrete and volume. Includes text: 'NO ESTA ACOTADA EN PLANOS...'

Table for 'VOL. TUBO' with columns for tube length and volume. Includes text: 'SE DIFIERE EN EL NUMERO DE COLUMNETAS...'

Table for 'VOL. CARRELA' with columns for concrete and volume. Includes text: 'NO ESTA ACOTADA EN PLANOS...'

Table for 'VOL. TUBO' with columns for tube length and volume. Includes text: 'SE DIFIERE EN EL NUMERO DE COLUMNETAS...'

| ITEM | ESPECIFICACION | UN | M | CM | CM ² | M ³ | M ² | Ø | Clas. | Elemento | 1.00 | M ² | M ³ |
|------|--|----|---|----|-----------------|----------------|----------------|---|-------|----------|------|----------------|----------------|
| 8.0 | Suministro, transporte e instalación de cruceo metálico F-22 para soporte de proyector. | UN | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | Unid. | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| 8.1 | Suministro, transporte e instalación de Proyector rectangular Mesalonda 200W Ref. 88A con lente con vidrio templado de seguridad, reflector sintético circular en brida de aluminio con gra. Incluye: bombillo Mesalonda de 200W. M. eléctrico, soporte en acero galvanizado, brida de purlin, tornillos, conectores y cables. | UN | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | Unid. | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| 8.2 | Suministro, transporte e instalación de controlador 20 controlado por caja palaneta, control, breaker y cableado. | UN | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | Unid. | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| 8.3 | Suministro, transporte e instalación de control timer conformado por caja metálica tipo interruptor de 30A/350V, interruptor automático ajustable, controlador digital timer y cableado incluido. | UN | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | Unid. | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| 8.4 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para postes de distribución pública. | UN | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | Unid. | | | | | | | | | | 2.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 2.00 | | |

¿SON DOS POSTES O CUATRO POSTES?

¿SON DOS POSTES O CUATRO POSTES?

| CANTIDADES TOTALES CALCULADAS (Anexo de SNI) | |
|--|------------|
| CEMENTO (M3) | 508.865211 |
| ARENA (M3) | 40.37 |
| GRANA (M3) | 63.30 |
| W/ LADRILLOS | 3.057.14 |
| PIEDRA (M3) | 7.668.00 |

ANEXO 8. Anexo 3 de primer informe parcial de práctica

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA | | |
| | PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC. | | |
| | PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL | | |
| | Código: 430.08.15-8 | Versión: 03 | Fecha: 05/12/2017 |

ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA

| ID | NOMBRE SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA |
|---|---|
| 236 | CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA |
| DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO | |
| Fecha: 12 de marzo de 2019 | |

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y **CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA** concertaron las acciones a desarrollar para la implementación de la siguiente medida del Plan Integral de Reparación Colectiva.

| TIPO MEDIDA DE REPARACIÓN COLECTIVA | SELECCIÓN |
|--------------------------------------|-----------|
| MEDIDA DE RESTITUCIÓN | x |
| MEDIDA DE REHABILITACIÓN | |
| MEDIDA DE SATISFACCIÓN | |
| MEDIDA DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN | |

| ID | MEDIDA DE REPARACIÓN COLECTIVA |
|-------|--|
| 29815 | RESTITUCIÓN |
| ID | ACCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA |
| 29824 | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arboleda. A. Adecuación de aulas, restaurante escolar y unidad sanitaria. |

En el marco de la implementación de la medida de reparación colectiva arriba mencionada, se concertó con el Sujeto de Reparación Colectiva el alcance de la medida y las necesidades técnicas necesarias para el desarrollo de los rituales con la comunidad, los cuales se detallan, en cantidad y especificaciones, a continuación:

Objetivo General

Adecuar la infraestructura de la Escuela del Consejo Comunitario Villa Arboleda para fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños y niñas de la comunidad.

Impacto que se quiere lograr

Incentivar en el proceso de aprendizaje entre los niños y niñas.

Población objetivo

La comunidad del Consejo Comunitario Villa Arboleda y de manera particular los niños y niñas.

Proceso de implementación, lugar y cronograma del proceso de implementación:

Estado actual:

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA | | |
| | PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC. | | |
| | PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL | | |
| | Código: 430.08.15-8 | Versión: 03 | Fecha: 05/12/2017 |

La Escuela está construida en un predio que la comunidad donó a la Alcaldía con la finalidad de contar con la anuencia de la Secretaría de Educación para contar con esta infraestructura, ya que las otras escuelas son muy distantes, con un recorrido costoso y que representaba riesgo para los niños y niñas al ser el traslado fluvial. De acuerdo con la gestión que la comunidad ha logrado la actual Alcaldía del Valle del Guamuez (2019) suscribió un contrato (anexo a la presente) que tuvo por objeto "Mejoramiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Rural Maravelez Sede Escuela Rural mixta Villa Arboleda en el Municipio Valle del Guamuez, departamento del Putumayo" y que se suscribió a los 31 días de julio de 2018.

Dentro del contrato se incluyeron el piso, guardaescobas, chapas para las puertas, mantenimiento de la ventanería y pintura, con el siguiente estado actual:



Teniendo en cuenta el avance del mejoramiento en la infraestructura se encuentra la siguiente necesidad de adecuación:



Estado Baños Escuela

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA | | |
| | PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC. | | |
| | PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL | | |
| | Código: 430.08.15-8 | Versión: 03 | Fecha: 05/12/2017 |



Estado de las Baterías sanitarias Escuela.

Se encuentra que si bien la Alcaldía dejó la estructura de los baños con cuatro (4) baterías instaladas estas no fueron funcionales, ya que no cuentan con pozo séptico, las puertas no sirven y en el momento no cuenta con instalación de agua.

Pasos a seguir:

1. Asesoría técnica del ingeniero civil o arquitecto de la Alcaldía o la Gobernación para que se faciliten el diseño hidrosanitario para que los baños queden útiles para la comunidad. Con el diseño se identificará la necesidad de mano de obra calificado, no calificada y obtener todos los requisitos para adelantar las acciones.
2. Recibir los insumos de la Unidad para las Víctimas para que en comunidad y con la mano de obra calificada se realicen las mejoras a la Casa Afro.

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| Cronograma | 2019 | <p>Consecución de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formato de estructura técnica – FET completamente diligenciado y sin modificación en la estructura del mismo. 2) Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. 3) Documento de titulación colectiva del predio a favor de la comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda. 4) Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales, expedido por la Oficina de Planeación Municipal. 5) Certificado de disponibilidad de servicios públicos, emitido por el municipio o la empresa de servicios respectiva. 6) Certificación de viabilidad del proyecto, emitida por el municipio. 7) Compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio. 8) Acta de socialización firmada por la comunidad que certifiquen estar de acuerdo con la ejecución del proyecto en las condiciones acordadas y en donde manifiestan su interés de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y mantenimiento periódico de los proyectos según, sea el caso. <p>Entrega de los insumos para el mejoramiento de los baños de la Escuela., por parte de la Unidad para las Víctimas.</p> |
|-------------------|-------------|--|

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA | | |
| | PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC. | | |
| | PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL | | |
| | Código: 430.08.15-8 | Versión: 03 | Fecha: 05/12/2017 |

RECURSOS NECESARIOS

Logística

- Jornadas de trabajo para la implementación de las mejoras de la escuela.

Técnicos

- Diseño hidrosanitario.

Insumos y Materiales

- Se definirán una vez se cuente con los estudios técnicos respectivos para el mejoramiento los baños de la escuela.

COMPROMISOS

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|-----|---|---|--|
| 1 | Gestión con la Alcaldía para avanzar en los compromisos de los estudios técnicos para el mejoramiento de los baños de la Escuela. | Unidad para las Víctimas | 2019 |
| 2 | Entrega de los insumos y materiales necesarios para el mejoramiento de los baños de la Escuela. | UARIV | <i>Una vez se cumplan las especificaciones técnicas.</i> |
| 3 | Entrega de la dotación para la Casa Afro, por una sola vez con las especificidades acordadas. | Unidad para las víctimas. | <i>Una vez luego de la protocolización del PIRC.</i> |
| 4 | Uso adecuado, manejo y mantenimiento de la dotación después de las entregas. | Comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda | <i>Permanente luego de la entrega.</i> |
| 5 | En el evento de pérdida y/o hurto total o parcial de la dotación entregada se realizará la respectiva denuncia ante las autoridades competentes y a informar de los hechos a la UNIDAD, dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia de los hechos. | Comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda | <i>Permanente luego de la entrega.</i> |
| 6 | Facilitar el seguimiento, evaluación y monitoreo del uso de la dotación por parte de la Unidad, mínimo cada seis (6) meses, y/o cuando lo estimen conveniente, durante el período de implementación del PIRC. | Comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda | <i>Permanente luego de la entrega y durante el período de implementación del PIRC.</i> |

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA | | |
| | PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC. | | |
| | PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL | | |
| | Código: 430.08.15-8 | Versión: 03 | Fecha: 05/12/2017 |
| | | | Página: 5 de 8 |

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|-----|--|---|--|
| 7 | La comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda no podrá ceder, vender, permutar, donar o adelantar cualquier tipo de transacción económica con la dotación que entregará la UNIDAD salvo que sea para actualizar a nuevos modelos. | Comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda | <i>Luego de la entrega hasta el cierre de la implementación del PIRC</i> |
| 8 | Responder por la administración, sostenimiento, usos adecuado e informar a la Unidad para las Víctimas en los tiempos definidos en la garantía, las fallas que presente el mobiliario, las cuales no pueden obedecer a usos inadecuados. | Comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda | <i>Luego de la entrega hasta el cierre de la implementación del PIRC</i> |
| 9 | No utilizar la dotación entregada por la UNIDAD para fines y/o actividades ilícitas y de carácter personal. | Comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda | <i>Luego de la entrega hasta el cierre de la implementación del PIRC</i> |
| 10 | Responder por el cuidado y custodia de cada uno de los elementos entregados y pagar los gastos que se generen por este concepto. | Comunidad del Consejo Comunitario de Villa Arboleda | <i>Luego de la entrega hasta el cierre de la implementación del PIRC</i> |

Las acciones concertadas para la implementación de esta medida cumplen con los parámetros y lineamientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4635 de 2011 y responde a cabalidad con las expectativas de las víctimas.



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC.

PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL

Código: 430.08.15-8

Versión: 03

Fecha: 05/12/2017

Página: 5 de 7

Firman en representación de la comunidad/organización/grupo:

| NOMBRE COMPLETO | DOCUMENTO | CARGO / ROL | TÉLEFONO | FIRMA |
|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Jaime Edison Ibarra | 78254825 | Secretario | 3157605559 | Jaime |
| Clara de los Angeles P. | 78785625 | | 3295 320480 | Clara de los Angeles P. |
| Soraida Ibarra O | 1126445533 | | 3158355909 | Soraida Ibarra O. |
| Lucia Armas | 69040416 | | | Lucia Armas |
| Rita Marina Ortega | 11116282 | ma jor del campo | 3164792339 | Rita Marina Ortega |
| Oscar A. Abledo | 18708696 | comate seguridad Abiedo | 3505432522 | Oscar A. Abledo |
| ANDRES ovemar arboleida | 1126446387 | Fiscal | 3502401279 | ovemar arboleida |
| Rosa Miriam M. Ortega | 11116262 | bocal | 3212487860 | Rosa M. Ortega P. |
| Arnulfo Hernandez | 18155130 | Presidente | 3506381027 | Arnulfo Hernandez |



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC

PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL

Código: 430.08.15-8

Versión: 03

Fecha: 05/12/2017

Página: 6 de 7

En representación de la Alcaldía Municipal y/o Gobernación Departamental y entidades del orden nacional firman los servidores públicos:

| NOMBRE COMPLETO | CARGO | ENTIDAD / DEPENDENCIA | TÉLEFONO / EXT | FIRMA |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Jaima Alexandra Ibarrido Ortega | Asesoría Re-AFIO | Alcaldía Valle del Guamuez | 3500515220 | Alexandra Ibarrido |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PIRC.

PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL

Código: 430.08.15-8

Versión: 03

Fecha: 05/12/2017

Página: 7 de 7

En representación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas firman los servidores públicos:

| NOMBRE COMPLETO | CARGO | DEPENDENCIA | TÉLEFONO / EXT | FIRMA |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Marcela Alejandra Calderón Ortiz | Profesional universitario | Reparación Colectiva | 3134628122 3307 | |
| WILLIAM ROMERO ANDRADA | profesional universitario | Reparación Colectiva | 3202518032 | |
| Anayela Moreno Martínez | Prof. Espec. Sub. Dir. Re. étnico | Sub. Dir. Rep. Cole. Étnico | 3212445354 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT N° 800102912-2



La presente relación contractual se registrará por lo dispuesto en las normas vigentes que regulan la materia y lo dispuesto en la invitación pública y estudios previos, así:

CLÁUSULA 1: OBJETO: El objeto a desarrollar en virtud de la presente relación contractual es: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MARAVELEZ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA VILLA ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CLÁUSULA 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas que se desarrollarán en virtud del objeto contractual, son las que se describen a continuación, en concordancia con los estudios previos, la invitación pública y la propuesta económica y sus anexos presentada por el contratista, así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT |
|------|---|------|------|
| 1 | ALISTADO DE PISO E=0.04M (M2) R=17.5 MPA | M2 | 95 |
| 2 | CERAMICA PISO GENERAL T5: acabado semibrillante, forma cuadrada, cerámica impermeable y antimanchas. | M2 | 95 |
| 3 | GUARDA ESCOBAS CERAMICA | ML | 80 |
| 4 | CHAPA PARA PUERTA METALICA: alto 139.80, ancho 183.04, profunido 74.75, doble cerrojo de tres golpes, accionado con llave por ambos lados, caja y cartonera de acero. | UNID | 4 |
| 5 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA METALICA | M2 | 29.2 |
| 6 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 | M2 | 150 |

CLÁUSULA 3.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la Alcaldía Valle del Guamuez (Ptyo), respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. Conoce las consecuencias de incumplir el **COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN** contenido en el Anexo 03 de la invitación Pública. 5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 8. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

CLÁUSULA 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución para el desarrollo y cumplimiento del presente objeto contractual será de un (01) mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (firma de las partes), y formalización del contrato suscrito (Expedición del compromiso presupuestal, pago de Impuestos municipales, constitución y aprobación de las garantías solicitadas por parte del Municipio, soportes del pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) del mes vigente y suscripción del acta de inicio.

El plazo de duración del contrato se contará desde la firma del acta de inicio entre el contratista y el supervisor del contrato y el término de cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del EL MUNICIPIO, periodo éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato.

enlace



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 NIT N° 800102912-2



CONTRATO No. SPOPM-CO-MINC-318-2018, del 31 de julio 2018. ✓

| | |
|--------------------------|--|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ |
| CONTRATISTA: | HEYNER HUGO ROSALES PONCE |
| No. Cédula de ciudadanía | 87.552.887 de Ricaurte (N) |
| CLASE DE CONTRATO: | OBRA |
| OBJETO: | "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARAVELEZ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA VILLA ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" |
| VALOR: | VEINTE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$20.122.352 M/cte) ✓ |
| PLAZO DEL CONTRATO: | UN (1) MES > |

Los aquí suscribientes, **LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**, Identificado con C.C No. 97.472.153 expedida en el Municipio de Sibundoy Putumayo, en su calidad de Alcalde Municipal de Valle del Guamuéz; según credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional el día 01 de noviembre de 2015 y Acta de Posesión del 31 de diciembre de 2015, proferida por el Notario Único del círculo Municipio Valle del Guamuéz, y como tal representante legal del mismo de conformidad con lo establecido en el Art 314 de la Constitución Política, autorizado para ordenar gastos y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral primero del Art 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 De 2015, quien en adelante se denomina EL MUNICIPIO como Entidad CONTRATANTE; y por la otra, **HEYNER HUGO ROSALES PONCE**, Identificado con cédula de ciudadanía No. 87.552.887 de Ricaurte (N), hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA**, previo el procedimiento de contratación mediante la modalidad de mínima cuantía, establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y su Decreto reglamentario No. 1082 de 2015 y previas las siguientes.

Entre los suscritos a saber, **LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**, Identificado con C.C No. 97.472.153 expedida en el Municipio de Sibundoy Putumayo, en su calidad de Alcalde Municipal de Valle del Guamuéz; según credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional el día 01 de noviembre de 2015 y Acta de Posesión del 31 de diciembre de 2015, proferida por el Notario Único del círculo Municipio Valle del Guamuéz, y como tal representante legal del mismo de conformidad con lo establecido en el Art 314 de la Constitución Política, autorizado para ordenar gastos y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral primero del Art 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 De 2015, quien en adelante se denomina EL MUNICIPIO como Entidad CONTRATANTE; de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se permite informarle que una vez realizada la evaluación y verificación de la oferta por usted presentada dentro del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. **MINC-SPOPM-014-2018**, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARAVELEZ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA VILLA ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" la misma cumple con los requerimientos establecidos por la entidad en la invitación previamente publicada en la Página www.contratos.gov.co, por lo cual fue aceptada de manera expresa e incondicional por el Departamento del Putumayo.

En ese sentido y considerando lo expuesto en el literal d) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, el presente documento y la propuesta presentada por **HEYNER HUGO ROSALES PONCE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.552.887 de Ricaurte (N), constituyen para todos los efectos la relación contractual originada en la Invitación Pública No. **MINC-SPOPM-014-2018**, con base en la cual se expedirá el correspondiente Registro Presupuestal.

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 NIT N° 800102912-2



EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecución de las obras a partir del día señalado en la suscripción del acta de inicio de obra, previo visto bueno del supervisor de la misma.

CLÁUSULA 5.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de **VEINTE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$20.122.352 M/cte)**, incluido el IVA y los demás descuentos, retenciones y deducciones de ley junto con la utilidad mínima a percibir por el contratista.

CLÁUSULA 6.- FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será de **VEINTE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$20.122.352 M/cte)**, o hasta el menor valor ofertado por el proponente favorecido, Que el municipio cancelará así:

UNICO PAGO: el municipio del Valle del Guamuez realizará un único pago al contratista por el ciento (100%) del valor total del contrato suscrito, una vez se de por terminada la obra, previa legalización y perfeccionamiento del contrato, además, de la Presentación de un (1) informe final de ejecución de obra, adjuntando el respectivo registro fotográfico, suscripción del acta de entrega y recibo final de obra, informe final de supervisión y acta de liquidación del contrato suscrita entre el Supervisor y el Contratista.

PARAGRAFO 1: La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al MUNICIPIO del pago de intereses moratorios.

PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 7.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO:

- a) Cumplir oportunamente con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución del mismo al igual que Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y demás especificaciones establecidas por la entidad en los Estudios Previos e Invitación Pública. Por tanto, el Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Plazo establecido.
- b) EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente, y de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que EL MUNICIPIO no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaren a ocasionarse.
- c) EL CONTRATISTA, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1995). EL CONTRATISTA deberá suministrar o tener en su campamento las medicinas y elementos de botiquín que se requieran para sortear emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por la seguridad del personal a su cargo y cuidará de los equipos, materiales y elementos, para lo cual organizará un almacén en el sitio de la obra. EL CONTRATISTA será responsable del pago de salarios y prestaciones sociales a obreros y demás personal que vincule para la ejecución de la obra, servicio de vigilancia que requiera, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos de servicios públicos que requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente, controlará el orden y velará porque las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el contrato. Atenderá las instrucciones impartidas por el supervisor en la ejecución de la obra. Se someterá a todas las normas de protección del medio ambiente, seguridad social, urbanística y demás que tenga relación con el objeto de la obra. En caso de necesitarse información adicional para ejecutar una obra específica o para resolver alguna inquietud técnica, solicitará, con la debida antelación, al supervisor, en el evento en que haya lugar, las aclaraciones necesarias.

EN UNO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT N° 800102912-2



- d) El contratista deberá garantizar la seguridad de todo el personal vinculado al proyecto, de acuerdo con las normas de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial, según las disposiciones legales aplicables en estas materias. Esta obligación se extiende al personal de sus subcontratistas, en cuyo caso se deben adoptar todas las medidas tendientes a lograr que los subcontratistas garanticen la seguridad de su personal en los mismos términos exigidos al contratista.
- e) El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales al respecto. El contratista se someterá a las regulaciones que sobre protección medioambiental le establezca la autoridad ambiental de Mocoa o la autoridad que tenga competencia sobre los recursos naturales que se requieran intervenir.
- f) Reportar de manera inmediata AL CONTRATANTE, cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato y mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente seleccionado.
- g) Es obligación del contratista ejecutar en su totalidad el objeto del Contrato y garantizar al municipio Valle del Guamuez que durante la vigencia del contrato se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (Ley 789/02 en concordancia con la Ley 828/03 y Ley 1150/07). De igual manera se obliga cumplir con las certificaciones sobre antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales entre otros.

CLÁUSULA 8.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga para con el contratista a:

- a) Pagar al contratista el valor total del Contrato suscrito en la forma y término que señalada por el Municipio, previo cumplimiento y acreditación de los requisitos para tramitar el pago.
- b) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
- c) Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual.
- d) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por EL CONTRATISTA.
- e) Resolver las peticiones presentadas por EL CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.
- f) Realizar la supervisión y seguimiento al proceso contractual la cual será ejercida por parte del Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal quien hará las veces de interventor; y que a su vez deberá recibir el objeto contractual a satisfacción, la entidad deberá asignar el personal idóneo para la supervisión.

CLÁUSULA 9. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato a celebrarse deberá ejecutarse en el Sector Rural vereda Villa Arboleda, municipio Valle del Guamuez (Putumayo).

CLÁUSULA 10.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de OBRA, como por los hechos u omisiones que le fueron imputables y que causen daño o perjuicio al MUNICIPIO.

CLAUSULA 11. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Jefe de Presupuesto así:

| | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------------|
| No. de CDP | 018000736 ✓ | F/Expedición | 23 de julio de 2018 |
|------------|-------------|--------------|---------------------|

CLÁUSULA 12.- CESIÓN DEL CONTRATO: Este contrato no puede ser cedido total o parcialmente a ninguna persona, salvo autorización escrita del Alcalde Municipal.

CLAUSULA 13.- GARANTÍAS: Dando aplicación a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No. 1082 de 2015 y atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor del municipio Valle del Guamuez (Putumayo), una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

afuse



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 NIT N° 800102912-2



220

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar los amparos que deben solicitarse al contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

| COBERTURA DEL RIESGO | COBERTURA EXIGIBLE | SI | NO | CUANTÍA | VIGENCIA |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | Garantía de seriedad de la Oferta | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial estimado | Tres (3) meses a partir del momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la Garantía que ampara los riesgos propios de la contratación |
| | Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cien por ciento (100%) del valor del anticipo | Duración del contrato y cuatro (4) meses más |
| | Pago Anticipado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cien por ciento (100%) del valor que el contratista reciba a título de pago anticipado | Duración del contrato y cuatro (4) meses más |
| | Cumplimiento General del Contrato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato | Duración del contrato y cuatro (4) meses más |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato | Duración del contrato y tres (3) años más |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato | Duración de un (1) años |
| | Calidad y Correción Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato | Duración del contrato y un (1) año más |
| | Calidad del Servicio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato | Duración del contrato y un (1) año más |
| | Responsabilidad Extracontractual | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato | Duración del contrato y seis (6) meses más |
| Excepción de mecanismo de cobertura del riesgo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cuando se trate de contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguros y en los contratos cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía | La entidad lo determina atendiendo la naturaleza del contrato y la forma de pago | |

El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o sanciones impuestas, él mismo se disminuyere o agotare o cuando se amplie el plazo del contrato o se adicione su valor. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo) podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

CLAUSULA 14.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la vigencia del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión, debiendo el CONTRATISTA ampliar la garantía única por el término de la suspensión. Cuando estas circunstancias afecten las

ca. Nuz



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT N° 800102912-2



obligaciones del CONTRATISTA, para ser aceptadas, éste debe comunicarlas por escrito al supervisor del contrato dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho con la debida comprobación.

CLÁUSULA 15.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley para contratar.

CLÁUSULA 16.- DOMICILIO: Para todos los efectos de este contrato se fija como domicilio el Municipio Valle del Guamuez- (Ptyo).

CLÁUSULA 17.- VALIDEZ: Este contrato requiere para su validez, la firma de las partes, el Compromiso Presupuestal, el pago de los impuestos Municipales respectivos, y la demás documentación requerida para su legalización.

CLÁUSULA 18.- RELACIÓN LABORAL: el presente contrato no genera relación laboral alguna con el contratista, ni con quien este emplee para la ejecución de la misma y en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones Sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor acordado. Por lo anterior entre **EL MUNICIPIO** y **EL CONTRATISTA** el personal que éste emplee para la ejecución del presente contrato no existe vínculo laboral alguno, en consecuencia, **EL MUNICIPIO** únicamente se obliga a pagar a **EL CONTRATISTA** pagar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás de ley al personal que emplee o contrate para la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que sucedan durante la ejecución contractual se solucionarán preferentemente mediante los mecanismos de conciliación y transacción o en su defecto se acudirá ante las instancias Administrativas.

CLÁUSULA 20.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de la presente Aceptación de Oferta, la oferta económica y los documentos previos que dieron lugar a la celebración del presente contrato.

CLÁUSULA 21.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión y control de ejecución del contrato la ejercerá el Municipio a través del Secretario De Planeación y Obras Públicas Municipales o quien haga sus veces o remplace, quien ejercerá el seguimiento técnico, administrativo y financiero, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, al cual el CONTRATISTA le suministrará la información necesaria para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la ley 80 de 1.993.

CLÁUSULA 22.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener indemne al Municipio de Valle del Guamuez de cualquier reclamación, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a persona o bienes, ocasionadas por él o su personal, durante la ejecución del objeto y obligación del Contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la entidad por asunto que sean de responsabilidad del contratista, se le comunicara lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la entidad, a solicitud del contratista podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen al Municipio sin que la responsabilidad del contratista se atenue por este reconocimiento, ni por el hecho que la entidad en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la entidad este podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo.

CLÁUSULA 23.- CADUCIDAD: El Municipio podrá declarar la caducidad del contrato en los casos previstos en la ley 80 de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 NIT N° 800102912-2





1993.

CLÁUSULA 24.- LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se realizará según el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, "la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

CLAUSULA 25.- PAGO ESTAMPILLAS: El contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes (Liquidación Oficina de Recaudo Municipal). Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del presente contrato serán asumidos por el CONTRATISTA. El Contratista se obliga a cumplir los requisitos de perfeccionamiento, legalización y requisitos de ejecución del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la publicación de la presente aceptación de oferta.

CLÁUSULA 26.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma del contrato, el pago del contrato y la entrega material de las pólizas y se legaliza una vez se expida el Compromiso Presupuestal por Parte del Profesional Universitario de Presupuesto y sean pagados los Impuestos Municipales correspondientes y se suscriba acta de inicio del contrato.


Para constancia se firma en el Municipio Valle del Guamuez – Putumayo, a los treinta y un (31) días del mes de julio del año 2018.

| POR EL MUNICIPIO | ACEPTO |
|--|---|
|  LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA Alcalde del Municipio del Valle del Guamuez |  HEYNER HUGO ROSALES PONCE Cédula de ciudadanía No. 87.552.887 de Ricaurte (N) |

Proyectó P. J. Erika Cansansca
 Contratista Of. Jurídica

Revisó P. J. Aura Viviana Rosales Arroyo
 Jefe de Oficina Jurídica

Revisó Favian Rosales
 Asesor de Despacho





ESCRITURA PUBLICA N° CIENTO VEINTE
 (120).----- FECHA: 14/02/2.007. ---
 CLASE DE ACTO: DONACION PARCIAL.----
 OBJETO: PREDIO RURAL.-----
 AREA: 5.443 M².- VALOR: \$6.700.000.- ----
 AVALUO SOBRE AREA DE: 5.600 M2.-----
 \$6.650.000.----- PREDIO N. 00 02 0034 0002 000.-----

MATRICULA N. 442- 25.622.-----

En la ciudad de La Hormiga, Municipio del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, República de Colombia a los catorce (14) días del mes de febrero de Dos mil siete (2.007), ante mí **ARMANDO RAMIRO HERNÁNDEZ ZAMBRANO**, Notario Único de este círculo, compareció (eron): **GERMAN JUSTAVO BASTIDAS BELTRAN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.152.460 expedida en el Valle del Guamuez (P), de estado civil casado, domiciliado en este Municipio, quién obra en este acto como apoderado de **AGUSTÍN HERNANDO ARIAS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.107.001 expedida en Puerto Asis (P/tyo), de estado civil soltero, domiciliado en este Municipio, según poder Especial, amplio y suficiente debidamente constituido y autenticado en esta misma Notaría, documento que se protocoliza con este instrumento y manifestó.-----

PRIMERO.- Que entrega a título de **DONACIÓN** a favor del Municipio **VALLE DEL GUAMUEZ -PUTUMAYO**, con Nit. 900 102 912 2, representado por su alcalde **ARTEMIO SAMUEL SOLARTE APRAEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.401.139 expedida en Pradera (Valle), de estado casado , domiciliado en La Hormiga (Ptyo), según actá de posesión de fecha 29-08-2005 y Acta de Ratificación No. 13 de fecha 30-08-2005 emanadas de las Notarias Cuarta y Única del Círculo de Pasto (Nar.) y Valle del Guamuez (Ptyo), y credencial emanada del Tribunal Administrativo de Nariño, documentos que se encuentran protocolizados en esta Notaria, quien para la firma de esta escritura pública, concede poder Especial . amplio y suficiente a **GERMAN GUSTAVO BASTIDAS BELTRAN**, de notas civiles antes mencionadas documento que se presenta para su protocolización.-----

y es a saber un bien inmueble : PREDIO RURAL, que hace parte de uno de mayor extensión denominado "Bella Vista", ubicado en la Vereda Villa Arboleda, Inspección del Policía El Tigre, jurisdicción del Municipio del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, República de Colombia de una EXTENSION SUPERFICIARIA DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS (5.443 M²), determinados por los siguientes linderos: - - - - -

ORIENTE.- Colinda con QUEBRADA LA PEÑA, mide 92 metros lineales. - - - - -

OCCIDENTE.- Colinda con CAMINO DE HERRADURA, mide 92 metros lineales. - - - - -

NORTE.- Colinda con AGUSTÍN ARIAS, mide 71 metros lineales. - - - - -

SUR.- Colinda con predios de la JUNTA DE ACCION COMUNAL, mide 52 metros lineales y encierra. - - - - -

DESTINACIÓN: Que esta donación se hace única y exclusivamente para la construcción de las INSTALACIONES ESCOLARES DE LA VEREDA VILLA ARBOLEDA. - - - - -

PARAGRAFO.- No obstante la mención sobre cabida y linderos acabados de relacionar; la presente donación se efectúa vinculada a cuerpo cierto, y en el estado en que actualmente se encuentra el inmueble, junto con todas sus mejoras, anexidades, dependencias, instalaciones y servicios que legal y naturalmente le corresponden. - - - - -

SEGUNDO.- Que el inmueble anteriormente descrito fue adquirido por el Donante en su estado civil soltero, mediante RESOLUCIÓN Nro. 000208 del 10/03/1.993, emanada de INCORA y Registrada en la oficina de II.PP. de Mocoa (P/tyo), el 29/06/93.-Turno 2277.- **MATRICULA N. 442- 26. 622** - - - - -

TERCERO.- Que el inmueble objeto de la presente donación tiene un valor comercial de **SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL**



CONTINUACION DE LA ESCRITURA PUBLICA
 N° (120).-----
 saneamiento en todos los casos de Ley, incluso en
 lo referente al Art. 27 del Decreto 960/70. -----
QUINTO.- Que dado el valor comercial del
 inmueble a donar no requiere insinuación

conforme lo prescribe el DECRETO 1712 DE 1989 encontrándose el señor
 Notario facultado para autorizar la presente Escritura Pública como en efecto se
 autoriza.-----

SEXTO.- Que este acto tiene plano y autorización de la Secretaria de Obras
 Públicas del Municipio del Valle del Guamuez (P/tyo), de fecha sin -documento
 que se protocoliza con este instrumento.-----

SEPTIMO.- Que el (la) donante queda con el patrimonio suficiente y necesario
 para atender a su congrua subsistencia en la medida que es propietario (a) y
 poseedor (a) del predio restante el cual queda con un área de TREINTA Y SEIS
 HECTÁREAS Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS
 (36 HAS y 9.307 M2) y los siguientes linderos:-----

ORIENTE.- Colinda con FLORENCIO ROJAS.-----

OCCIDENTE.- Colinda con ALONSO SALAZAR.-----

NORTE.- Colinda con RÍO GUAMUEZ.-----

SUR.- Colinda con JOSE OBANDO y encierra.-----

OCTAVO.- Que desde la misma fecha el (la) donante hace entrega real y
 material de los inmuebles anteriormente descrito(s) a el (la) donatario (a) junto
 con sus usos, costumbres y servidumbres que legalmente correspondan al mismo
 sin reservarse nada para sí.-----

NOVENO.- En este estado el apoderado del donatario (a) manifestó: - 1).- Que
 acepta la presente escritura, sus declaraciones y la donación que a través de ella
 se efectúa.-----

2).- Que desde este momento se encuentra en posesión del inmueble objeto de
 esta donación.-----

3).- Que esta donación es con destino a las excepciones establecidas en el
 Literal B. del Art. 45 de la Ley 160/94 en concordancia con el inciso 11 del Art. 72
 de la misma Ley.-----

El (los) compareciente (s) hace (n) constar que ha (n) verificado cuidadosamente las declaraciones inmersas en este instrumento y que todas las informaciones consignadas en el mismo son correctas y, en consecuencia asume (n) la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en aquellos.- Conocen la ley y que el Notario responde de la regularidad formal pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados.- Leído que les fue a los comparecientes lo aprueban y firman ante mí y conmigo el suscrito Notario que Da Fe, previa exhortación a su registro dentro del término legal de 60 días siguiente a su otorgamiento.-

DOCUMENTOS: Paz y salvo catastral N° 2152. -- Válido hasta el 15/02/2.007.-

A favor de AGUSTIN HERNANDO ARIAS B.

Predio N. 00 02 0034 0002 000.- Avalúo: \$6.650.179. - Superficie: 5.600 M2.-

Dirección: Villa Arboleda.- Hay firma y sello del Tesorero Municipal de Valle /Guamuez (Ptyo). - Fotocopias de las C.C. de las partes.- Documentos que se agregan al protocolo de este año.-

DERECHOS: \$39.285.- - - R. 7880/06.- IVA:\$6.286.- - - L. 633/00.-

RECAUDOS: \$6.350.- - - R. 7880/06.- Queda en las hojas AA 28157190.- y

AA 28157191.- Doy fe.-

APODERADO DEL DONANTE Y DEL DONATARIO:


GERMAN GUSTAVO BASTIDAS BELTRAN



I/D.

NOTARIO

ARMANDO RAMIRO HERNÁNDEZ ZAMBRANO



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE PUERTO ASIS
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Nro Matrícula: 442-60833

COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

Impreso el 2 de Mayo de 2012 a las 12:14:15 pm

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: 53988 impreso por: 53988
TURNO: 2012-442-1-5276 FECHA: 2/5/2012
EXPEDIDO EN: PUERTO ASIS

INDEPENDENCIA

El registrador REGISTRADOR SECCIONAL SAIRA PATRICIA DIAZ CIFUENTES

DE NOTARIADO

Y REGISTRO

LA GUARDA DE LA FE PUBLICA





**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO ASIS
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA**

Certificado generado con el Pin No: 190716661421800007

Nro Matrícula: 442-26622

Página 1

Impreso el 16 de Julio de 2019 a las 10:47:58 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 442 - PUERTO ASIS DEPTO: PUTUMAYO MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA: EL TIGRE

FECHA APERTURA: 29-06-1993 RADICACIÓN: S/N CON: SIN INFORMACION DE: 29-06-1993

CODIGO CATASTRAL: 86865000200000034000200000000000 COD CATASTRAL ANT: 868650002000000240062000000000

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

CABIDA 37 HAS. 4.750 M2 LINDEROS SEGUN RESOLUCION NO. 0208 DE FECHA 10-03-93 INCORA PASTO. (DEC. 1711 DE JULIO 06/84 (ANTES CIRCULO DE REGISTRO MOCOA)

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL
1) BELLAVISTA

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 29-06-1993 Radicación: 2277

Doc: RESOLUCION 0208 DEL 10-03-1993 INCORA DE PASTO

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 170 ADJUDICACION DE BALDIOS 37 HAS 4.750M2

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INCORA

A: ARIAS AGUSTIN HERNANDO

X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-02-2007 Radicación: 2007-442-6-677

Doc: ESCRITURA 120 DEL 14-02-2007 notaria unica DE VALLE DEL GUAMUEZ

VALOR ACTO: \$6,700,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0138 DONACION AREA 5443 MTS2

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARIAS AGUSTIN HERNANDO

CC# 18107001

A: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

NIT# 8001029122

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 09-07-2007 Radicación: 2007-442-6-2364

Doc: ESCRITURA 603 DEL 23-05-2007 notaria unica DE VALLE DEL GUAMUEZ

VALOR ACTO: \$1,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0126 COMPRAVENTA PARCIAL AREA 2 HAS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARIAS AGUSTIN HERNANDO

CC# 18107001

A: ARIAS CHAMORRO HERMES LAUREANO

CC# 18184859 X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 24-08-2007 Radicación: 2007-442-6-2890

Doc: ESCRITURA 778 DEL 04-07-2007 notaria unica DE VALLE DEL GUAMUEZ

VALOR ACTO: \$2,000,000



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO ASIS
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA**

Certificado generado con el Pin No: 190716661421800007

Nro Matrícula: 442-26622

Pagina 2

Impreso el 16 de Julio de 2019 a las 10:47:58 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0126 COMPRAVENTA PARCIAL AREA 3 HAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARIAS AGUSTIN HERNANDO

CC# 18107001

A: ARIAS JIMMY ARMANDO

CC# 18153721 X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 07-09-2007 Radicación: 2007-442-6-3113

Doc: ESCRITURA 804 DEL 10-07-2007 notaria unica DE VALLE DEL GUAMUEZ

VALOR ACTO: \$3,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0126 COMPRAVENTA PARCIAL AREA 4 HAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARIAS AGUSTIN HERNANDO

CC# 18107001

A: ARBOLEDA OBANDO MARIA DIOMAR

CC# 36875283 X

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 13-05-2008 Radicación: 2008-442-6-1740

Doc: ESCRITURA 48 DEL 25-01-2008 notaria unica DE VALLE DEL GUAMUEZ

VALOR ACTO: \$4,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 27 HAS 9307 M2

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARIAS BENAVIDES AGUSTIN HERNANDO

18107001

A: ARIAS ARBOLEDA AGUSTIN ARNOLDO

CC# 97445148 X

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 03-09-2015 Radicación: 2015-442-6-3041

Doc: ESCRITURA 530 DEL 28-08-2015 NOTARIA UNICA DE VALLE DEL GUAMUEZ

VALOR ACTO: \$4,800,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA AREA 27 HAS 9307 M2

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARIAS ARBOLEDA AGUSTIN ARNOLDO

CC# 97445148

A: SIFUENTES QUIÑONES FRADY GRACIANO

CC# 97436210 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS

2 -> 60833

3 -> 61253

4 -> 61398

5 -> 61487

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: 2011-442-3-274

Fecha: 16-07-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO ASIS
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 19071666142180007

Nro Matrícula: 442-26622

Página 3

Impreso el 16 de Julio de 2019 a las 10:47:58 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 2

Radicación: ICARE-2015

Fecha: 21-12-2015

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL I.G.A.C. (SNC), RES No. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech


TURNO: 2019-442-1-11966



FECHA: 16-07-2019



EXPEDIDO EN: BOGOTA


El Registrador: SAIRA PATRICIA DIAZ CIFUENTES

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

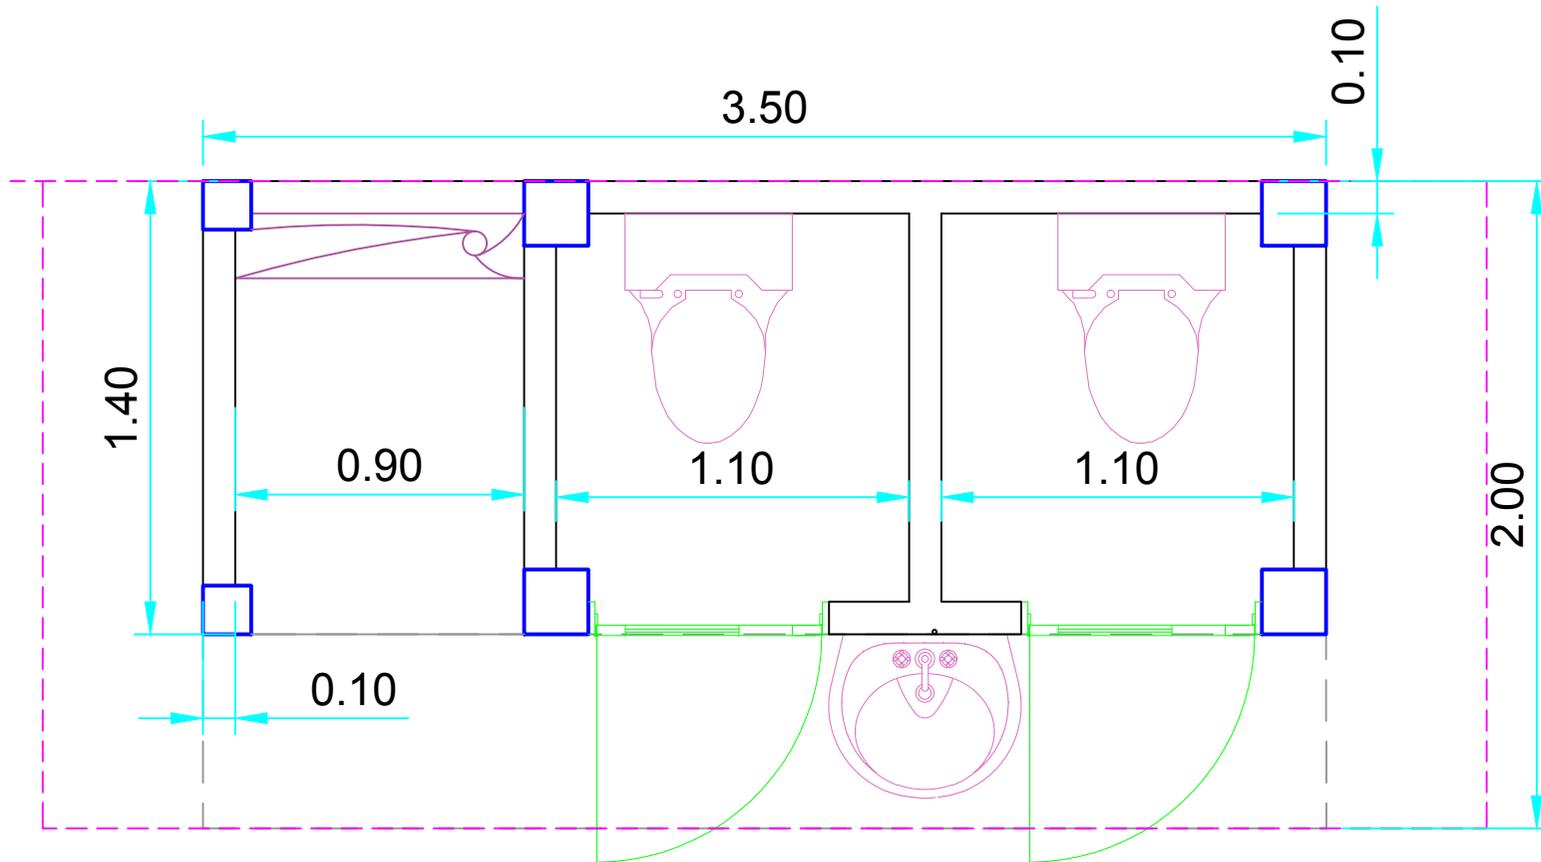


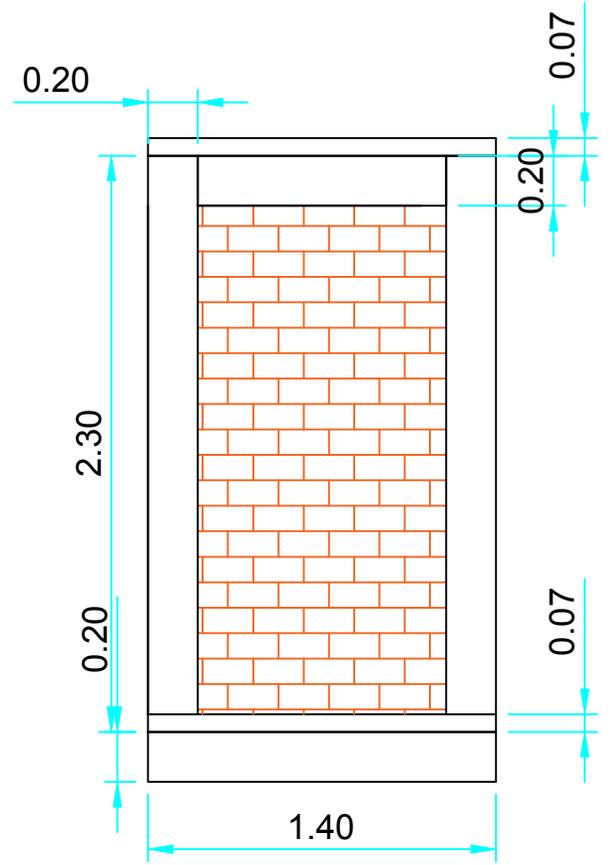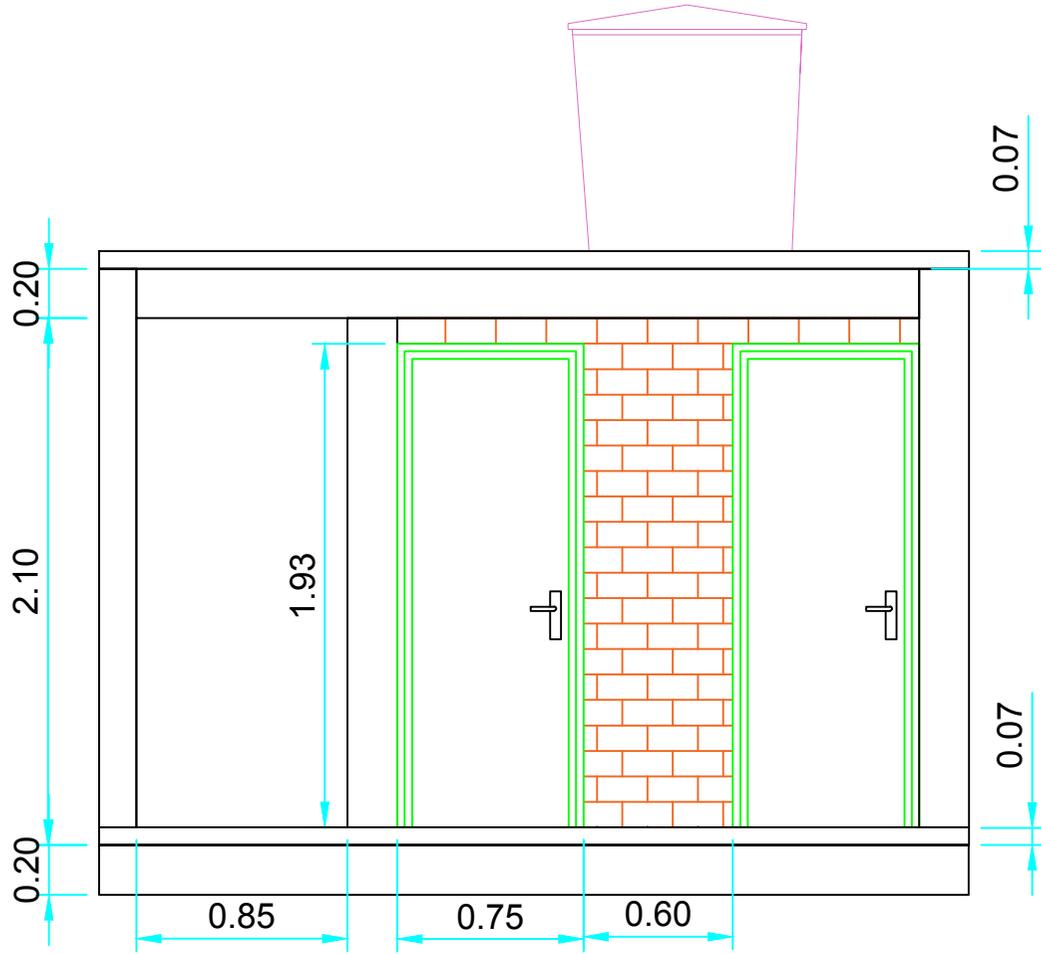


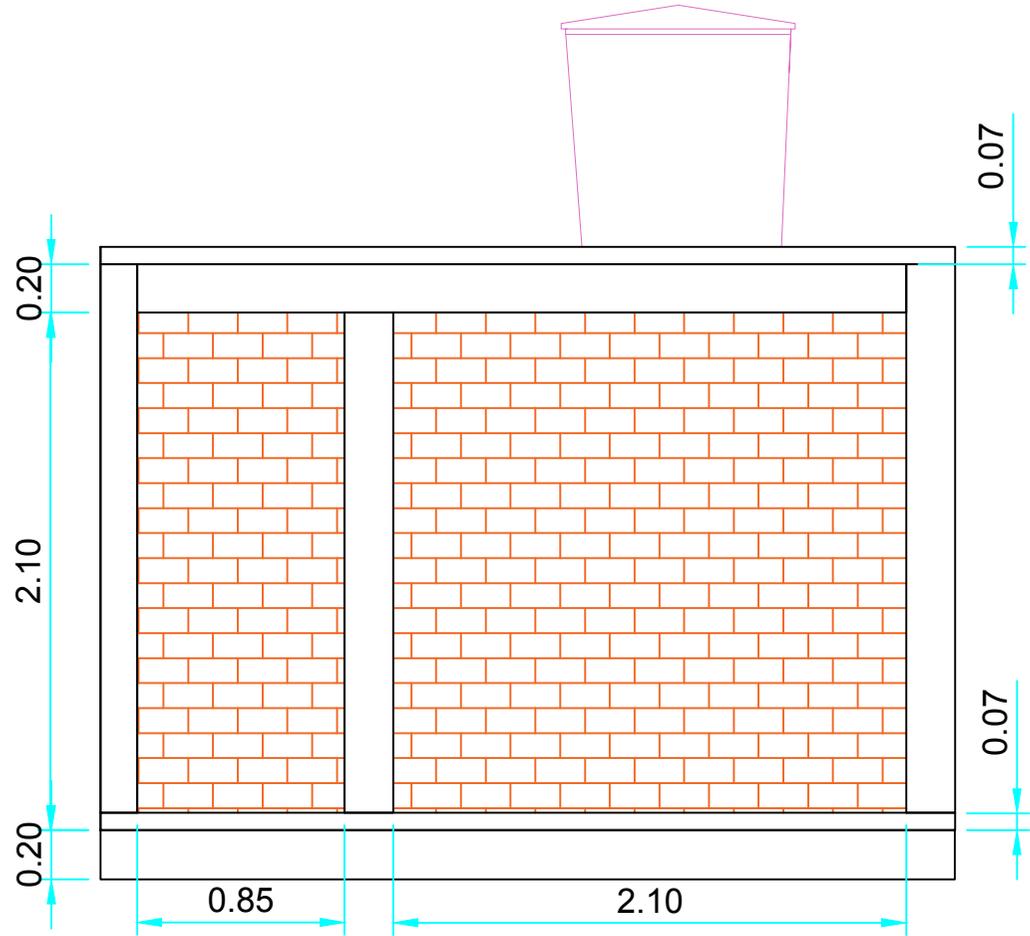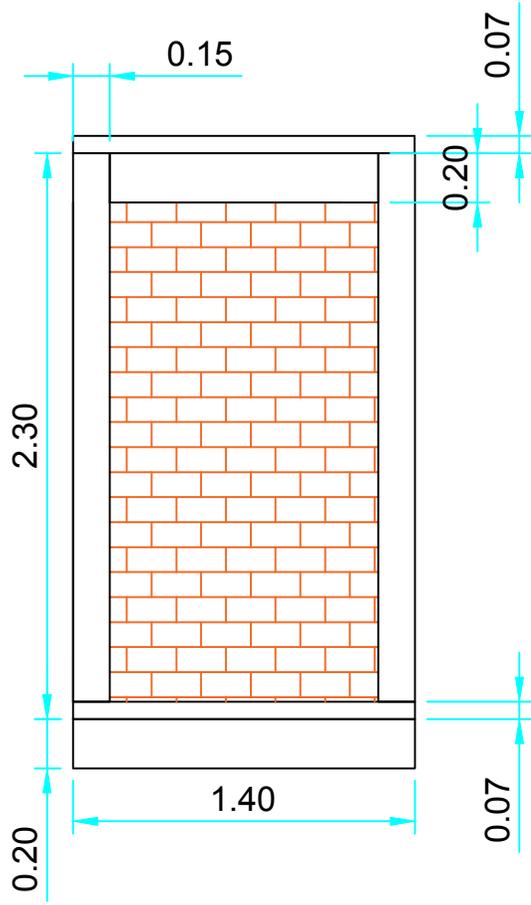


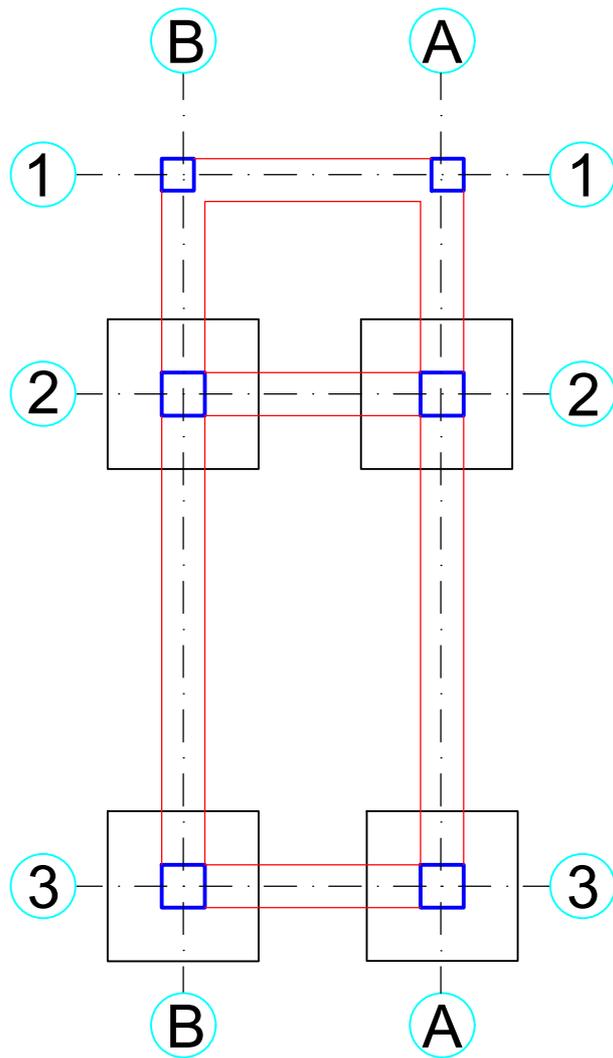



DETALLE VIGAS DE CIMENTACIÓN



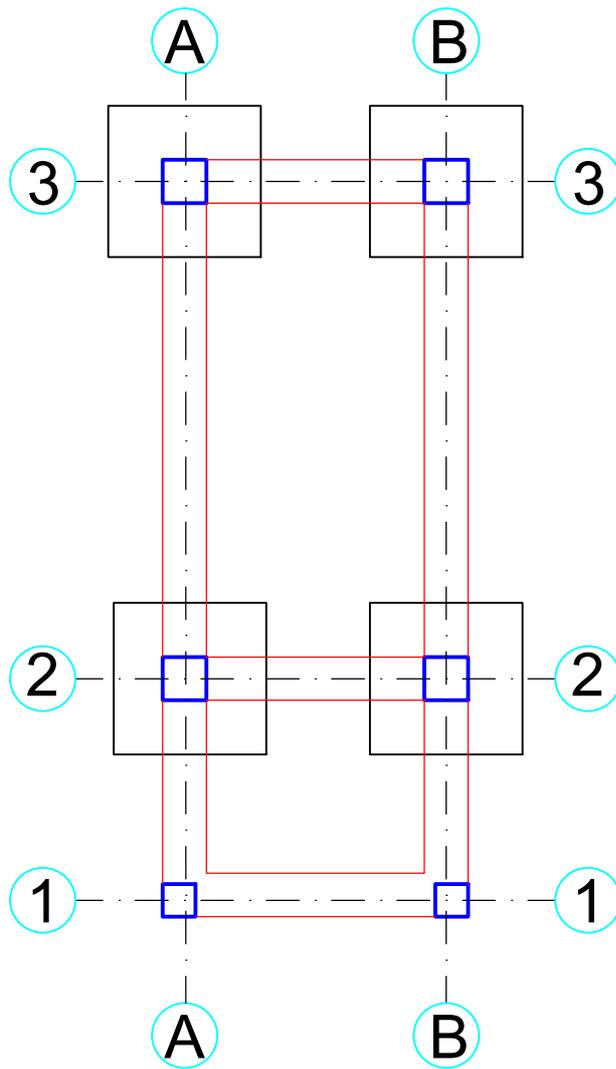



DETALLE VIGAS DE CIMENTACIÓN




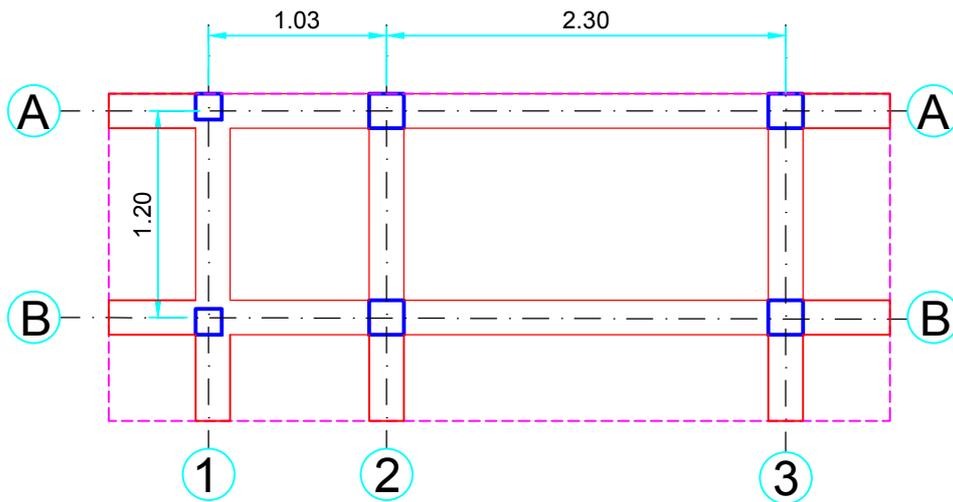



DETALLE VIGAS AEREAS

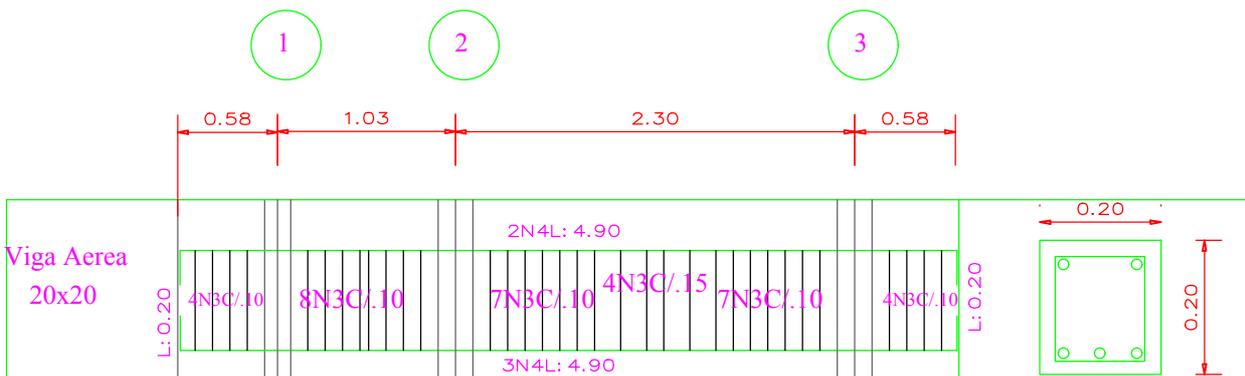

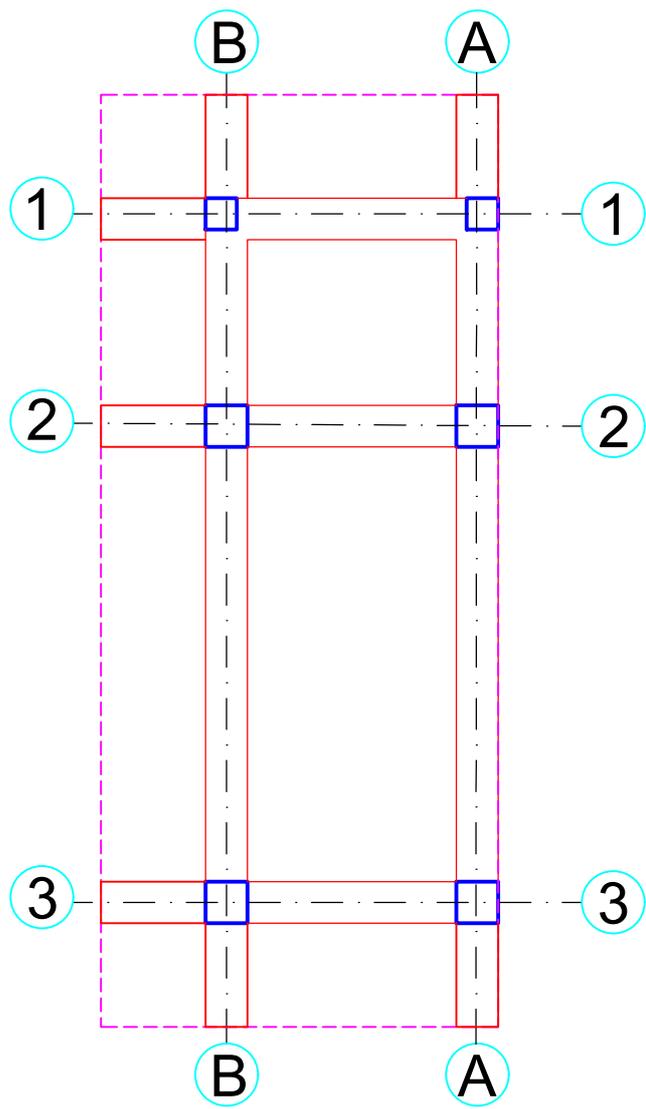



DETALLE VIGAS AEREAS



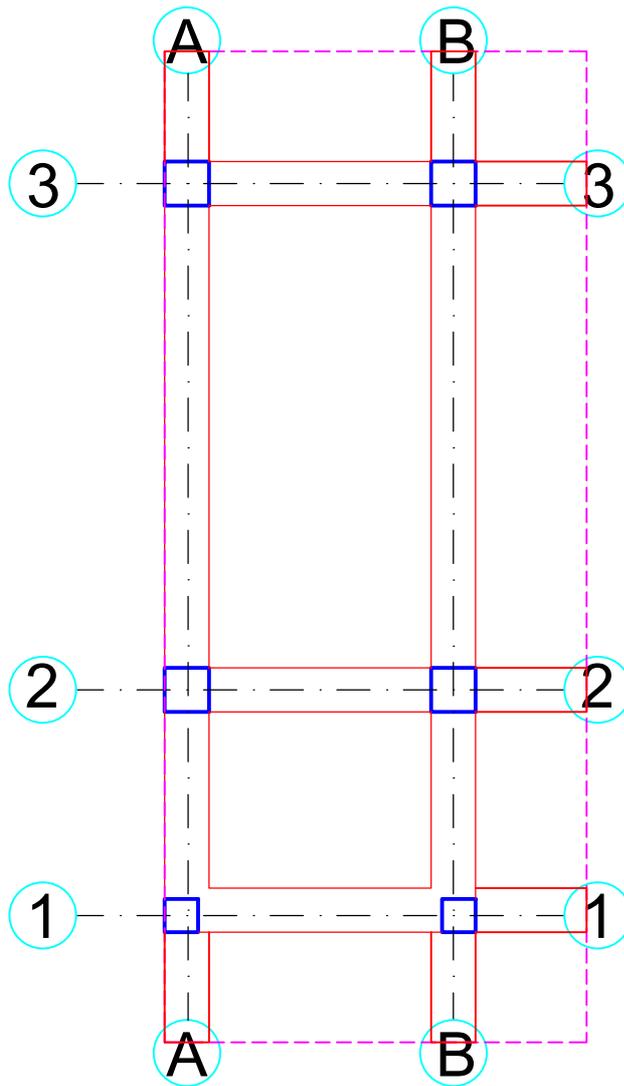

DETALLE VIGAS DE CIMENTACIÓN



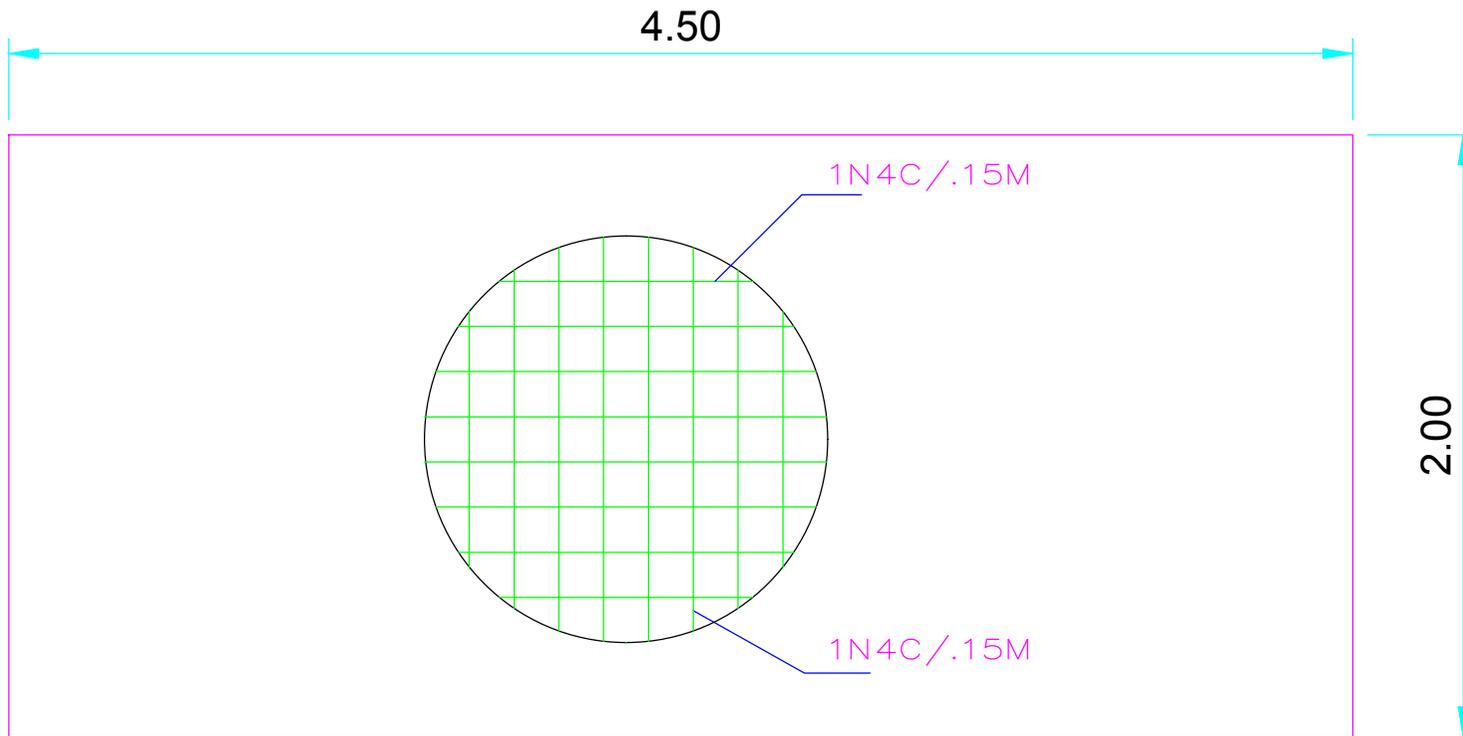

DETALLE PLACA AEREA

CUADRO GENERAL DE ZAPATAS

| ZAPATAS | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|---|-------------------|--|----|--|--|--|----|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | SON | PLANTA | ALZADA | REFUERZO INFERIOR | REFUERZO SUPERIOR | | | | | | | | |
| T-1 | 04 | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">A1</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">A2</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> </table> | A1 | | A2 | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">A1</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">A2</td> </tr> </table> | | A1 | | A2 |
| A1 | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: INCLUIR GANCHOS EN LOS ACEROS DE ZAPATAS L= 15 CM.

NIVELES Y DISTRIBUCION DE FLEJES

COLUMNA TIPO 1 - CANT. 04 un.

DESPIECE

SECCIÓN


N.E+2.37

N.E+0.20

N.E-1.00

2.03
6 E .10
c/c
4 E .10
c/c
6 E .10
c/c
0.20
0.85
12E .10
c/c

.10 .10
2#367 2#367
1.12
.30 .30

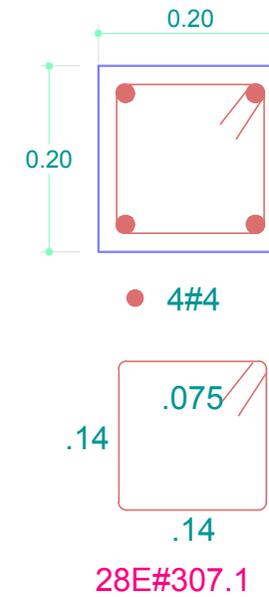

NIVELES Y DISTRIBUCION DE FLEJES

COLUMNETA - CANT. 02 un.

DESPIECE

SECCIÓN

N.E+2.37

N.E+0.20

N.E-1.00

2.03

0.20

0.85

6 E .10
c/c

4 E .10
c/c

6 E .10
c/c

12E .10
c/c

.10

.10


● 2#367

● 2#367


.30

.30

1.12

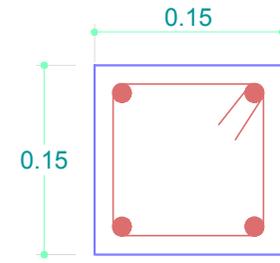

● 4#4




.075


.09


.09

28E#305.1

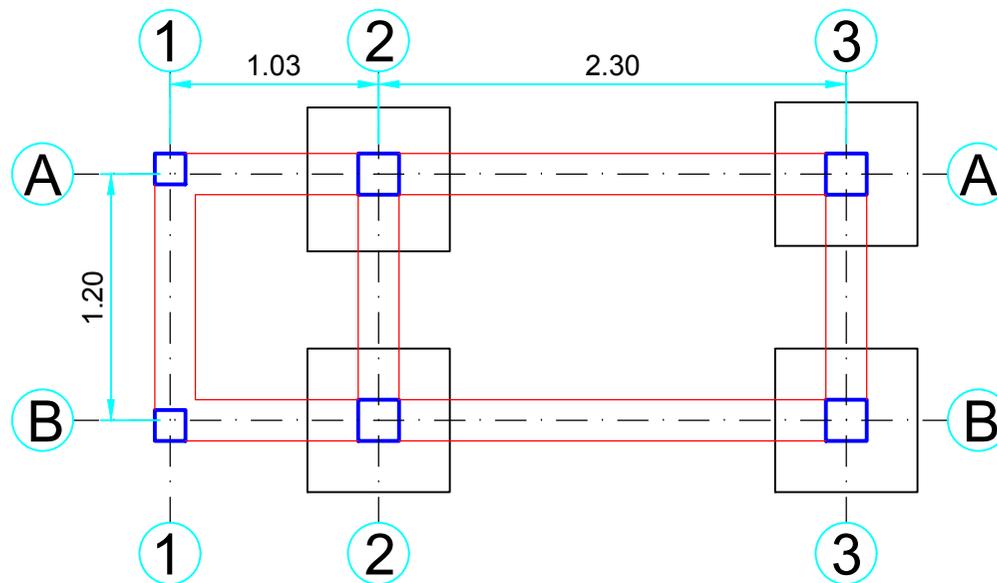

DETALLE VIGAS DE CIMENTACIÓN

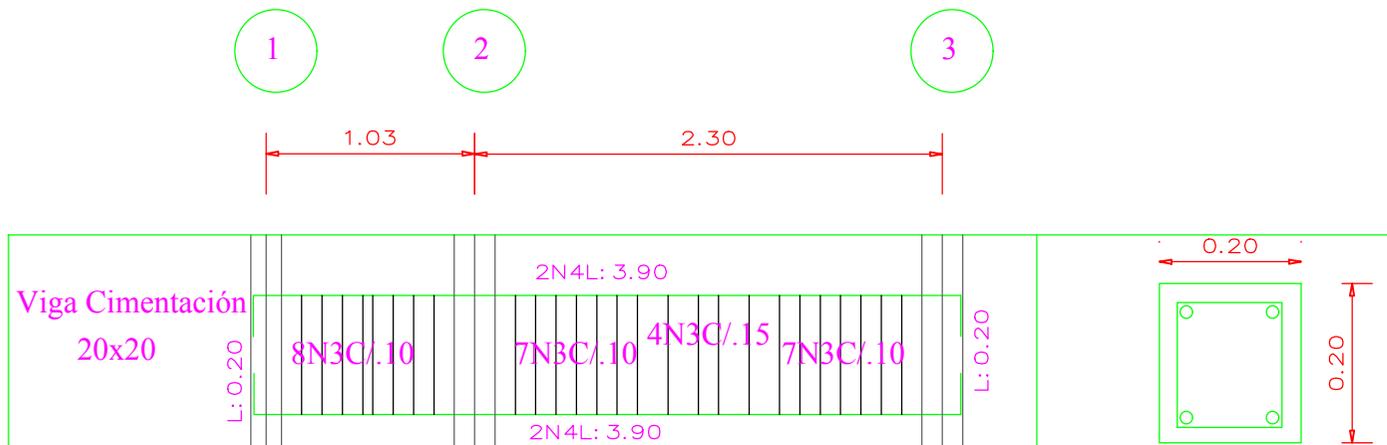

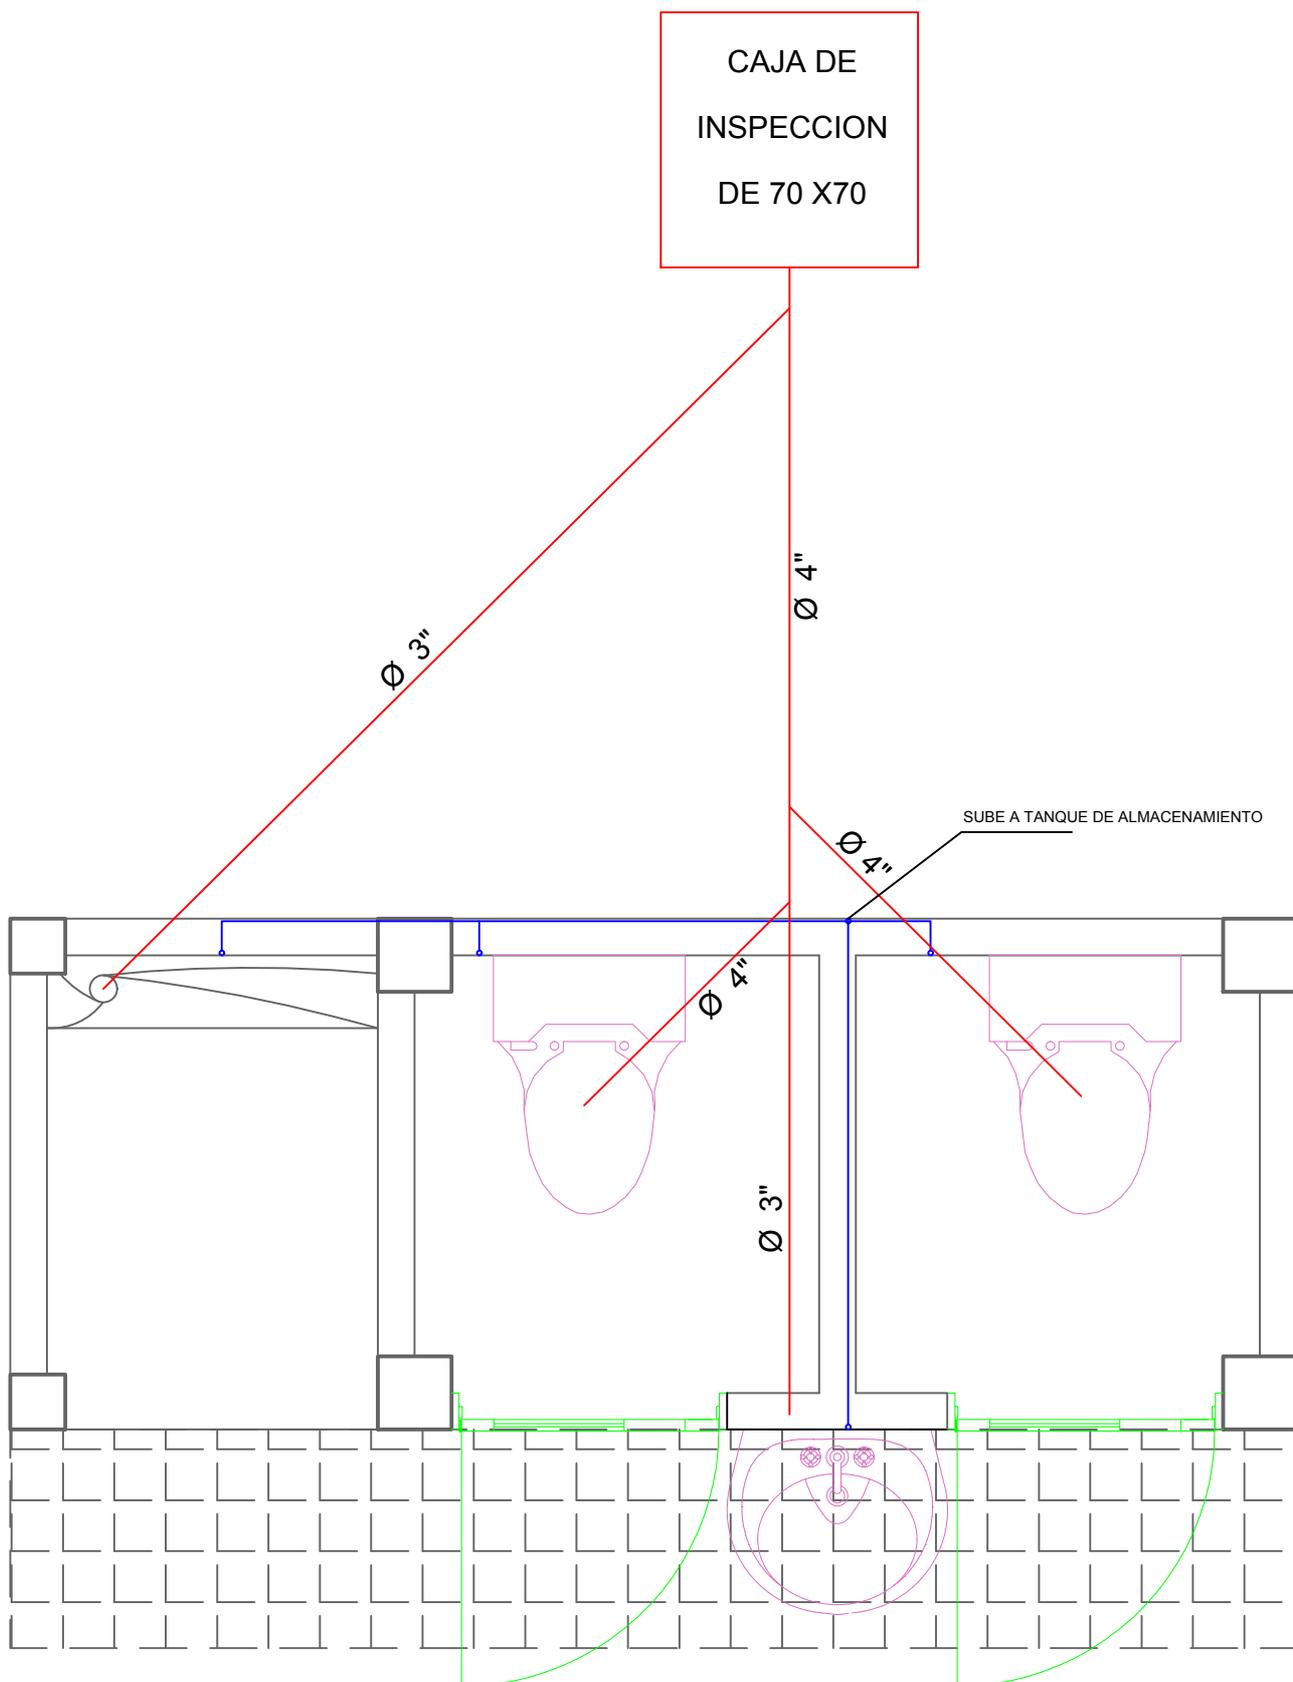

INSTALACIONES HIDRAULICAS EN TUBERIA 1/2"

| | | | | | |
|------------------|-------|---------|------------|-----------|--|
| concreto | | | | | |
| zapatas | 0.49 | 0.49 | | | |
| viga cimentacion | 8.9 | 0.364 | 2.402 | 0.4984 | |
| viga arena | 13.5 | 0.54 | 3.78 | 0.756 | |
| columnas | 3.35 | 0.536 | 3.762 | 0.7504 | |
| columnetas | 3.35 | 0.5075 | 1.05525 | 0.21105 | |
| placa | 0.63 | 0.63 | 4.41 | 0.882 | |
| placa | 0.63 | 0.63 | 4.41 | 0.882 | |
| placa | | | 21.32925 | 4.66385 | |
| asero | | | | | |
| zapatas | 1/2 | 48 | 8 | 1/2 | |
| viga cimentacion | 1/2 | 52.8 | 8.8 | 65.89667 | |
| viga arena | 3/8 | 56 | 9.3333333 | | |
| columnas | 1/2 | 83.5 | 13.92667 | 3.8 | |
| columnetas | 3/8 | 75.6 | 12.6 | 41.533333 | |
| placa | 1/2 | 58.2 | 9.366667 | | |
| placa | 3/8 | 78.4 | 13.066667 | | |
| placa | 1/2 | 79.36 | 14.8933333 | | |
| placa | 3/8 | 39.2 | 6.3333333 | | |
| placa | 1/2 | 123 | 30.5 | | |
| ladrillo | 16.25 | 243.75 | 0.325 | 0.3975 | |
| mortero 1-3 | | | | | |
| plafite | 53.14 | 478.26 | 58.454 | | |
| puertas | 2.85 | 481.385 | 58.3135 | | |
| inodoros | 2 | | | | |
| lavamanos | 1 | | | | |
| tanque | 1 | | | | |
| enchape piso | 9 | | | | |
| pagador | 39.6 | | | | |
| boquilla | 3.96 | | | | |
| pintura | 53.14 | | | | |
| tuberia 3" | 4.1 | | | | |
| tuberia 4" | 3.81 | | | | |
| tuberia 1/2" | 25 | | | | |
| accesorios 3" | u3 | 1 | | | |
| accesorios 4" | u4 | 2 | | | |
| reduccion 4 a 3" | u4 | 2 | | | |
| accesorios 4" | u4 | 2 | | | |
| accesorios 4" | u4 | 1 | | | |
| accesorios 1/2" | u3 | 8 | | | |
| accesorios 1/2" | u3 | 3 | | | |
| accesorios 1/2" | u3 | 3 | | | |
| ornal | 0.18 | 0.27 | 0.252 | 0.3378 | |
| caja inspec | 0.196 | 0.098 | 1.372 | 0.686 | |
| regla 3" | | | 3.507 | 0.7014 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------|---|---|--------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| PRPA GARANTIZADA 2700, 3000 PSI (NO ESPECIFICADO EN PLANOS) | | | | | | | | | |
| VOLUMENES CONCRETO (M3) | | | | | CONCRETO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS (1000 PSI) (ESPESOR 0.05M) | | | | |
| ZAPATAS (4x0.7x0.7x0.25) | 0.49 | PROF. AGR. | 1 M3 | TOTAL M3 (PR DESP) | BULTOS C. | PROF. AGR. | 1 M3 | TOTAL M3 (PR DESP) | BULTOS C. |
| VIGAS CIMENTACION | 0.4 | 1 | Kg C | 300 | 1.44534 | 3 | Kg C | 233.33333 | 24.01 |
| VIGAS ARENAS | 0.552 | 2 | M3 F | 0.84 | 2.1 | 5 | M3 F | 0.9334 | 0.96 |
| COLUMNAS (40x40x2.1) | 0.2048 | 3 | M3 G | 0.84 | 2.75 | | M3 G | 0.9334 | 0.96 |
| COLUMNETAS (20x15x0.15) | 0.09135 | | | | | | | | |
| PLACA CONTRA PISO | 0.63 | | | | | | | | |
| PLACA CUBIERTA | 0.63 | | | | | | | | |
| VOLUMEN TOTAL | 3.11815 | | | | | | | | |
| ACEROS | | | | | | | | | |
| ELEMENTO | LONG. ACERO (M) | NUMERO VARILLAS | ACERO (KG) | SE ASUMEN DIMENSIONES PARA ESTRIBOS (LLEVS) PARA VIGAS DE CIMENTACION Y ARENAS DE (0.147x0.147) M CON GANCHOS DE 0.075 M. NO ESTA ESPECIFICADO EN PLANOS. NO ES POSIBLE DETERMINAR EL ACERO DE REFUERZO PARA PLACA DE CONTRA PISO. ESTA DEBE TENER ACERO DE REFUERZO. HACE Falta Detalle de Refuerzo para Placa de Contrapiso en Planos | | | | | |
| CANASTA ZAPATAS (4) | N#3 | N#4 | N#3 | N#4 | | | | | |
| VIGAS CIMENTACION | 56.8 | 52.8 | 9,46666667 | 8 | 31.808 | 52,4832 | | | |
| VIGAS ARENAS | 79.68 | 83.5 | 13,781 | 13,781 | 42,9408 | 82,209 | | | |
| COLUMNAS (4) | 79.52 | 60 | 13,25333333 | 10 | 44,5312 | 59,64 | | | |
| COLUMNETAS (2) | 28.56 | 30 | 4,76 | 5 | 15,936 | 29,62 | | | |
| PLACA CUBIERTA | | | | | | | | | |
| TOTALES | 243.56 | 309.9 | 40.24 | 66.40 | 135.2736 | 336.9042 | | | |
| PLACA CONTRA PISO 1" | | | | | | | | | |
| TOTAL PLACA CONTRA PISO 1" | 243.56 | 309.9 | 40.24 | 66.40 | 135.2736 | 336.9042 | | | |
| DIMENSIONES BLOQUE (cm) | | | | | | | | | |
| AREA MAMPOSTO M2 | 16.00 | 30 | Largo | PARDELM2 | MORTERO DE PEGA (M3/M2) | MORTERO / M3 | 16.00 M3 (PR DESP) | | |
| ESPEOR | 30 | Equivo | 3,174003175 | 4,851162791 | (MURDO) | 1 | Kg cemento | 450 | M3 F |
| ESPEOR | 30 | Abo | Nº BLOCO | 14,76550916 | 0,011406423 | 3 | M3 F | 1.08 | M3 ARE |
| MORTERO PEGA (m3) | 1.5 | PARETE 32.18 M2 (ESPEOR 0.02 M) | | SE ENTREGA UN COBRO SANITARIO Y UN SANITARIO ADICIONAL, SEGUN PLANOS | | | | | |
| PARTE 12 M3 | 400 | DESPERDICIO DE 10% | | 118.13 | B. CEMENTO | | | | |
| KG CEMENTO | 1.08 | KG CEMENTO | | 0.74 | 1.734029 B. CEM | | | | |
| PUERTAS (M2) | 2.855 | INDICADORES | | 2 | LAVAMANOS | | 1 | TANQUE ALMACENAMIENTO 1 | |
| TOTALES | | | | | | | | | |
| CEMENTO (BULTO 50 KG) | 31,5038845 | DRENA FINA (M3) | | 0.76 | | | | | |
| ARENA (M3) | 2.20 | | | | | | | | |
| GRASA (M3) | 2.26 | | | | | | | | |
| VARILLA N#3 (LIND) | 0 | | | | | | | | |
| VARILLA N#4 (LIND) | 0 | | | | | | | | |
| BLOQUES (80x20x20) CM | 249,41 | | | | | | | | |
| ENCHAPE PISO (M2) | 9 | PLUS ACABADOS DEL ORINAL TIENEN ENCHAPE? | | GUARDIA ESCOBA (ML) | 12.075 | | | | |
| TUBERIA AGUAS NEGRAS | | | | | | | | | |
| TUBERIA 3" (M) | ORINAL | INDICHO 1 | LAVAMANOS | TOTAL | SE HACEN ESTIMACIONES APROXIMADAS DE ACUERDO A ESCALA OBSERVADA DEL PLANO (HACE Falta ACOTAR LAS MEDIDAS EN EL PLANO) | | | | |
| TUBERIA 4" (M) | 3 | 1.5 | 2 | 6.5 | Nº TUBOS (PARE) | | | | |
| TUBERIA 1/2" (M) | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0.75 | | | | |
| TUBERIA SUMINISTRO AGUA | | | | | | | | | |
| LAVAMANOS | INDICHO 1 | ORINAL | TANQUE | TOTAL | SE HACEN ESTIMACIONES APROXIMADAS DE ACUERDO A ESCALA OBSERVADA DEL PLANO (HACE Falta ACOTAR LAS MEDIDAS EN EL PLANO) | | | | |
| TUBERIA 1/2" (M) | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 8.0 | Nº TUBOS (PARE) | | | | |
| TUBERIA 1/2" (M) | | | | | 1.718466667 | | | | |
| AREA INTERNA DE PINTURA (M2) | | | | | | | | | |
| AREA EXTERNA DE PINTURA (M2) | 36.21 | PINTURA INTERIOR (GAL) | | 2.02189312 | | | | | |
| RENDIMIENTO PINTURA (M2/L) | 17,113 | PINTURA EXTERIOR (GAL) | | 0.99057878 | | | | | |
| MANOS DE PINTURA | 2 | | | | | | | | |

NO HAY PLANO ELECTRICO. LOS BAÑOS Y EL ORINAL REQUIEREN DE ILUMINACION ELECTRICA PARA SU PUESTA EN SERVICIO



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DIRECCIÓN DE REPARACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN O DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA ISC A TRAVÉS DEL OPERADOR SPAE
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|--|
| OBJETO: | ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DEL CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD |
| TIPO DE INVERSIÓN: | Suministro de materiales de construcción para infraestructura social comunitaria |
| SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA | Comunidad del consejo comunitario Villa Arboleda, de manera particular los niños y niñas de la escuela del Consejo Comunitario |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL: | Putumayo |
| DEPARTAMENTO: | Putumayo |
| MUNICIPIO: | Valle del Guamuez |
| VEREDA: | |
| FECHA DE ENTREGA: | |
| FECHA DE REVISIÓN: | 14/08/2019 |
| REVISÓ: | Christiam Soto Nuñez |
| ESTADO DEL PROYECTO: | En revisión |

El equipo técnico de la Subdirección de Reparación Colectiva a nivel nacional, procedió a realizar la revisión de la información predial, administrativa y técnica del proyecto entregado por el municipio a la dirección territorial de PUTUMAYO, del proyecto cuyo objeto es "LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DEL CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD".

| CONDICIONES ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO. (Certificaciones entregadas). | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| SOPORTE | APLICA (SÍ / N.A.) | CUMPLE (SÍ / NO) | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | FECHA DE EXPEDICIÓN | OBSERVACIONES | |
| 1 | Formato de estructura técnica – FET completamente diligenciado y suscrito por las partes; sin modificación en la estructura del mismo. | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | PENDIENTE |
| 2 | Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. (ver Anexo - Carta de presentación proyecto ISC) | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 3 | Certificado de tradición y libertad, copia de la escritura del lote y certificado de usos del suelo donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio. Título colectivo para SRC Étnicos | SÍ | SÍ | Alcaldía del Valle del Guamuez | | |
| 4 | Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales, expedido por la Oficina de Planeación Municipal. | N.A. | | Alcaldía del Valle del Guamuez | | |
| 5 | Certificado de disponibilidad de servicios públicos, emitido por el municipio o la empresa de servicios respectiva. | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 6 | Certificación de viabilidad del proyecto, emitida por el municipio. | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 7 | Compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio. | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 8 | Acta de socialización firmada por personas y/o líderes de la comunidad o de las juntas de acción comunal que certifiquen estar de acuerdo con la ejecución del proyecto en las condiciones acordadas y en donde manifiestan su interés de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y mantenimiento periódico de los proyectos según, sea el caso. | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 9 | Censo de población a beneficiar, de acuerdo con el Formato único de Censo, deberá incluir la totalidad de la información solicitada. | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 10 | Certificación de la capacidad del número de personas en función al área (m2) efectiva de uso, la cual debe ser acorde con las cantidades de mobiliario solicitado. | N.A. | | Alcaldía del Valle del Guamuez | | |
| 11 | Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), como soporte de la contrapartida por parte del municipio para la contratación de la totalidad de mano de obra requerida para la ejecución del proyecto. Certificado de ejecución y supervisión de obra para los SRC Étnicos | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 12 | Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), para los casos en los que se requiera realizar la entrega de materiales de construcción y sea necesario contar con transportes adicionales (Inter veredales y/o fluviales); soporte adicional por parte del municipio. Certificación de transportes adicionales para los SRC Étnicos. | N.A. | | Alcaldía del Valle del Guamuez | | |
| 13 | Certificación de que los estudios y diseños que se remiten con el proyecto cumplen con las normas vigentes de construcción (NSR-10 sismo resistencia, agua potable y saneamiento básico, código colombiano de fontanería, instalaciones eléctricas RETIE) y las demás que se consideren. Suscrita por el responsable de los diseños (Ente territorial o diseñadores contratados) | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos. |
| 14 | Planos de localización geográfica del proyecto, diseño arquitectónico y detalles constructivos debidamente firmados, diseños y estudios técnicos que apliquen (estructural, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, ambientales) debidamente firmados, especificaciones técnicas de la construcción, LISTA COMPLETA DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO CONFORME A LA LISTA SPAE 2019, MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES DE OBRA SOLICITADOS, presupuesto detallado debidamente firmado, Análisis de Precios Unitarios - A.P.U. de todos los ítems del proyecto. Los estudios y diseños solicitados deben ser acordes con el alcance técnico del proyecto. | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | No fue enviado plano de localización geográfica del proyecto. La información contenida en planos de diseño no concuerda con cantidades solicitadas. Los planos estructurales no permiten determinar la cantidad total de acero de refuerzo necesario para el proyecto. Hacen falta planos de detalle de la caja de inspección y del orinal. Se debe enviar los planos en formato .dwg para poder hacer su análisis en Software CAD. Revisar observaciones específicas |
| 15 | Para las intervenciones correspondientes a reparaciones o mejoras localivas (obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas). Están incluidas dentro de las reparaciones localivas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas), como mínimo se debe contar con: LISTA COMPLETA DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO CONFORME A LA LISTA SPAE 2019 y las MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES DE OBRA SOLICITADOS. | N.A. | | Alcaldía del Valle del Guamuez | | |
| 16 | CONTRATO DE MANO DE OBRA (Posterior a la aprobación del proyecto por parte de la UARIV) | SÍ | NO | Alcaldía del Valle del Guamuez | | PENDIENTE. No hace parte de la documentación enviada |

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS.

ESTUDIOS Y DISEÑOS: SE RECOMIENDA HACER UNA REVISIÓN RIGUROSA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO, LA PLACA DE CONTRA PISO DEBE CONTAR CON REFUERZO EN ACERO, ESTO NO SE CONTEMPLA EN LOS PLANOS DE DISEÑO ENVIADOS, SIN EMBARGO, SE ASUMIÓ LA MISMA CANTIDAD DE ACERO DE REFUERZO QUE TIENE LA PLACA DE CUBIERTA; PLANOS ELÉCTRICOS: NO HAY PLANO ELÉCTRICO, LOS BAÑOS Y EL ORINAL REQUIEREN DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA SU PUESTA EN SERVICIO (NO SE SOLICITAN INSUMOS PARA MONTAJE ELÉCTRICO: BOMBILLAS, TUBERÍA ELÉCTRICA, CABLES...); ACERO DE REFUERZO: LOS PLANOS DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AERÉAS DEBEN CONTENER LA INFORMACIÓN ACOTADA DE LAS DIMENSIONES DE LOS ESTRIBOS (FLEJES). PARA LA VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE CANTIDADES SE ASUMIERON LAS DIMENSIONES DE ESTRIBO (0,14X0,14) M CON GANCHOS DE 0,075 M; CAJA DE INSPECCIÓN Y ORINAL: NO ES POSIBLE HACER EL CUBICAJE DE MATERIAL PARA LA CAJA DE INSPECCIÓN Y EL ORINAL, LA INFORMACIÓN EN LOS PLANOS ES INSUFICIENTE. ADICIONALMENTE, NO SE ESPECIFICA EN PLANO EL ACERO DE REFUERZO PARA CAJA DE INSPECCIÓN O LA MAMPONERÍA A EMPLEAR; TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS Y DE INSTALACIONES HIDRULICAS: SE HACEN ESTIMACIONES APROXIMADAS DE ACUERDO A ESCALA OBSERVADA DEL PLANO, HACE FALTA ACOTAR LAS MEDIDAS EN EL PLANO. LOS PLANOS PRESENTAN INCONSISTENCIAS Y NO ESTAN ADECUADAMENTE ACOTADOS, SE DEBEN ENVIAR EN FORMATO DWG. PARA SU ANÁLISIS EN SOFTWARE CAD; NO SE SOLICITA CEMENTO, AUNQUE SE CALCULA EN LAS CANTIDADES DE MATERIALES SOLICITADAS PARA EL PROYECTO. **SE RECOMIENDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE CUBIERTA CON UNA PENDIENTE ADECUADA QUE PERMITA EL ESCURRIMIENTO DE AGUA LLUVIA. REVISAR HOJA DE VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

REVISÓ

Aprobado

No Aprobado

En Revisión

Nombres y Apellidos:

Christiam Soto Nuñez

Firma:

ANEXO 9. Anexo 4 de primer informe parcial de práctica

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DIRECCIÓN DE REPARACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA

ESTADO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2019

FECHA: 22/07/2019

| No. | No. | DIRECCIÓN TERRITORIAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VEREDA / CORREGIMIENTO | NOMBRE PROYECTO | LÍNEA | TIPO | PORCENTAJE DE AVANCE DOCUMENTAL | FECHA ESPERADA DE REMISIÓN A SPAE | OBSERVACIONES | COSTO PROYECTO (CON IVA) |
|------|-----|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|--|--|------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| NE2 | 1 | Santander | SANTANDER | Simacota | El Guamo | Adecuación del Puesto de salud El Guamo | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 83,33 | 9/08/2019 | Se realizó visita a Simacota el día 17-JUL-2019 para revisar correcciones con los funcionarios municipales | \$ 41.291.431 |
| NE3 | 2 | Santander | SANTANDER | Simacota | Puerto Nuevo | Construcción de la cubierta de la cancha múltiple del Colegio Agroindustrial de la vereda Puerto Nuevo - Cubierta cancha | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 54,17 | POR DEFINIR | Se realizó visita a Simacota el día 17-JUL-2019 y se asistió a reunión en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el día 18-JUL-2019, para que esta entidad ajuste los estudios y diseños de la cubierta. ES PROBABLE QUE EL PROYECTO QUEDE INVIABLE TÉCNICAMENTE. | \$ 160.658.827 |
| NE4 | 3 | Santander | SANTANDER | Simacota | El Guamo | Construcción de la placa en concreto para la cancha múltiple del colegio El Guamo del Municipio de Simacota Santander | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 83,33 | 2/08/2019 | Se realizó visita a Simacota el día 17-JUL-2019 para revisar correcciones con los funcionarios municipales | \$ 65.503.361 |
| NE7 | 4 | Antioquia | ANTIOQUIA | San Francisco | La Cristalina | Construcción de la cancha Múltiple Los Pocitos - SRC - San Francisco - Predio la Cristalina | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 83,33 | 23/08/2019 | | \$ 103.907.029 |
| NE8 | 5 | Antioquia | ANTIOQUIA | Argelia | | Construcción del Centro de Acopio | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 50,00 | POR DEFINIR | El proyecto se encuentra en su componente técnico a nivel de anteproyecto arquitectónico elaborado por la Universidad San Buenaventura; se están haciendo gestiones para continuar con dicho anteproyecto. ES PROBABLE QUE EL PROYECTO QUEDE INVIABLE TÉCNICAMENTE. | |
| NE10 | 6 | Nariño | NARIÑO | Albán | | Adecuación Parques Infantiles | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 45,83 | POR DEFINIR | Se realizó visita a Albán el 28-MAY-2019; el municipio se comprometió a realizar ajustes a las adecuaciones; ya cuentan con cantidades y les falta la planimetría de los levantamientos realizados. | |
| NE11 | 7 | Antioquia | ANTIOQUIA | Nariño | El Zafiro | Construcción Caseta El Zafiro | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 50,00 | POR DEFINIR | El municipio no está dispuesto a cubrir el transporte adicional de los materiales; se está averiguando si un tercero asumiría este costo. ES PROBABLE QUE EL PROYECTO QUEDE INVIABLE ADMINISTRATIVO y TÉCNICAMENTE. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|--|--|------------|--------|-------------|---|----------------|
| NE12 | 8 | Antioquia | ANTIOQUIA | Granada | | Mejoramiento del Campo Deportivo el Carmelo del municipio de Granada - Antioquia | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 83,33 | 23/08/2019 | | \$ 124.391.596 |
| NE13 | 9 | Santander | SANTANDER | Charalá | | Adecuar Puesto de Salud la Falda | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 83,33 | 23/08/2019 | | \$ 71.552.783 |
| NE15 | 10 | Antioquia | ANTIOQUIA | Cocorná | | Reparar el hogar juvenil campesino | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 54,00 | POR DEFINIR | Se realizó visita a Cocorná el día 28-JUN-2019; el municipio se comprometió a realizar ajustes a las adecuaciones; ya cuentan con cantidades y les falta la planimetría de los levantamientos realizados. | \$ 46.214.260 |
| NE18 | 11 | Putumayo | PUTUMAYO | Valle del Guamuez | | Reparaciones de la oficina de la Inspección de Policía | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 91,67 | 2/08/2019 | | \$ 135.257.615 |
| NE 20 | 12 | Meta y Llanos orientales | META | El Dorado | | Construcción de placa huella | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 91,67 | 2/08/2019 | | \$ 327.875.900 |
| NE 21 | 13 | Putumayo | PUTUMAYO | San Miguel | Puerto Colón | DOTACIÓN DE MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA PUERTO COLON | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 100,00 | 26/07/2019 | | \$ 52.430.319 |
| NE 22 | 14 | Putumayo | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | El Placer | DOTACION DE MOBILIARIO OFICINA INSPECCION DE POLICIA SRC EL PLACER | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 100,00 | 26/07/2019 | | \$ 5.135.177 |
| NE 23 | 15 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Caicedo | | DOTACION MOBILIARIO ASOCIACIONES DE MUJERES SRC PUERTO CAICEDO | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 100,00 | 26/07/2019 | | \$ 48.490.317 |
| NE 24 | 16 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Caicedo | | Dotación de mobiliario para el Centro de Convivencia de Puerto Caicedo | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 100,00 | 26/07/2019 | | \$ 50.223.003 |
| NE 25 | 17 | Antioquia | ANTIOQUIA | Cocorná | | Dotar con mobiliario el hogar juvenil campesino | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 100,00 | 2/08/2019 | Se realizó visita a Cocorná el día 28-JUN-2019. | \$ 46.214.260 |
| NE 26 | 18 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Dabeiba | La Balsita | Adecuación de escuela | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. | |
| NE 27 | 19 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Dabeiba | La Balsita | Adecuación de casetas | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-------------|-----------|----------|----------------------|---|--|------------|-------|-------------|--|
| NE 29 | 20 | SANTANDER | SANTANDER | Simacota | Santa Ana del Olvido | Construcción cubierta cancha Colegio María Auxiliadora | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. Se realizó visita a Simacota el día 17-JUL-2019 y se asistió a reunión en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el día 18-JUL-2019, para que esta entidad aporte los estudios y diseños de la cubierta. ES PROBABLE QUE EL PROYECTO QUEDE INVIABLE TÉCNICAMENTE. |
| NE 30 | 21 | SANTANDER | SANTANDER | Suratá | Turbay y El Mohán | Adecuación de espacio deportivo | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. |
| NE 33 | 22 | VALLE | VALLE | Pradera | Los Pinos | Reconstrucción de dos canchas en el corregimiento de los Pinos | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. |
| NE 34 | 23 | VALLE | VALLE | Pradera | Los Pinos | Construcción salón anexo a caseta comunal | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. |
| NE 35 | 24 | CENTRO | CUNDINAMA | La Palma | Hinche | Adecuación de dos escuelas | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. |
| NE 36 | 25 | VALLE | VALLE | Buga | La Habana | Dotación Bancas Parque | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. |
| NE 37 | 26 | META Y LLAN | CASANARE | Recetor | Managua | Reconstrucción de caseta comunal Vereda Maracagua e instalaciones locativas de la tienda comunitaria de la Asociación de Mujeres | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. |
| NE 38 | 27 | NARIÑO | NARIÑO | Leiva | El Palmar | Adecuación de parques | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | Este proyecto se identificó e ingresó a la matriz de infraestructura la última semana de JUN-2019. |
| E1 | 28 | URABA | CHOCÓ | ACANDÍ | | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 75,00 | 2/08/2019 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------|----------|-------------------|--|---|--|------------|-------|-------------|--|---|
| E2 | 29 | URABA | CHOCÓ | ACANDÍ | | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 75,00 | 2/08/2019 | | ##### |
| E3 | 30 | CHOCÓ | CHOCÓ | BAGADÓ | | Adecuar y dotar 4 (Tambos) colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias del pueblo embera katio, palabreos, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina ancestrales del pueblo katio, reuniones institucionales y demás. Uno (1) en cada una de las cuatro (4) zonas que | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 75,00 | 2/08/2019 | | |
| E4 | 31 | PUTUMAYO | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arboleda. B. Dotación tecnológica de las aulas escolares. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 0,00 | POR DEFINIR | | |
| E8 | 32 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | | Adecuación de bodega y tienda comunitaria en cemento en dimensión 8 x 11 de dos pisos. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | | | | | |
| E9 | 33 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | | Adecuación del local para la recuperación de la panadería comunitaria de la comunidad de Bellavista en cemento de 7 x 11 de 2 pisos con tanque de almacenamiento. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 25,00 | POR DEFINIR | | Estos dos (2) proyectos se integraron en una sola infraestructura, por lo cual fue remitido al equipo transversal el 15-JUL-2019. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-------|--------------|---|--|------------|-------|-------------|--|--|
| E12 | 34 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | Apoyo al mejoramiento y reacondicionamiento de los senderos en palafitos que conectan las casas de la comunidad y el acceso a el centro de salud y las instituciones educativas. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 75,00 | POR DEFINIR | | |
| E13 | 35 | CAUCA | CAUCA | JAMBALÓ | Construcción banco de semillas del Resguardo Jambaló | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 76,19 | POR DEFINIR | | |
| E14 | 36 | CHOCÓ | CHOCÓ | UNGUÍA | Construir y dotar un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como mingas, palabreos, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 91,67 | 2/08/2019 | | |
| E15 | 37 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | Adecuar y dotar, por cada zona, un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas de medicina propia. CAMAIBO (Comunidad de lana) DRUA WANDRA (Comunidad Punto Cedro) ACIRUP(Comunidad Tagua) | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 75,00 | 2/08/2019 | | |
| E16 | 38 | CHOCÓ | CHOCÓ | UNGUÍA | Suministro de materiales para el mejoramiento de puerto de desembarque artesanal de las comunidades de agua. La comunidad se compromete a poner la mano de obra | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 66,67 | POR DEFINIR | | |
| E17 | 39 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | Fortalecer el Comité Dos de Mayo a través de dotación de mobiliario. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|---------|-------------------|--|---|--|------------|----|-----------|--|--|
| E18 | 40 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | MAHATES | | Adecuación, mejoramiento y dotación de mobiliario escolar a favor de los niños , niñas, adolescentes y jóvenes de San Basilio de palenque de la Institución educativa y sus sedes (según reporte secretaria de educación municipal) | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |
| E19 | 41 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | MAHATES | | Mejoramiento de la infraestructura y dotación del jardín comunitario de San Basilio de Palenque, sector La Bonga que permita contar con un lugar que garantice el encuentro comunitario | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |
| E20 | 42 | URABA | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN | | Apoyar la revitalización y dotación de la casa de los ancestros. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |
| E21 | 43 | URABA | CHOCÓ | UNGUÍA | | Dotar con mobiliario comunitario el centro social comunitario con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna. Esta dotación incluirá el manejo necesario para los encuentros comunitarios. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |
| E22 | 44 | CHOCÓ | CHOCÓ | BAGADÓ | | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de la comodidad, y apoyar el fortalecimiento de la construcción de espacio intergeneracionales con fines de recuperar la memoria como pueblo embera katio. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|---|--|------------|----|----------------|--|--|
| E23 | 45 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | | Adecuación y dotación de mobiliario para las casa comunitaria, como aporte al fortalecimiento de la gobernabilidad. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |
| E24 | 46 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | EL BAGRE | | Fortalecer los comités juveniles a través de asistencia / capacitación técnica y dotación en materiales tecnológicos y de comunicaciones. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |
| E25 | 47 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | EL BAGRE | | Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrosa y Villagrande. | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | 9/08/2019 | | |
| OMG1 | 48 | Bolívar | BOLÍVAR | Simití | Monterrey | Suministrar materiales de construcción para la construcción del Hogar Juvenil de Monterrey (Simití-Bolívar) | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MATERIALES | 25 | 26/07/2019 | | |
| OMG1 | 49 | Bolívar | BOLÍVAR | Simití | Monterrey | Dotación de mobiliario para el Hogar Juvenil de Monterrey (Simití-Bolívar) | INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN COLECTIVA | MOBILIARIO | 25 | POR ESTABLECER | Este proyecto se encuentra en estructuración por parte del municipio | |

| ID REVISIÓN | DT | DEPARTAMENTO | MPO | ID SUJETO | NOMBRE SUJETO | ID MEDIDA | MEDIDA | ID ACCIÓN | ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | COSTO PROYECTO (CON IVA) 2018 | COSTO DEFINITIVO (CON IVA) | FECHA DE REMISIÓN A SPAE | FECHA DE ENTREGA (SEGÚN FORMATO) | FECHA DE SUBSANACIÓN | OBSERVACIONES | COSTO NETO | IVA | COSTO TOTAL | | | |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|--|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
| E1 | URABA | CHOCÓ | ACANDÍ | 36 | RESGUARDO CHIDMA TOLÓ - EMBERA KATIOS | 30568 | Restitución | 30969 | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Materiales | \$ 139.134.448 | \$ 183.497.815,10 | | | | 154199847,46 | 29297967,64 | 183497815,10 | | | | |
| E2 | URABA | CHOCÓ | ACANDÍ | 37 | RESGUARDO PESCADITO - EMBERA DOBIDA | 31028 | Restitución | 31027 | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Materiales | \$ 139.134.448 | \$ 183.497.815,10 | | | | 154199847,46 | 29297967,64 | 183497815,10 | | | | |
| E3 | CHOCÓ | CHOCÓ | BAGADÓ | 183 | RESGUARDO INDÍGENA TAHAMI DEL ALTO ANAGÜEDA | 31275 | Restitución | 31293 | Adecuar y dotar 4 (Tambos) colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias del pueblo embera katio, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina ancestrales del pueblo katio, reuniones institucionales y demás. Uno (1) en cada una de las cuatro (4) zonas que conforman el resguardo. | Adecuar y dotar 4 (Tambos) colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias del pueblo embera katio, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina ancestrales del pueblo katio, reuniones institucionales y demás. Uno (1) en cada una de las cuatro (4) zonas que conforman el resguardo. | Materiales | \$ 556.537.798 | \$ 733.991.260,39 | | | | 61679988,84 | 117191870,55 | 733991260,39 | | | | |
| E4 | PUTUMAYO | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUZÉ | 236 | CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLADA | 29815 | Restitución | 29824 | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arbolada. B. Dotación tecnológica de las aulas escolares. | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arbolada. B. Dotación tecnológica de las aulas escolares. | Materiales | | \$ 10.492.986,19 | | | | 8900287,256 | 1592698,94 | 10492986,19 | | | | |
| E5 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 186 | COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA | 30494 | Restitución de capacidades organizativas, comunitarias y políticas. | 30495 | Adecuación de bodega y tienda comunitaria en cemento en dimensión 8 x 11 de dos pisos. | Adecuación de bodega y tienda comunitaria en cemento en dimensión 8 x 11 de dos pisos. | Materiales | | \$ 481.118.731 | | | | | | | | | | |
| E6 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 186 | COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA | 30494 | Restitución de capacidades organizativas, comunitarias y políticas. | 30497 | Adecuación del local para la recuperación de la panadería comunitaria de la comunidad de Bellavista en cemento de 7 x 11 de 2 pisos con tanque de almacenamiento. | Adecuación local para la recuperación de la panadería comunitaria de la comunidad de Bellavista en cemento de 7 x 11 de 2 pisos con tanque de almacenamiento. | Materiales | \$ 481.118.731 | | | | | | | | | | | |
| E7 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGÜÍ | 31223 | Restitución | 31223 | Apoyo al mejoramiento y acondicionamiento de los senderos en pajullos que conectan las casas de la comunidad y el acceso a el centro de salud instituciones educativas. | Apoyo al mejoramiento y acondicionamiento de los senderos en pajullos que conectan las casas de la comunidad y el acceso a el centro de salud instituciones educativas. | Materiales | \$ 190.244.481 | | | | | | | | | | | |
| E8 | CAUCA | CAUCA | JAMBALÓ | 231 | Comunidad indígena Nasa del Resguardo Jambaló | 29721 | Restitución | 29741 | Crear el Banco de semillas propias a través de la investigación y construcción de un invernadero que conserve las propiedades de las semillas que se estaban desapareciendo por la dinámica del conflicto armado. | Construcción banco de semillas del Resguardo Jambaló | Materiales | \$ 4.891.139 | | | | | | | | | | | |
| E9 | CHOCÓ | CHOCÓ | UNGUÍA | 39 | RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS | 28446 | Restitución | 28458 | Construir y dotar un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como rituales, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina propia, reuniones institucionales y demás. | Construir y dotar un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como rituales, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina propia, reuniones institucionales y demás. | Materiales | \$ 139.134.448 | \$ 183.497.815,10 | | | | | | | | | | |
| E10 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 414 | COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA DOBIDA DE BOJAYÁ | 31302 | Restitución | 316 | Adecuar y dotar, por cada zona, un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas de medicina propia. CAMAMBÓ (Comunidad de Inga) DRISA WANDRA (Comunidad Purú Cedro) ACIRUPU(Comunidad Tagua) | Adecuar y dotar, por cada zona, un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas de medicina propia. CAMAMBÓ (Comunidad de Inga) DRISA WANDRA (Comunidad Purú Cedro) ACIRUPU(Comunidad Tagua) | Materiales | \$ 417.403.348 | \$ 550.493.445,29 | | | | 46259942,38 | 87893902,91 | 550493445,29 | | | | |
| E11 | CHOCÓ | CHOCÓ | UNGUÍA | 148 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO - COCOMUNGUÍA | 31202 | Restitución | 31211 | Suministro de materiales para el mejoramiento de puerto de desembargo artesanal de las comunidades de agua. La comunidad se compromete a poner la mano de obra | Suministro de materiales para el mejoramiento de puerto de desembargo artesanal de las comunidades de agua. La comunidad se compromete a poner la mano de obra | Materiales | \$ 137.301.728 | | | | | | | | | | | |
| E12 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 186 | COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA | 30494 | Restitución | 30002 | Fortalecer el Comité Dos de Mayo a través de dotación de mobiliario. | Fortalecer el Comité Dos de Mayo a través de dotación de mobiliario. | Mobiliario | \$ 40.841.280 | \$ 43.561.978,05 | 8/08/2019 | | | 36606703,74 | 6955274,31 | 43561978,05 | | | | |
| E13 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | MAHATES | 125 | PALENQUE DE SAN BASILIO - LA BONGA | 31167 | Restitución | 31169 | Adecuación, mejoramiento y dotación de mobiliario escolar a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de San Basilio de palenque de la Institución educativa y sus sedes (según reporte secretaria de educación municipal) | Adecuación, mejoramiento y dotación de mobiliario escolar a favor de los niños niñas, adolescentes y jóvenes de San Basilio de palenque de la Institución educativa y sus sedes (según reporte secretaria de educación municipal) | Mobiliario | \$ 13.246.146,76 | \$ 6.831.102,52 | 1/08/2019 | | | 5740422,30 | 1095680,22 | 6831102,52 | | | | |
| E14 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | MAHATES | 125 | PALENQUE DE SAN BASILIO - LA BONGA | 31167 | Restitución | 31177 | Mejoramiento de la infraestructura y dotación del jardín comunitario de San Basilio de Palenque, sector La Bonga que permita contar con un lugar que garantice el encuentro comunitario | Mejoramiento de la infraestructura y dotación del jardín comunitario de San Basilio de Palenque, sector La Bonga que permita contar con un lugar que garantice el encuentro comunitario | Mobiliario | \$ 56.788.318,76 | \$ 56.788.318,76 | 1/08/2019 | | | 47721275,68 | 9067043,08 | 56788318,76 | | | | |
| E15 | URABA | CHOCÓ | CARMEN DEL DAKEN | 145 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO SEGUMANDO | 31100 | Satisfacción | 31105 | Apoyar la revitalización y dotación de la casa de los ancestros. | Apoyar la revitalización y dotación de la casa de los ancestros. | Mobiliario | \$ 6.348.291,82 | \$ 7.533.934,25 | 2/08/2019 | | | 6331037,09 | 1202897,16 | 7533934,25 | | | | |
| E16 | URABA | CHOCÓ | UNGUÍA | 146 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO - COCOMUNGUÍA | 31202 | Restitución | 31207 | Dotar con mobiliario comunitario el centro social comunitario con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna. Esta dotación incluirá el manejo necesario para los encuentros comunitarios. | Dotar con mobiliario comunitario el centro social comunitario con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna. Esta dotación incluirá el manejo necesario para los encuentros comunitarios. | Mobiliario | \$ 39.231.871,75 | \$ 40.717.893,75 | 6/08/2019 | | | 34216717,16 | 6501176,59 | 40717893,75 | | | | |
| E17 | CHOCÓ | CHOCÓ | BAGADÓ | 183 | RESGUARDO INDÍGENA TAHAMI DEL ALTO ANAGÜEDA | 31274 | Restitución | 31285 | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de la comodidad, y apoyar el fortalecimiento de la construcción de espacio intergeneracionales con fines de recuperar la memoria como pueblo embera katio. | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de la comodidad, y apoyar el fortalecimiento de la construcción de espacio intergeneracionales con fines de recuperar la memoria como pueblo embera katio. | Mobiliario | \$ 25.511.040,09 | \$ 19.567.474,88 | 2/08/2019 | | | 16443256,32 | 3124218,56 | 19567474,88 | | | | |
| E18 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGÜÍ | 31223 | Restitución | 31224 | Adecuación y dotación de mobiliario para las casa comunitarias, como aporte al fortalecimiento de la gobernabilidad. | Adecuación y dotación de mobiliario para las casa comunitarias, como aporte al fortalecimiento de la gobernabilidad. | Mobiliario | \$ 8.916.788,92 | \$ 11.104.467,26 | 2/08/2019 | | | 9311484,72 | 1772982,54 | 11104467,26 | | | | |
| E19 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 226 | CORREIMIENTO PUERTO LÓPEZ. CONSEJOS COMUNITARIOS DE VILLAGRANDE, CHAPARROSA Y NUEVA ESPERANZA | 31050 | Satisfacción | 31076 | Fortalecer los comités juveniles a través de asistencia / capacitación técnica y dotación en materiales tecnológicos y de comunicaciones | Fortalecer los comités juveniles a través de asistencia / capacitación técnica y dotación en materiales tecnológicos y de comunicaciones | Mobiliario | \$ 3.262.032,74 | \$ 3.214.636,48 | 5/08/2019 | | | 2701375,20 | 513261,28 | 3214636,48 | | | | |
| E20 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 226 | CORREIMIENTO PUERTO LÓPEZ. CONSEJOS COMUNITARIOS DE VILLAGRANDE, CHAPARROSA Y NUEVA ESPERANZA | 31054 | Restitución | 31068 | Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrosa y Villagrande. | Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrosa y Villagrande. | Mobiliario | \$ 23.509.558,48 | \$ 27.970.365,20 | 5/08/2019 | | | 23504508,40 | 4465856,80 | 27970365,20 | | | | |
| E21 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGÜÍ | 31223 | Restitución | 31232 | Suministro material y dotación de dos espacios comunitarios de prácticas culturales, uno para adultos mayores y el otro para las mujeres. | Suministro material y dotación de dos espacios comunitarios de prácticas culturales, uno para adultos mayores y el otro para las mujeres. | Mobiliario | \$ 2.815.579,12 | \$ 2.815.579,12 | 8/08/2019 | | | 2366032,81 | 449546,31 | 2815579,12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 2.425.481.484 | \$ 228.105.750 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|--|-----|---|--|--|-------|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NE 29 | SANTANDER | | | 118 | LA COMUNIDAD DE SIMACOTA SECTOR ALTO | | | 1900 | 21. Desarrollar la instalación de la Unidad de Inmunización múltiple del Colegio María Auxiliadora de la Finca Santa Ana del Cháco. | Cubierta contra Colegio María Auxiliadora | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 30 | SANTANDER | | | 119 | LA COMUNIDAD DE LOS CORRECAMENTOS DE TURKEY Y EL MOHAN | | | 2223 | Solicitar evaluación pre-factible. Realizar obra técnica de arquitectura para construcción de un (1) aula. Realizar diseño y presupuesto. Realizar obra técnica del proyecto y contratación de diseño y ejecución. Solicitar licitaciones y presentar presupuesto. Contratar de arquitectura. Solicitar diseño con licencia. Solicitar contrato de trabajo. Solicitar coordinación y apoyo técnico. Solicitar LUPV. Logística. Ejecución. Inspecciones y entrega de medida a la comunidad (foto, asistencia y registro fotográfico). Construcción comunidad y actividades. | Escuela deportiva | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 31 | BOGOTÁ | | | 167 | COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL PALMAR | | | 2178 | Realización de mejoramiento de la infraestructura y mejoras de San José del Palmar, principalmente en el sistema de drenaje y en las obras de saneamiento y en las obras de saneamiento de la zona. | | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 32 | BOGOTÁ | | | 167 | COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL PALMAR | | | 2181 | Mejoramiento a vivienda | | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 33 | Valle | VALLE | | 231 | ARENILLO - PRADERA | | | 19593 | 1. Realización de la obra comunal del mejoramiento de las Pisos y las canchales deportivos de El Areñillo y Las Pintas, para el fortalecimiento organizacional comunitario. | Canchales los Pinos | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 34 | Valle | VALLE | | 231 | ARENILLO - PRADERA | | | 19594 | 2. Construir un salón anexo a la casa comunal de los Pinos, con su debida licencia, que permita realizar las brigadas de salud, en condiciones de dignidad. | Salón anexo a casa comunal | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 35 | CENTRO | | | 13 | LA COMUNIDAD DE LA VERDEHUELA DE ALTO Y BAJO DEL MUNICIPIO DE LA FLOR | | | 2110 | Gestionar con el SEDNA el programa de "Jóvenes rurales" enfocado en la formación técnica de acuerdo a las necesidades e intereses de los jóvenes de la comunidad. | Revisación de obra escuela | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 36 | VALLE | | | 238 | LA HABANA | | | 2028 | Realizar la obra de construcción de un salón anexo a la casa comunal de la Habana, para el fortalecimiento organizacional comunitario. | Salón anexo a casa comunal | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 37 | META Y LLANOS | | | 20 | RECTOR | | | 3106 | Recuperación organizativa y productiva de las organizaciones. Asociación de Mujeres de Rector. Organización de Mujeres. Recuperación de la venta de Managuas, recuperación y mejoramiento de la venta Managuas LAC de referencia municipal y regional al comité cultural de la zona Managuas. | Recuperación de venta comunal Managuas a las localidades de la zona comunitaria de la Asociación de Mujeres | Materiales | | | | | | | | | | |
| NE 38 | HUASTA | | | 127 | EL PALMAR | | | 2009 | Construcción y mejoramiento del puente de salud del municipio de El Palmar, que sirva a la comunidad. | Reconstrucción de puente | Materiales | | | | | | | | | | |

\$ 1.278.448.876

\$ 726.316.916


| ID REVISIÓN | DT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID SUJETO | NOMBRE SUJETO | ID MEDIDA | MEDIDA | ID ACCIÓN | ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | COSTO PROYECTO (CON IVA) | COSTO PROYECTO (CON IVA) | FECHA DE REMISIÓN A SPAE | OBSERVACIONES | COSTO NETO | IVA | COSTO TOTAL | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--|
| OMG1 | Bolivar | Bolivar | Similiti | 42 | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL HOGAR JUVENIL DE MONTERREY | 654 | 1. Implementar la Estrategia Reparación con sentido del ICBF para 60 NNA del Hogar Juvenil de Monterrey durante primer año de ejecución del plan. A través de tres (03) talleres de formación dirigidos a niñas, niños y adolescentes. | 2463 | 7. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura donde se encuentra ubicado el Hogar Juvenil de Monterrey. - Construcción hogar juvenil | Suministrar materiales de construcción para la construcción del Hogar Juvenil de Monterrey (Similiti-Bolivar) | Materiales | \$ 141.974,726 | \$ 218.427.591 | 2/08/2019 | | 188211101,06 | 30216490,27 | 218427591,33 | |
| OMG2 | Bolivar | Bolivar | Similiti | 42 | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL HOGAR JUVENIL DE MONTERREY | 654 | 1. Implementar la Estrategia Reparación con sentido del ICBF para 60 NNA del Hogar Juvenil de Monterrey durante primer año de ejecución del plan. A través de tres (03) talleres de formación dirigidos a niñas, niños y adolescentes. | 2463 | 7. Gestionar el mobiliario del Hogar Juvenil de Monterrey. - Construcción hogar juvenil | Dotar mobiliario para el Hogar Juvenil de Monterrey (Similiti-Bolivar) | Materiales | \$ 120.574.079 | \$ 105.524.298 | 31/07/2019 | 1. CARTA DE PRESENTACIÓN, EL NÚMERO DE PERSONAS VULNERABLES NO CORRESPONDE FRENTE A LO CONSIGNADO EN FAP. | 88675880,29 | 16848417,36 | 105524297,65 | |
| OMG3 | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | Norte de Santander | CÚCUTA | 316 | LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. | 26455 | Estrategias, planes, programas y acciones de carácter psicológico-político y social dirigidos al restablecimiento de derechos y de las condiciones físicas y psicosociales de los integrantes a la FEDECOMUNAL CÚCUTA. | 26456 | Construcción de las instalaciones de la "SEDE FEDECOMUNAL CÚCUTA", en la que se requiere que sea estructuralmente de dos plantas, con capacidad funcional de 10 salones para la formación de sus afiliados, 5 oficinas directivas, salón de juntas con capacidad para 400 personas para los asambleos y reuniones de junta directivas, con dotación y destinación de recursos definidos para garantizar el mantenimiento de la sede y del centro de desarrollo y de memoria histórica comunal (y dotación de mobiliario. (Adecuación) | Suministrar materiales de construcción para la adecuación del auditorio para las Juntas de Acción Comunal de San José de Cúcuta. Centro Comercial las Mercedes | Materiales | | | | | | | | |
| OMG4 | Central | Bogotá D.C. | Bogotá | 263 | Grupo Distal al Auto 092 | 27678 | Recuperación de un espacio físico para el desarrollo de las acciones colectivas del grupo, en propiedad e comodato y dotación del mismo | 27679 | Adquisición, dotación y adecuación de un espacio físico para el desarrollo de las actividades psicosociales, políticas, culturales y de liderazgo del Grupo Distal. | Dotación de mobiliario para la oficina del Auto 092 para el desarrollo de sus funciones. | Mobiliario | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ | 262.548.805 | \$ 323.951.889 | | | | | |

ANEXO 10. Segundo informe parcial de práctica

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE PASANTÍA EN LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

| | |
|--|--|
| Nombres completo del practicante | Jairo Alonso Segura Pulido |
| Documento de identidad del practicante | 1023917216 |
| Institución de Educación Superior | Universidad Antonio Nariño |
| Programa académico | Ingeniería Civil |
| Entidad pública donde desarrolla la práctica | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas |
| Caja de Compensación Familiar | Compensar |
| Objetivo general de la práctica | Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad |
| Duración de la práctica | (5) meses |
| Número de informe | 2 |

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|---------------|
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 50 % | Asistencia a reunión de equipo de trabajo con objeto de establecer acciones de mejora continua | ANEXO 1 |
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 36,84 % | Archivo .xlsx con la determinación de localización geográfica (coordenadas geográficas) de Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas de Colombia | ANEXO 2 |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 36,84 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval de ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXO 3 |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 36,84 % | Formato para la evaluación de oferentes de proceso contractual en concurso de méritos y formato para el registro del consolidado histórico de costos definitivos de proyectos con Aval de ejecución (vigencias 2013 a 2019) | ANEXO 4 |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 36,84 % | Archivos .xlsx con verificación técnica de requerimientos para el aval de ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria | ANEXO 3 |




| | | | |
|--|-----|--|---------|
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 50% | Asistencia a capacitación sobre Modelo de Reparación Colectiva | ANEXO 5 |
|--|-----|--|---------|

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA

| ITEM | ACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MESES Y SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|--|--|--|--|
| | | | Meses del año 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | | | | |
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | |
| 1 | Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

APRUEBAN


JUANITA IBAÑEZ SANTAMARIA
 TUTOR DE PRÁCTICA
 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
 INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS


ALEXANDRA MORALES
 SUPERVISOR DE PRÁCTICA
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO


JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO
 PRACTICANTE
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ANEXO 11. Anexo 1 de segundo informe parcial de práctica



El futuro es de todos

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: 710.14.15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 03

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SIG

Fecha: 16/09/2019

Página 2 de 2

No. de Acta:

Objetivo: Reunión equipo proyectos y Financiere

Fecha de Reunión: 16/09/2019

CAPACITACION HERPARENTA MARTIV,

| No. | Nombre | * Género M/F | ** Etnia A/I/G/NA | Entidad o Dependencia | E-mail | Teléfono | Firma |
|-----|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------|-------|
| 1 | Nelson Meze | M | N/A | SRC | nelson.meze | 4252 | |
| 2 | Tara A. Segura P. | M | N/A | SRC | jairo.segura | 3124703981 | |
| 3 | José Claudio | M | N/A | SRC | José Claudio | 3002100000 | |
| 4 | Diana Quijano | F | N/A | SRC | diana.quijano | 3104799188 | |
| 5 | Mónica Quintal | F | NA | SRC | montecito | — | |
| 6 | Yamile Jaques L. | F | NA | SRC | yamilejaques | 300180110 | |
| 7 | Christian Soto Niz | M | N.A. | SRC | christiansoto | 2240 | |
| 8 | Zamira Reina | F | A | SRC | Zamira.reina | 4237 | |
| 9 | Juan Pablo Urrego | M | N/A | SRC | Juan.urrego | — | |
| 10 | José Iván Acero | M | N/A | SRC | Jose.acero | — | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

* Género: M: Masculino / F: Femenino

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA: No aplica

ANEXO 12. Anexo 2 de segundo informe parcial de práctica

| NOMBRE_CONSEJO COMUNITARIO | LONG | LAT | LATITUD | | | LONGITUD | | |
|---|------------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | | | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
| PORCE MEDIO | -74,89932 | 7,323261 | 7 | 19 | 23,7396 | -74 | -53 | -57,552 |
| DOS BOCAS | -77,225448 | 7,10232 | 7 | 6 | 8,352 | -77 | -13 | -31,6128 |
| TIERRA BAJA | -75,475252 | 10,489819 | 10 | 29 | 23,3484 | -75 | -28 | -30,9072 |
| PREDIO EL CARMEN | -72,992873 | 11,109996 | 11 | 6 | 35,9856 | -72 | -59 | -34,3428 |
| TURRIQUITADÓ | -76,833623 | 6,895424 | 6 | 53 | 43,5264 | -76 | -50 | -1,0428 |
| BELLAVISTA | -76,905679 | 3,618728 | 3 | 37 | 7,4208 | -76 | -54 | -20,4444 |
| CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO | -76,898254 | 3,840105 | 3 | 50 | 24,378 | -76 | -53 | -53,7144 |
| CAÑO DEL ORO | -75,550588 | 10,343795 | 10 | 20 | 37,662 | -75 | -33 | -2,1168 |
| SAN JOAQUIN AGUA DULCE | -77,110187 | 3,898367 | 3 | 53 | 54,1212 | -77 | -6 | -36,6732 |
| GUAYABAL | -76,628478 | 5,743007 | 5 | 44 | 34,8252 | -76 | -37 | -42,5208 |
| EL BIEN DEL FUTURO | -78,1872 | 1,687442 | 1 | 41 | 14,7912 | -78 | -11 | -13,92 |
| VILLA GRANDE | -74,703806 | 7,532319 | 7 | 31 | 56,3484 | -74 | -42 | -13,7016 |
| PUERTO ECHEVERRY | -76,974273 | 5,32283 | 5 | 19 | 22,188 | -76 | -58 | -27,3828 |
| AGRICULTORES DEL PATÍA GRANDE | -78,430857 | 1,951285 | 1 | 57 | 4,626 | -78 | -25 | -51,0852 |
| UNIÓN RÍO ROSARÍO | -78,592241 | 1,622948 | 1 | 37 | 22,6128 | -78 | -35 | -32,0676 |
| EL PLAYÓN DEL RÍO SIGUÍ | -77,013979 | 2,882477 | 2 | 52 | 56,9172 | -77 | 0 | -50,3244 |
| LA CUENCA DEL RÍO SAN BERNARDO PATÍA NORTE | -77,327944 | 2,66484 | 2 | 39 | 53,424 | -77 | -19 | -40,5984 |
| PRO-DEFENSA DEL RÍO TAPAJE | -78,002352 | 2,157156 | 2 | 9 | 25,7616 | -78 | 0 | -8,4672 |
| LA NUPA DEL RÍO CAUNAPÍ | -78,608354 | 1,448082 | 1 | 26 | 53,0952 | -78 | -36 | -30,0744 |
| SAN NICOLÁS | -75,820928 | 6,475396 | 6 | 28 | 31,4256 | -75 | -49 | -15,3408 |
| UNIÓN DE CUENCAS DE ISAGUALPI | -78,350274 | 1,646871 | 1 | 38 | 48,7356 | -78 | -21 | -0,9864 |
| ALTO ANCHICAYA | -76,869537 | 3,612194 | 3 | 36 | 43,8984 | -76 | -52 | -10,3332 |
| MAYOR DE NÓVITA | -76,456989 | 4,936663 | 4 | 56 | 11,9868 | -76 | -27 | -25,1604 |
| RESCATE LAS VARAS | -78,691933 | 1,721167 | 1 | 43 | 16,2012 | -78 | -41 | -30,9588 |
| BOCAS DE ATRATO Y LEONCITO | -76,937768 | 7,954546 | 7 | 57 | 16,3656 | -76 | -56 | -15,9648 |
| LA GRAN UNION DEL RIO TELPI | -78,070467 | 1,589761 | 1 | 35 | 23,1396 | -78 | -4 | -13,6812 |
| RÍO BAUDÓ ACABA | -76,993033 | 5,242043 | 5 | 14 | 31,3548 | -76 | -59 | -34,9188 |
| UNIÓN PATÍA VIEJO | -78,276984 | 2,019983 | 2 | 1 | 11,9388 | -78 | -16 | -37,1424 |
| PARTE BAJA DEL RÍO SAJIA | -77,600622 | 2,855512 | 2 | 51 | 19,8432 | -77 | -36 | -2,2392 |
| NEGROS EN ACCIÓN | -77,587988 | 2,744762 | 2 | 44 | 41,1432 | -77 | -35 | -16,7568 |
| LOS RÍOS LA LARGA Y TUMARADÓ | -76,937187 | 7,494718 | 7 | 29 | 40,9848 | -76 | -56 | -13,8732 |
| LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO COPDICONC | -77,498065 | 2,034269 | 2 | 2 | 3,3684 | -77 | -29 | -53,034 |
| RÍO SAN FRANCISCO | -77,559738 | 2,389177 | 2 | 23 | 21,0372 | -77 | -33 | -35,0568 |
| MANOS AMIGAS DEL PATÍA GRANDE | -77,982629 | 1,904587 | 1 | 54 | 16,5132 | -77 | -58 | -57,4644 |
| CONCEJO COMUNITARIO LA BARRA | -77,392425 | 4,001607 | 4 | 0 | 5,7852 | -77 | -23 | -32,73 |
| RÍO RAPOSO | -77,075398 | 3,656488 | 3 | 39 | 23,3568 | -77 | -4 | -31,4328 |
| BAJO Potedó | -77,062982 | 3,790983 | 3 | 47 | 27,5388 | -77 | -3 | -46,7352 |
| PEDEGUITA Y MANCILLA | -77,011656 | 7,309205 | 7 | 18 | 33,138 | -77 | 0 | -41,9616 |
| IYE PINTO | -72,97787 | 11,130361 | 11 | 7 | 49,2996 | -72 | -58 | -40,332 |
| LA NUEVA ESPERANZA | -78,022807 | 1,415251 | 1 | 24 | 54,9036 | -78 | -1 | -22,1052 |
| ACADESÁN | -76,780097 | 4,459996 | 4 | 27 | 35,9856 | -76 | -46 | -48,3492 |
| MAKANKAMANA | -75,196545 | 10,082488 | 10 | 4 | 56,9568 | -75 | -11 | -47,562 |
| EL PROGRESO DEL RÍO NERETE | -78,205355 | 2,373378 | 2 | 22 | 24,1608 | -78 | -12 | -19,278 |
| CATANGUEROS | -78,343956 | 1,843946 | 1 | 50 | 38,2056 | -78 | -20 | -38,2416 |
| EL PROGRESO DEL CAMPO | -78,178762 | 2,24193 | 2 | 14 | 30,948 | -78 | -10 | -43,5432 |
| BELLAVISTA DUBAZA | -77,018198 | 5,308814 | 5 | 18 | 31,7304 | -77 | -1 | -5,5128 |
| LA GRANDE | -76,836811 | 7,028795 | 7 | 1 | 43,662 | -76 | -50 | -12,5196 |
| GUAPÍ ABAJO | -77,8423 | 2,474282 | 2 | 28 | 27,4152 | -77 | -50 | -32,28 |
| CUPICA | -77,392008 | 6,750946 | 6 | 45 | 3,4056 | -77 | -23 | -31,2288 |
| ZACARIAS RÍO DAGUA | -77,000986 | 3,822034 | 3 | 49 | 19,3224 | -77 | 0 | -3,5496 |
| GAMBOA | -77,007891 | 3,915643 | 3 | 54 | 56,3148 | -77 | 0 | -28,4076 |
| CÉRTEGUI | -76,56103 | 5,373646 | 5 | 22 | 25,1256 | -76 | -33 | -39,708 |
| NUEVA ALIANZA | -78,023735 | 1,68879 | 1 | 41 | 19,644 | -78 | -1 | -25,446 |
| AGUA CLARA | -76,873689 | 3,659515 | 3 | 39 | 34,254 | -76 | -52 | -25,2804 |
| CALLE LARGA RÍO DAGUA | -76,961328 | 3,821736 | 3 | 49 | 18,2496 | -76 | -57 | -40,7808 |
| MALAGUITA BAJO SAN JUAN | -77,222305 | 4,143559 | 4 | 8 | 36,8124 | -77 | -13 | -20,298 |
| PAIMADÓ | -76,726772 | 5,472023 | 5 | 28 | 19,2828 | -76 | -43 | -36,3792 |
| PIEDRAS BACHICHI | -76,133891 | 5,345771 | 5 | 20 | 44,7756 | -76 | -8 | -2,0076 |
| RENACER TELEMBI | -78,119327 | 1,710248 | 1 | 42 | 36,8928 | -78 | -7 | -9,5772 |
| MAYOR DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO DAGUA | -76,800614 | 3,841395 | 3 | 50 | 29,022 | -76 | -48 | -2,2104 |
| VILLA MARÍA DE PURRICHÁ | -77,276442 | 5,163914 | 5 | 9 | 50,0904 | -77 | -16 | -35,1912 |
| BRAZITOS Y AMAZONAS | -77,13116 | 3,730708 | 3 | 43 | 50,5488 | -77 | -7 | -52,176 |
| TABLÓN SALADO | -78,525949 | 1,760464 | 1 | 45 | 37,6704 | -78 | -31 | -33,4164 |
| CABECERAS RÍO SAN JUAN | -77,273471 | 4,219601 | 4 | 13 | 10,5636 | -77 | -16 | -24,4956 |
| RÍO CURVARADÓ | -76,846034 | 7,219307 | 7 | 13 | 9,5052 | -76 | -50 | -45,7224 |
| MANATÍES | -76,851877 | 7,835405 | 7 | 50 | 7,458 | -76 | -51 | -6,7572 |
| UNICOSTA | -77,983868 | 2,530259 | 2 | 31 | 48,9324 | -77 | -59 | -1,9248 |
| MAYOR DEL MUNICIPIO DE CONDOTO E IRÓ | -76,475312 | 5,121893 | 5 | 7 | 18,8148 | -76 | -28 | -31,1232 |
| GENERAL DE LA COSTA PACÍFICA DEL NORTE - LOS DELFINES | -77,488887 | 6,546396 | 6 | 32 | 47,0256 | -77 | -29 | -19,9932 |
| RÍO MONTAÑO | -76,968814 | 6,922349 | 6 | 55 | 20,4564 | -76 | -58 | -7,7304 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----|----|---------|-----|-----|----------|
| MAYOR DEL CANTÓN SAN PABLO "ACISANP" | -76,762356 | 5,365523 | 5 | 21 | 55,8828 | -76 | -45 | -44,4816 |
| UNION RIO CAUNAPI | -78,675796 | 1,595501 | 1 | 35 | 43,8036 | -78 | -40 | -32,8656 |
| SAN MARCOS | -76,913687 | 3,71536 | 3 | 42 | 55,296 | -76 | -54 | -49,2732 |
| BOCAS DE TAPARAL | -77,264898 | 7,048165 | 7 | 2 | 53,394 | -77 | -15 | -53,6328 |
| TAPARAL | -77,066299 | 3,770527 | 3 | 46 | 13,8972 | -77 | -3 | -58,6764 |
| APARTADÓ BUENAVISTA | -77,121631 | 7,005483 | 7 | 0 | 19,7388 | -77 | -7 | -17,8716 |
| CONCOARAPIOS | -76,006663 | 8,214812 | 8 | 12 | 53,3232 | -76 | 0 | -23,9868 |
| VIRUDÓ | -77,372199 | 5,40726 | 5 | 24 | 26,136 | -77 | -22 | -19,9164 |
| LA GRAN MINGA DE LOS RÍOS INGUAMBÍ Y ALBÍ | -78,243245 | 1,642706 | 1 | 38 | 33,7416 | -78 | -14 | -35,682 |
| CAMPO HERMOSO | -77,029617 | 3,824545 | 3 | 49 | 28,362 | -77 | -1 | -46,6212 |
| SAN JOC PARTE ALTA DEL RÍO MICAY | -77,243134 | 2,783256 | 2 | 46 | 59,7216 | -77 | -14 | -35,2824 |
| TRUANDÓ MEDIO | -77,452668 | 6,948181 | 6 | 56 | 53,4516 | -77 | -27 | -9,6048 |
| CAÑO BODEGAS | -74,195841 | 6,938623 | 6 | 56 | 19,0428 | -74 | -11 | -45,0276 |
| PUEBLO NUEVO | -74,900991 | 7,44915 | 7 | 26 | 56,94 | -74 | -54 | -3,5676 |
| IMBILPÍ DEL CARMEN | -78,537097 | 1,716594 | 1 | 42 | 59,7384 | -78 | -32 | -13,5492 |
| BAHÍA MÁLAGA -LA PLATA | -77,171337 | 4,001611 | 4 | 0 | 5,7996 | -77 | -10 | -16,8132 |
| LA AMISTAD | -78,021965 | 1,782325 | 1 | 46 | 56,37 | -78 | -1 | -19,074 |
| CHICAO | -77,121381 | 6,872942 | 6 | 52 | 22,5912 | -77 | -7 | -16,9716 |
| MAYOR DEL BAJO ATRATO | -77,011071 | 8,063643 | 8 | 3 | 49,1148 | -77 | 0 | -39,8556 |
| TABLÓN DULCE | -78,514927 | 1,730378 | 1 | 43 | 49,3608 | -78 | -30 | -53,7372 |
| C.C. BRISAS DEL ALTO TELEMBI | -77,823043 | 1,719701 | 1 | 43 | 10,9236 | -77 | -49 | -22,9548 |
| EL CUERVAL | -77,755778 | 2,722354 | 2 | 43 | 20,4744 | -77 | -45 | -20,8008 |
| UNIÓN BAJO RÍO GUELMAMBÍ | -78,185617 | 1,608889 | 1 | 36 | 32,0004 | -78 | -11 | -8,2212 |
| LIBERACION Y FUTURO | -77,155163 | 0,495491 | 0 | 29 | 43,7676 | -77 | -9 | -18,5868 |
| DE ALTO RIO DAGUA | -76,790735 | 3,773567 | 3 | 46 | 24,8412 | -76 | -47 | -26,646 |
| GUALMAR | -78,247562 | 2,416764 | 2 | 25 | 0,3504 | -78 | -14 | -51,2232 |
| VEREDAS UNIDAS | -78,545752 | 2,357296 | 2 | 21 | 26,2656 | -78 | -32 | -44,7072 |
| CITRONELA RÍO DAGUA | -76,948959 | 3,84352 | 3 | 50 | 36,672 | -76 | -56 | -56,2524 |
| PORTE ALTA SUR DEL RÍO SAIJA | -77,430309 | 2,670157 | 2 | 40 | 12,5652 | -77 | -25 | -49,1124 |
| CASIMIRO | -76,648518 | 5,722707 | 5 | 43 | 21,7452 | -76 | -38 | -54,6648 |
| MAYOR DE UNIÓN PANAMERICANA | -76,643116 | 5,269936 | 5 | 16 | 11,7696 | -76 | -38 | -35,2176 |
| LA ESPERANZA DEL RÍO LA TOLA | -78,173057 | 2,364478 | 2 | 21 | 52,1208 | -78 | -10 | -23,0052 |
| CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLOORO | -76,488267 | 5,523949 | 5 | 31 | 26,2164 | -76 | -29 | -17,7612 |
| LA BREA | -76,95099 | 3,9356 | 3 | 56 | 8,16 | -76 | -57 | -3,564 |
| GUAIMÍA | -76,897826 | 3,730242 | 3 | 43 | 48,8712 | -76 | -53 | -52,1736 |
| EL AGUACATE | -74,907118 | 7,409452 | 7 | 24 | 34,0272 | -74 | -54 | -25,6248 |
| LA VOZ DE LOS NEGROS | -78,191936 | 1,841323 | 1 | 50 | 28,7628 | -78 | -11 | -30,9696 |
| LOS ANDES | -76,737966 | 0,509756 | 0 | 30 | 35,1216 | -76 | -44 | -16,6776 |
| LOS MANGOS | -76,844832 | 7,755074 | 7 | 45 | 18,2664 | -76 | -50 | -41,3952 |
| RECUERDO DE NUESTROS ANCESTROS DEL RÍO MEJICAN | -78,548698 | 1,650495 | 1 | 39 | 1,782 | -78 | -32 | -55,3128 |
| LA COSTA - CONCOSTA | -77,205038 | 4,686964 | 4 | 41 | 13,0704 | -77 | -12 | -18,1368 |
| MAYORQUÍN Y PAPAYAL | -77,119829 | 3,589445 | 3 | 35 | 22,002 | -77 | -7 | -11,3844 |
| BAZAN - LA BOCANA | -77,200148 | 3,868824 | 3 | 52 | 7,7664 | -77 | -12 | -0,5328 |
| PAVASA | -77,360817 | 5,314139 | 5 | 18 | 50,9004 | -77 | -21 | -38,9412 |
| ODEMAP MOSQUERA SUR | -78,491132 | 2,434881 | 2 | 26 | 5,5716 | -78 | -29 | -28,0752 |
| ISTMINA Y PARTE DEL MEDIO SAN JUAN | -76,757112 | 5,141514 | 5 | 8 | 29,4504 | -76 | -45 | -25,6032 |
| ALTO MIRA Y FRONTERA | -78,637598 | 1,358577 | 1 | 21 | 30,8772 | -78 | -38 | -15,3528 |
| SIVIRÚ | -77,26265 | 4,834361 | 4 | 50 | 3,6996 | -77 | -15 | -45,54 |
| LIMONES | -76,905605 | 3,7359 | 3 | 44 | 9,24 | -76 | -54 | -20,178 |
| PIZARRO | -77,324014 | 4,958883 | 4 | 57 | 31,9788 | -77 | -19 | -26,4504 |
| RÍO NAYA | -77,171846 | 3,121309 | 3 | 7 | 16,7124 | -77 | -10 | -18,6456 |
| SAN AGUSTÍN DE TERRÓN | -77,322358 | 5,261438 | 5 | 15 | 41,1768 | -77 | -19 | -20,4888 |
| LA ESPERANZA | -76,903398 | 3,903201 | 3 | 54 | 11,5236 | -76 | -54 | -12,2328 |
| ALEJANDRO RINCÓN DEL RÍO ÑAMBÍ | -77,972602 | 1,595496 | 1 | 35 | 43,7856 | -77 | -58 | -21,3672 |
| INTEGRACIÓN DEL RÍO CHUARE | -77,105178 | 2,927059 | 2 | 55 | 37,4124 | -77 | -6 | -18,6408 |
| RÍO CALIMA | -76,96357 | 4,017752 | 4 | 1 | 3,9072 | -76 | -57 | -48,852 |
| LA NUEVA ESPERANZA DE LOS NEGROS | -73,003577 | 11,086831 | 11 | 5 | 12,5916 | -73 | 0 | -12,8772 |
| CHANZARÁ | -77,925221 | 2,587738 | 2 | 35 | 15,8568 | -77 | -55 | -30,7956 |
| RÍO GUALAJÓ | -78,604209 | 1,693553 | 1 | 41 | 36,7908 | -78 | -36 | -15,1524 |
| ANIZACIÓN POPULAR CAMPESINA DEL ALTO ATRATO - C | -76,445373 | 5,478204 | 5 | 28 | 41,5344 | -76 | -26 | -43,3428 |
| SABALETAS | -76,896488 | 3,771637 | 3 | 46 | 17,8932 | -76 | -53 | -47,3568 |
| RÍO DOMINGODÓ | -77,093249 | 7,136887 | 7 | 8 | 12,7932 | -77 | -5 | -35,6964 |
| BOCAS DE CANÁ | -74,903074 | 7,374194 | 7 | 22 | 27,0984 | -74 | -54 | -11,0664 |
| SANQUIANGA | -78,355121 | 2,286583 | 2 | 17 | 11,6988 | -78 | -21 | -18,4356 |
| GENERAL DEL MUNICIPIO DE NUQUÍ - LOS RISCALES | -77,332337 | 5,650022 | 5 | 39 | 0,0792 | -77 | -19 | -56,4132 |
| LA CUENCA DEL RÍO TOLO Y ZONA COSTERA SUR | -77,314527 | 8,375962 | 8 | 22 | 33,4632 | -77 | -18 | -52,2972 |
| RÍO PILIZÁ | -77,303707 | 5,0581 | 5 | 3 | 29,16 | -77 | -18 | -13,3452 |
| MANOS UNIDAS DEL SOCORRO | -78,245034 | 1,556011 | 1 | 33 | 21,6396 | -78 | -14 | -42,1224 |
| SAN ANDRÉS DE USARAGÁ | -77,249291 | 4,914249 | 4 | 54 | 51,2964 | -77 | -14 | -57,4476 |
| MAYOR DEL RÍO ANCHICAYA | -77,063151 | 3,754178 | 3 | 45 | 15,0408 | -77 | -3 | -47,3436 |
| SAN FRANCISCO CUGUCHO | -77,075053 | 5,762639 | 5 | 45 | 45,5004 | -77 | -4 | -30,1908 |
| CUCHEROS ENSENADA DEL TIGRE | -77,284546 | 3,913149 | 3 | 54 | 47,3364 | -77 | -17 | -4,3656 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----|----|---------|-----|-----|----------|
| MAYOR DEL MUNICIPIO DE JURADÓ | -77,723159 | 7,178101 | 7 | 10 | 41,1636 | -77 | -43 | -23,3724 |
| RÍO YURUMANGUÍ | -77,242707 | 3,291696 | 3 | 17 | 30,1056 | -77 | -14 | -33,7452 |
| EL PROGRESO | -78,450172 | 2,111075 | 2 | 6 | 39,87 | -78 | -27 | -0,6192 |
| CAUCANA | -76,976645 | 3,914406 | 3 | 54 | 51,8616 | -76 | -58 | -35,922 |
| ALTO GUAPI | -77,662975 | 2,288581 | 2 | 17 | 18,8916 | -77 | -39 | -46,71 |
| RÍO CACARICA | -77,294042 | 7,587544 | 7 | 35 | 15,1584 | -77 | -17 | -38,5512 |
| CHAPARROSA | -74,640746 | 7,559358 | 7 | 33 | 33,6888 | -74 | -38 | -26,6856 |
| LA CUENCA DEL RÍO QUIPARADÓ | -77,27742 | 7,252805 | 7 | 15 | 10,098 | -77 | -16 | -38,712 |
| CUEVITAS | -77,385497 | 5,494457 | 5 | 29 | 40,0452 | -77 | -23 | -7,7892 |
| VIGÍA DE CURVARADÓ Y SANTA ROSA DE LIMÓN | -76,875074 | 7,08767 | 7 | 5 | 15,612 | -76 | -52 | -30,2664 |
| LA BOQUILLA | -75,493565 | 10,477797 | 10 | 28 | 40,0692 | -75 | -29 | -36,834 |
| GUADUALITO | -77,049249 | 3,827607 | 3 | 49 | 39,3852 | -77 | -2 | -57,2964 |
| PUERTO ESPAÑA | -77,383498 | 4,093164 | 4 | 5 | 35,3904 | -77 | -23 | -0,5928 |
| ACAPA | -78,559152 | 2,122114 | 2 | 7 | 19,6104 | -78 | -33 | -32,9472 |
| CHILONA - EL SALTO | -74,862623 | 7,543052 | 7 | 32 | 34,9872 | -74 | -51 | -45,4428 |
| BAJO MIRA Y FRONTERA | -78,865165 | 1,623838 | 1 | 37 | 25,8168 | -78 | -51 | -54,594 |
| NEGROS UNIDOS | -77,7114 | 2,775925 | 2 | 46 | 33,33 | -77 | -42 | -41,04 |
| MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA | -76,152385 | 5,320482 | 5 | 19 | 13,7352 | -76 | -9 | -8,586 |
| ALEJANDRO | -74,122461 | 8,818552 | 8 | 49 | 6,7872 | -74 | -7 | -20,8596 |
| LA NUEVA | -77,19283 | 7,232297 | 7 | 13 | 56,2692 | -77 | -11 | -34,188 |
| LA MADRE | -77,051165 | 6,954868 | 6 | 57 | 17,5248 | -77 | -3 | -4,194 |
| LA CUENCA DEL RÍO SALAQUÍ | -77,305731 | 7,399699 | 7 | 23 | 58,9164 | -77 | -18 | -20,6316 |
| INTEGRACIÓN DE TELEMBÍ | -78,266075 | 1,765725 | 1 | 45 | 56,61 | -78 | -15 | -57,87 |
| RÍO JIGUAMIANDÓ | -76,677793 | 7,14859 | 7 | 8 | 54,924 | -76 | -40 | -40,0548 |
| CORTINA VERDE MANDELA | -78,623544 | 1,527557 | 1 | 31 | 39,2052 | -78 | -37 | -24,7584 |
| LLANO BAJO | -76,923987 | 3,691501 | 3 | 41 | 29,4036 | -76 | -55 | -26,3532 |
| SAN ISIDRO | -76,761624 | 5,647914 | 5 | 38 | 52,4904 | -76 | -45 | -41,8464 |
| LA CUENCA DEL RÍO ACANDÍ SECO, EL CEDRO Y JUANCHO | -77,389858 | 8,48498 | 8 | 29 | 5,928 | -77 | -23 | -23,4888 |
| CLAVELLINO | -77,297935 | 7,122452 | 7 | 7 | 20,8272 | -77 | -17 | -52,566 |
| LA MOLANA | -76,686007 | 5,593708 | 5 | 35 | 37,3488 | -76 | -41 | -9,6252 |
| POR LA IDENTIDAD CULTURAL | -76,480275 | 6,507779 | 6 | 30 | 28,0044 | -76 | -28 | -48,99 |
| UNIÓN DEL RÍO CHAGÚÍ | -78,462592 | 1,734113 | 1 | 44 | 2,8068 | -78 | -27 | -45,3312 |
| LA MAMUNCIA, PARTE MEDIA DEL RÍO MICAY | -77,362333 | 2,952354 | 2 | 57 | 8,4744 | -77 | -21 | -44,3988 |
| ALTO POTO DÓ | -76,993807 | 3,785799 | 3 | 47 | 8,8764 | -76 | -59 | -37,7052 |
| RÍO NAPI | -77,52044 | 2,435351 | 2 | 26 | 7,2636 | -77 | -31 | -13,584 |
| NUEVO RENACER | -77,195818 | 0,400935 | 0 | 24 | 3,366 | -77 | -11 | -44,9448 |
| LA NUEVA RESERVA ACANURE | -78,25742 | 1,443717 | 1 | 26 | 37,3812 | -78 | -15 | -26,712 |
| CUELLAR RÍO SAN JUAN | -77,256274 | 4,196086 | 4 | 11 | 45,9096 | -77 | -15 | -22,5864 |
| RÍO SATINGA | -78,24782 | 2,236433 | 2 | 14 | 11,1588 | -78 | -14 | -52,152 |
| OBATALA | -73,956513 | 10,378261 | 10 | 22 | 41,7396 | -73 | -57 | -23,4468 |
| RENACER NEGRO | -77,483753 | 2,556868 | 2 | 33 | 24,7248 | -77 | -29 | -1,5108 |
| LA CUENCA DEL RÍO ISCUANDÉ | -77,848169 | 2,214379 | 2 | 12 | 51,7644 | -77 | -50 | -53,4084 |
| NUEVA ESPERANZA | -74,616653 | 7,546459 | 7 | 32 | 47,2524 | -74 | -36 | -59,9508 |
| RÍO PEPE | -76,842477 | 5,11798 | 5 | 7 | 4,728 | -76 | -50 | -32,9172 |
| POR EL DESARROLLO INTEGRAL | -76,750562 | 6,981123 | 6 | 58 | 52,0428 | -76 | -45 | -2,0232 |
| VILLA CONTO | -76,852158 | 5,573571 | 5 | 34 | 24,8556 | -76 | -51 | -7,7688 |
| MAYOR DEL MEDIO ATRATO ACIA | -76,75017 | 6,215923 | 6 | 12 | 57,3228 | -76 | -45 | -0,612 |
| MANGLARES DEL RÍO MICAY | -77,553391 | 3,058782 | 3 | 3 | 31,6152 | -77 | -33 | -12,2076 |
| ALTO RÍO SEQUIHONDA | -78,044953 | 2,42629 | 2 | 25 | 34,644 | -78 | -2 | -41,8308 |
| LA CUENCA DEL RÍO ACANDÍ ZONA COSTERA NORTE | -77,378011 | 8,57481 | 8 | 34 | 29,316 | -77 | -22 | -40,8396 |
| MAYOR DEL ALTO SAN JUAN "ASOCASAN" | -76,399087 | 5,281077 | 5 | 16 | 51,8772 | -76 | -23 | -56,7132 |
| RÍO GUAJUÍ | -77,727777 | 2,61688 | 2 | 37 | 0,768 | -77 | -43 | -39,9972 |
| JUANCHACO | -77,345259 | 3,979613 | 3 | 58 | 46,6068 | -77 | -20 | -42,9324 |
| RÍO CAJAMBRE | -77,192906 | 3,444588 | 3 | 26 | 40,5168 | -77 | -11 | -34,4616 |

| NOMBRE_RESGUARDO | LAT | LONG | LATITUD | | | LONGITUD | | |
|--|----------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | | | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
| PEÑA LA ALEGRIA | 1,583786 | -78,630299 | 1 | 35 | 1,6296 | -78 | -37 | -49,0764 |
| CHINGUIRITO MIRA | 1,367575 | -78,606136 | 1 | 22 | 3,27 | -78 | -36 | -22,0896 |
| EL CEDRO, LAS PEÑAS, LA BRAVA, PILVÍ Y LA PINTADA | 1,522527 | -78,584952 | 1 | 31 | 21,0972 | -78 | -35 | -5,8272 |
| SAN AGUSTIN-LA FLORESTA | 1,676377 | -78,557671 | 1 | 40 | 34,9572 | -78 | -33 | -27,6156 |
| PIEDRA SELLADA-QUEBRADA TRONQUERIA | 1,232696 | -78,557375 | 1 | 13 | 57,7056 | -78 | -33 | -26,55 |
| INDA GUACARAY | 1,430247 | -78,5302 | 1 | 25 | 48,8892 | -78 | -31 | -48,72 |
| INDA ZABALETA | 1,482199 | -78,529127 | 1 | 28 | 55,9164 | -78 | -31 | -44,8572 |
| SANTA ROSITA | 1,348792 | -78,519614 | 1 | 20 | 55,6512 | -78 | -31 | -10,6104 |
| PIGUAMBI PALANGALA | 1,368839 | -78,49653 | 1 | 22 | 7,8204 | -78 | -29 | -47,508 |
| PULGANDE CAMPOALEGRE | 1,451985 | -78,475634 | 1 | 27 | 7,146 | -78 | -28 | -32,2824 |
| GRAN ROSARIO | 1,519764 | -78,439708 | 1 | 31 | 11,1504 | -78 | -26 | -22,9488 |
| LA TURBIA | 1,245 | -78,436614 | 1 | 14 | 42 | -78 | -26 | -11,8104 |
| CUAYQUER DEL ALTO ALBI | 1,343908 | -78,430099 | 1 | 20 | 38,0688 | -78 | -25 | -48,3564 |
| SANQUIANGUITA | 2,298687 | -78,425657 | 2 | 17 | 55,2732 | -78 | -25 | -32,3652 |
| SAUNDE GUIGUAY | 1,504207 | -78,322891 | 1 | 30 | 15,1452 | -78 | -19 | -22,4076 |
| EL GRAN SABALO | 1,306755 | -78,296165 | 1 | 18 | 24,318 | -78 | -17 | -46,194 |
| LA FLORESTA, SANTA ROSA Y SAN FRANCISCO | 2,134798 | -78,29392 | 2 | 8 | 5,2728 | -78 | -17 | -38,112 |
| HONDA RÍO GUIZA | 1,37474 | -78,228723 | 1 | 22 | 29,064 | -78 | -13 | -43,4028 |
| RÍO SATINGA | 2,093149 | -78,209802 | 2 | 5 | 35,3364 | -78 | -12 | -35,2872 |
| CUAMBI-YASLAMI | 1,254174 | -78,206511 | 1 | 15 | 15,0264 | -78 | -12 | -23,4396 |
| CUASBIL-LA FALDADA | 1,3331 | -78,193109 | 1 | 19 | 59,16 | -78 | -11 | -35,1924 |
| SAN JUAN DE PAMPON | 2,294028 | -78,18775 | 2 | 17 | 38,5008 | -78 | -11 | -15,9 |
| PINGULLO-SARDINERO | 1,207453 | -78,178754 | 1 | 12 | 26,8308 | -78 | -10 | -43,5144 |
| NULPE MEDIO-ALTO Y RÍO SAN JUAN | 1,073051 | -78,177307 | 1 | 4 | 22,9836 | -78 | -10 | -38,3052 |
| GUELNAMI-CARAÑO | 1,395135 | -78,177016 | 1 | 23 | 42,486 | -78 | -10 | -37,2576 |
| NUNALBÍ ALTO ULBÍ | 1,454879 | -78,168194 | 1 | 27 | 17,5644 | -78 | -10 | -5,4984 |
| PIPALTA-PALBI-YAGUAPI | 1,493269 | -78,126363 | 1 | 29 | 35,7684 | -78 | -7 | -34,9068 |
| CHAGUI CHIMBUZA VEGAS Y OTROS | 1,238962 | -78,124706 | 1 | 14 | 20,2632 | -78 | -7 | -28,9416 |
| GUADUAL, CUMBAS, MAGÜI, INVINA Y ARRAYÁN | 1,110304 | -78,084936 | 1 | 6 | 37,0944 | -78 | -5 | -5,7696 |
| CUASCUABI-PALDUBI | 1,18574 | -78,081514 | 1 | 11 | 8,664 | -78 | -4 | -53,4504 |
| AWÁ ÑAMBL PIEDRA VERDE | 1,410203 | -78,071827 | 1 | 24 | 36,7308 | -78 | -4 | -18,5772 |
| CUAIQUER INTEGRADO LA MILAGROSA | 1,20949 | -78,060914 | 1 | 12 | 34,164 | -78 | -3 | -39,2904 |
| MAIZ BLANCO | 2,182822 | -78,056943 | 2 | 10 | 58,1592 | -78 | -3 | -24,9948 |
| CUCHILLA-PALMAR | 1,16741 | -78,055887 | 1 | 10 | 2,676 | -78 | -3 | -21,1932 |
| INTEGRADO EL CHARCO | 2,37375 | -78,049789 | 2 | 22 | 25,5 | -78 | -2 | -59,2404 |
| PIALAPI-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL-YARE | 1,11136 | -78,037888 | 1 | 6 | 40,896 | -78 | -2 | -16,3968 |
| PALMAR IMBI | 1,313739 | -78,028128 | 1 | 18 | 49,4604 | -78 | -1 | -41,2608 |
| RAMOS-MONGON-MANCHURIA | 1,365797 | -78,01159 | 1 | 21 | 56,8692 | -78 | 0 | -41,724 |
| MORRITO | 2,217219 | -77,995715 | 2 | 13 | 1,9884 | -77 | -59 | -44,574 |
| ALTO CARTAGENA | 1,262234 | -77,97207 | 1 | 15 | 44,0424 | -77 | -58 | -19,452 |
| GUALCALA | 1,337203 | -77,939186 | 1 | 20 | 13,9308 | -77 | -56 | -21,0696 |
| TRONQUERIA, PULGANDE-PALCITO | 1,524074 | -77,927893 | 1 | 31 | 26,6664 | -77 | -55 | -40,4148 |
| PEÑA, TELEMBI, PUNDE, PITADERO, BRAVO, TRONQUERIA Y ZARZAL | 1,434674 | -77,924624 | 1 | 26 | 4,8264 | -77 | -55 | -28,6464 |
| QUEBRADA GRANDE | 2,200253 | -77,919274 | 2 | 12 | 0,9108 | -77 | -55 | -9,3864 |
| PLANADAS TELEMBÍ | 1,499637 | -77,851351 | 1 | 29 | 58,6932 | -77 | -51 | -4,8636 |
| CUMBAL | 0,825615 | -77,827917 | 0 | 49 | 32,214 | -77 | -49 | -40,5012 |
| JURADÓ | 7,288708 | -77,807106 | 7 | 17 | 19,3488 | -77 | -48 | -25,5816 |
| EL SANDE | 1,394482 | -77,799315 | 1 | 23 | 40,1352 | -77 | -47 | -47,534 |
| NUSSI PURRU | 7,342269 | -77,763702 | 7 | 20 | 32,1684 | -77 | -45 | -49,3272 |
| MUELLAMUEZ | 0,976292 | -77,745814 | 0 | 58 | 34,6512 | -77 | -44 | -44,9304 |
| CARLOSAMA | 0,850573 | -77,742057 | 0 | 51 | 2,0628 | -77 | -44 | -31,4052 |
| GUAYABAL DE PARTADÓ | 7,142076 | -77,674696 | 7 | 8 | 31,4736 | -77 | -40 | -28,9056 |
| SALAQUI Y PAVARANDO | 7,416571 | -77,608845 | 7 | 24 | 59,6556 | -77 | -36 | -31,842 |
| SANTA MARTA DE CURICHE | 7,016965 | -77,608607 | 7 | 1 | 1,074 | -77 | -36 | -30,9852 |
| CALLE SANTA ROSA RÍO SAIJA | 2,90256 | -77,560308 | 2 | 54 | 9,216 | -77 | -33 | -37,1088 |
| ALMORZADERO, SAN ISIDRO Y LA NUEVA UNIÓN | 2,765163 | -77,552249 | 2 | 45 | 54,5868 | -77 | -33 | -8,0964 |
| PLAYITA SAN FRANCISCO | 3,040278 | -77,542305 | 3 | 2 | 25,0008 | -77 | -32 | -32,298 |
| PASTO DE ILES | 0,964515 | -77,525349 | 0 | 57 | 52,254 | -77 | -31 | -31,2564 |
| PEÑA BLANCA-RÍO TRUANDÓ | 7,114222 | -77,50989 | 7 | 6 | 51,1992 | -77 | -30 | -35,604 |
| ISLA DEL MONO | 2,981913 | -77,49415 | 2 | 58 | 54,8868 | -77 | -29 | -38,94 |
| LA RAYA | 7,587741 | -77,452881 | 7 | 35 | 15,8676 | -77 | -27 | -10,3716 |
| TIOSILIDIO | 4,18982 | -77,448806 | 4 | 11 | 23,352 | -77 | -26 | -55,7016 |
| VILLA NUEVA JUNA | 6,181037 | -77,448769 | 6 | 10 | 51,7332 | -77 | -26 | -55,5684 |
| BUENAVISTA | 4,166369 | -77,42434 | 4 | 9 | 58,9284 | -77 | -25 | -27,624 |
| INFI | 2,703074 | -77,423851 | 2 | 42 | 11,0664 | -77 | -25 | -25,8636 |
| RÍO GUANGÜI | 2,824373 | -77,405287 | 2 | 49 | 27,7428 | -77 | -24 | -19,0332 |
| EPERARA SIAPIDARA DEL RIO NAYA | 3,252934 | -77,396327 | 3 | 15 | 10,5624 | -77 | -23 | -46,7772 |
| PERANCHITO | 7,711781 | -77,372875 | 7 | 42 | 42,4116 | -77 | -22 | -22,35 |
| PLAYA BENDITA | 2,914209 | -77,368369 | 2 | 54 | 51,1524 | -77 | -22 | -6,1284 |
| RÍO QUIPARADO | 7,238625 | -77,362545 | 7 | 14 | 19,05 | -77 | -21 | -45,162 |
| PERANCHO | 7,617374 | -77,359549 | 7 | 37 | 2,5464 | -77 | -21 | -34,3764 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|---|----|---------|-----|-----|----------|
| BURUJON O LA UNIÓN-SAN BERNARDO | 4,167865 | -77,346503 | 4 | 10 | 4,314 | -77 | -20 | -47,4108 |
| YARUMAL Y EL BARRANCO | 7,33878 | -77,342816 | 7 | 20 | 19,608 | -77 | -20 | -34,1376 |
| JAGUAL RÍO CHINTADO | 6,978104 | -77,340294 | 6 | 58 | 41,1744 | -77 | -20 | -25,0584 |
| DOCORDO-BALSALITO | 4,290353 | -77,307379 | 4 | 17 | 25,2708 | -77 | -18 | -26,5644 |
| RÍO PAVASA Y QUEBRADA JELLA | 5,434253 | -77,305089 | 5 | 26 | 3,3108 | -77 | -18 | -18,3204 |
| LA IGUANA | 2,987048 | -77,294907 | 2 | 59 | 13,3728 | -77 | -17 | -41,6652 |
| NAPIPÍ | 6,643313 | -77,294228 | 6 | 38 | 35,9268 | -77 | -17 | -39,2208 |
| PAPAYO | 4,157493 | -77,291258 | 4 | 9 | 26,9748 | -77 | -17 | -28,5288 |
| RÍOS VALLE Y BOROBORO | 6,162408 | -77,290963 | 6 | 9 | 44,6688 | -77 | -17 | -27,4668 |
| RÍO PANGÜI | 5,565197 | -77,288471 | 5 | 33 | 54,7092 | -77 | -17 | -18,4956 |
| TOGOROMA | 4,36134 | -77,284328 | 4 | 21 | 40,824 | -77 | -17 | -3,5808 |
| NASA UH | 0,657943 | -77,282416 | 0 | 39 | 28,5948 | -77 | -16 | -56,6976 |
| CHACHAJO | 4,189982 | -77,279706 | 4 | 11 | 23,9352 | -77 | -16 | -46,9416 |
| CHIDIMA TOLO | 8,324871 | -77,271234 | 8 | 19 | 29,5356 | -77 | -16 | -16,4424 |
| EL PIÑAL | 5,341765 | -77,261228 | 5 | 20 | 30,354 | -77 | -15 | -40,4208 |
| PUERTO CHICHILIANO | 4,915805 | -77,249702 | 4 | 54 | 56,898 | -77 | -14 | -58,9272 |
| RÍO DOMINGODO | 6,851017 | -77,246325 | 6 | 51 | 3,6612 | -77 | -14 | -46,77 |
| DO IMAMA TUMA Y BELLA LUZ | 5,268371 | -77,244643 | 5 | 16 | 6,1356 | -77 | -14 | -40,7148 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,201474 | -77,2419 | 1 | 12 | 5,3064 | -77 | -14 | -30,84 |
| CABECERAS O PUERTO PIZARÍO | 4,243327 | -77,240199 | 4 | 14 | 35,9772 | -77 | -14 | -24,7164 |
| NUEVO PITALITO | 4,168123 | -77,23915 | 4 | 10 | 5,2428 | -77 | -14 | -20,94 |
| RÍO NUQUI | 5,586375 | -77,234113 | 5 | 35 | 10,95 | -77 | -14 | -2,8068 |
| RÍO PICHIMA | 4,401633 | -77,233287 | 4 | 24 | 5,8788 | -77 | -13 | -59,8332 |
| PESCADITO | 8,374869 | -77,233248 | 8 | 22 | 29,5284 | -77 | -13 | -59,6928 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,198407 | -77,2316 | 1 | 11 | 54,2652 | -77 | -13 | -53,76 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,196027 | -77,230776 | 1 | 11 | 45,6972 | -77 | -13 | -50,7936 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,195847 | -77,229557 | 1 | 11 | 45,0492 | -77 | -13 | -46,4052 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,195692 | -77,229431 | 1 | 11 | 44,4912 | -77 | -13 | -45,9516 |
| ALTO RÍO CUIA | 6,533747 | -77,226759 | 6 | 32 | 1,4892 | -77 | -13 | -36,3324 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,202136 | -77,226309 | 1 | 12 | 7,6896 | -77 | -13 | -34,7124 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,202445 | -77,226089 | 1 | 12 | 8,802 | -77 | -13 | -33,9204 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,202621 | -77,225298 | 1 | 12 | 9,4356 | -77 | -13 | -31,0728 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,208448 | -77,22239 | 1 | 12 | 30,4128 | -77 | -13 | -20,604 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,195151 | -77,220447 | 1 | 11 | 42,5436 | -77 | -13 | -13,6092 |
| OPOGADÓ - DOGUADÓ | 6,742583 | -77,220389 | 6 | 44 | 33,2988 | -77 | -13 | -13,4004 |
| LA JAGUA-GUACHAL-PITALITO | 4,787281 | -77,220229 | 4 | 47 | 14,2116 | -77 | -13 | -12,8244 |
| EYAKERA DOGIBI | 8,206755 | -77,21924 | 8 | 12 | 24,318 | -77 | -13 | -9,264 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,201981 | -77,21906 | 1 | 12 | 7,1316 | -77 | -13 | -8,616 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,202074 | -77,219001 | 1 | 12 | 7,4664 | -77 | -13 | -8,4036 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,204849 | -77,218512 | 1 | 12 | 17,4564 | -77 | -13 | -6,6432 |
| RUMIYACO | 0,624475 | -77,218476 | 0 | 37 | 28,11 | -77 | -13 | -6,5136 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,194828 | -77,217423 | 1 | 11 | 41,3808 | -77 | -13 | -2,7228 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,215174 | -77,21526 | 1 | 12 | 54,6264 | -77 | -12 | -54,936 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,199525 | -77,212017 | 1 | 11 | 58,29 | -77 | -12 | -43,2612 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,225498 | -77,210888 | 1 | 13 | 31,7928 | -77 | -12 | -39,1968 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,218544 | -77,20815 | 1 | 13 | 6,7584 | -77 | -12 | -29,34 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,192405 | -77,202415 | 1 | 11 | 32,658 | -77 | -12 | -8,694 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,228483 | -77,201764 | 1 | 13 | 42,5388 | -77 | -12 | -6,3504 |
| LAGUNA PEJENDINO | 1,208174 | -77,200629 | 1 | 12 | 29,4264 | -77 | -12 | -2,2644 |
| RÍOS UVA Y POGUE-QUEBRADA TAPARAL | 6,345205 | -77,19983 | 6 | 20 | 42,738 | -77 | -11 | -59,388 |
| RÍO PURRICHÁ | 5,182144 | -77,190002 | 5 | 10 | 55,7184 | -77 | -11 | -24,0072 |
| ORDO SIVIRÚ AGUACLARA | 4,865041 | -77,183398 | 4 | 51 | 54,1476 | -77 | -11 | -0,2328 |
| RÍO ORPUA | 4,486182 | -77,180222 | 4 | 29 | 10,2552 | -77 | -10 | -48,7992 |
| PICHICORA, CHICUE, PUERTO ALEGRE | 6,468345 | -77,179613 | 6 | 28 | 6,042 | -77 | -10 | -46,6068 |
| RÍO TAPARAL | 4,272993 | -77,169005 | 4 | 16 | 22,7748 | -77 | -10 | -8,418 |
| RÍOS JURUBIDA-CHORI Y ALTO BAUDO | 5,879463 | -77,166027 | 5 | 52 | 46,0668 | -77 | -9 | -57,6972 |
| ISHU AWA | 0,569383 | -77,162272 | 0 | 34 | 9,7788 | -77 | -9 | -44,1792 |
| ALTO RÍO BOJAYÁ | 6,165182 | -77,155652 | 6 | 9 | 54,6552 | -77 | -9 | -20,3472 |
| SANTA ROSA DE IUJA | 4,63357 | -77,149238 | 4 | 38 | 0,852 | -77 | -8 | -57,2568 |
| GUAYACAN-SANTA ROSA | 4,117801 | -77,147174 | 4 | 7 | 4,0836 | -77 | -8 | -49,8264 |
| RÍOS CATRU-DUBASA Y ANCOSO | 5,364676 | -77,139495 | 5 | 21 | 52,8336 | -77 | -8 | -22,182 |
| PUERTO ALEGRE Y LA DIVISA | 5,589881 | -77,135397 | 5 | 35 | 23,5716 | -77 | -8 | -7,4292 |
| SANTA ROSA SUCUMBOS EL DIVISO | 0,394384 | -77,131868 | 0 | 23 | 39,7824 | -77 | -7 | -54,7248 |
| ARQUIA | 7,995537 | -77,116128 | 7 | 59 | 43,9332 | -77 | -6 | -58,0608 |
| REFUGIO EL SOL | 1,062438 | -77,111082 | 1 | 3 | 44,7768 | -77 | -6 | -39,8952 |
| AGUACLARA Y BELLA LUZ DEL RÍO AMPORÁ | 5,502194 | -77,108362 | 5 | 30 | 7,8984 | -77 | -6 | -30,1032 |
| MAMEY DE DIPURDÚ | 6,854198 | -77,107724 | 6 | 51 | 15,1128 | -77 | -6 | -27,8064 |
| QUEBRADA QUERA | 5,100377 | -77,106225 | 5 | 6 | 1,3572 | -77 | -6 | -22,41 |
| CUTI | 8,192289 | -77,090599 | 8 | 11 | 32,2404 | -77 | -5 | -26,1564 |
| RÍOS TORREIDO Y CHIMANI | 5,190795 | -77,090083 | 5 | 11 | 26,862 | -77 | -5 | -24,2988 |
| BAJO GRANDE | 4,70505 | -77,087526 | 4 | 42 | 18,18 | -77 | -5 | -15,0936 |
| PATIO BONITO | 5,128191 | -77,087519 | 5 | 7 | 41,4876 | -77 | -5 | -15,0684 |
| TANELA | 8,236823 | -77,085811 | 8 | 14 | 12,5628 | -77 | -5 | -8,9196 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---|----|---------|-----|-----|----------|
| LA UNIÓN CHOCO - SAN CRISTOBAL | 4,583775 | -77,075348 | 4 | 35 | 1,59 | -77 | -4 | -31,2528 |
| CHAGPIEN TORDO | 4,381979 | -77,071585 | 4 | 22 | 55,1244 | -77 | -4 | -17,706 |
| DEARADE BIAKIRUDE | 5,681989 | -77,070338 | 5 | 40 | 55,1604 | -77 | -4 | -13,2168 |
| ALTO RÍO BUEY | 6,099298 | -77,057328 | 6 | 5 | 57,4728 | -77 | -3 | -26,3808 |
| ALTO ORITO | 0,795596 | -77,052249 | 0 | 47 | 44,1456 | -77 | -3 | -8,0964 |
| DOMINICO, LONDOÑO Y APARTADÓ | 5,434414 | -77,049836 | 5 | 26 | 3,8904 | -77 | -2 | -59,4096 |
| PUERTO LIBIA TRIPICAY | 5,542667 | -77,039485 | 5 | 32 | 33,6012 | -77 | -2 | -22,146 |
| RÍO DAGUA | 3,825264 | -77,032936 | 3 | 49 | 30,9504 | -77 | -1 | -58,5696 |
| BELLAVISTA-UNIÓN PITALITO | 4,842505 | -77,030753 | 4 | 50 | 33,018 | -77 | -1 | -50,7108 |
| SANTA CECILIA DE LA QUEBRADA ORO CHOCÓ | 4,973921 | -77,029919 | 4 | 58 | 26,1156 | -77 | -1 | -47,7084 |
| SIMORNA | 0,83459 | -77,025868 | 0 | 50 | 4,524 | -77 | -1 | -33,1248 |
| CHIGORODO MEMBA | 5,196374 | -77,025213 | 5 | 11 | 46,9464 | -77 | -1 | -30,7668 |
| BETE-AUROBETE Y AURO DEL BUEY | 5,998251 | -77,024435 | 5 | 59 | 53,7036 | -77 | -1 | -27,966 |
| INGA DE COLON | 1,224913 | -77,010974 | 1 | 13 | 29,6868 | -77 | 0 | -39,5064 |
| TRAPICHE DEL RÍO PEPÉ | 5,043408 | -77,006153 | 5 | 2 | 36,2688 | -77 | 0 | -22,1508 |
| ALTO DEL RÍO MUNGUIDÓ | 5,864481 | -76,996128 | 5 | 51 | 52,1316 | -76 | -59 | -46,0608 |
| PASO DEL RÍO SALADO | 5,940857 | -76,991753 | 5 | 56 | 27,0852 | -76 | -59 | -30,3108 |
| ALTO RÍO TAGACHI | 6,207824 | -76,989958 | 6 | 12 | 28,1664 | -76 | -59 | -23,8488 |
| BUCHADÓ AMPARRADÓ | 6,320346 | -76,987692 | 6 | 19 | 13,2456 | -76 | -59 | -15,6912 |
| PUERTO ANTIOQUIA | 6,470958 | -76,979585 | 6 | 28 | 15,4488 | -76 | -58 | -46,506 |
| PUADÓ, LA LERMA, MATARÉ, Y TERDO | 4,664672 | -76,97331 | 4 | 39 | 52,8192 | -76 | -58 | -23,916 |
| PUERTO LIBRE DEL RÍO PEPÉ | 5,042457 | -76,966983 | 5 | 2 | 32,8452 | -76 | -58 | -1,1388 |
| SANTA MARÍA DE PANGALA | 4,237265 | -76,965671 | 4 | 14 | 14,154 | -76 | -57 | -56,4156 |
| INGA DE SAN ANDRÉS | 1,042888 | -76,958276 | 1 | 2 | 34,3968 | -76 | -57 | -29,7936 |
| NUEVO HORIZONTE | 0,399236 | -76,952163 | 0 | 23 | 57,2496 | -76 | -57 | -7,7868 |
| GUARANDO CARRIZAL | 5,826123 | -76,939958 | 5 | 49 | 34,0428 | -76 | -56 | -23,8488 |
| TUNGINA Y APARTADO | 6,406249 | -76,933289 | 6 | 24 | 22,4964 | -76 | -55 | -59,8404 |
| CAIMANERO DE JAMPAPA | 5,681077 | -76,925021 | 5 | 40 | 51,8772 | -76 | -55 | -30,0756 |
| MIASA DE PARTADO | 5,65417 | -76,922797 | 5 | 39 | 15,012 | -76 | -55 | -22,0692 |
| GEGENADÓ | 6,291114 | -76,914642 | 6 | 17 | 28,0104 | -76 | -54 | -52,7112 |
| INGA DE APONTE | 1,403507 | -76,912895 | 1 | 24 | 12,6252 | -76 | -54 | -46,422 |
| SAN JOSÉ AMIA DE PATO | 5,579719 | -76,894609 | 5 | 34 | 46,9884 | -76 | -53 | -40,5924 |
| QUEBRADA CHICUE RÍO TANGUI | 5,930581 | -76,892268 | 5 | 55 | 50,0916 | -76 | -53 | -32,1648 |
| SANTA ROSA DEL GUAMUÉZ | 0,4642 | -76,876516 | 0 | 27 | 51,12 | -76 | -52 | -35,4576 |
| RÍO AMÉ | 6,043024 | -76,874226 | 6 | 2 | 34,8864 | -76 | -52 | -27,2136 |
| CHONARA HUENA | 3,897548 | -76,873427 | 3 | 53 | 51,1728 | -76 | -52 | -24,3372 |
| RÍOS PATO Y JENGADO | 5,601051 | -76,860128 | 5 | 36 | 3,7836 | -76 | -51 | -36,4608 |
| SIRENA BERRECUY | 5,175104 | -76,857563 | 5 | 10 | 30,3744 | -76 | -51 | -27,2268 |
| BELLA VISTA | 0,763535 | -76,852967 | 0 | 45 | 48,726 | -76 | -51 | -10,6812 |
| YARINAL (SAN MARCELINO) | 0,28228 | -76,837196 | 0 | 16 | 56,208 | -76 | -50 | -13,9056 |
| SAN FRANCISCO | 1,118463 | -76,836537 | 1 | 7 | 6,4668 | -76 | -50 | -11,5332 |
| LA CRISTALINA | 0,632626 | -76,835683 | 0 | 37 | 57,4536 | -76 | -50 | -8,4588 |
| PAINA | 5,842118 | -76,835298 | 5 | 50 | 31,6248 | -76 | -50 | -7,0728 |
| MUNGARADÓ | 5,722639 | -76,831776 | 5 | 43 | 21,5004 | -76 | -49 | -54,3936 |
| LOS GUADUALES | 0,668186 | -76,82909 | 0 | 40 | 5,4696 | -76 | -49 | -44,724 |
| CAÑAVERAL | 0,745384 | -76,824592 | 0 | 44 | 43,3824 | -76 | -49 | -28,5312 |
| LA LOMITA | 5,643927 | -76,820406 | 5 | 38 | 38,1372 | -76 | -49 | -13,4616 |
| CAICEDONIA | 0,772758 | -76,820296 | 0 | 46 | 21,9288 | -76 | -49 | -13,0656 |
| CHIMBORAZO | 2,741868 | -76,809489 | 2 | 44 | 30,7248 | -76 | -48 | -34,1604 |
| KAMÉNTSÁ BIYA DE SIBUNDOY | 1,305686 | -76,806938 | 1 | 18 | 20,4696 | -76 | -48 | -24,9768 |
| YU YIC KWE | 3,722823 | -76,796617 | 3 | 43 | 22,1628 | -76 | -47 | -47,8212 |
| GUARAPAMBA | 2,447773 | -76,786219 | 2 | 26 | 51,9828 | -76 | -47 | -10,3884 |
| AGUA NEGRA | 2,753626 | -76,784315 | 2 | 45 | 13,0536 | -76 | -47 | -3,534 |
| EL ESPINGO | 0,747619 | -76,780879 | 0 | 44 | 51,4284 | -76 | -46 | -51,1644 |
| CHALUAYACO | 0,838747 | -76,78016 | 0 | 50 | 19,4892 | -76 | -46 | -48,576 |
| BOCANAS DE LUZON | 0,518016 | -76,766477 | 0 | 31 | 4,8576 | -76 | -45 | -59,3172 |
| SELVA VERDE | 0,76802 | -76,766233 | 0 | 46 | 4,872 | -76 | -45 | -58,4388 |
| LA FLORIDA | 1,04196 | -76,761651 | 1 | 2 | 31,056 | -76 | -45 | -41,9436 |
| LA DELFINA | 3,829507 | -76,76158 | 3 | 49 | 46,2252 | -76 | -45 | -41,688 |
| CAMPO ALEGRE DEL AFILADOR | 0,320952 | -76,75929 | 0 | 19 | 15,4272 | -76 | -45 | -33,444 |
| INKAL AWA | 0,690808 | -76,747094 | 0 | 41 | 26,9088 | -76 | -44 | -49,5384 |
| AGUA BLANCA | 0,54178 | -76,742167 | 0 | 32 | 30,408 | -76 | -44 | -31,8012 |
| CXAYU'CE FIW | 2,611197 | -76,73904 | 2 | 36 | 40,3092 | -76 | -44 | -20,544 |
| KITEK KIWE | 2,35933 | -76,734417 | 2 | 21 | 33,588 | -76 | -44 | -3,9012 |
| KITEK KIWE | 2,357305 | -76,734179 | 2 | 21 | 26,298 | -76 | -44 | -3,0444 |
| KITEK KIWE | 2,357622 | -76,733695 | 2 | 21 | 27,4392 | -76 | -44 | -1,302 |
| LA ARGELIA | 0,426828 | -76,731515 | 0 | 25 | 36,5808 | -76 | -43 | -53,454 |
| JENGADO APARTADÓ | 6,523069 | -76,726962 | 6 | 31 | 23,0484 | -76 | -43 | -37,0632 |
| CAMENTSÁ BIYA | 1,154656 | -76,723455 | 1 | 9 | 16,7616 | -76 | -43 | -24,438 |
| GUACHICONO | 2,077835 | -76,720632 | 2 | 4 | 40,206 | -76 | -43 | -14,2752 |
| EL MORAL | 2,167224 | -76,711479 | 2 | 10 | 2,0064 | -76 | -42 | -41,3244 |
| DAMASCO VIDES | 0,786347 | -76,709825 | 0 | 47 | 10,8492 | -76 | -42 | -35,37 |
| CAIMÁN NUEVO | 8,260408 | -76,708686 | 8 | 15 | 37,4688 | -76 | -42 | -31,2696 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---|----|---------|-----|-----|----------|
| SAN ANDRES - LAS VEGAS - VILLA UNION | 0,774791 | -76,704324 | 0 | 46 | 29,2476 | -76 | -42 | -15,5664 |
| PLAYA LARGA | 0,84482 | -76,697231 | 0 | 50 | 41,352 | -76 | -41 | -50,0316 |
| LAS PLAYAS | 7,862091 | -76,687503 | 7 | 51 | 43,5276 | -76 | -41 | -15,0108 |
| RÍO JARAPETÓ | 6,562682 | -76,683733 | 6 | 33 | 45,6552 | -76 | -41 | -1,4388 |
| INGA DE CONDAGUA | 1,294897 | -76,683487 | 1 | 17 | 41,6292 | -76 | -41 | -0,5532 |
| INGA DE MOCOA | 1,14419 | -76,681895 | 1 | 8 | 39,084 | -76 | -40 | -54,822 |
| INGA KAMSA | 1,119874 | -76,681202 | 1 | 7 | 11,5464 | -76 | -40 | -52,3272 |
| PEÑAS DEL OLVIDO | 5,096139 | -76,681166 | 5 | 5 | 46,1004 | -76 | -40 | -52,1976 |
| KITEK KIWE | 2,314201 | -76,67786 | 2 | 18 | 51,1236 | -76 | -40 | -40,296 |
| LA ITALIA | 0,456404 | -76,666039 | 0 | 27 | 23,0544 | -76 | -39 | -57,7404 |
| SAN MIGUEL DE LA CASTELLANA | 0,915775 | -76,660537 | 0 | 54 | 56,79 | -76 | -39 | -37,9332 |
| RÍO CHAJERADÓ | 6,751994 | -76,660127 | 6 | 45 | 7,1784 | -76 | -39 | -36,4572 |
| EL SALADO | 6,485587 | -76,659861 | 6 | 29 | 8,1132 | -76 | -39 | -35,4996 |
| BLASIAKU | 0,922644 | -76,659569 | 0 | 55 | 21,5184 | -76 | -39 | -34,4484 |
| LA PALMA | 7,852603 | -76,650816 | 7 | 51 | 9,3708 | -76 | -39 | -2,9376 |
| MUSSE UKWE | 2,78832 | -76,643713 | 2 | 47 | 17,952 | -76 | -38 | -37,3668 |
| PIEDRA SAGRADA LA GRAN FAMILIA DE LOS PASTOS | 0,914083 | -76,642319 | 0 | 54 | 50,6988 | -76 | -38 | -32,3484 |
| SAN JOSÉ | 1,444351 | -76,635587 | 1 | 26 | 39,6636 | -76 | -38 | -8,1132 |
| YUNGILLO | 1,378287 | -76,631247 | 1 | 22 | 41,8332 | -76 | -37 | -52,4892 |
| KWES KIWE NASA | 3,19588 | -76,614223 | 3 | 11 | 45,168 | -76 | -36 | -51,2028 |
| LAS DELICIAS | 2,917465 | -76,613836 | 2 | 55 | 2,874 | -76 | -36 | -49,8096 |
| LA BONANZA | 2,761664 | -76,613057 | 2 | 45 | 41,9904 | -76 | -36 | -47,0052 |
| RÍO MURINDÓ | 6,934937 | -76,606012 | 6 | 56 | 5,7732 | -76 | -36 | -21,6432 |
| URADÁ JIGUAMIANDÓ | 7,090323 | -76,596811 | 7 | 5 | 25,1628 | -76 | -35 | -48,5196 |
| SANANDOCITO | 4,385163 | -76,594304 | 4 | 23 | 6,5868 | -76 | -35 | -39,4944 |
| GUADUALITO | 2,96159 | -76,592208 | 2 | 57 | 41,724 | -76 | -35 | -31,9488 |
| DOKERAZAVI | 7,983471 | -76,590344 | 7 | 59 | 0,4956 | -76 | -35 | -25,2384 |
| ALBANIA | 0,814829 | -76,590272 | 0 | 48 | 53,3844 | -76 | -35 | -24,9792 |
| VEGAS DE SANTANA | 0,60375 | -76,590137 | 0 | 36 | 13,5 | -76 | -35 | -24,4932 |
| CORIBÍ BEDADÓ | 7,341083 | -76,589598 | 7 | 20 | 27,8988 | -76 | -35 | -22,5528 |
| LA CONCEPCIÓN | 2,905642 | -76,582491 | 2 | 54 | 20,3112 | -76 | -34 | -56,9676 |
| WASIPUNGO | 1,035209 | -76,581182 | 1 | 2 | 6,7524 | -76 | -34 | -52,2552 |
| LA PAILA-NAYA | 3,105159 | -76,578 | 3 | 6 | 18,5724 | -76 | -34 | -40,8 |
| GUAGUANDÓ | 6,331136 | -76,577995 | 6 | 19 | 52,0896 | -76 | -34 | -40,782 |
| VILLA MARIA DE ANAMÚ | 1,183619 | -76,571492 | 1 | 11 | 1,0284 | -76 | -34 | -17,3712 |
| SAN JOAQUIN | 1,326722 | -76,568223 | 1 | 19 | 36,1992 | -76 | -34 | -5,6028 |
| LOS ALMENDROS | 8,648751 | -76,554693 | 8 | 38 | 55,5036 | -76 | -33 | -16,8948 |
| ALTO LORENZO | 0,324729 | -76,552744 | 0 | 19 | 29,0244 | -76 | -33 | -9,8784 |
| ZENU DE EL VOLAO | 8,531686 | -76,550375 | 8 | 31 | 54,0696 | -76 | -33 | -1,35 |
| POLINES | 7,687583 | -76,543147 | 7 | 41 | 15,2988 | -76 | -32 | -35,3292 |
| POBLAZON | 2,372949 | -76,538291 | 2 | 22 | 22,6164 | -76 | -32 | -17,8476 |
| TOKOLLORO | 5,545341 | -76,537745 | 5 | 32 | 43,2276 | -76 | -32 | -15,882 |
| YABERARADÓ | 7,586814 | -76,534281 | 7 | 35 | 12,5304 | -76 | -32 | -3,4116 |
| LA MARÍA | 2,729679 | -76,53336 | 2 | 43 | 46,8444 | -76 | -32 | -0,096 |
| MANDIYACO | 1,283314 | -76,531871 | 1 | 16 | 59,9304 | -76 | -31 | -54,7356 |
| AMPARRADO ALTO Y MEDIO Y QUEBRADA CHONTADURO | 6,825237 | -76,529813 | 6 | 49 | 30,8532 | -76 | -31 | -47,3268 |
| NOVIRAO | 2,548325 | -76,528882 | 2 | 32 | 53,97 | -76 | -31 | -43,9752 |
| PUERTO LIMON | 1,014416 | -76,527675 | 1 | 0 | 51,8976 | -76 | -31 | -39,63 |
| PARED Y PARECITO | 5,356064 | -76,518539 | 5 | 21 | 21,8304 | -76 | -31 | -6,7404 |
| SANTA MARTA | 1,337886 | -76,517877 | 1 | 20 | 16,3896 | -76 | -31 | -4,3572 |
| LA LAGUNA - SIBERIA | 2,741457 | -76,515141 | 2 | 44 | 29,2452 | -76 | -30 | -54,5076 |
| MURRI-PANTANOS | 6,632873 | -76,509922 | 6 | 37 | 58,3428 | -76 | -30 | -35,7192 |
| CAÑÓN DEL RÍO SANQUININI | 4,377406 | -76,504639 | 4 | 22 | 38,6616 | -76 | -30 | -16,7004 |
| RÍO GARRAPATAS | 4,431803 | -76,503585 | 4 | 25 | 54,4908 | -76 | -30 | -12,906 |
| CAÑAVERALES-ANTADO | 6,805415 | -76,503478 | 6 | 48 | 19,494 | -76 | -30 | -12,5208 |
| LAS MERCEDES | 2,833616 | -76,503418 | 2 | 50 | 1,0176 | -76 | -30 | -12,3048 |
| JERUSALÉN-SAN LUIS ALTO PICUDITO | 0,863902 | -76,499117 | 0 | 51 | 50,0472 | -76 | -29 | -56,8212 |
| CHONTADURAL CAÑERO | 7,183003 | -76,499019 | 7 | 10 | 58,8108 | -76 | -29 | -56,4684 |
| LOS NIASA | 3,783171 | -76,497331 | 3 | 46 | 59,4156 | -76 | -29 | -50,3916 |
| RÍO NEGUA | 5,877568 | -76,494373 | 5 | 52 | 39,2448 | -76 | -29 | -39,7428 |
| PAVARANDÓ Y AMPARRADÓ MEDIO | 7,025824 | -76,488563 | 7 | 1 | 32,9664 | -76 | -29 | -18,8268 |
| KOKONUÇO | 2,29285 | -76,485856 | 2 | 17 | 34,26 | -76 | -29 | -9,0816 |
| PALETARÁ | 2,232832 | -76,484113 | 2 | 13 | 58,1952 | -76 | -29 | -2,8068 |
| STA ROSA-JUANAMBU-CAMPO ALEGRE-ALPES ORIENTALES | 0,777892 | -76,482669 | 0 | 46 | 40,4112 | -76 | -28 | -57,6084 |
| TUMBURAO | 2,707609 | -76,479777 | 2 | 42 | 27,3924 | -76 | -28 | -47,1972 |
| QUINTANA | 2,471799 | -76,479089 | 2 | 28 | 18,4764 | -76 | -28 | -44,7204 |
| JEBALÁ | 2,591751 | -76,472739 | 2 | 35 | 30,3036 | -76 | -28 | -21,8604 |
| PURACÉ | 2,390187 | -76,469047 | 2 | 23 | 24,6732 | -76 | -28 | -8,5692 |
| MOTORDO | 5,738234 | -76,46533 | 5 | 44 | 17,6424 | -76 | -27 | -55,188 |
| WASIRUMA | 3,762161 | -76,463489 | 3 | 45 | 43,7796 | -76 | -27 | -48,5604 |
| EL VEINTIUNO | 5,754311 | -76,462684 | 5 | 45 | 15,5196 | -76 | -27 | -45,6624 |
| CANOAS | 2,929224 | -76,459686 | 2 | 55 | 45,2064 | -76 | -27 | -34,8696 |
| JENATURADÓ | 6,756078 | -76,455689 | 6 | 45 | 21,8808 | -76 | -27 | -20,4804 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---|----|---------|-----|-----|----------|
| RÍO ICHO Y LA QUEBRADA BARATUDO | 5,809765 | -76,45537 | 5 | 48 | 35,154 | -76 | -27 | -19,332 |
| LA FLORESTA - LA ESPAÑOLA | 0,998465 | -76,445488 | 0 | 59 | 54,474 | -76 | -26 | -43,7568 |
| RÍO BEBARAMA | 6,007506 | -76,442949 | 6 | 0 | 27,0216 | -76 | -26 | -34,6164 |
| COPE DEL RÍO INGARA | 4,834993 | -76,442091 | 4 | 50 | 5,9748 | -76 | -26 | -31,5276 |
| ELVEINTE, PLAYALTA Y EL NOVENTA | 5,700999 | -76,440917 | 5 | 42 | 3,5964 | -76 | -26 | -27,3012 |
| GUADUALITO | 5,652522 | -76,437866 | 5 | 39 | 9,0792 | -76 | -26 | -16,3176 |
| NASA CHAMB | 0,51983 | -76,437804 | 0 | 31 | 11,388 | -76 | -26 | -16,0944 |
| RÍO BEBARA | 6,116027 | -76,423201 | 6 | 6 | 57,6972 | -76 | -25 | -23,5236 |
| POLINDARA | 2,482567 | -76,421309 | 2 | 28 | 57,2412 | -76 | -25 | -16,7124 |
| MAJORÉ-AMBURÁ | 6,475775 | -76,419161 | 6 | 28 | 32,79 | -76 | -25 | -8,9796 |
| HURTADO Y TEGAVERA | 5,648736 | -76,414066 | 5 | 38 | 55,4496 | -76 | -24 | -50,6376 |
| QUIZGO | 2,639668 | -76,410059 | 2 | 38 | 22,8048 | -76 | -24 | -36,2124 |
| CANIME | 8,79248 | -76,40517 | 8 | 47 | 32,928 | -76 | -24 | -18,612 |
| CHIMURRO Y NENDÓ | 6,956041 | -76,398117 | 6 | 57 | 21,7476 | -76 | -23 | -53,2212 |
| ANDABÚ | 6,258707 | -76,397337 | 6 | 15 | 31,3452 | -76 | -23 | -50,4132 |
| JAIKERAZAVI | 7,317383 | -76,38872 | 7 | 19 | 2,5788 | -76 | -23 | -19,392 |
| BOCHOROMA-BOCHOROMACITO | 5,266889 | -76,383198 | 5 | 16 | 0,8004 | -76 | -22 | -59,5128 |
| ALTO BONITO VIRA VIRA | 5,118172 | -76,382877 | 5 | 7 | 5,4192 | -76 | -22 | -58,3572 |
| PAEZ DE TOEZ | 3,050159 | -76,380947 | 3 | 3 | 0,5724 | -76 | -22 | -51,4092 |
| CHAQUENODA | 6,704578 | -76,377157 | 6 | 42 | 16,4808 | -76 | -22 | -37,7652 |
| QUICHAYA | 2,711368 | -76,375599 | 2 | 42 | 40,9248 | -76 | -22 | -32,1564 |
| DRUA DO (PORTALES DEL RÍO) | 4,21968 | -76,373089 | 4 | 13 | 10,848 | -76 | -22 | -23,1204 |
| GEGORÁ, QUIPARÁ, MURARÁ, TIRAVENADO Y JIGUADÓ | 5,487052 | -76,370194 | 5 | 29 | 13,3872 | -76 | -22 | -12,6984 |
| AMBALÓ | 2,564856 | -76,369154 | 2 | 33 | 53,4816 | -76 | -22 | -8,9544 |
| HUELLAS | 3,005881 | -76,358419 | 3 | 0 | 21,1716 | -76 | -21 | -30,3084 |
| EL 18 | 5,73347 | -76,358184 | 5 | 44 | 0,492 | -76 | -21 | -29,4624 |
| CHUSCAL Y TUGURIDOCITO | 6,840647 | -76,3547 | 6 | 50 | 26,3292 | -76 | -21 | -16,92 |
| EL SILENCIO | 5,342065 | -76,354315 | 5 | 20 | 31,434 | -76 | -21 | -15,534 |
| VALLE DE PERDIDAS | 6,551063 | -76,352395 | 6 | 33 | 3,8268 | -76 | -21 | -8,622 |
| BAJO CÁCERES | 4,215656 | -76,350709 | 4 | 12 | 56,3616 | -76 | -21 | -2,5524 |
| SABALETERA SAN ONOFRE Y EL TIGRE | 5,026846 | -76,344583 | 5 | 1 | 36,6456 | -76 | -20 | -40,4988 |
| ABEJERO | 5,724721 | -76,341519 | 5 | 43 | 28,9956 | -76 | -20 | -29,4684 |
| TOTORÓ | 2,538381 | -76,340671 | 2 | 32 | 18,1716 | -76 | -20 | -26,4156 |
| SAN AGUSTIN | 1,880133 | -76,339016 | 1 | 52 | 48,4788 | -76 | -20 | -20,4576 |
| RÍO LA PLAYA | 5,793159 | -76,337184 | 5 | 47 | 35,3724 | -76 | -20 | -13,8624 |
| LA AGUADITA | 0,903031 | -76,333349 | 0 | 54 | 10,9116 | -76 | -20 | -0,0564 |
| EL DESCANSO | 0,924924 | -76,329196 | 0 | 55 | 29,7264 | -76 | -19 | -45,1056 |
| MONDO-MONDOCITO | 5,272697 | -76,328121 | 5 | 16 | 21,7092 | -76 | -19 | -41,2356 |
| JAMBALÓ | 2,897126 | -76,324299 | 2 | 53 | 49,6536 | -76 | -19 | -27,4764 |
| RÍO MUMBU | 5,62462 | -76,315077 | 5 | 37 | 28,632 | -76 | -18 | -54,2772 |
| CORINTO LÓPEZ ADENTRO | 3,115484 | -76,309972 | 3 | 6 | 55,7424 | -76 | -18 | -35,8992 |
| CHOROMANDÓ ALTO Y MEDIO | 6,948266 | -76,30478 | 6 | 56 | 53,7576 | -76 | -18 | -17,208 |
| SEVER | 7,126025 | -76,303449 | 7 | 7 | 33,69 | -76 | -18 | -12,4164 |
| LANAS | 5,673387 | -76,295443 | 5 | 40 | 24,1932 | -76 | -17 | -43,5948 |
| GUAMBÍA | 2,62127 | -76,294587 | 2 | 37 | 16,572 | -76 | -17 | -40,5132 |
| LA CRISTALINA | 6,104846 | -76,286111 | 6 | 6 | 17,4456 | -76 | -17 | -9,9996 |
| ALPAMANGA | 0,94827 | -76,284534 | 0 | 56 | 53,772 | -76 | -17 | -4,3224 |
| TARENA | 5,253864 | -76,272267 | 5 | 15 | 13,9104 | -76 | -16 | -20,1612 |
| NARIKIZAVI | 6,951346 | -76,271166 | 6 | 57 | 4,8456 | -76 | -16 | -17,976 |
| EL DOCE O QUEBRADA BORBOLLÓN | 5,719022 | -76,271411 | 5 | 43 | 8,4792 | -76 | -16 | -17,0796 |
| EL FIERA | 5,83966 | -76,265166 | 5 | 50 | 22,776 | -76 | -15 | -54,5976 |
| EMBERA DRUA | 6,93805 | -76,265035 | 6 | 56 | 16,98 | -76 | -15 | -54,126 |
| INGA DE SAN MIGUEL | 1,146986 | -76,252251 | 1 | 8 | 49,1496 | -76 | -15 | -8,1036 |
| NASA THA | 3,359609 | -76,249674 | 3 | 21 | 34,5924 | -76 | -14 | -58,8264 |
| BUENAVISTA | 0,453771 | -76,240096 | 0 | 27 | 13,5756 | -76 | -14 | -24,3456 |
| EL CHARCÓN | 6,881486 | -76,22774 | 6 | 52 | 53,3496 | -76 | -13 | -39,864 |
| ALTO SINU, ESMERALDA CRUZ GRANDE E IWAGADO | 7,638083 | -76,225984 | 7 | 38 | 17,0988 | -76 | -13 | -33,5424 |
| SABALETA | 5,792956 | -76,225844 | 5 | 47 | 34,6416 | -76 | -13 | -33,0384 |
| WANCHIRADO | 5,627615 | -76,223854 | 5 | 37 | 39,414 | -76 | -13 | -25,8744 |
| SAN ANTONIO DEL FRAGUA | 1,092431 | -76,218844 | 1 | 5 | 32,7516 | -76 | -13 | -7,8384 |
| LA PURIA | 5,69834 | -76,21763 | 5 | 41 | 54,024 | -76 | -13 | -3,468 |
| DOXURA | 4,687283 | -76,21573 | 4 | 41 | 14,2188 | -76 | -12 | -56,628 |
| NUSIDO | 6,793904 | -76,209348 | 6 | 47 | 38,0544 | -76 | -12 | -33,6528 |
| WASIPANGA | 1,004326 | -76,206571 | 1 | 0 | 15,5736 | -76 | -12 | -23,6556 |
| NASA KWE'S KIWE | 3,310669 | -76,199653 | 3 | 18 | 38,4084 | -76 | -11 | -58,7508 |
| LA CILIA O LA CALERA | 3,195768 | -76,186246 | 3 | 11 | 44,7648 | -76 | -11 | -10,4856 |
| KWET WALA (PIEDRA GRANDE) | 3,404431 | -76,17309 | 3 | 24 | 15,9516 | -76 | -10 | -23,124 |
| JUAN TAMA | 2,244959 | -76,165287 | 2 | 14 | 41,8524 | -76 | -9 | -55,0332 |
| ANDAGUEDA | 5,539583 | -76,150247 | 5 | 32 | 22,4988 | -76 | -9 | -0,8892 |
| EL PORTAL | 1,210424 | -76,148917 | 1 | 12 | 37,5264 | -76 | -8 | -56,1012 |
| GITO DOCABU | 5,391593 | -76,142955 | 5 | 23 | 29,7348 | -76 | -8 | -34,638 |
| SAN RAFAEL | 1,091439 | -76,132667 | 1 | 5 | 29,1804 | -76 | -7 | -57,6012 |
| RUMIYACO | 1,895262 | -76,129769 | 1 | 53 | 42,9432 | -76 | -7 | -47,1684 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------|---|----|---------|-----|-----|----------|
| VANIA CHAMÍ DE ARGELIA | 4,690277 | -76,127077 | 4 | 41 | 24,9972 | -76 | -7 | -37,4772 |
| CALENTURAS | 0,99326 | -76,118602 | 0 | 59 | 35,736 | -76 | -7 | -6,9672 |
| NAM MISAK | 2,140566 | -76,115256 | 2 | 8 | 26,0376 | -76 | -6 | -54,9216 |
| SANTA CRUZ DE PIÑUÑA BLANCO | 0,406329 | -76,111801 | 0 | 24 | 22,7844 | -76 | -6 | -42,4836 |
| LA ESTACIÓN TÁLAGA | 2,196359 | -76,104542 | 2 | 11 | 46,8924 | -76 | -6 | -16,3512 |
| YURAYACO | 1,247528 | -76,101094 | 1 | 14 | 51,1008 | -76 | -6 | -3,9384 |
| LAS BRISAS | 1,079064 | -76,099847 | 1 | 4 | 44,6304 | -76 | -5 | -59,4492 |
| TUMBICHUCUE | 2,638969 | -76,099398 | 2 | 38 | 20,2884 | -76 | -5 | -57,8328 |
| TRIUNFO CRISTAL | 3,345212 | -76,099119 | 3 | 20 | 42,7632 | -76 | -5 | -56,8284 |
| LA ESTACIÓN TÁLAGA | 2,208171 | -76,08613 | 2 | 12 | 29,4156 | -76 | -5 | -10,068 |
| VILLA CATALINA-DE PUERTO ROSARIO | 0,71043 | -76,085264 | 0 | 42 | 37,548 | -76 | -5 | -6,9504 |
| LA GAITANA | 2,497513 | -76,082642 | 2 | 29 | 51,0468 | -76 | -4 | -57,5112 |
| LA GAITANA | 2,363283 | -76,079067 | 2 | 21 | 47,8188 | -76 | -4 | -44,6412 |
| NUEVO AMANECER - LA MESETA | 2,179132 | -76,074592 | 2 | 10 | 44,8752 | -76 | -4 | -28,5312 |
| LA ESTACIÓN TÁLAGA | 2,201169 | -76,073279 | 2 | 12 | 4,2084 | -76 | -4 | -23,8044 |
| DACHI DRUA MUNDI | 4,76791 | -76,066327 | 4 | 46 | 4,476 | -76 | -3 | -58,7772 |
| LA ESTACIÓN TÁLAGA | 2,202747 | -76,064764 | 2 | 12 | 9,8892 | -76 | -3 | -53,1504 |
| LA ESTACIÓN TÁLAGA | 2,204574 | -76,060636 | 2 | 12 | 16,4664 | -76 | -3 | -38,2896 |
| LA REFORMA | 2,207165 | -76,054837 | 2 | 12 | 25,794 | -76 | -3 | -17,4132 |
| CALDERAS | 2,641631 | -76,047043 | 2 | 38 | 29,8716 | -76 | -2 | -49,3548 |
| UNIFICADO CHAMÍ DEL RÍO SAN JUAN | 5,439823 | -76,046656 | 5 | 26 | 23,3628 | -76 | -2 | -47,9616 |
| PICKWE IKH | 2,116653 | -76,037988 | 2 | 6 | 59,9508 | -76 | -2 | -16,7568 |
| HERMEREGILDO CHAKIAMA | 5,820974 | -76,033839 | 5 | 49 | 15,5064 | -76 | -2 | -1,8204 |
| LA ESPERANZA | 1,542368 | -75,945861 | 1 | 32 | 32,5248 | -75 | -56 | -45,0996 |
| CRISTIANÍA | 5,552846 | -75,925929 | 5 | 33 | 10,2456 | -75 | -55 | -33,3444 |
| LOMA DE CITABARA | 5,404316 | -75,923299 | 5 | 24 | 15,5376 | -75 | -55 | -23,8764 |
| CALARCA | 0,267772 | -75,910824 | 0 | 16 | 3,9792 | -75 | -54 | -38,9664 |
| DACHI DRUA CHAMÍ | 4,088018 | -75,906234 | 4 | 5 | 16,8648 | -75 | -54 | -22,4424 |
| LA NUEVA ESPERANZA | 2,355881 | -75,904721 | 2 | 21 | 21,1716 | -75 | -54 | -16,9956 |
| FLOR DEL MONTE | 5,140369 | -75,881577 | 5 | 8 | 25,3284 | -75 | -52 | -53,6772 |
| LAS MERCEDES | 3,297145 | -75,87343 | 3 | 17 | 49,722 | -75 | -52 | -24,348 |
| NASA DE CXHAB WALA LUUCX | 2,459859 | -75,87324 | 2 | 27 | 35,4924 | -75 | -52 | -23,664 |
| ALTO SAN JORGE | 7,739027 | -75,861462 | 7 | 44 | 20,4972 | -75 | -51 | -41,2632 |
| QUEBRADA CAÑAVERAL | 7,430811 | -75,854529 | 7 | 25 | 50,9196 | -75 | -51 | -16,3044 |
| POTRERITO | 2,352078 | -75,851421 | 2 | 21 | 7,4808 | -75 | -51 | -5,1156 |
| PAEZ DE GAITANÍA | 3,092162 | -75,848945 | 3 | 5 | 31,7832 | -75 | -50 | -56,202 |
| PICKWE THA FIW | 2,511559 | -75,848081 | 2 | 30 | 41,6124 | -75 | -50 | -53,0916 |
| LOS PIJAOS | 1,226157 | -75,846768 | 1 | 13 | 34,1652 | -75 | -50 | -48,3648 |
| LA CERINDA | 1,609459 | -75,845979 | 1 | 36 | 34,0524 | -75 | -50 | -45,5244 |
| BERNARDINO PANCHI | 5,766699 | -75,83585 | 5 | 46 | 0,1164 | -75 | -50 | -9,06 |
| TOTUMAL | 5,010697 | -75,815319 | 5 | 0 | 38,5092 | -75 | -48 | -55,1484 |
| KARABIDRUA | 4,251841 | -75,81472 | 4 | 15 | 6,6276 | -75 | -48 | -52,992 |
| LA ALBANIA | 5,106044 | -75,810958 | 5 | 6 | 21,7584 | -75 | -48 | -39,4488 |
| SURATENA | 5,004807 | -75,76126 | 5 | 0 | 17,3052 | -75 | -45 | -40,536 |
| HONDURAS | 1,573621 | -75,756389 | 1 | 34 | 25,0356 | -75 | -45 | -23,0004 |
| ALTOMIRA | 4,956346 | -75,752429 | 4 | 57 | 22,8456 | -75 | -45 | -8,7444 |
| LLANO BUCO BUKI UKUE | 2,663899 | -75,749402 | 2 | 39 | 50,0364 | -75 | -44 | -57,8472 |
| CUSUMBE-AGUA BLANCA | 0,893183 | -75,73209 | 0 | 53 | 35,4588 | -75 | -43 | -55,524 |
| SAN LORENZO | 5,512168 | -75,715207 | 5 | 30 | 43,8048 | -75 | -42 | -54,7452 |
| LA MIRLA | 5,638932 | -75,686125 | 5 | 38 | 20,1552 | -75 | -41 | -10,05 |
| JAI-DUKAMA | 7,420779 | -75,683685 | 7 | 25 | 14,8044 | -75 | -41 | -1,266 |
| ESCOPEPETERA - PIRZA | 5,364547 | -75,673092 | 5 | 21 | 52,3692 | -75 | -40 | -23,1312 |
| DACHÍ AGORE DRUA | 4,425979 | -75,65388 | 4 | 25 | 33,5244 | -75 | -39 | -13,788 |
| KARABIJUA | 4,473451 | -75,639238 | 4 | 28 | 24,4236 | -75 | -38 | -21,2568 |
| LA MARÍA | 5,603457 | -75,624367 | 5 | 36 | 12,4452 | -75 | -37 | -27,7212 |
| EL PORVENIR - LA BARRIALOSA | 0,655094 | -75,61182 | 0 | 39 | 18,3384 | -75 | -36 | -42,552 |
| JAIDEZAVÍ | 7,442106 | -75,540573 | 7 | 26 | 31,5816 | -75 | -32 | -26,0628 |
| EL HACHA | 0,010328 | -75,518421 | 0 | 0 | 37,1808 | -75 | -31 | -6,3156 |
| SAN ANDRES DE SOTAVENTO | 9,207037 | -75,511087 | 9 | 12 | 25,3332 | -75 | -30 | -39,9132 |
| NASA WE SX KIWE LA GAITANA_D | 1,607361 | -75,510492 | 1 | 36 | 26,4996 | -75 | -30 | -37,7712 |
| SAN ANTONIO DE CALARMA | 3,979393 | -75,477113 | 3 | 58 | 45,8148 | -75 | -28 | -37,6068 |
| GORGONIA | 1,324966 | -75,47095 | 1 | 19 | 29,8776 | -75 | -28 | -15,42 |
| MATICURÚ | 1,061879 | -75,435102 | 1 | 3 | 42,7644 | -75 | -26 | -6,3672 |
| GETUCHÁ | 1,126137 | -75,41868 | 1 | 7 | 34,0932 | -75 | -25 | -7,248 |
| PAEZ DEL LIBANO | 0,769594 | -75,41425 | 0 | 46 | 10,5384 | -75 | -24 | -51,3 |
| SAN PABLO EL PARÁ | 1,899154 | -75,403486 | 1 | 53 | 56,9544 | -75 | -24 | -12,5496 |
| BACHE | 3,009146 | -75,401161 | 3 | 0 | 32,9256 | -75 | -24 | -4,1796 |
| NIÑERAS | 0,793161 | -75,388251 | 0 | 47 | 35,3796 | -75 | -23 | -17,7036 |
| AGUA NEGRA | -0,06816 | -75,364742 | 0 | -4 | -5,376 | -75 | -21 | -53,0712 |
| CAMPOALEGRE | 4,038112 | -75,354177 | 4 | 2 | 17,2032 | -75 | -21 | -15,0372 |
| JACOME | 1,057472 | -75,345293 | 1 | 3 | 26,8992 | -75 | -20 | -43,0548 |
| HERICHA | 0,955078 | -75,336376 | 0 | 57 | 18,2808 | -75 | -20 | -10,9536 |
| GUADUALITO | 3,639054 | -75,317517 | 3 | 38 | 20,5944 | -75 | -19 | -3,0612 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|---|----|----------|-----|-----|----------|
| ANABA | 3,953935 | -75,306487 | 3 | 57 | 14,166 | -75 | -18 | -23,3532 |
| EL VERGEL | 3,9669 | -75,300564 | 3 | 58 | 0,84 | -75 | -18 | -2,0304 |
| EL CEDRITO | 1,322613 | -75,294178 | 1 | 19 | 21,4068 | -75 | -17 | -39,0408 |
| AGUA NEGRA | 1,024468 | -75,291162 | 1 | 1 | 28,0848 | -75 | -17 | -28,1832 |
| LA FLECHA ALTOZANO | 3,981766 | -75,289436 | 3 | 58 | 54,3576 | -75 | -17 | -21,9696 |
| POTRERITO | 3,679235 | -75,289191 | 3 | 40 | 45,246 | -75 | -17 | -21,0876 |
| LA PERECERA | -0,074552 | -75,287965 | 0 | -4 | -28,3872 | -75 | -17 | -16,674 |
| LA PAYA | -0,027457 | -75,269425 | 0 | -1 | -38,8452 | -75 | -16 | -9,93 |
| CONSARA-MECAYA | 0,421833 | -75,263568 | 0 | 25 | 18,5988 | -75 | -15 | -48,8448 |
| BALSILLAS | 3,797184 | -75,257562 | 3 | 47 | 49,8624 | -75 | -15 | -27,2232 |
| LA TUTIRA BONANZA | 3,69522 | -75,256448 | 3 | 41 | 42,792 | -75 | -15 | -23,2128 |
| BALSILLAS LIMON | 3,779032 | -75,255915 | 3 | 46 | 44,5152 | -75 | -15 | -21,294 |
| MESA DE ORTEGA | 4,014549 | -75,254229 | 4 | 0 | 52,3764 | -75 | -15 | -15,2244 |
| SAN LUIS | 0,94564 | -75,25121 | 0 | 56 | 44,304 | -75 | -15 | -4,356 |
| MENCHE SAN CAYETANO | 3,749118 | -75,248486 | 3 | 44 | 56,8248 | -75 | -14 | -54,5496 |
| CHENCHE BUENAVISTA | 3,720491 | -75,247717 | 3 | 43 | 13,7676 | -75 | -14 | -51,7812 |
| POCARA | 3,872058 | -75,245983 | 3 | 52 | 19,4088 | -75 | -14 | -45,5388 |
| GUAIPA UNO | 3,800702 | -75,242175 | 3 | 48 | 2,5272 | -75 | -14 | -31,83 |
| WITACK KIWE | 1,898525 | -75,240948 | 1 | 53 | 54,69 | -75 | -14 | -27,4128 |
| BELTRAN | 3,586336 | -75,240353 | 3 | 35 | 10,8096 | -75 | -14 | -25,2708 |
| TRES ESQUINAS | 3,648268 | -75,236119 | 3 | 38 | 53,7648 | -75 | -14 | -10,0284 |
| AICO | 3,822753 | -75,232304 | 3 | 49 | 21,9108 | -75 | -13 | -56,2944 |
| TAMA - PAEZ LA GABRIELA | 2,875497 | -75,231668 | 2 | 52 | 31,7892 | -75 | -13 | -54,0048 |
| NICOLÁS RAMÍREZ | 3,85083 | -75,230651 | 3 | 51 | 2,988 | -75 | -13 | -50,3436 |
| NATACOY PIJAO | 3,587845 | -75,23036 | 3 | 35 | 16,242 | -75 | -13 | -49,296 |
| TAMA DEL CAGUAN | 2,831326 | -75,21836 | 2 | 49 | 52,7736 | -75 | -13 | -6,096 |
| GUAIPA CENTRO | 3,78237 | -75,218253 | 3 | 46 | 56,532 | -75 | -13 | -5,7108 |
| LA SORTIJA | 3,880749 | -75,215242 | 3 | 52 | 50,6964 | -75 | -12 | -54,8712 |
| LA TATACOA | 3,319518 | -75,208885 | 3 | 19 | 10,2648 | -75 | -12 | -31,986 |
| TOTARCO DINDE TRADICIONAL | 3,718031 | -75,200705 | 3 | 43 | 4,9116 | -75 | -12 | -2,538 |
| SAN DIEGO | 3,819888 | -75,199655 | 3 | 49 | 11,5968 | -75 | -11 | -58,758 |
| TOTARCO DINDE-INDEPENDIENTE | 3,714196 | -75,198902 | 3 | 42 | 51,1056 | -75 | -11 | -56,0472 |
| CHENCHE AMAYARCO | 3,74069 | -75,198592 | 3 | 44 | 26,484 | -75 | -11 | -54,9312 |
| EL TRIUNFO | 0,909315 | -75,197907 | 0 | 54 | 33,534 | -75 | -11 | -52,4652 |
| IMBA | 3,59421 | -75,196361 | 3 | 35 | 39,156 | -75 | -11 | -46,8996 |
| EL QUINCE | 0,795635 | -75,194397 | 0 | 47 | 44,286 | -75 | -11 | -39,8292 |
| SAN MIGUEL | 0,914123 | -75,191834 | 0 | 54 | 50,8428 | -75 | -11 | -30,6024 |
| PUERTO NARANJO, PEÑAS ROJAS, CUERAZO Y EL DIAMANTE | 0,955054 | -75,18941 | 0 | 57 | 18,1944 | -75 | -11 | -21,876 |
| VUELTA DEL RÍO | 3,862519 | -75,189154 | 3 | 51 | 45,0684 | -75 | -11 | -20,9544 |
| ALTOS DEL TIGRE | 7,584286 | -75,186779 | 7 | 35 | 3,4296 | -75 | -11 | -12,4044 |
| PALERMO | 3,893401 | -75,181464 | 3 | 53 | 36,2436 | -75 | -10 | -53,2704 |
| TOTARCO TAMARINDO | 3,710291 | -75,180844 | 3 | 42 | 37,0476 | -75 | -10 | -51,0384 |
| TOTARCO PIEDRAS | 3,686177 | -75,176598 | 3 | 41 | 10,2372 | -75 | -10 | -35,7528 |
| TOTARCO NIPLE | 3,670075 | -75,174654 | 3 | 40 | 12,27 | -75 | -10 | -28,7544 |
| BOCAS DE TETUAN | 3,869364 | -75,173702 | 3 | 52 | 9,7104 | -75 | -10 | -25,3272 |
| CHENCHE BALSILLAS | 3,748848 | -75,166883 | 3 | 44 | 55,8528 | -75 | -10 | -0,7788 |
| ANACARCO | 3,467932 | -75,165546 | 3 | 28 | 4,5552 | -75 | -9 | -55,9656 |
| CHENCHE BALSILLAS | 3,755686 | -75,164859 | 3 | 45 | 20,4696 | -75 | -9 | -53,4924 |
| POTRERITO DOYARÉ | 3,815026 | -75,159908 | 3 | 48 | 54,0936 | -75 | -9 | -35,6688 |
| GUATAVITA TÚA | 3,896494 | -75,157939 | 3 | 53 | 47,3784 | -75 | -9 | -28,5804 |
| ZANJA HONDA | 3,679106 | -75,15785 | 3 | 40 | 44,7816 | -75 | -9 | -28,26 |
| LA ESPERANZA | 0,976777 | -75,154925 | 0 | 58 | 36,3972 | -75 | -9 | -17,73 |
| SANTA MARTA PALMAR | 3,862957 | -75,150753 | 3 | 51 | 46,6452 | -75 | -9 | -2,7108 |
| PACANDE | 3,501136 | -75,150115 | 3 | 30 | 4,0896 | -75 | -9 | -0,414 |
| EL TABLERO | -0,016978 | -75,149345 | 0 | -1 | -1,1208 | -75 | -8 | -57,642 |
| RINCÓN BODEGA | 3,471592 | -75,149211 | 3 | 28 | 17,7312 | -75 | -8 | -57,1596 |
| LOMAS DE HILARCO | 3,710697 | -75,14879 | 3 | 42 | 38,5092 | -75 | -8 | -55,644 |
| PUEBLO NUEVO | 3,447709 | -75,148545 | 3 | 26 | 51,7524 | -75 | -8 | -54,762 |
| PASO ANCHO-CHICUAMBE | 3,928334 | -75,14246 | 3 | 55 | 42,0024 | -75 | -8 | -32,856 |
| YACO MOLANA | 3,494354 | -75,134939 | 3 | 29 | 39,6744 | -75 | -8 | -5,7804 |
| BARZALOZA | 3,439321 | -75,133753 | 3 | 26 | 21,5556 | -75 | -8 | -1,5108 |
| NATARROCO | 3,608073 | -75,131227 | 3 | 36 | 29,0628 | -75 | -7 | -52,4172 |
| ZARAGOZA TAMARINDO | 3,76823 | -75,130762 | 3 | 46 | 5,628 | -75 | -7 | -50,7432 |
| GUASIMAL | 3,574014 | -75,127108 | 3 | 34 | 26,4504 | -75 | -7 | -37,5888 |
| SAN MIGUEL | 3,634134 | -75,124379 | 3 | 38 | 2,8824 | -75 | -7 | -27,7644 |
| CHENCHE BUENOS AIRES TRADICIONAL | 3,793693 | -75,122665 | 3 | 47 | 37,2948 | -75 | -7 | -21,594 |
| COCANA | 3,458724 | -75,11907 | 3 | 27 | 31,4064 | -75 | -7 | -8,652 |
| CHENCHE BUENOS AIRES INDEPENDIENTE | 3,801296 | -75,117955 | 3 | 48 | 4,6656 | -75 | -7 | -4,638 |
| HILARQUITO | 3,742691 | -75,116773 | 3 | 44 | 33,6876 | -75 | -7 | -0,3828 |
| QUEBRADITAS | 3,489652 | -75,114674 | 3 | 29 | 22,7472 | -75 | -6 | -52,8264 |
| SANTA MARTA DIAMANTE | 3,858758 | -75,110058 | 3 | 51 | 31,5288 | -75 | -6 | -36,2088 |
| MERCADILLO | 3,49155 | -75,109857 | 3 | 29 | 29,58 | -75 | -6 | -35,4852 |
| LOMAS DE GUAGUARCO | 3,698398 | -75,108628 | 3 | 41 | 54,2328 | -75 | -6 | -31,0608 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|----|-----|----------|-----|-----|----------|
| RINCÓN DE ANCHIQUE | 3,608828 | -75,108613 | 3 | 36 | 31,7808 | -75 | -6 | -31,0068 |
| RINCÓN VELÚ | 3,542477 | -75,108165 | 3 | 32 | 32,9172 | -75 | -6 | -29,394 |
| PALMA ALTA | 3,681336 | -75,107658 | 3 | 40 | 52,8096 | -75 | -6 | -27,5688 |
| CHENCHÉ MEDIA LUNA | 3,768213 | -75,107212 | 3 | 46 | 5,5668 | -75 | -6 | -25,9632 |
| CHENCHÉ-SOCORRO-LOS GUAYABOS | 3,794015 | -75,100911 | 3 | 47 | 38,454 | -75 | -6 | -3,2796 |
| NUEVA ESPERANZA | 3,720887 | -75,100433 | 3 | 43 | 15,1932 | -75 | -6 | -1,5588 |
| RECINTO PALMAROSA | 3,928492 | -75,09494 | 3 | 55 | 42,5712 | -75 | -5 | -41,784 |
| EL GUAYABAL | 0,844689 | -75,08883 | 0 | 50 | 40,8804 | -75 | -5 | -19,788 |
| NASSA KIWE | 1,948275 | -75,085295 | 1 | 56 | 53,79 | -75 | -5 | -7,062 |
| CASTILLA - ANGOSTURAS | 3,802563 | -75,078118 | 3 | 48 | 9,2268 | -75 | -4 | -41,2248 |
| FLORAL TRADICIONAL | 3,707282 | -75,070454 | 3 | 42 | 26,2152 | -75 | -4 | -13,6344 |
| VELU CENTRO | 3,561655 | -75,068718 | 3 | 33 | 41,958 | -75 | -4 | -7,3848 |
| GUALERAS | 3,572229 | -75,067996 | 3 | 34 | 20,0244 | -75 | -4 | -4,7856 |
| JERICÓ-CONSAYA | 0,597674 | -75,067153 | 0 | 35 | 51,6264 | -75 | -4 | -1,7508 |
| DIAMANTE | 3,528541 | -75,065978 | 3 | 31 | 42,7476 | -75 | -3 | -57,5208 |
| NANURCO | 3,604903 | -75,065629 | 3 | 36 | 17,6508 | -75 | -3 | -56,2644 |
| LOS ÁNGELES | 3,62229 | -75,065383 | 3 | 37 | 20,244 | -75 | -3 | -55,3788 |
| EL TAMBO | 3,656858 | -75,059909 | 3 | 39 | 24,6888 | -75 | -3 | -35,6724 |
| SAN MIGUEL | 3,79231 | -75,054089 | 3 | 47 | 32,316 | -75 | -3 | -14,7204 |
| OLIRCO | 3,590722 | -75,053909 | 3 | 35 | 26,5992 | -75 | -3 | -14,0724 |
| BATEAS | 3,565085 | -75,043535 | 3 | 33 | 54,306 | -75 | -2 | -36,726 |
| CHAQUIRA | 3,540386 | -75,036738 | 3 | 32 | 25,3896 | -75 | -2 | -12,2568 |
| VEGAS DE SEGOVIA | 7,453566 | -75,034559 | 7 | 27 | 12,8376 | -75 | -2 | -4,4124 |
| POCHARCO | 3,667281 | -75,024507 | 3 | 40 | 2,2116 | -75 | -1 | -28,2252 |
| TINAJAS | 3,504472 | -75,022996 | 3 | 30 | 16,0992 | -75 | -1 | -22,7856 |
| TAMIRCO | 3,591 | -75,021608 | 3 | 35 | 27,6 | -75 | -1 | -17,7888 |
| BAJO CASACUNTE | -0,105481 | -75,011679 | 0 | -6 | -19,7316 | -75 | 0 | -42,0444 |
| ZIT-SET DEL QUECAL | 1,95188 | -74,995088 | 1 | 57 | 6,768 | -74 | -59 | -42,3168 |
| LAS PALMAS | 3,713467 | -74,994882 | 3 | 42 | 48,4812 | -74 | -59 | -41,5752 |
| MESAS DE SAN JUAN | 3,745561 | -74,991931 | 3 | 44 | 44,0196 | -74 | -59 | -30,9516 |
| LA TEÓFILA | 0,500639 | -74,967812 | 0 | 30 | 2,3004 | -74 | -58 | -4,1232 |
| COROPOYA | 0,433984 | -74,967005 | 0 | 26 | 2,3424 | -74 | -58 | -1,218 |
| BANDERAS DEL RECAIBO | 2,113985 | -74,961533 | 2 | 6 | 50,346 | -74 | -57 | -41,5188 |
| CECILIA COCHA | -0,126273 | -74,944664 | 0 | -7 | -34,5828 | -74 | -56 | -40,7904 |
| LA SIBERIA | 1,563189 | -74,918711 | 1 | 33 | 47,4804 | -74 | -55 | -7,3596 |
| ALTAMIRA | 2,502035 | -74,891315 | 2 | 30 | 7,326 | -74 | -53 | -28,734 |
| TUKUNARE | -0,142601 | -74,87231 | 0 | -8 | -33,3636 | -74 | -52 | -20,316 |
| LAGARTO COCHA | -0,106627 | -74,844388 | 0 | -6 | -23,8572 | -74 | -50 | -39,7968 |
| PABLO MUERA | 7,339065 | -74,80269 | 7 | 20 | 20,634 | -74 | -48 | -9,684 |
| ACO VIEJO PATIO BONITO | 3,7461 | -74,794596 | 3 | 44 | 45,96 | -74 | -47 | -40,5456 |
| SOHIBADO | 7,93548 | -74,74848 | 7 | 56 | 7,728 | -74 | -44 | -54,528 |
| EL PROGRESO | -0,03672 | -74,718502 | 0 | -2 | -12,192 | -74 | -43 | -6,6072 |
| JIRIJIRI | -0,005866 | -74,69865 | 0 | 0 | -21,1176 | -74 | -41 | -55,14 |
| LOS ALMENDROS | 7,460436 | -74,675028 | 7 | 27 | 37,5696 | -74 | -40 | -30,1008 |
| SANTA RITA | -0,262567 | -74,67419 | 0 | -15 | -45,2412 | -74 | -40 | -27,084 |
| WITORA O HUITORA | 0,277675 | -74,644993 | 0 | 16 | 39,63 | -74 | -38 | -41,9748 |
| TAGUAL-LA PO | 7,260187 | -74,605637 | 7 | 15 | 36,6732 | -74 | -36 | -20,2932 |
| AGUAS NEGRAS | 0,001197 | -74,570414 | 0 | 0 | 4,3092 | -74 | -34 | -13,4904 |
| LA LIBERTAD 2 | 1,496323 | -74,444849 | 1 | 29 | 46,7628 | -74 | -26 | -41,4564 |
| LOS PLANES | 3,289594 | -74,413996 | 3 | 17 | 22,5384 | -74 | -24 | -50,3856 |
| CHIMILAS O CACAHEROS DE SAN ANGEL | 10,013278 | -74,301252 | 10 | 0 | 47,8008 | -74 | -18 | -4,5072 |
| ONDAS DEL CAFRE | 3,400075 | -74,229426 | 3 | 24 | 0,27 | -74 | -13 | -45,9336 |
| LA JULIA | 2,86277 | -74,195387 | 2 | 51 | 45,972 | -74 | -11 | -43,3932 |
| VILLA LUCIA | 3,47543 | -74,165093 | 3 | 28 | 31,548 | -74 | -9 | -54,3348 |
| MUISCA DE FONQUETÁ Y CERCA DE PIEDRA | 4,857172 | -74,085181 | 4 | 51 | 25,8192 | -74 | -5 | -6,6516 |
| ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA | 10,611985 | -73,675645 | 10 | 36 | 43,146 | -73 | -40 | -32,322 |
| BUSINCHAMA | 10,325601 | -73,645365 | 10 | 19 | 32,1636 | -73 | -38 | -43,314 |
| LLANOS DEL YARÍ - YAGUARÁ II | 1,826809 | -73,596145 | 1 | 49 | 36,5124 | -73 | -35 | -46,122 |
| KOGUI-MALAYO ARHUACO | 10,970863 | -73,550221 | 10 | 58 | 15,1068 | -73 | -33 | -0,7956 |
| PUERTO SABALO | -0,266666 | -73,447848 | 0 | -15 | -59,9976 | -73 | -26 | -52,2528 |
| MENKUE-MISAYA Y LA PISTA | 9,891333 | -73,444311 | 9 | 53 | 28,7988 | -73 | -26 | -39,5196 |
| KANKUAMO | 10,679141 | -73,329763 | 10 | 40 | 44,9076 | -73 | -19 | -47,1468 |
| MAGUARE | 4,012418 | -73,219611 | 4 | 0 | 44,7048 | -73 | -13 | -10,5996 |
| CAMPO ALEGRE | 9,781024 | -73,158563 | 9 | 46 | 51,6864 | -73 | -9 | -30,8268 |
| MOTILÓN - BARÍ | 9,053516 | -73,156438 | 9 | 3 | 12,6576 | -73 | -9 | -23,1768 |
| EL ROSARÍO, BELLAVISTA Y YUKATÁN | 10,158375 | -73,132009 | 10 | 9 | 30,15 | -73 | -7 | -55,2324 |
| GABARRA-CATALAURA | 8,834733 | -73,088288 | 8 | 50 | 5,0388 | -73 | -5 | -17,8368 |
| CAÑO PADILLA | 10,29306 | -73,078533 | 10 | 17 | 35,016 | -73 | -4 | -42,7188 |
| PERRATPU | 11,435117 | -73,078072 | 11 | 26 | 6,4212 | -73 | -4 | -41,0592 |
| SOCORPA | 9,763279 | -73,06581 | 9 | 45 | 47,8044 | -73 | -3 | -56,916 |
| LA LAGUNA-EL COSO-CINCO CAMINOS | 10,300398 | -73,03601 | 10 | 18 | 1,4328 | -73 | -2 | -9,636 |
| IROKA | 9,942266 | -73,03438 | 9 | 56 | 32,1576 | -73 | -2 | -3,768 |
| MONTE HARMON | 11,44155 | -72,98077 | 11 | 26 | 29,58 | -72 | -58 | -50,772 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----|-----|----------|-----|-----|----------|
| LAS DELICIAS | 11,529708 | -72,945574 | 11 | 31 | 46,9488 | -72 | -56 | -44,0664 |
| POTRERITO | 10,945455 | -72,940711 | 10 | 56 | 43,638 | -72 | -56 | -26,5596 |
| CAICEMAPA | 10,849734 | -72,915635 | 10 | 50 | 59,0424 | -72 | -54 | -56,286 |
| POTRERITO | 10,925351 | -72,899186 | 10 | 55 | 31,2636 | -72 | -53 | -57,0696 |
| MAYABANGLOMA | 10,957644 | -72,881802 | 10 | 57 | 27,5184 | -72 | -52 | -54,4872 |
| CERRODEO | 10,993506 | -72,843385 | 10 | 59 | 36,6216 | -72 | -50 | -36,186 |
| EL ZAHINO GUAYABITO MURIAYTUY | 11,043387 | -72,815362 | 11 | 2 | 36,1932 | -72 | -48 | -55,3032 |
| RODEITO EL POZO | 11,059893 | -72,789374 | 11 | 3 | 35,6148 | -72 | -47 | -21,7464 |
| TRUIOGACHO Y LA MESETA | 11,017267 | -72,788849 | 11 | 1 | 2,1612 | -72 | -47 | -19,8564 |
| SAN FRANCISCO | 11,002705 | -72,763724 | 11 | 0 | 9,738 | -72 | -45 | -49,4064 |
| CERRO DE HATONUEVO | 11,052069 | -72,762017 | 11 | 3 | 7,4484 | -72 | -45 | -43,2612 |
| PROVINCIAL | 11,02292 | -72,750404 | 11 | 1 | 22,512 | -72 | -45 | -1,4544 |
| EL TILLA | 1,607449 | -72,744553 | 1 | 36 | 26,8164 | -72 | -44 | -40,3908 |
| LOMAMATO | 11,114557 | -72,732573 | 11 | 6 | 52,4052 | -72 | -43 | -57,2628 |
| EL PORVENIR KANANGUCHAL | 0,144847 | -72,716471 | 0 | 8 | 41,4492 | -72 | -42 | -59,2956 |
| NUEVO ESPINAL | 10,951252 | -72,705065 | 10 | 57 | 4,5072 | -72 | -42 | -18,234 |
| NUEVO ESPINAL | 10,949272 | -72,699305 | 10 | 56 | 57,3792 | -72 | -41 | -57,498 |
| NUEVO ESPINAL | 10,939302 | -72,697936 | 10 | 56 | 21,4872 | -72 | -41 | -52,5696 |
| NUEVO ESPINAL | 10,945711 | -72,697618 | 10 | 56 | 44,5596 | -72 | -41 | -51,4248 |
| MAÑATURE | 11,177577 | -72,693459 | 11 | 10 | 39,2772 | -72 | -41 | -36,4524 |
| NUEVO ESPINAL | 10,947365 | -72,690798 | 10 | 56 | 50,514 | -72 | -41 | -26,8728 |
| NUEVO ESPINAL | 10,926798 | -72,681473 | 10 | 55 | 36,4728 | -72 | -40 | -53,3028 |
| GUAYABERO DE LA MARÍA | 2,549335 | -72,673109 | 2 | 32 | 57,606 | -72 | -40 | -23,1924 |
| MONOCHOA | -0,33804 | -72,649796 | 0 | -20 | -16,944 | -72 | -38 | -59,2656 |
| UNA'APUCHON | 11,304351 | -72,648992 | 11 | 18 | 15,6636 | -72 | -38 | -56,3712 |
| NAEXIL PUT | 2,73935 | -72,643309 | 2 | 44 | 21,66 | -72 | -38 | -35,9124 |
| PANURE (VENEZUELA) | 2,574535 | -72,615426 | 2 | 34 | 28,326 | -72 | -36 | -55,5336 |
| EL SOLDADO PARATE BIEN | 11,247227 | -72,612286 | 11 | 14 | 50,0172 | -72 | -36 | -44,2296 |
| EL REFUGIO | 2,599938 | -72,563406 | 2 | 35 | 59,7768 | -72 | -33 | -48,2616 |
| BARRANCÓN | 2,58123 | -72,557953 | 2 | 34 | 52,428 | -72 | -33 | -28,6308 |
| CUATRO DE NOVIEMBRE | 11,18665 | -72,519083 | 11 | 11 | 11,94 | -72 | -31 | -8,6988 |
| LA ASUNCION | 2,171285 | -72,513113 | 2 | 10 | 16,626 | -72 | -30 | -47,2068 |
| PREDIO PUTUMAYO | -1,384952 | -72,511199 | -1 | -23 | -5,8272 | -72 | -30 | -40,3164 |
| LA SAL | 2,731617 | -72,506642 | 2 | 43 | 53,8212 | -72 | -30 | -23,9112 |
| LA FUGA | 2,6359 | -72,476149 | 2 | 38 | 9,24 | -72 | -28 | -34,1364 |
| LA YUQUERA | 1,827007 | -72,394427 | 1 | 49 | 37,2252 | -72 | -23 | -39,9372 |
| BARRANQUILLITA | 1,550653 | -72,311428 | 1 | 33 | 2,3508 | -72 | -18 | -41,1408 |
| MESAI | -0,487968 | -72,296837 | 0 | -29 | -16,6848 | -72 | -17 | -48,6132 |
| EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) | 4,293004 | -72,2957 | 4 | 17 | 34,8144 | -72 | -17 | -44,52 |
| WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU | 11,37258 | -72,289443 | 11 | 22 | 21,288 | -72 | -17 | -21,9948 |
| CAÑO OVEJAS (BETANIA COROCITO) | 2,925153 | -72,276249 | 2 | 55 | 30,5508 | -72 | -16 | -34,4964 |
| UNIDO UWA | 6,795643 | -72,238686 | 6 | 47 | 44,3148 | -72 | -14 | -19,2696 |
| OKOCHI | 11,337723 | -72,237627 | 11 | 20 | 15,8028 | -72 | -14 | -15,4572 |
| CACHIVERA DE NARE | 2,816019 | -72,191927 | 2 | 48 | 57,6684 | -72 | -11 | -30,9372 |
| TUCÁN DE CAÑO GIRIZA Y PUERTO LA PALMA | 1,34326 | -72,171404 | 1 | 20 | 35,736 | -72 | -10 | -17,0544 |
| ADUCHE | -0,470156 | -72,167415 | 0 | -28 | -12,5616 | -72 | -10 | -2,694 |
| CAÑO NEGRO | 2,778971 | -72,152047 | 2 | 46 | 44,2956 | -72 | -9 | -7,3692 |
| PUERTO NARE | 1,077639 | -72,108855 | 1 | 4 | 39,5004 | -72 | -6 | -31,878 |
| SABANAS DE CURIPAO | 6,207836 | -72,082198 | 6 | 12 | 28,2096 | -72 | -4 | -55,9128 |
| CHAPARRAL Y BARRONEGRO | 6,07443 | -72,047188 | 6 | 4 | 27,948 | -72 | -2 | -49,8768 |
| PLAYAS DE BOJABÁ | 6,843195 | -72,013617 | 6 | 50 | 35,502 | -72 | 0 | -49,0212 |
| PUERTO VIEJO Y PUERTO ESPERANZA | 1,304625 | -72,012854 | 1 | 18 | 16,65 | -72 | 0 | -46,2744 |
| CIBARIZA | 6,628336 | -72,004657 | 6 | 37 | 42,0096 | -72 | 0 | -16,7652 |
| VALLES DEL SOL | 6,751943 | -71,994077 | 6 | 45 | 6,9948 | -71 | -59 | -38,6772 |
| PUERTO MONFORTH | 1,426323 | -71,981606 | 1 | 25 | 34,7628 | -71 | -58 | -53,7816 |
| YAVILLA II | 0,990515 | -71,975656 | 0 | 59 | 25,854 | -71 | -58 | -32,3616 |
| ALTA Y MEDIA GUAJIRA | 11,855169 | -71,970832 | 11 | 51 | 18,6084 | -71 | -58 | -14,9952 |
| CENTRO MIRAFLORES | 1,303648 | -71,949438 | 1 | 18 | 13,1328 | -71 | -56 | -57,9768 |
| COROCITO, YOPALITO Y GUALABO | 4,385497 | -71,943351 | 4 | 23 | 7,7892 | -71 | -56 | -36,0636 |
| LAGUNA TRANQUILA | 6,589169 | -71,922857 | 6 | 35 | 21,0084 | -71 | -55 | -22,2852 |
| LAGOS DEL DORADO, LAGOS DEL PASO Y EL REMANSO | 1,16516 | -71,917016 | 1 | 9 | 54,576 | -71 | -55 | -1,2576 |
| NUNUYA DE VILLAZUL | -0,581979 | -71,852662 | 0 | -34 | -55,1244 | -71 | -51 | -9,5832 |
| ANGOSTURAS | 6,578149 | -71,831793 | 6 | 34 | 41,3364 | -71 | -49 | -54,4548 |
| BARRANCO COLORADO | 2,76785 | -71,805125 | 2 | 46 | 4,26 | -71 | -48 | -18,45 |
| VUELTA DEL ALIVIO | 1,096902 | -71,769344 | 1 | 5 | 48,8472 | -71 | -46 | -9,6384 |
| MACARIEROS | 6,498027 | -71,766055 | 6 | 29 | 52,8972 | -71 | -45 | -57,798 |
| LOS IGUANITOS | 6,690949 | -71,763477 | 6 | 41 | 27,4164 | -71 | -45 | -48,5172 |
| CAÑO JABÓN | 2,886616 | -71,687296 | 2 | 53 | 11,8176 | -71 | -41 | -14,2656 |
| PUYEROS | 6,548808 | -71,661421 | 6 | 32 | 55,7088 | -71 | -39 | -41,1156 |
| SIKUANI DE AWÁLIBA | 4,110796 | -71,643739 | 4 | 6 | 38,8656 | -71 | -38 | -37,4604 |
| CAÑO CLARO | 6,598896 | -71,64252 | 6 | 35 | 56,0256 | -71 | -38 | -33,072 |
| VENCEDOR-PIRIRI-GUAMITO Y MATANEGRA | 4,001151 | -71,62022 | 4 | 0 | 4,1436 | -71 | -37 | -12,792 |
| LAGUNA ARAGUATO Y BARRANCO CEIBA | 2,783698 | -71,619369 | 2 | 47 | 1,3128 | -71 | -37 | -9,7284 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----|-----|----------|-----|-----|----------|
| EL TIGRE | 3,556596 | -71,613561 | 3 | 33 | 23,7456 | -71 | -36 | -48,8196 |
| ROQUEROS | 6,503711 | -71,587947 | 6 | 30 | 13,3596 | -71 | -35 | -16,6092 |
| MACUARE | 2,950174 | -71,568452 | 2 | 57 | 0,6264 | -71 | -34 | -6,4272 |
| EL VIGÍA | 7,012785 | -71,561976 | 7 | 0 | 46,026 | -71 | -33 | -43,1136 |
| LA ESPERANZA - LA FORTALEZA Y EL TOTUMO | 6,531823 | -71,505408 | 6 | 31 | 54,5628 | -71 | -30 | -19,4688 |
| CUILOTO II | 6,559317 | -71,46038 | 6 | 33 | 33,5412 | -71 | -27 | -37,368 |
| PARREROS | 6,477496 | -71,439682 | 6 | 28 | 38,9856 | -71 | -26 | -22,8552 |
| ARARA, BACATÍ, CARURU Y MIRAFLORES | 1,050495 | -71,436193 | 1 | 3 | 1,782 | -71 | -26 | -10,2948 |
| JULIEROS Y VELASQUEROS | 6,483263 | -71,401584 | 6 | 28 | 59,7468 | -71 | -24 | -5,7024 |
| NUKAK - MAKU | 2,508455 | -71,401528 | 2 | 30 | 30,438 | -71 | -24 | -5,5008 |
| EL CONSEJO | 4,849393 | -71,394074 | 4 | 50 | 57,8148 | -71 | -23 | -38,6664 |
| CUSAY | 6,440136 | -71,389098 | 6 | 26 | 24,4896 | -71 | -23 | -20,7528 |
| EL MEDANO | 5,143298 | -71,359487 | 5 | 8 | 35,8728 | -71 | -21 | -34,1532 |
| BAYONEROS | 7,012303 | -71,32795 | 7 | 0 | 44,2908 | -71 | -19 | -40,62 |
| EL SUSPIRO EL RINCÓN DEL SOCORRO | 5,006392 | -71,327177 | 5 | 0 | 23,0112 | -71 | -19 | -37,8372 |
| SAN JUANITO, EL DUYA Y PARAVARE | 4,915276 | -71,306909 | 4 | 54 | 54,9936 | -71 | -18 | -24,8724 |
| SIKUANI DE DOMO PLANAS | 4,149105 | -71,27766 | 4 | 8 | 56,778 | -71 | -16 | -39,576 |
| CAJAROS | 7,009454 | -71,276668 | 7 | 0 | 34,0344 | -71 | -16 | -36,0048 |
| WALIANI | 3,964254 | -71,212487 | 3 | 57 | 51,3144 | -71 | -12 | -44,9532 |
| CHARCO CAIMÁN | 2,917107 | -71,170334 | 2 | 55 | 1,5852 | -71 | -10 | -13,2024 |
| LA VORAGINE-LA ILUSION | 6,585294 | -71,115497 | 6 | 35 | 7,0584 | -71 | -6 | -55,7892 |
| COROZAL TAPAJO | 4,806244 | -71,099996 | 4 | 48 | 22,4784 | -71 | -5 | -59,9856 |
| EL SALADILLO | 4,923036 | -71,090129 | 4 | 55 | 22,9296 | -71 | -5 | -24,4644 |
| LA ESPERANZA | 6,540676 | -71,070117 | 6 | 32 | 26,4336 | -71 | -4 | -12,4212 |
| SIKUANI DE IWIWI | 4,140456 | -71,068326 | 4 | 8 | 25,6416 | -71 | -4 | -5,9736 |
| MACUCUANA | 4,993789 | -71,046683 | 4 | 59 | 37,6404 | -71 | -2 | -48,0588 |
| SAN JOSÉ DE LIPA O CAÑO COLORADO | 6,656804 | -71,006481 | 6 | 39 | 24,4944 | -71 | 0 | -23,3316 |
| VEJEJO, SANTA ROSA, CERRO CUCUY, SANTA CRUZ, CAÑO DAN | 2,042339 | -70,95441 | 2 | 2 | 32,4204 | -70 | -57 | -15,876 |
| MIRITÍ-PARANÁ | -0,841836 | -70,951654 | 0 | -50 | -30,6096 | -70 | -57 | -5,9544 |
| ALTO UNUMA | 3,609647 | -70,933745 | 3 | 36 | 34,7292 | -70 | -56 | -1,482 |
| EL ZAMURO | 7,030302 | -70,913035 | 7 | 1 | 49,0872 | -70 | -54 | -46,926 |
| MUCO MAYORAGUA | 4,45522 | -70,909425 | 4 | 27 | 18,792 | -70 | -54 | -33,93 |
| SANTA ROSALIA | 5,091417 | -70,874402 | 5 | 5 | 29,1012 | -70 | -52 | -27,8472 |
| MATECANDELA | 7,079852 | -70,7949 | 7 | 4 | 47,4672 | -70 | -47 | -41,64 |
| KAWÁNERUBA | 4,213267 | -70,777849 | 4 | 12 | 47,7612 | -70 | -46 | -40,2564 |
| RÍOS MUCO Y GUARROJO | 4,308793 | -70,710499 | 4 | 18 | 31,6548 | -70 | -42 | -37,7964 |
| RÍO SIARE | 3,009271 | -70,645967 | 3 | 0 | 33,3756 | -70 | -38 | -45,4812 |
| SAN LUIS DEL TOMO | 4,625024 | -70,585432 | 4 | 37 | 30,0864 | -70 | -35 | -7,5552 |
| MEREY, LA VERAITA | 4,721383 | -70,567445 | 4 | 43 | 16,9788 | -70 | -34 | -2,802 |
| COROCORO | 2,797385 | -70,54533 | 2 | 47 | 50,586 | -70 | -32 | -43,188 |
| NUEVA ESPERANZA DEL TOMO | 4,766116 | -70,527156 | 4 | 45 | 58,0176 | -70 | -31 | -37,7616 |
| VAUPÉS | 0,776061 | -70,525701 | 0 | 46 | 33,8196 | -70 | -31 | -32,5236 |
| PUERTO NARIÑO | -3,634805 | -70,47038 | -3 | -38 | -5,298 | -70 | -28 | -13,368 |
| SARACURE-CADÁ | 4,004719 | -70,464102 | 4 | 0 | 16,9884 | -70 | -27 | -50,7672 |
| LA ISLA | 6,976595 | -70,418937 | 6 | 58 | 35,742 | -70 | -25 | -8,1732 |
| CHOLOLOBO MATATU | 4,359418 | -70,412126 | 4 | 21 | 33,9048 | -70 | -24 | -43,6536 |
| CONCORDIA | 3,262348 | -70,377295 | 3 | 15 | 44,4528 | -70 | -22 | -38,262 |
| GUACAMAYAS MAMIYARE | 4,447016 | -70,343077 | 4 | 26 | 49,2576 | -70 | -20 | -35,0772 |
| VALDIVIA | 4,560762 | -70,333759 | 4 | 33 | 38,7432 | -70 | -20 | -1,5324 |
| PUNTA BANDERA | 4,737751 | -70,3211 | 4 | 44 | 15,9036 | -70 | -19 | -15,96 |
| LA ESMERALDA | 4,619858 | -70,314266 | 4 | 37 | 11,4888 | -70 | -18 | -51,3576 |
| CARPINTERO PALOMAS | 3,019976 | -70,313806 | 3 | 1 | 11,9136 | -70 | -18 | -49,7016 |
| LA PASCUA | 5,170223 | -70,287659 | 5 | 10 | 12,8028 | -70 | -17 | -15,5724 |
| YAIGOJÉ-RÍO APAPORIS | -0,656332 | -70,259479 | -0 | -39 | -22,7952 | -70 | -15 | -34,1244 |
| CHOCON | 3,508294 | -70,246412 | 3 | 30 | 29,8584 | -70 | -14 | -47,0832 |
| MOCAGUA, MACEDONIA, EL VERGEL Y ZARAGOZA | -3,829986 | -70,18801 | -3 | -49 | -47,9496 | -70 | -11 | -16,836 |
| GUACO BAJO Y GUACO ALTO | 3,383234 | -70,179927 | 3 | 22 | 59,6424 | -70 | -10 | -47,7372 |
| PUERTO TRIUNFO | -3,940897 | -70,133201 | -3 | -56 | -27,2292 | -70 | -7 | -59,5236 |
| SANTA SOFÍA | -3,983504 | -70,109568 | -3 | -59 | -0,6144 | -70 | -6 | -34,4448 |
| CANANAMA | 6,249934 | -70,088412 | 6 | 14 | 59,7624 | -70 | -5 | -18,2832 |
| RÍOS COTUHÉ Y PUTUMAYO | -3,059087 | -70,056698 | -3 | -3 | -32,7132 | -70 | -3 | -24,1128 |
| CALI-BARRANQUILLA | 3,594391 | -70,049411 | 3 | 35 | 39,8076 | -70 | -2 | -57,8796 |
| ARARA | -3,959428 | -70,045294 | -3 | -57 | -33,9408 | -70 | -2 | -43,0584 |
| NAZARET | -4,086842 | -70,028817 | -4 | -5 | -12,6312 | -70 | -1 | -43,7412 |
| CAÑO MOCHUELO | 5,982618 | -70,025477 | 5 | 58 | 57,4248 | -70 | -1 | -31,7172 |
| CURARE LOS INGLESES | -1,540443 | -70,011082 | -1 | -32 | -25,5948 | -70 | 0 | -39,8952 |
| SAN JOSÉ DEL RÍO | -4,108044 | -69,99915 | -4 | -6 | -28,9584 | -69 | -59 | -56,94 |
| ISLA DE RONDA | -4,15477 | -69,990249 | -4 | -9 | -17,172 | -69 | -59 | -24,8964 |
| RÍOS TOMO Y WEBERI | 4,845802 | -69,979042 | 4 | 50 | 44,8872 | -69 | -58 | -44,5512 |
| SAN ANTONIO DE LOS LAGOS Y SAN SEBASTIÁN | -4,139439 | -69,966423 | -4 | -8 | -21,9804 | -69 | -57 | -59,1228 |
| SAN JUAN DE LOS PARENTES | -4,157008 | -69,961898 | -4 | -9 | -25,2288 | -69 | -57 | -42,8328 |
| LA PLAYA | -4,135017 | -69,952888 | -4 | -8 | -6,0612 | -69 | -57 | -10,3968 |
| K 6 y 11 CARRETERA LETICIA TARAPACA | -4,039595 | -69,945349 | -4 | -2 | -22,542 | -69 | -56 | -43,2564 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----|-----|----------|-----|-----|----------|
| PUEBLO NUEVO-LAGUNA COLORADA | 3,368224 | -69,938653 | 3 | 22 | 5,6064 | -69 | -56 | -19,1508 |
| UITIBOC | -3,189923 | -69,814311 | -3 | -11 | -23,7228 | -69 | -48 | -51,5196 |
| MINITAS-MIRALINDO | 3,349081 | -69,797087 | 3 | 20 | 56,6916 | -69 | -47 | -49,5132 |
| PUERTO CORDOBA | -1,139887 | -69,776236 | -1 | -8 | -23,5932 | -69 | -46 | -34,4496 |
| FLORES SOMBRERO | 3,767857 | -69,704084 | 3 | 46 | 4,2852 | -69 | -42 | -14,7024 |
| CHIGUIRO | 3,494672 | -69,702096 | 3 | 29 | 40,8192 | -69 | -42 | -7,5456 |
| CAMPO ALEGRE Y RIPIALITO | 5,960412 | -69,683169 | 5 | 57 | 37,4832 | -69 | -40 | -59,4084 |
| LA LLANURA | 4,997613 | -69,657118 | 4 | 59 | 51,4068 | -69 | -39 | -25,6248 |
| CAMARITAGUA | -1,382041 | -69,606255 | -1 | -22 | -55,3476 | -69 | -36 | -22,518 |
| COMEYAFU | -1,235478 | -69,592188 | -1 | -14 | -7,7208 | -69 | -35 | -31,8768 |
| MURCIÉLAGO ALTAMIRA | 3,613876 | -69,56583 | 3 | 36 | 49,9536 | -69 | -33 | -56,988 |
| SANTA TERESITA DEL TUPARRO | 4,676938 | -69,49803 | 4 | 40 | 36,9768 | -69 | -29 | -52,908 |
| LAGUNA-CURVINA SAPUARA | 3,647903 | -69,395125 | 3 | 38 | 52,4508 | -69 | -23 | -42,45 |
| CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO INIRIDA | 2,889646 | -69,323836 | 2 | 53 | 22,7256 | -69 | -19 | -25,8096 |
| RÍOS CUIARI E ISANA | 1,954899 | -69,294535 | 1 | 57 | 17,6364 | -69 | -17 | -40,326 |
| PARTE ALTA DEL RÍO GUAINIA | 2,334107 | -69,135147 | 2 | 20 | 2,7852 | -69 | -8 | -6,5292 |
| ARRCIFAL | 3,62681 | -69,092686 | 3 | 37 | 36,516 | -69 | -5 | -33,6696 |
| CUMARAL-GUAMUCO | 3,692351 | -68,806622 | 3 | 41 | 32,4636 | -68 | -48 | -23,8392 |
| SELVA DE MATAVÉN | 4,268628 | -68,796413 | 4 | 16 | 7,0608 | -68 | -47 | -47,0868 |
| BACHACO BUENAVISTA | 3,441482 | -68,551794 | 3 | 26 | 29,3352 | -68 | -33 | -6,4584 |
| JUNA NIÑAL,COCUY, LOMA BAJA Y LOMA ALTA DEL CAÑO GUAR | 3,670984 | -68,468777 | 3 | 40 | 15,5424 | -68 | -28 | -7,5972 |
| TONINA, SEJAL, SAN JOSÉ Y OTRAS | 2,460726 | -68,283904 | 2 | 27 | 38,6136 | -68 | -17 | -2,0544 |
| CARRIZAL | 3,935799 | -68,139986 | 3 | 56 | 8,8764 | -68 | -8 | -23,9496 |
| PAUJIL | 3,856784 | -68,118686 | 3 | 51 | 24,4224 | -68 | -7 | -7,2696 |
| CARANACOA YURI-LAGUNA MOROCOTO | 3,741245 | -68,092899 | 3 | 44 | 28,482 | -68 | -5 | -34,4364 |
| REMANSO - CHORRO BOCON | 3,390535 | -68,082674 | 3 | 23 | 25,926 | -68 | -4 | -57,6264 |
| EL VENADO | 3,27131 | -67,979069 | 3 | 16 | 16,716 | -67 | -58 | -44,6484 |
| EGUA-GUARIACANA | 4,934383 | -67,933376 | 4 | 56 | 3,7788 | -67 | -56 | -0,1536 |
| TIERRA ALTA | 3,878744 | -67,894496 | 3 | 52 | 43,4784 | -67 | -53 | -40,1856 |
| CAÑO MESETAS-DAGUA Y MURCIELAGO | 5,716019 | -67,870795 | 5 | 42 | 57,6684 | -67 | -52 | -14,862 |
| ALMIDÓN LA CEIBA | 3,576673 | -67,857938 | 3 | 34 | 36,0228 | -67 | -51 | -28,5768 |
| COAYARE EL COCO | 3,907048 | -67,823884 | 3 | 54 | 25,3728 | -67 | -49 | -25,9824 |
| RÍO ATABAPO E INIRIDA | 3,377682 | -67,719971 | 3 | 22 | 39,6552 | -67 | -43 | -11,8956 |
| PIAROA DE CACHICAMO | 5,511086 | -67,707769 | 5 | 30 | 39,9096 | -67 | -42 | -27,9684 |
| CAÑO BACHACO | 5,952593 | -67,627515 | 5 | 57 | 9,3348 | -67 | -37 | -39,054 |
| GUACAMAYAS MAIPORE | 6,044109 | -67,600195 | 6 | 2 | 38,7924 | -67 | -36 | -0,702 |
| CAÑO LA HORMIGA | 5,924978 | -67,562475 | 5 | 55 | 29,9208 | -67 | -33 | -44,91 |
| CAÑO GUARIPA | 5,98043 | -67,527075 | 5 | 58 | 49,548 | -67 | -31 | -37,47 |
| BAJO RÍO GUAINIA Y RÍO NEGRO | 2,100898 | -67,489436 | 2 | 6 | 3,2328 | -67 | -29 | -21,9696 |

ANEXO 13. Anexo 3 de segundo informe parcial de práctica



Guadalajara de Buga, Agosto 16 de 2019

Doctor,
RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
Director General Unidad de Víctimas
Bogotá D.C

Asunto: Carta de presentación e intención del proyecto: "Dotación mobiliario para parque" Municipio Guadalajara de Buga DEPARTAMENTO Valle del Cauca.

Respetado señor

Por medio del presente oficio, hoy Agosto 16 de 2019 certifico con relación al proyecto mobiliario para el parque ubicado en la vereda Alaska del corregimiento de La Habana, lo siguiente:

Que el número de personas víctimas a beneficiar con el proyecto es de 300 personas.

Que el número de personas vulnerables a beneficiar con el proyecto es de 500 personas.

Que las personas beneficiadas por el proyecto se discriminan de acuerdo a los siguientes grupos poblacionales:

| Grupo Étnico | |
|--------------------------|------|
| Población Indígena | % |
| Población Afrocolombiana | % |
| Población Raizal | % |
| Población ROM | % |
| Población Campesina | 100% |

Que el valor total estimado del proyecto es: **CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.065.480)**, representados en los siguientes aportes:

| ENTIDAD | APORTE |
|---------|--------------|
| UARIV | \$ 5.065.480 |



Que el proyecto () SI (x) NO, ha sido presentado en ninguna otra entidad, ni del ente territorial, no le han asignado recursos, ni si se viene adelantando ningún tipo de obra y/o suministro de mobiliario del aquí solicitado.

Que el proyecto NO cuenta con recursos de cofinanciación.


La entidad ejecutora del proyecto es LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS: ACRP LA HABANA.

El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de UNA SEMANA de acuerdo con el cronograma presentado en el formato de estructura técnica.

El representante de la entidad ejecutora quien realizará la interlocución con la Unidad de Víctimas es:

Nombre: SANDRA PATRICIA GIL SUAREZ
Entidad: ACRP LA HABANA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Teléfono: 3178542432
Celular: 3178542432
Correo Electrónico: helen322-@hotmail.com

Cordialmente,

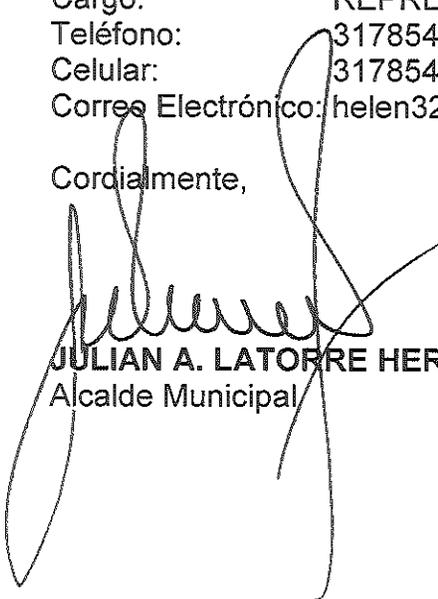
JULIAN A. LATORRE HERRADA
Alcalde Municipal


MAURICIO D. PEREIRA H.
Secretario de Gobierno.

FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC
**PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA**

 Código: 310.03.15-19
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 6/10/2015
 Pág: 1 de 5

CÓDIGO DEL PROYECTO:
1. PROCESO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO (LINEA DE ACCIÓN) (marcar con X)

- a) PREVENCIÓN e) OTRA?
- b) AYUDA Y ATENCIÓN INMEDIATA Reparación Colectiva

2. GRUPO ÉTNICO AL QUE PERTENECEN LOS HOGARES

- a) AFROCOLOMBIANOS d) ROM
- b) INDÍGENAS e) CAMPESINOS
- c) RAÍZALES Otro: _____

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

- a) DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
- b) MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA
- c) CORREGIMIENTO (Barrio) LA HABANA
- d) VEREDA(S) (Dirección, Localidad, Predio) LAHABANA, Alaska, Diamante

- e) PUNTO DE ENTREGA MATERIALES Y/O MOBILIARIO: Caseta comunal
- de la vereda Alaska del corregimiento de La Habana

- f) RURAL h) URBANO
- g) CONCENTRICO i) DISPERSO

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
a) Objeto del proyecto (descripción general)

Fortalecer la generación de ingresos por medio de la implementación de la medida de satisfacción ID 438 del PIRC, que permite dinamizar la economía local en el sector turismo con gran impacto en el colectivo

- b) Número de personas víctimas beneficiadas con el proyecto
- c) Número de personas en condición de vulnerabilidad beneficiadas
- d) Impacto social y comunitario del proyecto (descripción general)

| NUMERO |
|--------|
| 250 |
| 100 |

Hacer de la Zona un Gran Parque temático del "agua, la vida y el oxígeno" que permita al visitante disfrutar de senderos ecológicos, nacimientos y cascadas de agua, observar fauna y flora propias del hábitat, venta de productos frescos del campo, deliciosa gastronomía.

5. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO

- a) **REQUISITOS PARA APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA (PISC)** Marque X

| ACTIVIDAD | CUMPLE (Si / No) | NO APLICA | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | OBSERVACIONES (informar fecha de expedición del documento) |
|--|------------------|-----------|--------------------------|--|
| 1. Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. | | | | |
| 2. Certificado de tradición y libertad y/o copia de la escritura del lote donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio | | | | |
| 3. Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales. | | | | |
| 4. Certificado de disponibilidad de servicios públicos | | | | |
| 5. Certificación de viabilidad del proyecto | | | | |
| 6. Compromiso de sostenibilidad | | | | |
| 7. Acta de socialización | | | | |
| 8. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) | | | | |
| * 9. Certificación de que los estudios y diseños que se remiten con el proyecto cumplen con las normas vigentes de construcción. Remisión de Estudios y diseños. | | | | |

* Los estudios y diseños solicitados deben ser acordes con el alcance técnico del proyecto. No toda la información aplicaría para obras locativas menores (reparaciones menores).

- b) **REQUISITOS PARA APOYO CON DOTACION DE MOBILIARIO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA (PISC)** Marque X

| ACTIVIDAD | CUMPLE (Si / No) | NO APLICA | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | OBSERVACIONES (informar fecha de expedición del documento) |
|---|------------------|-----------|--------------------------|--|
| 1. Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. | SI | | | |
| 2. Compromiso de sostenibilidad | | | | |
| 3. Acta de socialización | | | | |
| 4. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) | | | | |
| 5. Censo y/o certificación de uso y capacidad en número de personas | | | | |



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC

Código: 310_03_15-19

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 6/10/2015

Pág: 2 de 5

PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

6. APORTES Y FUENTES DE FINANCIACION

CÓDIGO DEL PROYECTO:

| ENTIDAD | TIPO DE APORTE | DESCRIPCION DEL APORTE | VALOR ESTIMADO |
|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| a) | | | |
| b) | | | |
| c) | | | |
| d) | | | |
| e) | | | |
| f) | | | |
| g) | | | |
| h) | | | |
| i) | | | |
| j) | | | |
| Total Proyecto | | | \$ 0,00 |

Tipos de Aporte:

MAT. Materiales de construcción

A.T. Asistencia Técnica

D.O. Dirección de Obra

LOT. Lote

EST.D. Estudios y Diseños

A.S. Asistencia Social

S.PUB. Servicios públicos

DOT. Dotación

INT. Interventoría.

7. RESPONSABLE DEL PROYECTO - EJECUTOR

a) RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ISC Y/O RECIBO DE MATERIALES Y/O MOBILIARIO

Teniendo en cuenta el presente formato, la entidad responsable de su ejecución se compromete a:

- a) Dar buen uso al aporte realizado por LA UNIDAD al proyecto, de acuerdo con el objeto, diseños, cronograma y alcance técnico definido para la intervención.
- b) Ejecutar el proyecto en cumplimiento de los requisitos y normatividad vigente aplicable.
- c) Informar oportunamente a LA UNIDAD para la aprobación respectiva, sobre cualquier situación o imprevisto que origine ajustes o modificaciones al objeto del proyecto.
- d) Asumir los costos adicionales que puedan presentarse en el proyecto por concepto de deficiencias en diseño, planeación, así como imprevistos.
- e) Una vez se realice la entrega de materiales y/o mobiliario por parte de la Unidad de Víctimas, es responsabilidad de la entidad territorial la custodia de los mismos, por tanto serán los responsables en
- f) Entregar la obra en buenas condiciones para su uso.
- g) Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura y definir el o los responsables de su administración.
- h) Dar el crédito respectivo a LA UNIDAD sobre su participación y aporte en el proyecto.
- i) Cubrir los gastos que se generen a partir de las anteriores responsabilidades.

| ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / OTRO | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | No. CEDULA DE CIUDADANIA |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ACRP LA HABANA | SANDRA PATRICIA GIL SUAREZ | | 31642224 |

Para constancia se firma a los ___ días del mes de _____ de 2015

Por LA ASOCIACIÓN

ACRP LA HABANA

Representante Encargado de MUNICIPIO

SECRETARIO DE GOBIERNO

Nombre Representante Legal:

SANDRA PATRICIA GIL SUAREZ

Nombre Representante:

MAURICIO PEREIRA

Firma:

Firma:

Teléfono:

3178542432

Teléfono (obligatorio):

3174014437

correo electrónico:

helen322@hotmail.com

correo electrónico (obligatorio)

sgobierno@quadalajaradebuga-valle.gov.co

Responsable gestión de LA UNIDAD

REPARACION COLECTIVA DT VALLE

OTRO

Nombre Representante:

JULIANA MEJIA GARRIDO

Nombre:

Firma:

Firma:

Teléfono:

3162539097

Teléfono:

correo electrónico:

juliana.mejia@unidadvictimas.gov.co

correo electrónico

FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC

PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

Código: 310.03.15-19
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 6/10/2015
Pág: 3 de 5

8. CONSOLIDADO APORTE DE LA UNIDAD

CÓDIGO DEL PROYECTO:

| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
|-------|--------|----------|------------------------------|----------------|------------------------|
| 1 896 | unidad | 10 | BANCAS CONCRETO SIN ESPALDAR | \$ 506.548,00 | \$ 5.065.480,00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| | | | | TOTAL | \$ 5.065.480,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Por la asociación | ACRP LA HABANA | Representante Encargado de MUNICIPIO | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| Nombre Representante Legal: | SANDRA PATRICIA GIL SUAREZ | Nombre Representante: | MAURICIO PEREIRA |
| Firma: | _____ | Firma: | _____ |
| Teléfono: | 3178542432 | Teléfono (obligatorio): | 3174014437 |
| correo electrónico: | helen322@hotmail.com | correo electrónico (obligatorio) | gobierno@quadalajaradebuga-valle.gov.co |
| Responsable gestión de LA UNIDAD | REPARACION COLECTIVA DT VALLE | OTRO | _____ |
| Nombre Representante: | JULIANA MEJIA GARRIDO | Nombre: | _____ |
| Firma: | _____ | Firma: | _____ |
| Teléfono: | 3162539097 | Teléfono: | _____ |
| correo electrónico: | juliana.mejia@unidadvictimas.gov.co | correo electrónico | _____ |

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION

CÓDIGO DEL PROYECTO: _____

DEPTO: VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA FECHA DE ELABORACION: dd 12 mm 8 aa 2019
 PROYECTO: DOTACION BANCAS SENDERO TURISTICO - PARQUE TEMATICO ULTIMA FECHA DE MODIFICACION: dd ____ mm ____ aa ____
 ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ACRP LA HABANA

a) Fecha de Inicio del Proyecto: dd 2 mm 10 aa 19
 b) Fecha de Terminación del Proyecto: dd 9 mm 10 aa 19

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR ESTIMADO | INDICADOR | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--------|------|----------------|------------|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--|--|
| | | | | | | Mes 1 | | | Mes 2 | | | Mes 3 | | | Mes 4 | | | Mes 5 | | | Mes 6 | | | Mes 7 | | | | |
| | | | | | | S1 | S2 | S3 | | |
| 1 | recibir el mobiliario | unidad | 12 | | PROGRAMADO | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | distribuir en las veredas | unidad | 12 | | PROGRAMADO | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | instalar las bancas | unidad | 12 | | PROGRAMADO | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teniendo en cuenta el presente formato, la entidad responsable de su ejecución se compromete a:

- a) Ejecutar el proyecto en los tiempos acordados en el presente formato, una vez recibido el aporte de La **Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas**.
- b) Reportar mensualmente a **LA UARIV** el avance del proyecto.
- c) Informar oportunamente a **LA UARIV** sobre cualquier situación o imprevisto que origine ajustes en el cronograma del proyecto.

Representante Encargado de MUNICIPIO SECRETARIO DE GOBIERNO
 Nombre Representante Legal: MAURICIO PEREIRA
 Firma: _____
 Teléfono (obligatorio): 3174914437
 correo electrónico (obligatorio) bierno@quadalajaradebuqa-valle.gov

Representante Encargado de EJECUCION ACRP LA HABANA
 Nombre Representante: SANDRA PATRICIA GIL SUAREZ
 Firma: _____
 Teléfono (obligatorio): 3178542432
 correo electrónico (obligatorio) HELEN322-@HOTMAIL.COM

Responsable gestión de LA UNIDAD REPARACION COLECTIVA DT VALLE
 Nombre Representante: JULIANA MEJIA GARRIDO
 Firma: _____
 Teléfono: 3162539097
 correo electrónico: juliana.mejia@unidadvictimas.gov.co

OTRO _____
 Nombre: _____
 Firma: _____
 Teléfono: _____
 correo electrónico _____



FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC

PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Estado actual del predio () y/o infraestructura física a Intervenir (), se presenta el siguiente registro fotográfico:

Como resultado parcial () y/o final () la Alcaldía Municipal _____, se presenta el siguiente registro fotográfico:

CÓDIGO DEL PROYECTO

| DESCRIPCION | FOTOGRAFÍA | DESCRIPCION | FOTOGRAFÍA |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 | | 2 | |
| 3 | | 4 | |
| 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | |
| 9 | | 10 | |
| 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | |

Fecha de elaboración: dd _____ mes _____ año _____

Representante Encargado de MUNICIPIO _____

Nombre Representante Legal: _____

Firma: _____

Teléfono (obligatorio): _____

correo electrónico (obligatorio) _____

Representante Encargado de EJECUCION _____

Nombre Representante: _____

Firma: _____

Teléfono (obligatorio): _____

correo electrónico (obligatorio) _____



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DIRECCIÓN DE REPARACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN O DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA ISC A TRAVÉS DEL OPERADOR SPAE
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|---|
| OBJETO: | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA PARQUE EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA |
| TIPO DE INVERSIÓN: | Dotación de mobiliario para el parque de la vereda Alaska del corregimiento de La Habana |
| SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA | Comunidad campesina de la vereda Alaska, corregimiento de La Habana, Valle del Cauca |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL: | Valle del Cauca |
| DEPARTAMENTO: | Valle del Cauca |
| MUNICIPIO: | Guadalajara de Buga |
| VEREDA: | Alaska |
| FECHA DE ENTREGA: | |
| FECHA DE REVISIÓN: | 26/08/2019 |
| REVISÓ: | Christiam Soto Núñez |
| ESTADO DEL PROYECTO: | En revisión |

El equipo técnico de la Subdirección de Reparación Colectiva a nivel nacional, procedió a realizar la revisión de la información predial, administrativa y técnica del proyecto entregado por el municipio a la dirección territorial de PUTUMAYO, del proyecto cuyo objeto es "LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA PARQUE EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA".

| CONDICIONES ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO. (Certificaciones entregadas). | | | | | |
|---|--------------------|------------------|---|---------------------|---|
| SOPORTE | APLICA (SI / N.A.) | CUMPLE (SI / NO) | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | FECHA DE EXPEDICIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 Formato de estructura técnica - FET completamente diligenciado y suscrito por las partes; sin modificación en la estructura del mismo. | SI | NO | Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga | | Hace falta diligenciar espacios en las diferentes hojas del formato, este debe ser diligenciado en su totalidad. No se presenta el registro fotográfico de la zona en la que se hará la entrega de la dotación solicitada |
| 2 Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. (ver Anexo - Carta de presentación proyecto ISC) | SI | NO | Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga | | El número de personas víctimas a beneficiar no coincide con el censo presentado en el formato respectivo |
| 3 Compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio. | SI | NO | Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 4 Acta de socialización firmada por personas y/o líderes de la comunidad o de las juntas de acción comunal que certifiquen estar de acuerdo con la ejecución del proyecto en las condiciones acordadas y en donde manifiestan su interés de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y mantenimiento periódico de la dotación | SI | NO | Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga | | No se envió el documento. El documento es necesario para cumplir requisitos |
| 5 Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), para los casos en los que se requiera realizar la entrega de la dotación de mobiliario y sea necesario contar con transportes adicionales (Inter veredales y/o fluviales) y/o instalación de la dotación Certificación de transportes adicionales y/o instalación de la dotación para los SRC Étnicos. | N. A. | | Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga | | |
| 6 Censo de población a beneficiar, de acuerdo con el Formato único de Censo, deberá incluir la totalidad de la información solicitada. *Cuando se solicite apoyo para la dotación con mobiliario para instituciones educativas, se deberá remitir censo de estudiantes con el Registro de matrícula vigente en el Formato único de Censo | SI | NO | Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga | | Algunas celdas en el formato están en blanco, este debe ser diligenciado en su totalidad |
| 7 Certificación de la capacidad del número de personas en función al área (m2) efectiva de uso, la cual debe ser acorde con las cantidades de mobiliario solicitado. | N.A. | | Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga | | |

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS.

FORMATO DE CENSO: HAY CELDAS EN BLANCO, DEBE ESTAR DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD, EL NUMERO DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL CENSO NO CORRESPONDE AL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS MENCIONADAS EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
FORMATO FET: EN LA HOJA 2 NO SE DILIGENCIARON LOS APORTES PARCIALES, NI EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO, LA HOJA 5 DEL FORMATO NO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ZONA EN LA CUAL SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO DE DOTACIÓN

Aprobado

No Aprobado

En Revisión

REVISÓ

Nombres y Apellidos:

Christiam Soto Núñez

Firma:



ANEXO 3. CARTA DE PRESENTACIÓN PROYECTO ISC

Cocorná, 16 de agosto de 2019

Doctor,

RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE

Director General Unidad para las Víctimas
Dirección de Gestión Social y Humanitaria
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Carrera 8 # 15 – 73 piso 3
Bogotá D.C

Asunto: Carta de presentación e intención del proyecto: Adecuación infraestructura del Hogar Juvenil Campesino Municipio Cocorná Departamento de Antioquia

Respetado señor,

Por medio del presente oficio, hoy 16 de agosto de 2019 certifico con relación al proyecto *Adecuación infraestructura del Hogar Juvenil Campesino de Cocorná* ubicado en el sector Calle Bolívar, Calle 20 N° 23-33, lo siguiente:

Que el número de personas víctimas a beneficiar con el proyecto es de 16 personas.

Que el número de personas vulnerables a beneficiar con el proyecto es de 16 personas.

Que las personas beneficiadas por el proyecto se discriminan de acuerdo a los siguientes grupos poblacionales:

| Grupo Étnico | |
|--------------------------|------|
| Población Indígena | 0% |
| Población Afrocolombiana | 0% |
| Población Raizal | 0% |
| Población ROM | 0% |
| Población Campesina | 100% |

Que el valor total estimado del proyecto es \$49'921.366 representados en los siguientes aportes:

| ENTIDAD | APORTE |
|------------------|---------------|
| UARIV | \$ 49'921.366 |
| ALCALDÍA COCORNÁ | \$12'655.600 |



Que el proyecto NO ha sido presentado en ninguna otra entidad, ni del ente territorial, no le han asignado recursos, ni si se viene adelantando ningún tipo de obra y/o suministro de mobiliario del aquí solicitado.

Que el proyecto NO cuenta con recursos de cofinanciación.

La entidad ejecutora del proyecto es la Alcaldía de Cocorná.

El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de cuatro meses y una semana de acuerdo con el cronograma presentado en el formato de estructura técnica.

El representante de la entidad ejecutora quien realizará la interlocución con la Unidad de Víctimas es:

Nombre: Darwin Fernando Duque Quintero

Entidad: Alcaldía de Cocorná

Cargo: Secretario de Planeación

Teléfono: 8343404

Celular: 3104296608

Correo Electrónico: planeacion@cocorna-antioquia.gov.co

Cordialmente,

Cocorná
FLORECE

JOHAN ALBERTO RAMÍREZ MEJÍA

Alcalde Municipal de Cocorná

Departamento de Antioquia

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE
COCORNÁ

HACE CONSTAR QUE:

El hogar juvenil campesino de Cocorná, tiene una capacidad en su estructura para albergar cincuenta personas entre hombre y mujeres

Dicha constancia se expide a los 30 días del mes de julio de 2019.

Atentamente,

Gloria Estella Zuluaga
Gloria Estella Zuluaga Muñoz
Directora H J C Cocorná

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE
COCORNA

HACE CONSTAR QUE:

Con respecto a la sostenibilidad del HOGAR antes mencionado será efectuada por el personal adscrito a dicha institución, una vez ejecutadas las obras entre ellas el amueblamiento del Hogar.

Dicha constancia se expide a los 25 días del mes de julio 2019.

Atentamente

Gloria Estella Zuluaga M.
GLORIA ESTELLA ZULUAGA MUÑOZ
Directora



**EN CALIDAD DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ
CERTIFICO QUE**

La mano de obra calificada y no calificada necesaria para llevar a cabo la ejecución del proyecto de adecuación de la infraestructura del HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE COCORNÁ será asumida en su totalidad por la Administración Municipal de Cocorná.

Dado en Cocorná, a los 16 días del mes de agosto de 2019.



JOHAN ALBERTO RAMÍREZ MEJÍA
Alcalde Municipal
Cocorná Antioquia

ITEM 1 DEMOLICIONES.

ITEM 1.2.

1.1. y 3.2

8.2 Suministro y colocación
ITEM 1.3 y 1.4 DEMONTE Sanitarias,
1.3 RETIRO (1.3) 8.1 Sumin y colocación

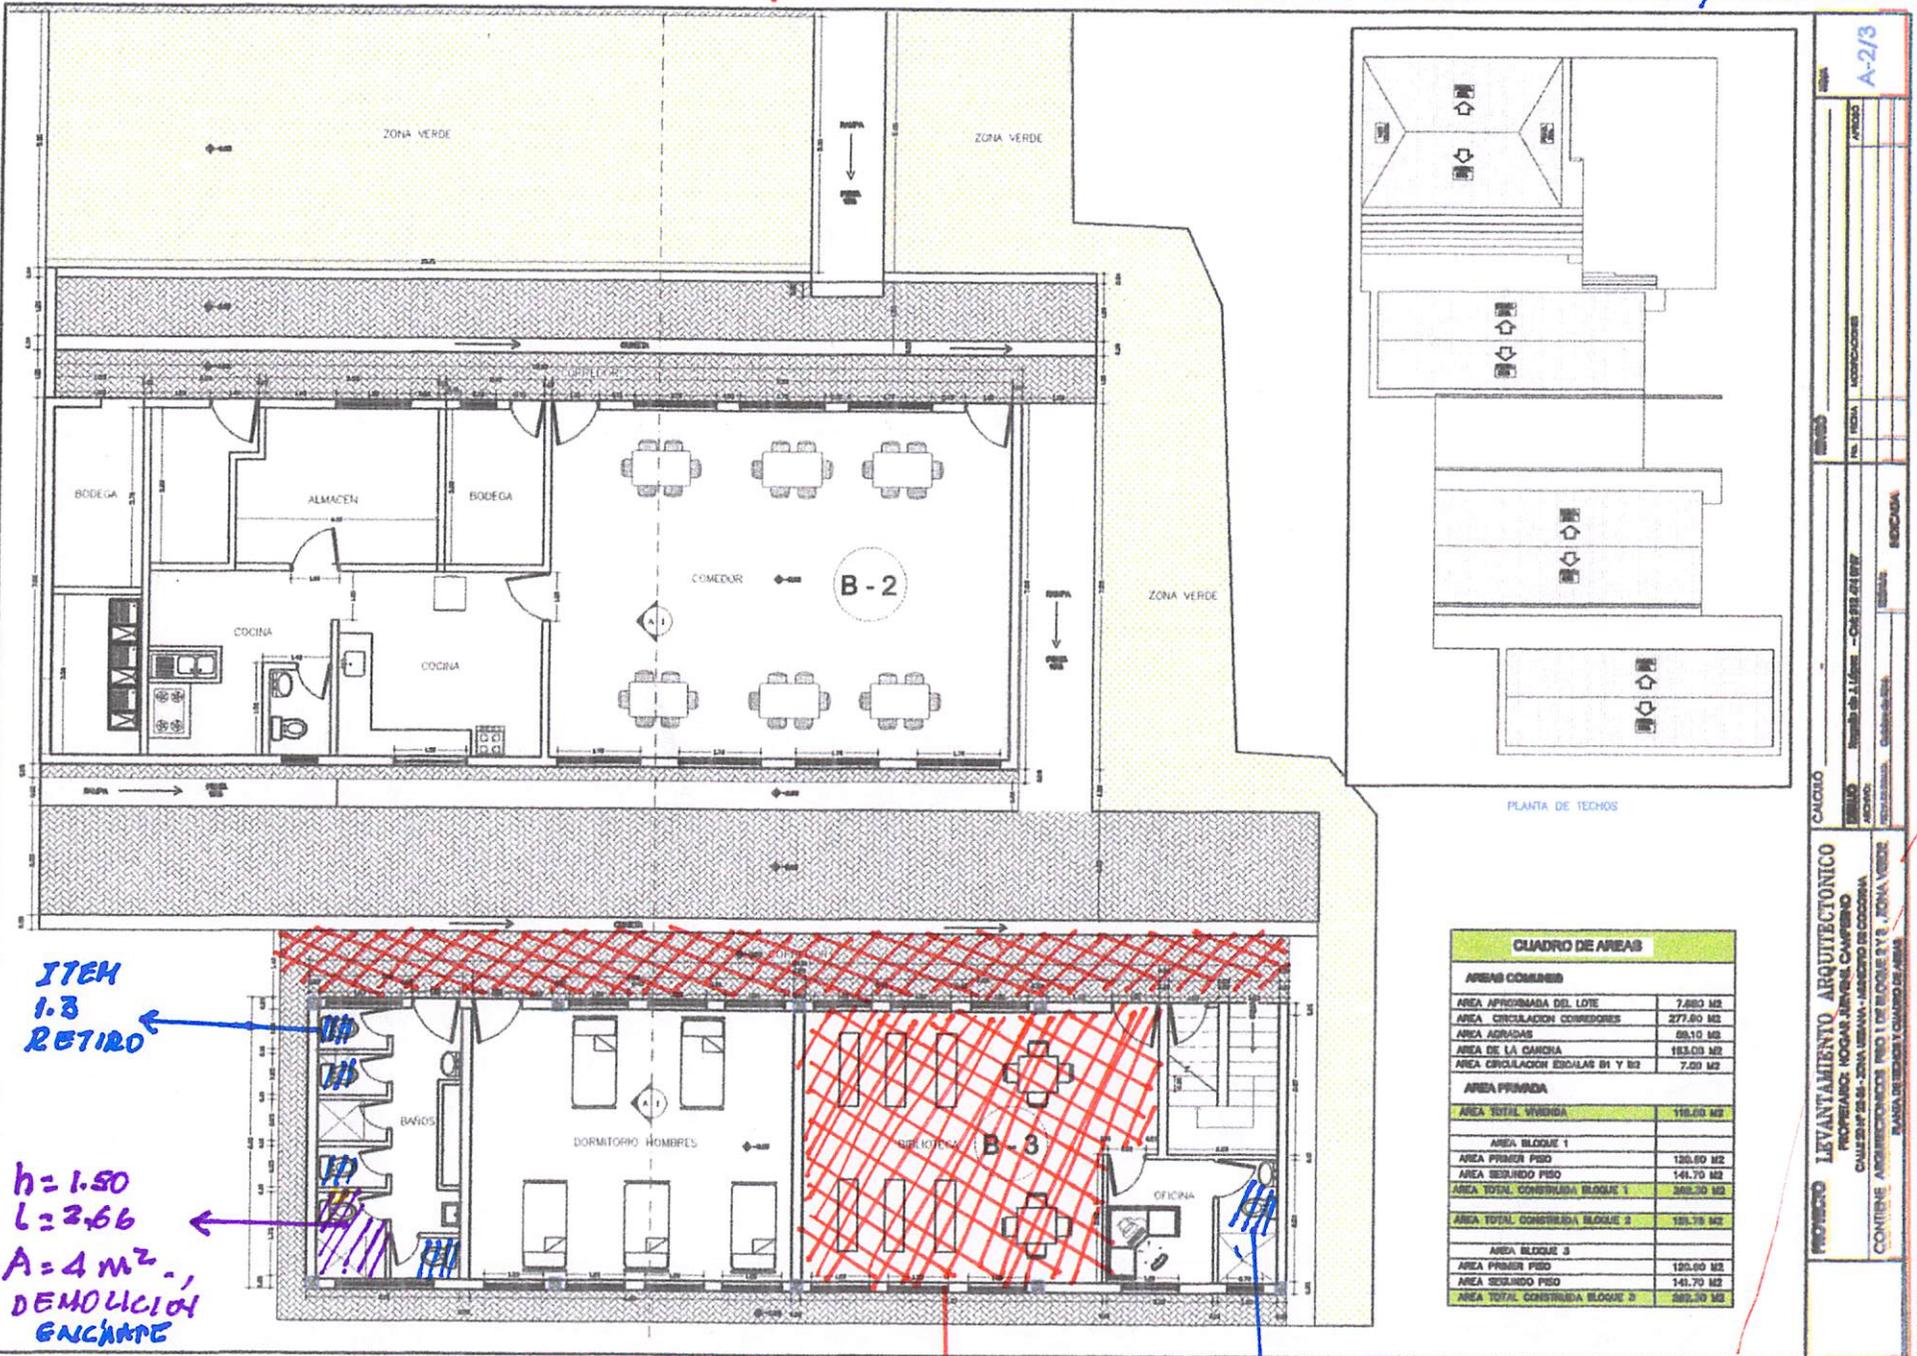

ITEM 1.3 RETIRO

$h = 1.50$
 $l = 2.66$
 $A = 4 \text{ m}^2$
 DEMOLICION ENCHASTE

1.1 DEMOLICION
3.2 suministro y colocacion baldosa

ITEM 1.3 RETIRO HERRAJES
8.1 suministro y colocacion

| CUADRO DE AREAS | |
|----------------------------------|------------|
| AREAS COMIDAS | |
| AREA APROBADA DEL LOTE | 7.880 M2 |
| AREA CIRCULACION COSEDORES | 277.80 M2 |
| AREA AGRADAS | 88.10 M2 |
| AREA DE LA GARCHA | 183.00 M2 |
| AREA CIRCULACION ESCALAS B1 y B2 | 7.00 M2 |
| AREA PRIMADA | |
| AREA TOTAL VIVIENDA | 1165.00 M2 |
| AREA BLOQUE 1 | |
| AREA PRIMER PISO | 126.60 M2 |
| AREA SEGUNDO PISO | 141.70 M2 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUE 1 | 268.30 M2 |
| AREA BLOQUE 2 | |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUE 2 | 191.78 M2 |
| AREA BLOQUE 3 | |
| AREA PRIMER PISO | 195.60 M2 |
| AREA SEGUNDO PISO | 141.70 M2 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUE 3 | 337.30 M2 |

PROYECTO LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
 PROYECTO: NOGAR JUVENIL CAMPESINO
 CALLE 20 N. 20-30 ZONA URBANA - BARCELONA DE COLOMBIA
 CONTIENE: ARCHITECTONICO PISO 1 (DE DORMIT. Y ZONA VERDE), PLANTA DE TECHOS Y CUBIERTA DE AREA

CALCULO


NO. FECHA: A-2/13

MONEDAS: MONEDAS


UNIDADES: UNIDADES

ESCALA: ESCALA



ITEM 6 6.1 hasta 6.10
ESTUCCO Y PINTURA.

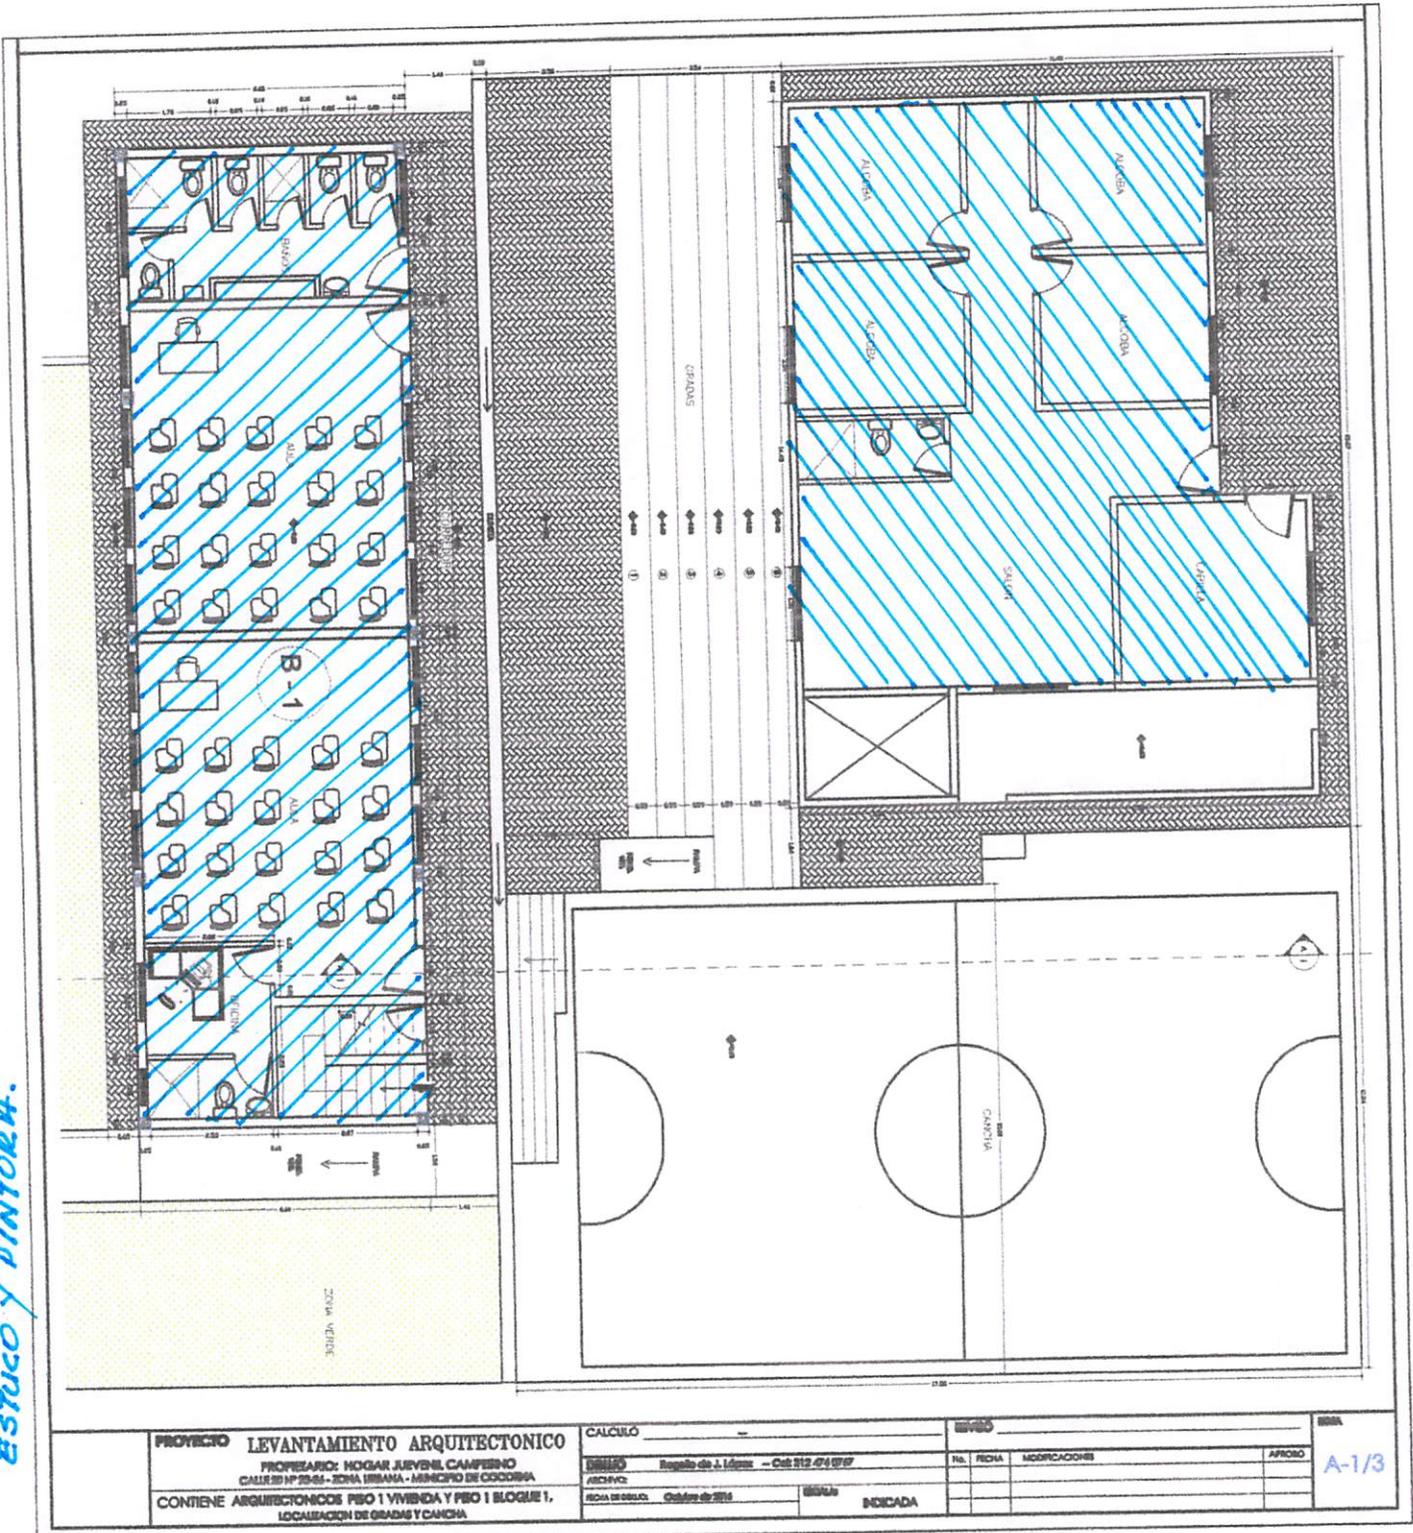

ITEM 6 6.1 a 6.10
ESTRUCO Y PINTURA

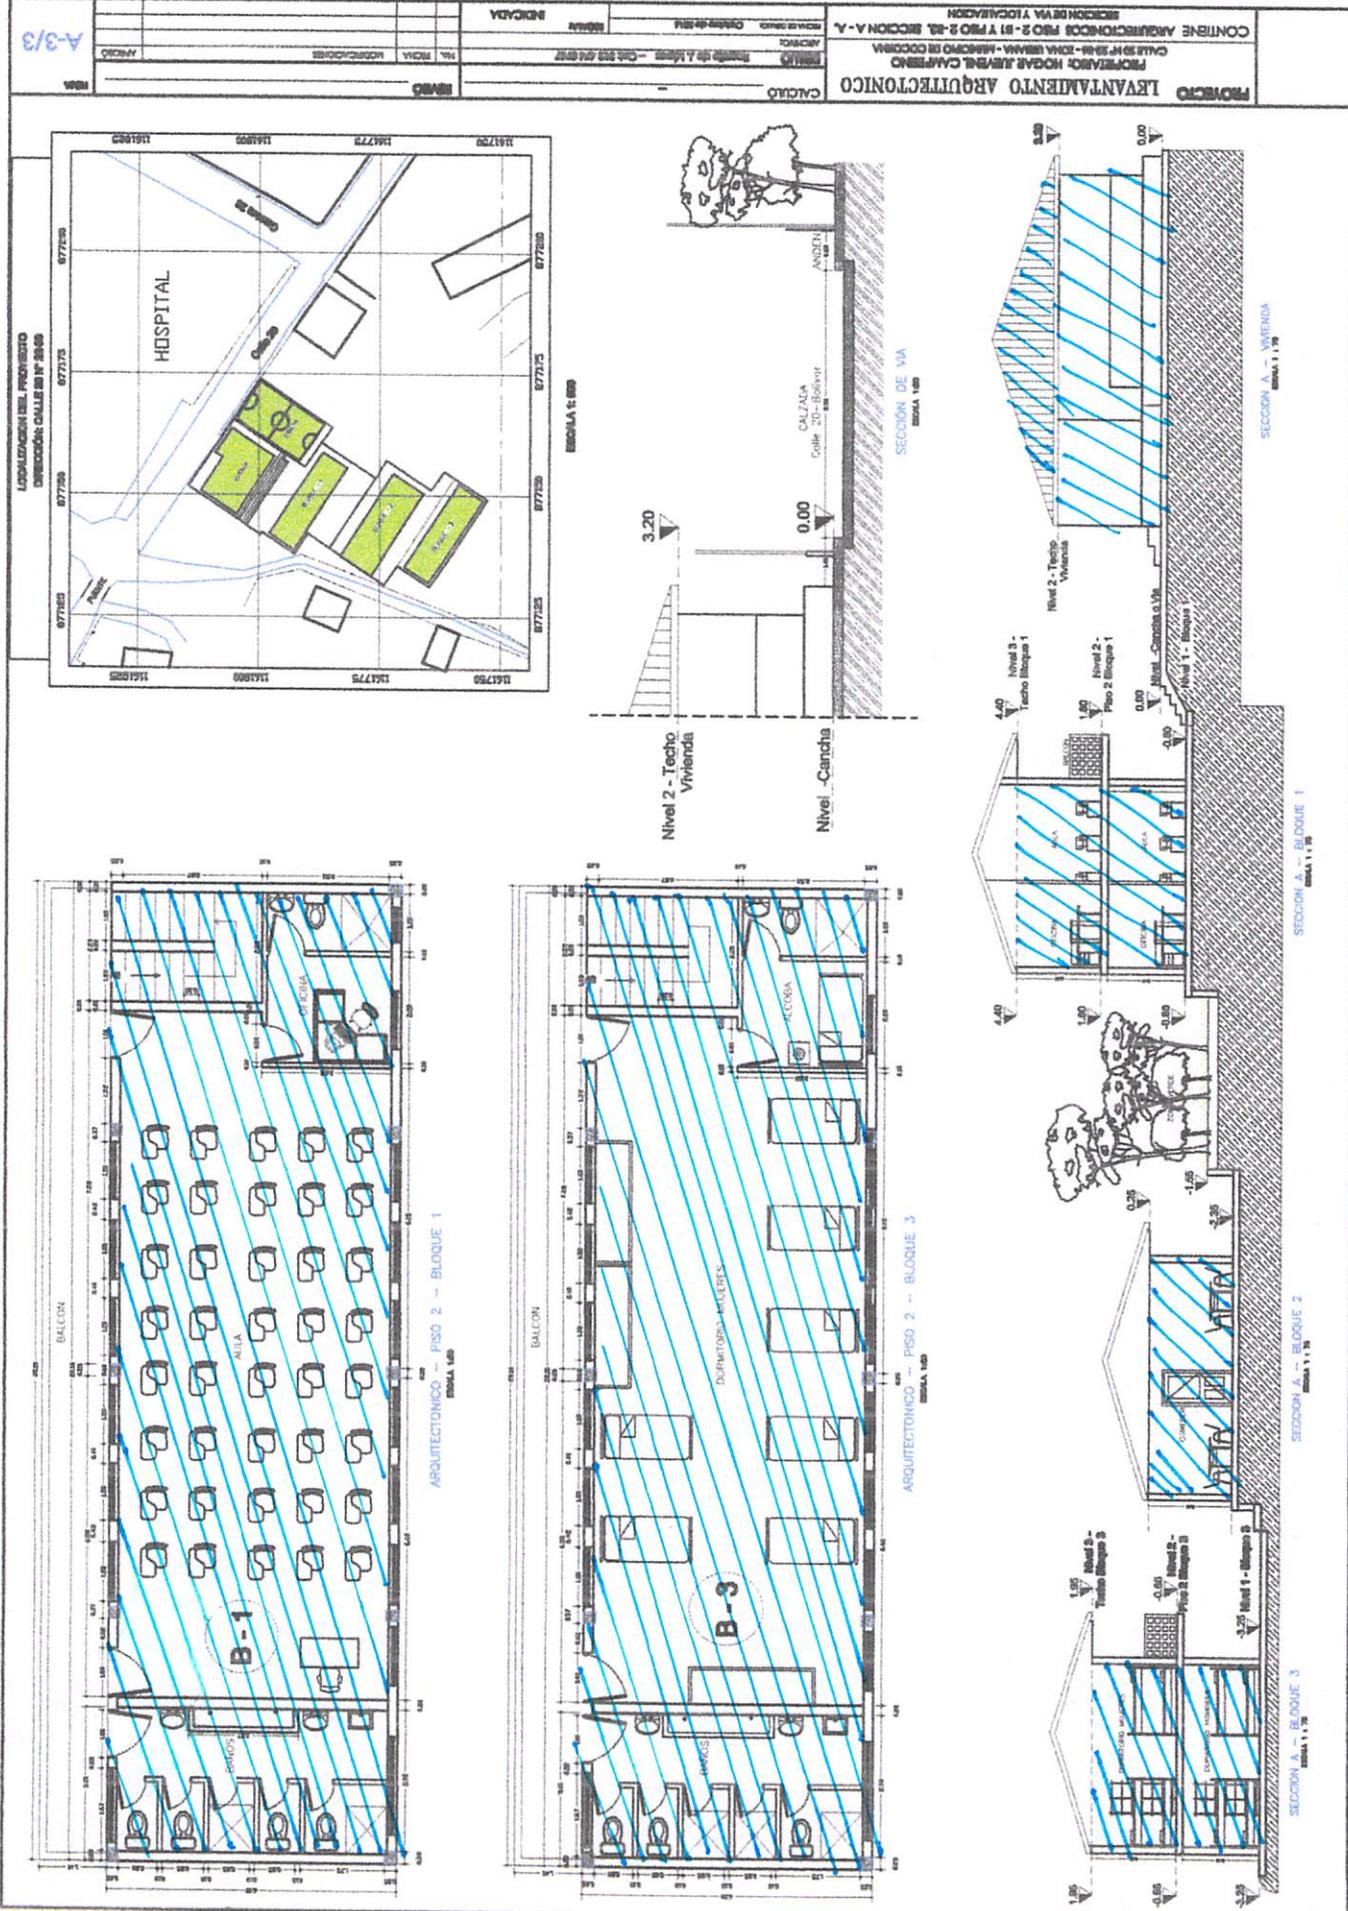



| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| PROYECTO | | LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO | | CALIDAD | | RUBRO | | RMA | |
| CONTIENE ARQUITECTONICO PISO 2 - B1 Y PISO 2 - B2, SECCION A - A1 | | PROYECTO: HOJAS LIBEREL CAMPESINO | | CALLE 20 - BOLIVAR - ZONA URBANA - PARROQUIA DE COCORA | | Escala de 1:500 - C.A. 2018.02.01 | | MA. TICA, HOSPEDAJERO | |
| INDICADA | | INDICADA | | INDICADA | | INDICADA | | INDICADA | |
| INDICADA | | INDICADA | | INDICADA | | INDICADA | | INDICADA | |

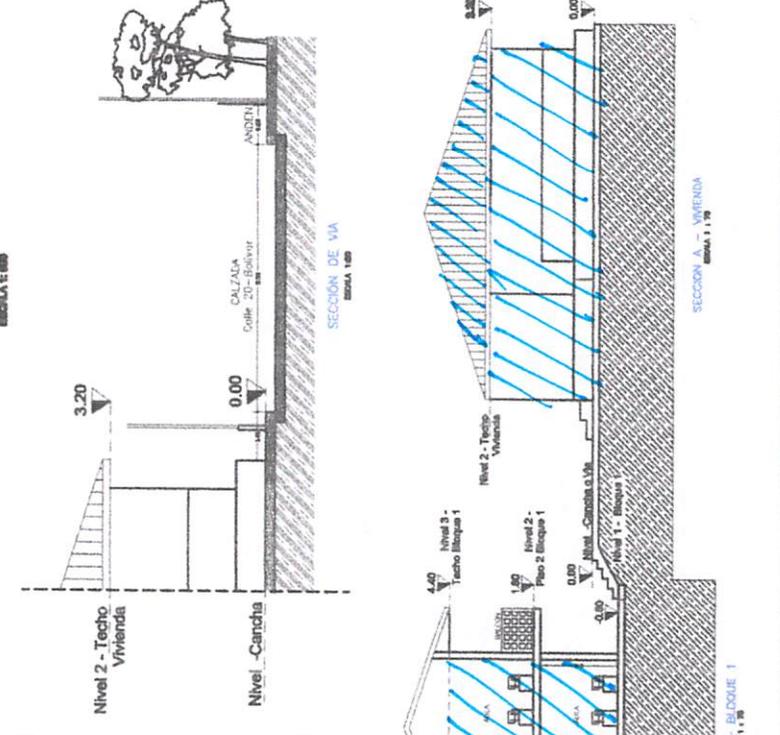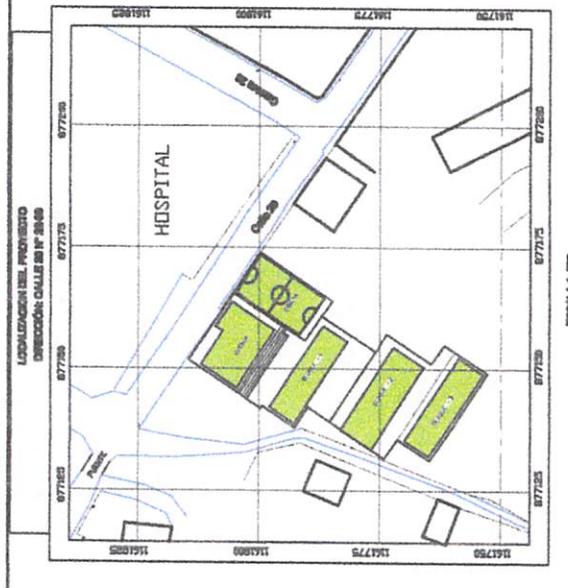

2


3.

ITEM 6 6.1 a 6.10
 ESTUCCO y PINTURA
 ITEM 7 TECHOS
 7.1 som y color Teja Esternit N°6

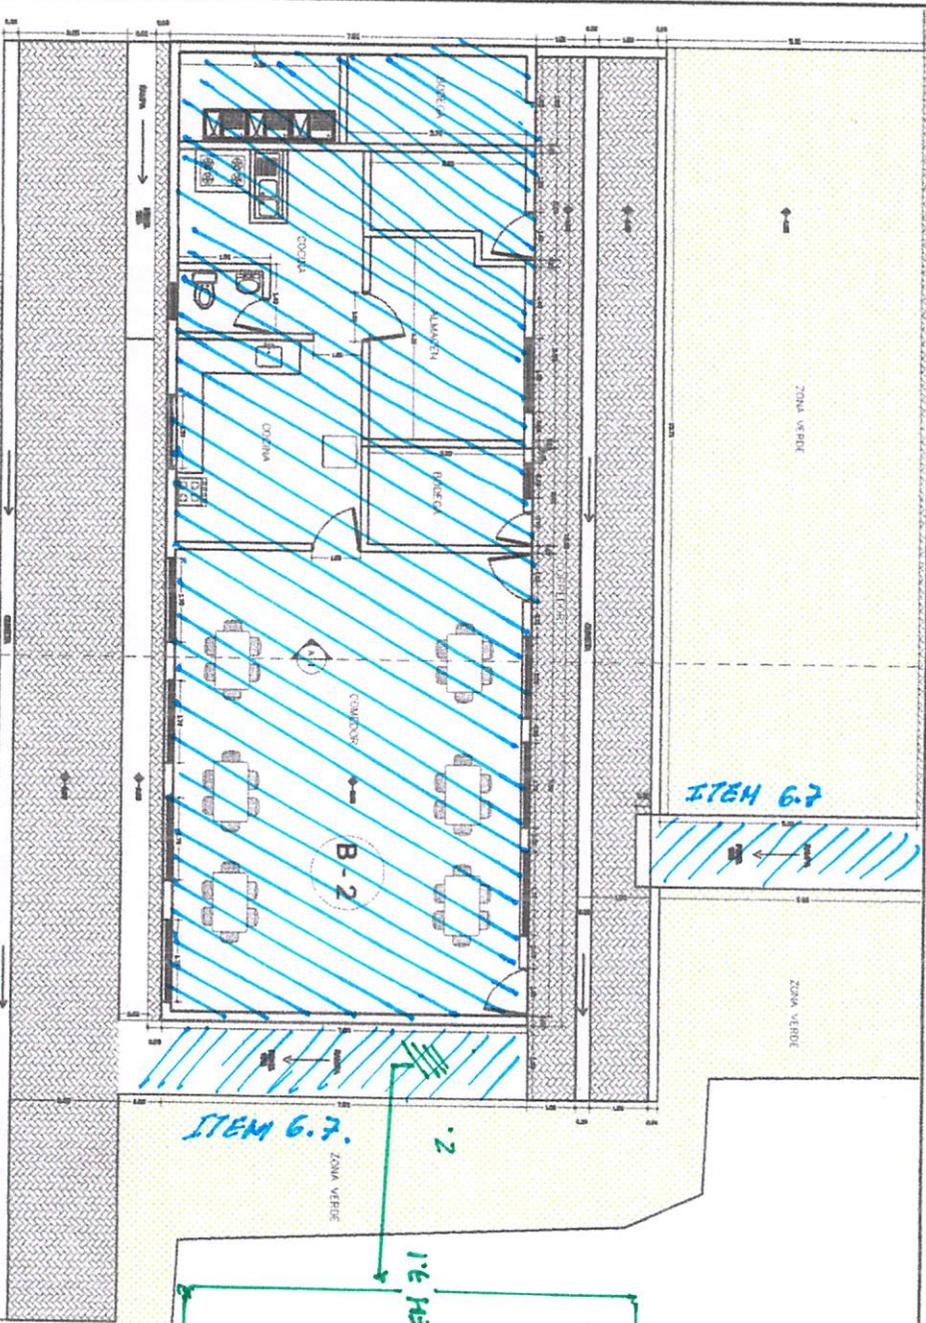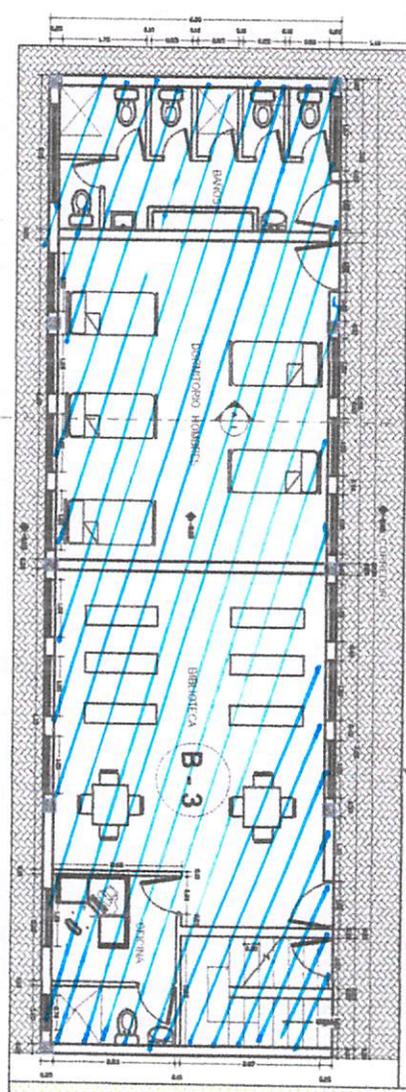


| CUADRO DE AREAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| AREA CUBIERTA | |
| AREA PERIFERIA DEL LOTE | 7.800 M ² |
| AREA CIRCUNSCRIPCION CONSERVADA | 277.20 M ² |
| AREA DE LA GRANJA | 65.10 M ² |
| AREA CIRCUNSCRIPCION ESCUELAS B1 Y B2 | 7.200 M ² |
| AREA PERIFERIA | |
| AREA TOTAL VERDE | 7.800 M ² |
| AREA BLOQUE 1 | 130.50 M ² |
| AREA PUNTA PISO | 141.50 M ² |
| AREA TOTAL CONSERVADA BLOQUE 1 | 272.00 M ² |
| AREA TOTAL CONSERVADA BLOQUE 2 | 518.70 M ² |
| AREA BLOQUE 3 | 150.50 M ² |
| AREA PUNTA PISO | 141.70 M ² |
| AREA TOTAL CONSERVADA BLOQUE 3 | 292.20 M ² |

PLANTA DE TECHOS

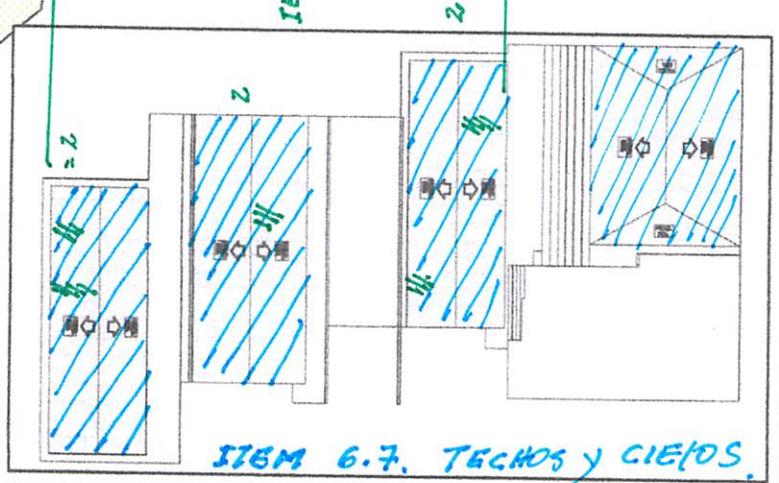

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---|----------------|--|
| PROYECTO | LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO | CALCULO | | REVISADO | |
| PROPIETARIO: | HOGAR JUVENIL CAMPESINO | DISEÑADO | Ricardo de A. López - Cel: 992 474 8787 | FECHA | |
| CALLE: | 20 N° 20-01 - ZONA URBANA - MANCIPALDIO DE COCONA | REVISADO | | MODIFICACIONES | |
| CONTIENE: | ARQUITECTONICOS PRO 1 DE BLOQUE 2 Y 3, ZONA VERDE | FECHA DE REVISION | | INDICADA | |
| | PLANTA DE TECHOS Y CUADRO DE AREAS | | | | |

ITEM 2 CONCRETOS Y HORTEROS
2.1 Suministro y colocación de concreto 3000 PSI CUPETA

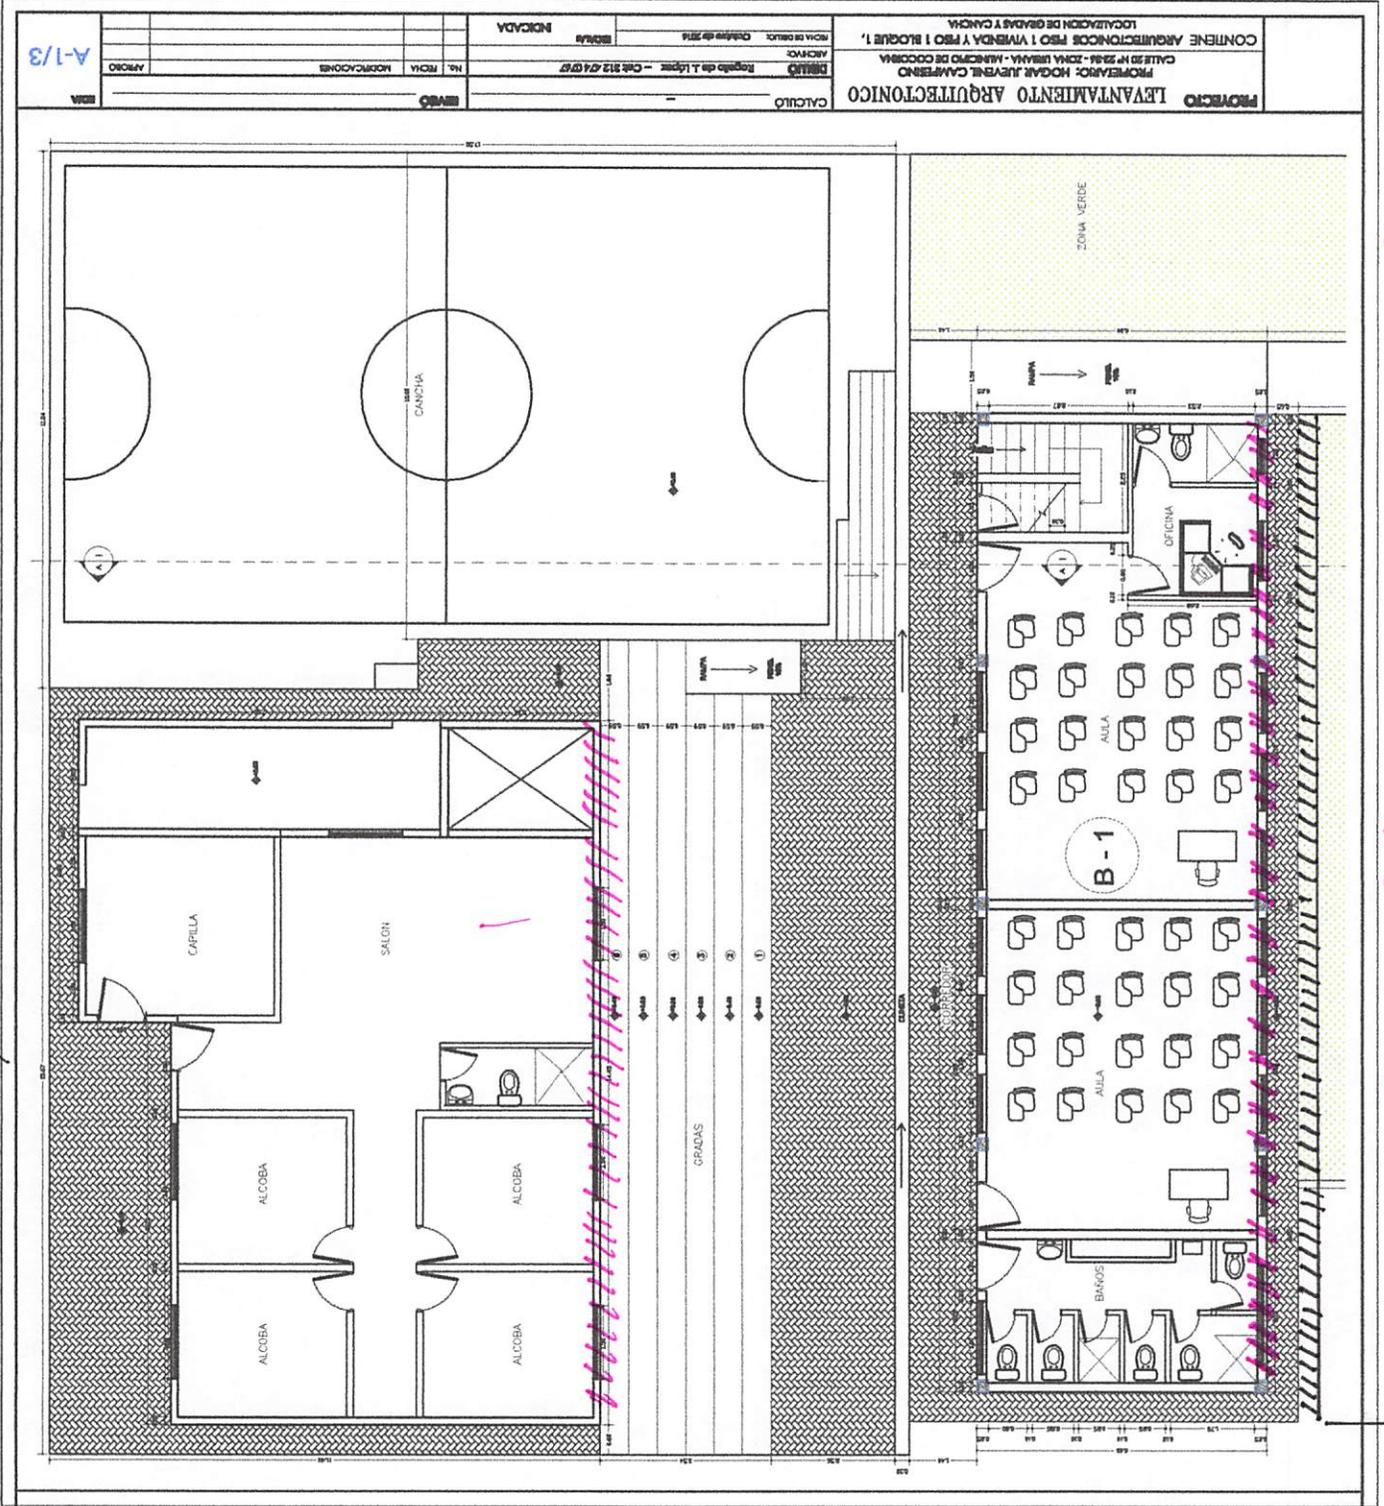


ITEM 7 7.2 BOJANTES SUMINISTRO Y colocación
h: 4.85 7.3

ITEM 2.1
SUM. y coloc

ITEM 5 CARPINTERIA DE MADERA

5.1 RETIRO MARCOS
5.2 DESMONTAJE PUERTAS
5.3 REPARACION PUERTAS

5.4 SUMINISTRO Y COLOCACION MARCOS.
5.5 SUM Y COLOCACION PUERTAS MADERA.

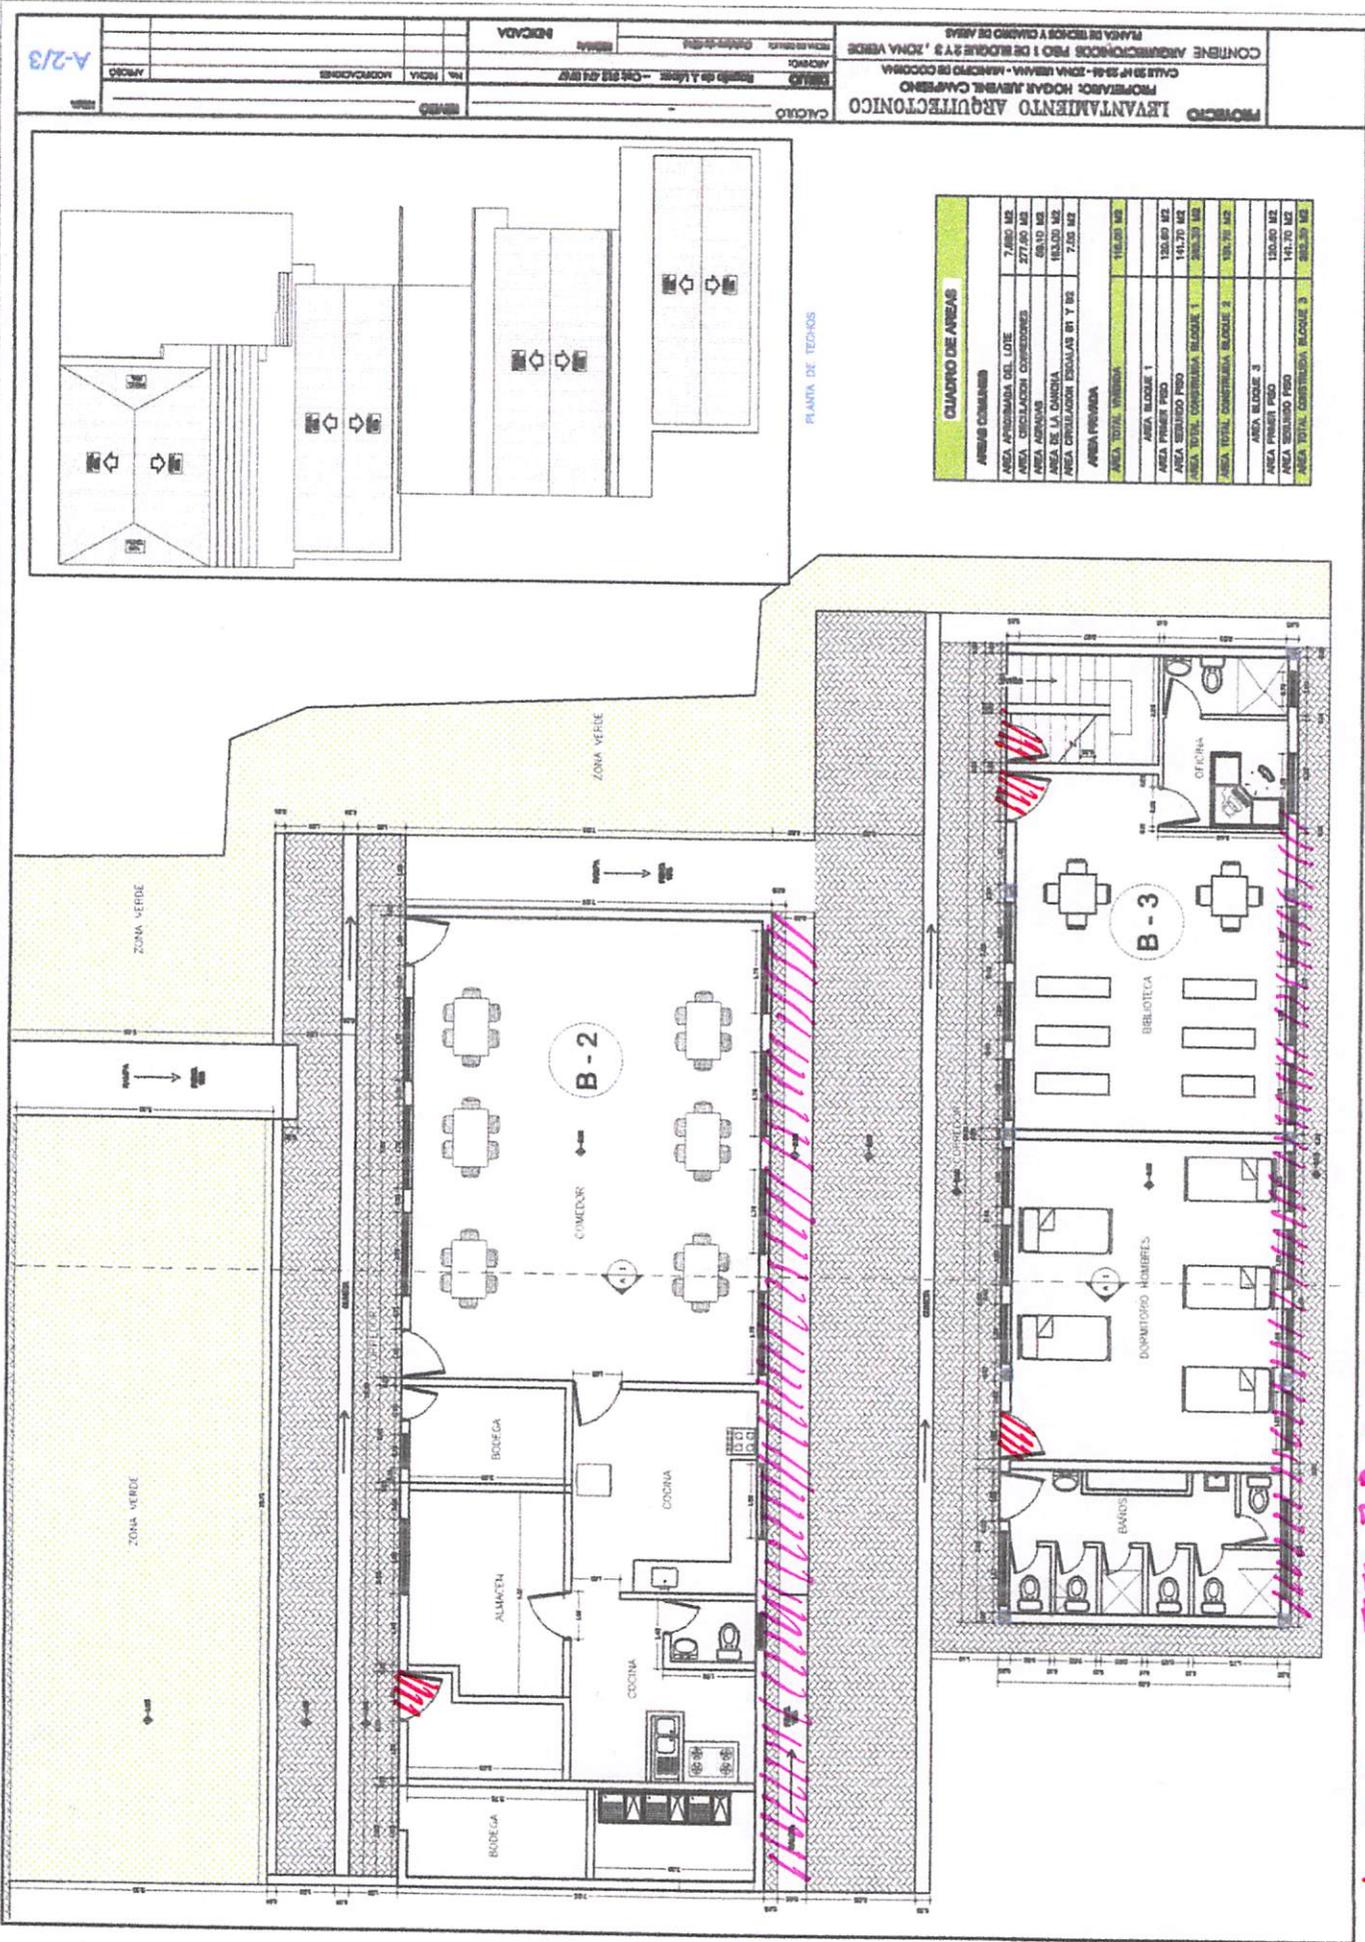


h = 2.00
A = 0.90



ITEM 7.2 CARPINTERIA Y LAMINA
7.3

5.6 SUMINISTRO Y COLOCACION MARCOS EN MADERA.






PROYECTO LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
PROFESIONISTA HOGAR JUVENIL CAPRIBENO
CALLE N° 2948 - ZONA VERDE - MANCORA DE COCOA
CONTIENE ARQUITECTONICO FIBO 1 DE BLOQUE 2 Y 3 , ZONA VERDE
FECHA 08/04/2014
INDICADA
INDICADO Registro de 1.ª Ley - C# 912 571 875
NUMERO 1001
INDICACIONES
NUMERO A-2/3

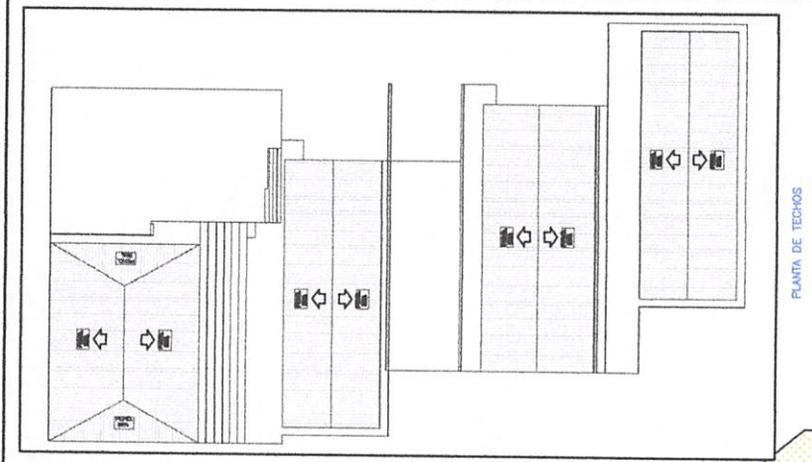

| CUADRO DE AREAS | |
|----------------------------------|-----------|
| AREAS COMUNES | |
| AREA AFROANADA DEL LOTE | 7,680 M2 |
| AREA CIRCULACION COMUNICACIONES | 277,00 M2 |
| AREA AZARAS | 69,10 M2 |
| AREA DE LA CANCHA | 183,00 M2 |
| AREA CIRCULACION ESCALAS B1 Y B2 | 7,00 M2 |
| AREA PRIVADA | |
| AREA TOTAL VIVIENDA | 116,00 M2 |
| AREA BLOQUE 1 | |
| AREA PRIMERO PISO | 100,80 M2 |
| AREA SEGUNDO PISO | 141,70 M2 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUE 1 | 242,50 M2 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUE 2 | 101,78 M2 |
| AREA BLOQUE 3 | |
| AREA PRIMERO PISO | 100,80 M2 |
| AREA SEGUNDO PISO | 141,70 M2 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA BLOQUE 3 | 242,50 M2 |

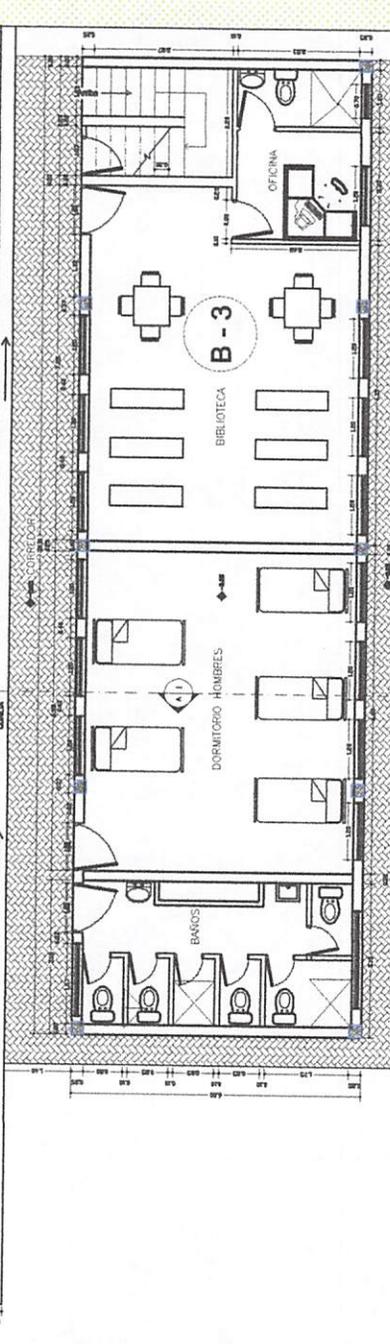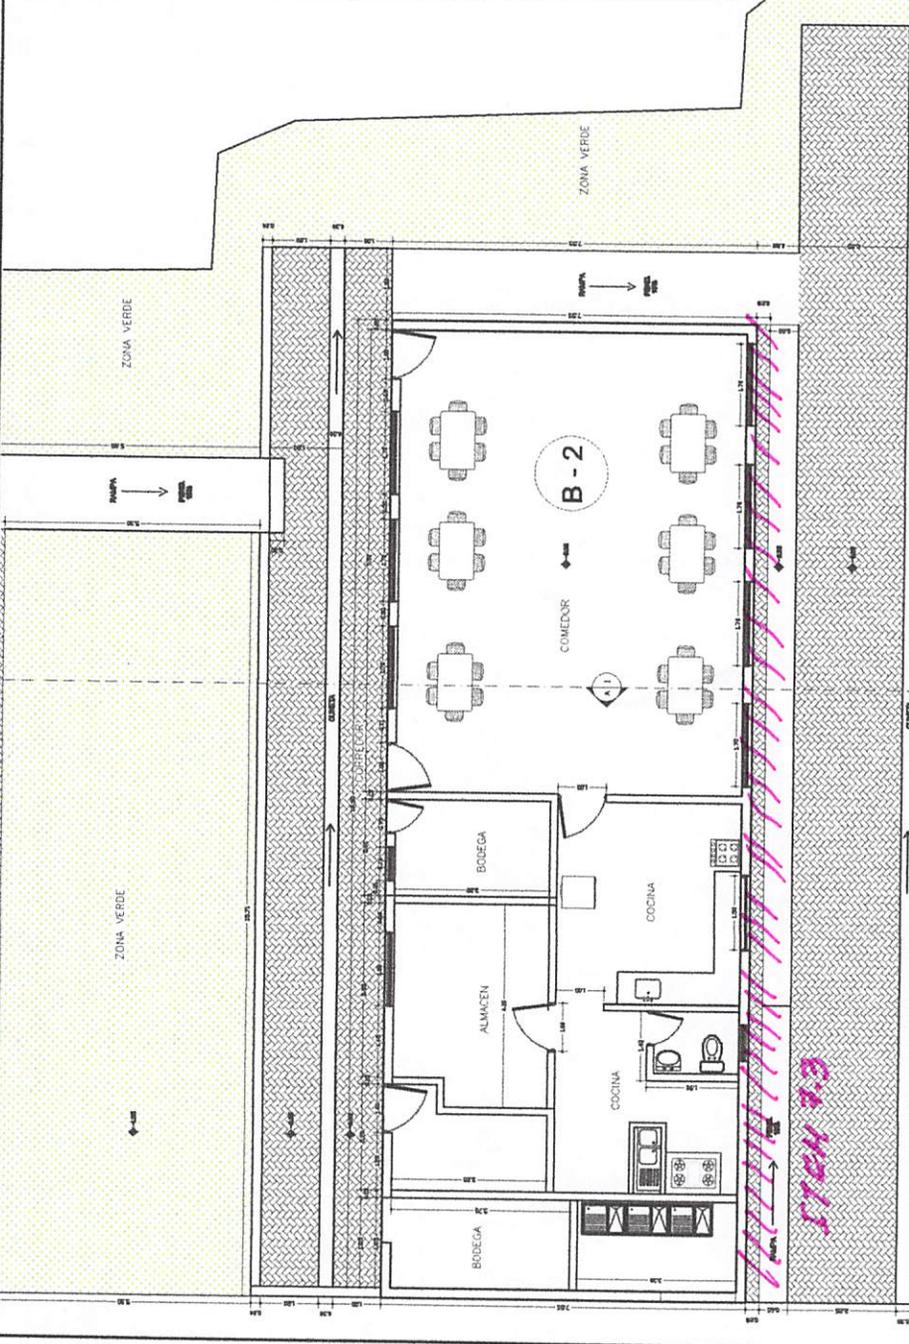

ITEM 9. 9.1 ●
9.2 ●

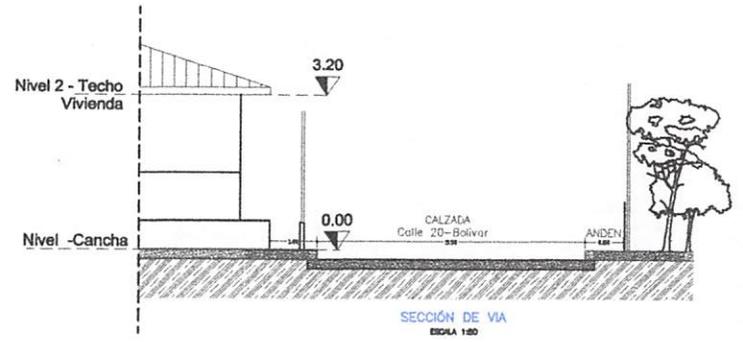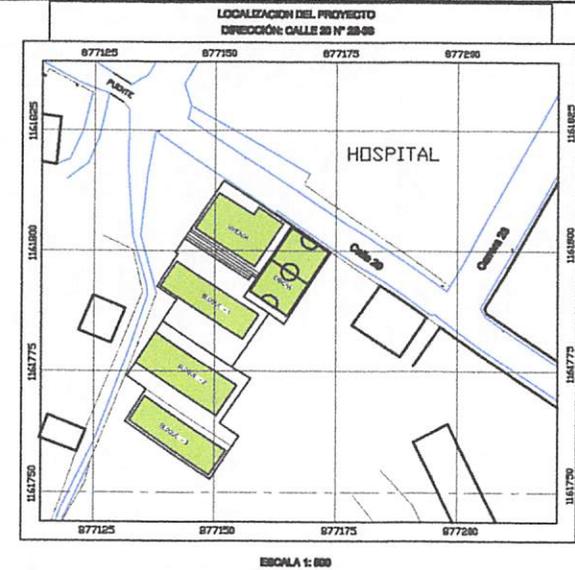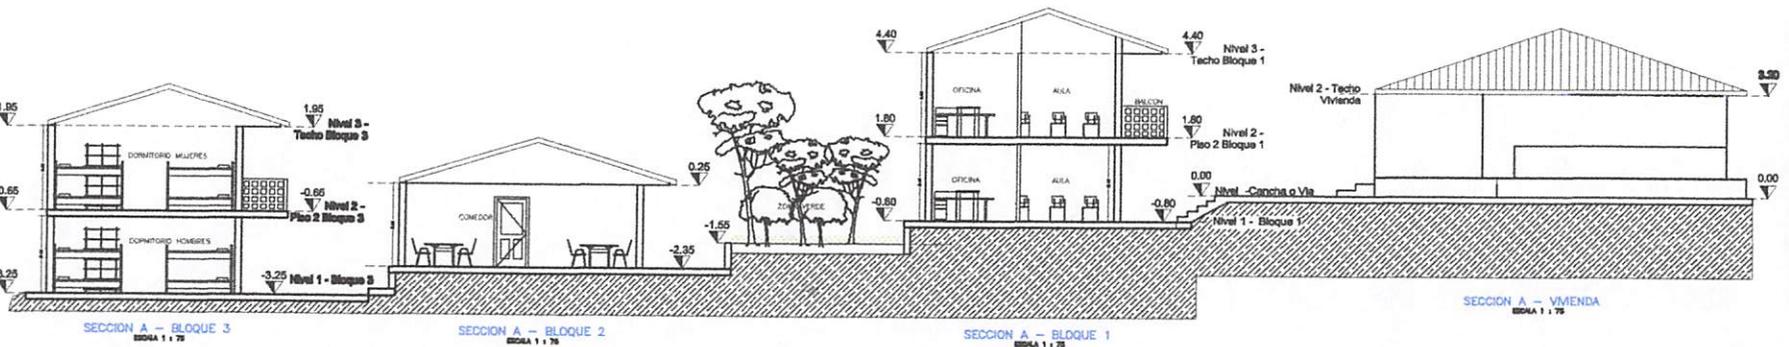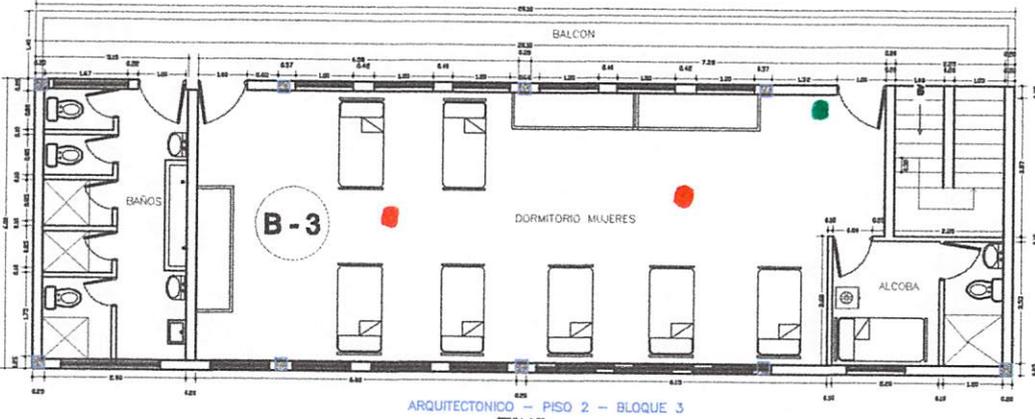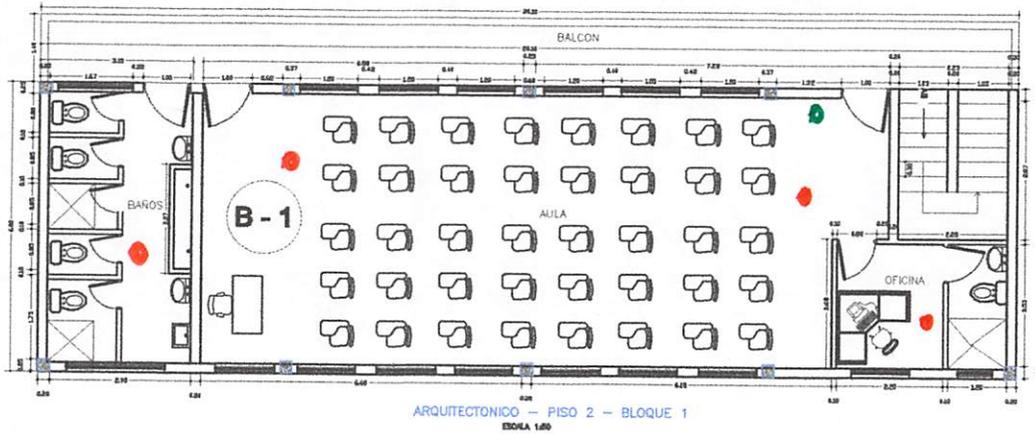





| | | |
|-----------|---|--------------|
| TITULO | A-3/3 | |
| | NO. FOLIO | INDICACIONES |
| INDICADO | | |
| ELABORADO | PROYECTO DE LEY - CAS 312 04 017 | |
| REVISADO | DISEÑO DE PLANTA | |
| INDICADA | | |
| PROYECTO | LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO | |
| | PROPIETARIO: Hogar Juvenil Campesino | |
| | CALLE 20 N° 28-88 - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE COCHINA | |
| | CONTIENE: ARQUITECTONICOS PISO 2 - B1 Y PISO 2-3B, SECCION A-A, SECCION DE VIA Y LOCALIZACION | |

PROYECTO LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
PROPÓSITO: HOGAR PARA EL CAMBIADO
CUADRA: 2680 - ZONA 18MA - MUNICIPIO DE ESCOBADO

CONTRATE: ARQUITECTOS RPO S. DE CV RPO S. DE CV. SECCION A-A, SECCION B-B, SECCION C-C, SECCION D-D, SECCION E-E, SECCION F-F, SECCION G-G, SECCION H-H, SECCION I-I, SECCION J-J, SECCION K-K, SECCION L-L, SECCION M-M, SECCION N-N, SECCION O-O, SECCION P-P, SECCION Q-Q, SECCION R-R, SECCION S-S, SECCION T-T, SECCION U-U, SECCION V-V, SECCION W-W, SECCION X-X, SECCION Y-Y, SECCION Z-Z

PROYECTANTE: ANDRÉS RAMÍREZ
PROYECTISTA: ANDRÉS RAMÍREZ

NO. IDENTIFICACION:
FECHA:

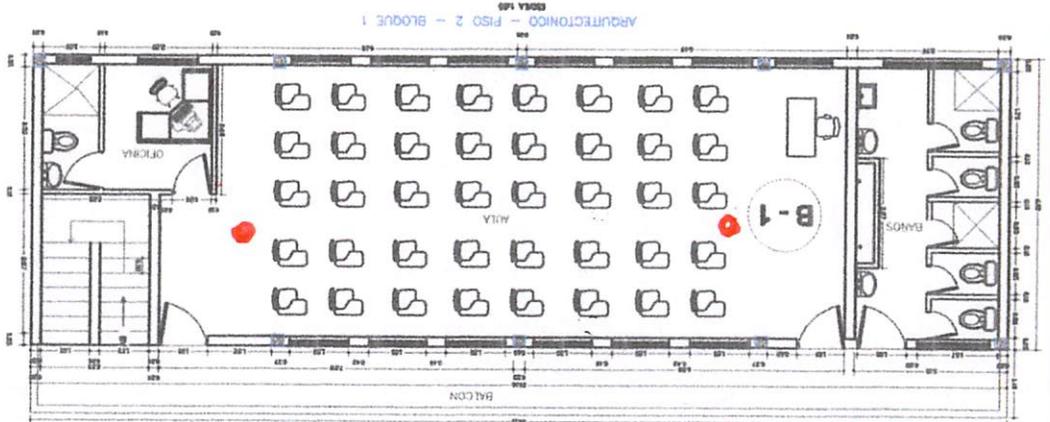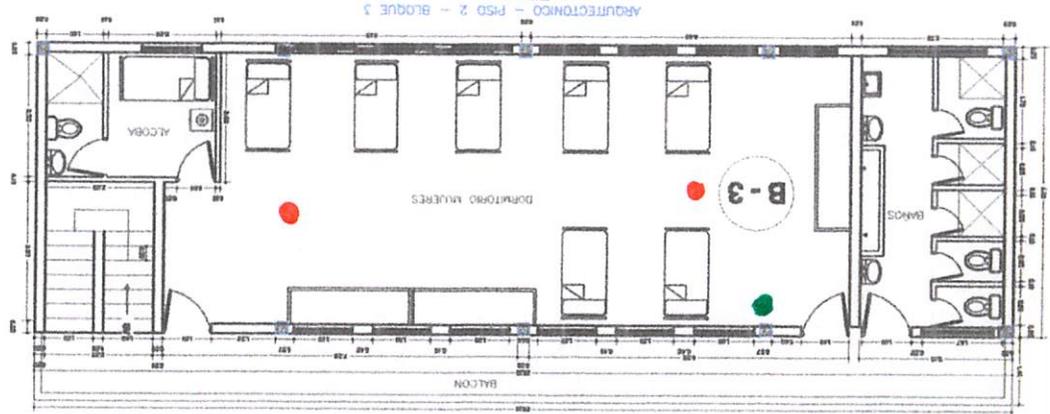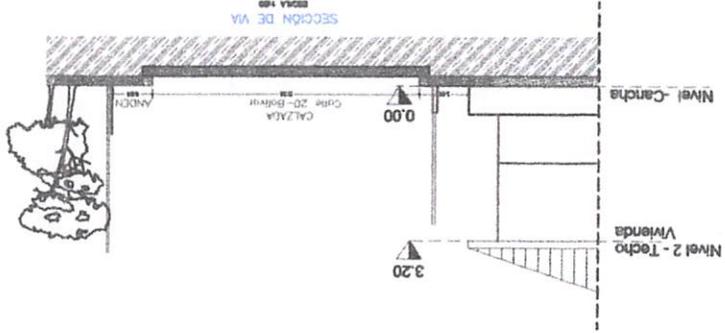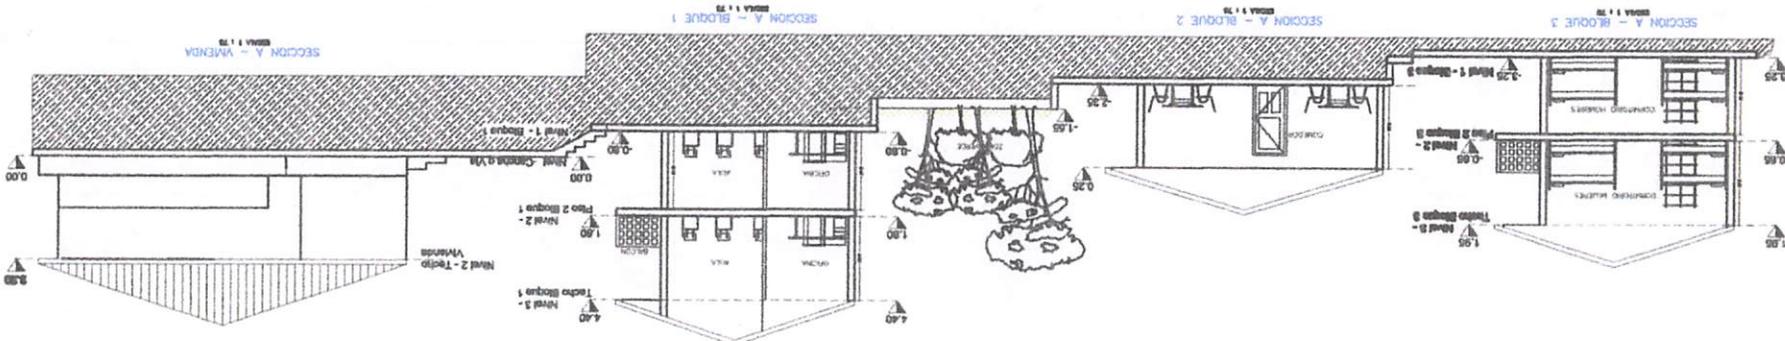


9.2 = ●
 9.1 = ●

A-3/3

ITEM 9 ELECTRICOS

9.1 Switches
9.2 Luminares

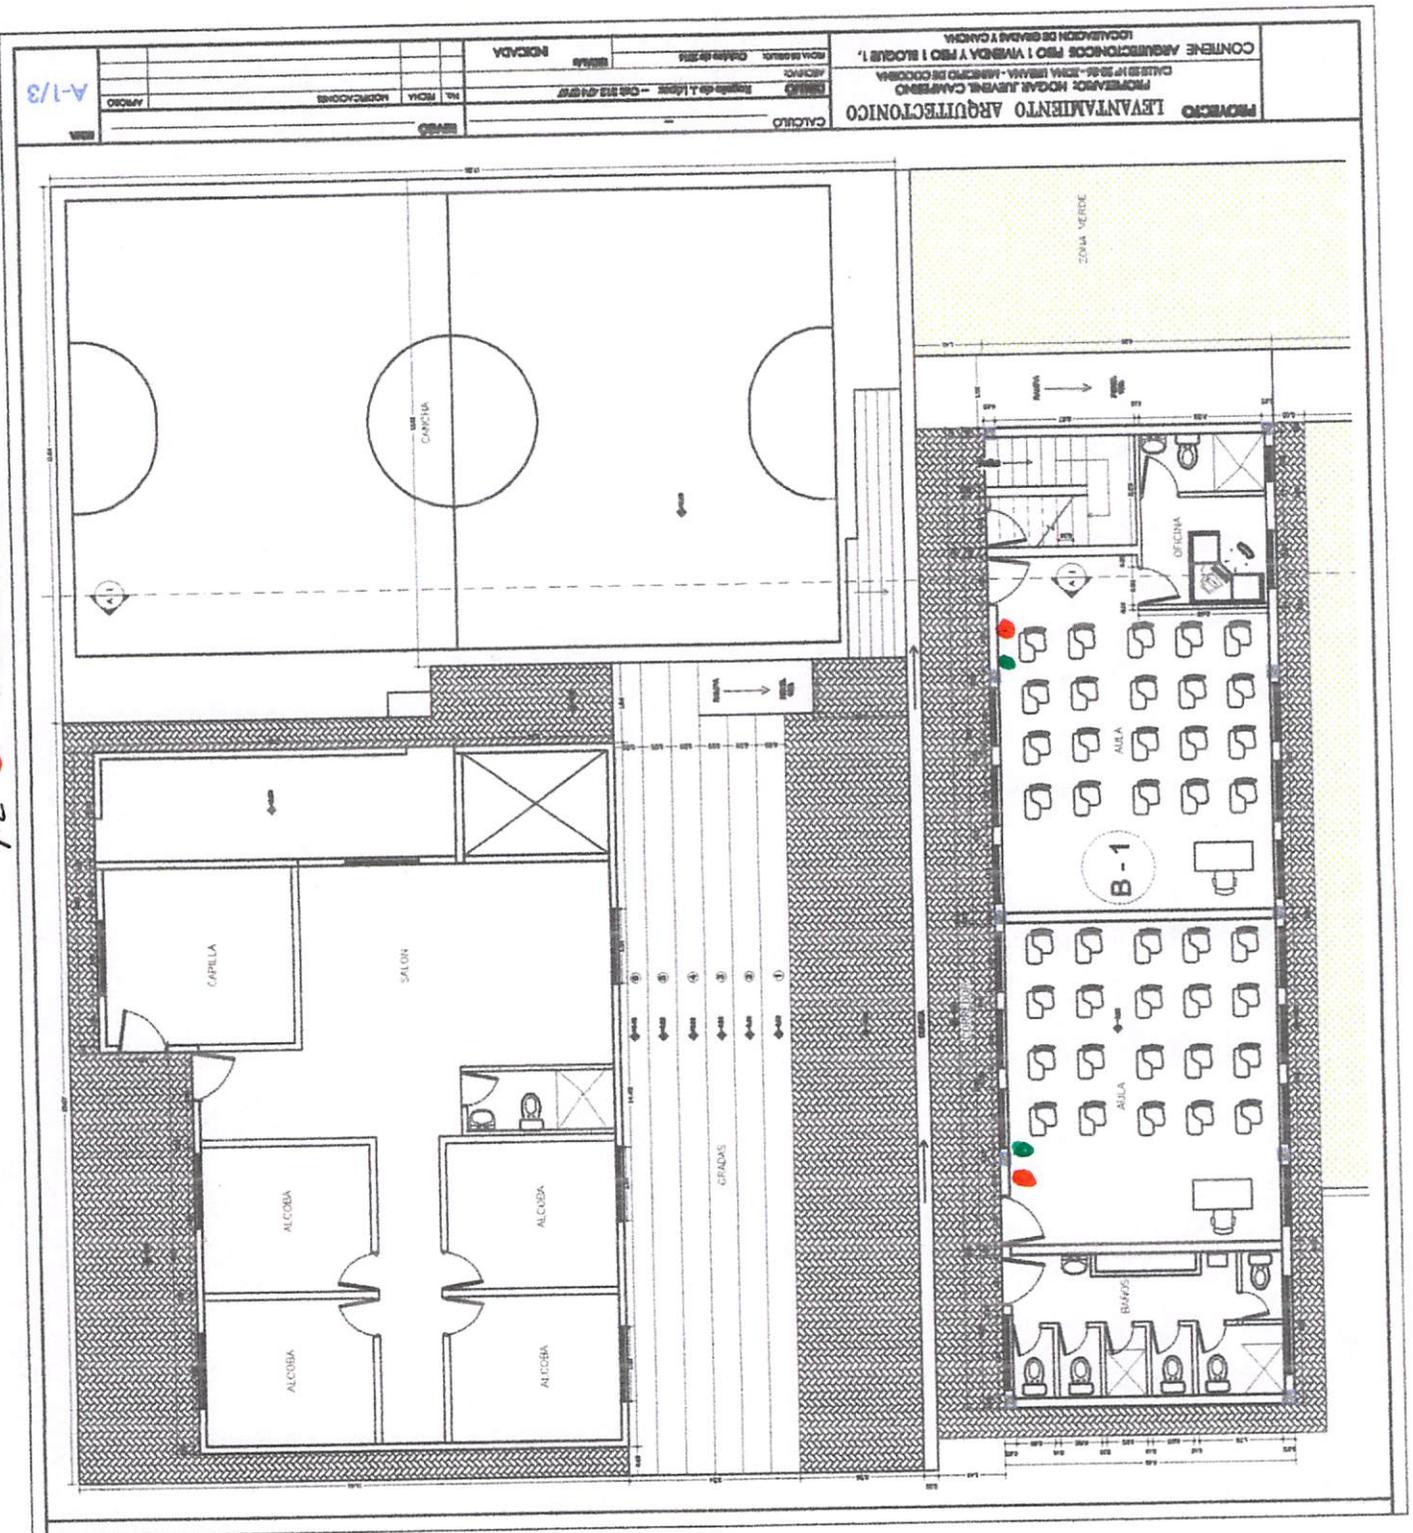

| UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | | FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC | | Código: | 310.03.15-19 |
|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| | | PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | | Versión: | 01 |
| | | PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | | Fecha de Aprobación: | 6/10/2015 |
| | | | | Pág: | 1 de 5 |

CÓDIGO DEL PROYECTO:

| 1. PROCESO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO (LINEA DE ACCIÓN) (marcar con X) a) PREVENCIÓN <input type="checkbox"/> c) OTRA? <input checked="" type="checkbox"/> b) AYUDA Y ATENCIÓN INMEDIATA <input type="checkbox"/> Reparación Colectiva | | 2. GRUPO ÉTNICO AL QUE PERTENECEN LOS HOGARES a) AFROCOLOMBIANOS <input type="checkbox"/> d) ROM <input type="checkbox"/> b) INDÍGENAS <input type="checkbox"/> e) CAMPESINOS <input checked="" type="checkbox"/> c) RAIZALES <input type="checkbox"/> Otro. _____ | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------------------|--|--------|---|----|---|----|
| 3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO a) DEPARTAMENTO <u>Antioquia</u> b) MUNICIPIO <u>Cocorná</u> c) CORREGIMIENTO (Barrio) <u>Sector Calle Bolívar</u> d) VEREDA(S) (Dirección, Localidad, Predio) <u>Calle 20 n° 23-33</u> e) PUNTO DE ENTREGA MATERIALES Y/O MOBILIARIO: <u>Calle 20n° 23-33</u> <u>Sector Calle Bolívar, zona urbana municipio de Cocorná</u> <u>Instalaciones del Hogar Juvenil Campesino</u> f) RURAL <input type="checkbox"/> h) UBANO <input checked="" type="checkbox"/> g) CONCENTRICO <input type="checkbox"/> i) DISPERSO <input type="checkbox"/> | | 4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO a) Objeto del proyecto (descripción general) <u>Adecuación y mantenimiento del HOGAR JUVENIL CAMPESINO de cocorná</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NUMERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b) Número de personas víctimas beneficiadas con el proyecto</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>c) Número de personas en condición de vulnerabilidad beneficiadas</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table> d) Impacto social y comunitario del proyecto (descripción general) <u>Se mejoraran las condiciones de estadia de niños, niñas y Adolescentes del Hogar Juvenil Campesino garantizandoles el derecho a la educación básica primaria y media, adicionalmente con las adecuaciones que se realicen se aumentará la capacidad del establecimiento y por ende permitirá recibir jóvenes que requieran Educación superior y no cuentan con alimentación y un lugar donde alojarse, durante el periodo académico, contribuyendo así con</u> | | | NUMERO | b) Número de personas víctimas beneficiadas con el proyecto | 64 | c) Número de personas en condición de vulnerabilidad beneficiadas | 64 |
| | NUMERO | | | | | | | | |
| b) Número de personas víctimas beneficiadas con el proyecto | 64 | | | | | | | | |
| c) Número de personas en condición de vulnerabilidad beneficiadas | 64 | | | | | | | | |
| 5. VERIFICACION DE CONDICIONES ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO a) REQUISITOS PARA APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA (PISC) <input type="checkbox"/> Marque X | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | CUMPLE (Si / No) | NO APLICA | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | OBSERVACIONES (informar fecha de expedición del documento) | | | | | |
| 1. Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. | | | | | | | | | |
| 2. Certificado de tradición y libertad y/o copia de la escritura del lote donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio | | | | | | | | | |
| 3. Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales. | | | | | | | | | |
| 4. Certificado de disponibilidad de servicios públicos | | | | | | | | | |
| 5. Certificación de viabilidad del proyecto | | | | | | | | | |
| 6. Compromiso de sostenibilidad | | | | | | | | | |
| 7. Acta de socialización | | | | | | | | | |
| 8. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) | | | | | | | | | |
| * 9. Certificación de que los estudios y diseños que se remiten con el proyecto cumplen con las normas vigentes de construcción. Remisión de Estudios y diseños. | | | | | | | | | |
| * Los estudios y diseños solicitados deben ser acordes con el alcance técnico del proyecto. No toda la información aplicaría para obras localivas menores (reparaciones menores). | | | | | | | | | |
| b) REQUISITOS PARA APOYO CON DOTACION DE MOBILIARIO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA (PISC) <input checked="" type="checkbox"/> Marque X | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | CUMPLE (Si / No) | NO APLICA | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | OBSERVACIONES (informar fecha de expedición del documento) | | | | | |
| 1. Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. | Si | | Alcaldía Municipal | 22/10/2018 | | | | | |
| 2. Compromiso de sostenibilidad | Si | | Hogar Juvenil Campesino | | | | | | |
| 3. Acta de socialización | Si | | Alcaldía Municipal | 29/09/2018 | | | | | |
| 4. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) | | X | | La mano de obra la suministra la administración Municipal | | | | | |
| 5. Censo y/o certificación de uso y capacidad en número de personas | Si | | Alcaldía Municipal | 25/10/2018 | | | | | |



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC

| | |
|----------------------|--------------|
| Código: | 310,03,15-19 |
| Versión: | 01 |
| Fecha de Aprobación: | 6/10/2015 |
| Pág: | 2 de 5 |

**PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA**

CÓDIGO DEL PROYECTO:

6. APORTES Y FUENTES DE FINANCIACION

| ENTIDAD | TIPO DE APORTE | DESCRIPCION DEL APORTE | VALOR ESTIMADO |
|-----------------------------|----------------|---|-------------------------|
| a) Unidad para las Víctimas | Especie | Materiales para ejecución proyecto reparación y mantenimiento estructura Hogar juvenil Campesino de Cocorná | \$ 35.399.770,51 |
| b) Alcaldía de Cocorná | Mano de Obra | El Municipio realizara la ejecución de las obras con personal adscrito a la Institución | \$ 12.655.600,83 |
| c) | | | |
| d) | | | |
| e) | | | |
| f) | | | |
| g) | | | |
| h) | | | |
| i) | | | |
| j) | | | |
| Total Proyecto | | | \$ 48.055.371,34 |

Tipos de Aporte:

MAT. Materiales de construcción

LOT. Lote

S.PUB. Servicios públicos

A.T. Asistencia Técnica

EST.D. Estudios y Diseños

DOT. Dotación

D.O. Dirección de Obra

A.S. Asistencia Social

INT. Interventoría.

7. RESPONSABLE DEL PROYECTO - EJECUTOR

a) RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ISC Y/O RECIBO DE MATERIALES Y/O MOBILIARIO

Teniendo en cuenta el presente formato, la entidad responsable de su ejecución se compromete a:

- Dar buen uso al aporte realizado por LA UNIDAD al proyecto, de acuerdo con el objeto, diseños, cronograma y alcance técnico definido para la intervención.
- Ejecutar el proyecto en cumplimiento de los requisitos y normatividad vigente aplicable.
- Informar oportunamente a LA UNIDAD para la aprobación respectiva, sobre cualquier situación o imprevisto que origine ajustes o modificaciones al objeto del proyecto.
- Asumir los costos adicionales que puedan presentarse en el proyecto por concepto de deficiencias en diseño, planeación, así como imprevistos.
- Una vez se realice la entrega de materiales y/o mobiliario por parte de la Unidad de Víctimas, es responsabilidad de la entidad territorial la custodia de los mismos, por tanto serán los responsables en
- Entregar la obra en buenas condiciones para su uso.
- Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura y definir el o los responsables de su administración.
- Dar el crédito respectivo a LA UNIDAD sobre su participación y aporte en el proyecto.
- Cubrir los gastos que se generen a partir de las anteriores responsabilidades.

| ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / OTRO | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | No. CEDULA DE CIUDADANIA |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | |

Para constancia se firma a los ___ días del mes de _____ de 2015

Por el MUNICIPIO Y/O DISTRITO de

Cocorná

Representante Encargado de MUNICIPIO

Nombre Representante Legal:

Johan Alberto Ramírez Mejía

Nombre Representante:

Darwin Fernando Duque Quintero

Firma:

Firma:

Teléfono:

3183498851

Teléfono (obligatorio):

3166186985

correo electrónico:

alcaldia@cocorna-antioquia.gov.co

correo electrónico (obligatorio)

planeacion@cocorna-antioquia.gov.co

Responsable gestión de LA UNIDAD

OTRO

Nombre Representante:

Maria Clara Espinosa Botero

Nombre:

Juan Carlos Arango Diez

Firma:

Firma:

Teléfono:

3016005261

Teléfono:

3104323082

correo electrónico:

maria.espinosa@unidadvictimas.gov.co

correo electrónico

juanc.arango@unidadvictimas.gov.co

8. CONSOLIDADO APORTE DE LA UNIDAD

| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ESTIMADO | |
|--------------|--------|----------|------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | 504 | BULTO | 57,56 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos | \$ 23.852,81 | \$ 1.372.991,60 |
| 2 | 55 | M2 | 14 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 6 mm | \$ 14.435,60 | \$ 199.211,28 |
| 3 | 75 | M3 | 7 | Arena de río | \$ 185.552,86 | \$ 1.239.493,10 |
| 4 | 81 | M3 | 1,38 | Gravilla | \$ 203.839,32 | \$ 281.298,26 |
| 5 | 811 | KG | 42 | Cemento blanco | \$ 1.946,01 | \$ 81.732,42 |
| 6 | 17 | KG | 8,4 | Mortero listo seco para pisos | \$ 1.435,64 | \$ 12.059,38 |
| 7 | 791 | M2 | 42 | Baldosa cemento lisa 20 cm x 20 cm x 2 mm | \$ 32.856,72 | \$ 1.379.982,24 |
| 8 | 644 | LB | 1 | Puntilla con cabeza de 1" caja x 500 gr | \$ 4.021,57 | \$ 4.021,57 |
| 9 | 815 | M2 | 6 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 20 x 20 cm | \$ 39.992,75 | \$ 239.956,50 |
| 10 | 162 | UNIDAD | 8 | Cerradura de sobreponer con caja, cantonera, pestillos en acero, para puertas izquierdas o derechas. | \$ 129.572,96 | \$ 1.036.583,68 |
| 11 | 140 | M | 20 | Marco de puerta en madera ancho 12 cm | \$ 109.589,10 | \$ 2.191.782,00 |
| 12 | 143 | M2 | 8 | Puerta entamborada en madera incluye marco y pintura | \$ 275.052,99 | \$ 2.200.423,92 |
| 13 | 835 | KG | 57,50 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) | \$ 19.431,18 | \$ 1.117.292,85 |
| 14 | 602 | UNIDAD | 44,36 | Lija seca grano 150 | \$ 1.848,08 | \$ 81.980,83 |
| 15 | 744 | KG | 22,32 | Waípe o estopa | \$ 10.380,80 | \$ 231.699,46 |
| 16 | 686 | GARRAFA | 20 | Thinner | \$ 20.813,04 | \$ 421.984,39 |
| 17 | 874 | CUÑETE | 47 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | \$ 231.899,35 | \$ 10.899.269,45 |
| 18 | 18 | GAL | 85 | Pintura a base de aceite | \$ 60.745,74 | \$ 5.156.098,13 |
| 19 | 207 | UNIDAD | 12 | Teja plástica No. 6. Dimensiones 92 x 183 cm | \$ 35.945,81 | \$ 431.349,72 |
| 20 | 175 | UNIDAD | 48 | Gancho para teja de fibrocemento | \$ 579,48 | \$ 27.815,06 |
| 21 | 170 | M | 120 | CANAleta GALVANIZADA CALIBRE 24 | \$ 33.105,21 | \$ 3.972.625,20 |
| 22 | 1199 | UNIDAD | 8 | Tubo sanitario PVC. Diámetro 3" x 6m | \$ 85.810,52 | \$ 686.484,16 |
| 23 | 172 | UNIDAD | 12 | Codo Bajante 45° | \$ 8.256,18 | \$ 99.074,16 |
| 24 | 173 | UNIDAD | 12 | Codo Bajante 90° | \$ 7.365,22 | \$ 88.382,64 |
| 25 | 25 | JUEGO | 6 | JUEGO DE HERRAJES PARA SANITARIO | \$ 45.031,05 | \$ 270.186,27 |
| 26 | 829 | | 2 | Combo sanitario, incluye: taza, tanque, asiento, lavamanos, incrustaciones, grifería (institucional, Referencia acuacer, acuaplus o equivalente) | \$ 275.525,79 | \$ 551.051,58 |
| 27 | 315 | UNIDAD | 5 | Interruptor sencillo | \$ 6.650,07 | \$ 33.250,35 |
| 28 | 242 | M | 54 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color | \$ 2.225,10 | \$ 120.155,40 |
| 29 | 245 | UNIDAD | 12 | Bombillo ahorrador espiral 15 w | \$ 14.520,77 | \$ 174.249,24 |
| 30 | 1283 | UNIDAD | 12 | Plafon o roseta de losa | \$ 2.847,06 | \$ 34.164,72 |
| 31 | 671 | UNIDAD | 24 | Rodillo de felpa 9 pulgadas | \$ 6.038,61 | \$ 144.926,64 |
| 32 | 487 | UNIDAD | 39 | Brocha barniz 1" | \$ 3.325,53 | \$ 129.363,12 |
| 33 | 489 | UNIDAD | 28 | Brocha barniz 2" | \$ 5.089,34 | \$ 142.511,52 |
| 34 | 490 | UNIDAD | 13 | Brocha barniz 3" | \$ 8.997,77 | \$ 117.510,88 |
| 35 | 234 | JUEGO | 6 | Herraje completo para sanitario | \$ 45.031,05 | \$ 270.186,27 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 35.399.770,51 |

Por el MUNICIPIO Y/O DIS: Cocorná

Nombre Representante Leg: Johan Alberto Ramírez Mejía Darwin Fernando Duque Quintero

Firma: _____

Teléfono: 3183498851 3166186985

correo electrónico: alcaldia@cocorna-antioquia.gov.co planeacion@cocorna-antioquia.gov.co

Responsable gestión de LA UNIDAD

Nombre Representante: María Clara Espinosa Botero Juan Carlos Arango Díez

Firma: _____

Teléfono: 3016005261 3104323082

correo electrónico: maria.espinosa@unidadvictimas.gov.co juanc.arango@unidadvictimas.gov.co



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC

PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

| | |
|----------------------|---------|
| Código: | 0.03.15 |
| Versión: | 01 |
| Fecha de Aprobación: | ##### |
| Pág: | 4 de 5 |

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION

CÓDIGO DEL PROYECTO:

DEPTO: Antioquia MUNICIPIO: Cocorná FECHA DE ELABORACION: dd 29 mm 10 aa 2018
 PROYECTO: Adecuación y mantenimiento del HOGAR JUVENIL de cocorná ULTIMA FECHA DE MODIFICACION: dd 29 mm 10 aa 2018
 ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Alcaldía de Cocorná

a) Fecha de Iniciación del Proyecto: dd mm 10 aa 18

b) Fecha de Terminación del Proyecto: dd mm 12 aa 18

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR ESTIMADO | INDICADOR | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|------|-----------------|------------|-----------|---------|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--|
| | | | | | | Mes 1 | | | | Mes 2 | | | | Mes 3 | | | | Mes 4 | | | | Mes 5 | | | | Mes 6 | | | | Mes 7 | | | | Mes 8 | | | | Mes 9 | | | | Mes 10 | | | | |
| | | | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| 1 | Formulación y elaboración del proyecto | | | \$67'843.019,39 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Observaciones y ajustes al mismo | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presentación o entrega definitiva del proyecto | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Comunicado por parte de víctimas aprobación y ejecución del proyecto | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Envío de materiales operador víctimas | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Recibo de materiales | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inicio ejecución de obras | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Acta de recibo final de obra | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Informe ejecución de las obras para la Unidad de víctimas | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | %AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teniendo en cuenta el presente formato, la entidad responsable de su ejecución se compromete a:

- a) Ejecutar el proyecto en los tiempos acordados en el presente formato, una vez recibido el aporte de La **Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas**.
b) Reportar mensualmente a **LA UARIV** el avance del proyecto.
c) Informar oportunamente a **LA UARIV** sobre cualquier situación o imprevisto que origine ajustes en el cronograma del proyecto.

Representante Encargado de MUNICIPIO

Nombre Representante Legal: Darwin Fernando Duque Quintero
Firma: _____
Teléfono (obligatorio): 3166186985
correo electrónico (obligatorio) planeacion@cocorna-antioquia.gov.co

Responsable gestión de LA UNIDAD

Nombre Representante: Maria Clara Espinosa Botero
Firma: _____
Teléfono: 3016005261
correo electrónico: maria.espinosa@unidadvictimas.gov.co

Representante Encargado de EJECUCION

Nombre Representante: Darwin Fernando Duque Quintero
Firma: _____
Teléfono (obligatorio): 3166186985
correo electrónico (obligatorio) planeacion@cocorna-antioquia.gov.co

OTRO

Nombre: Juan Carlos Arango Diez
Firma: _____
Teléfono: 3104323082
correo electrónico juanc.arango@unidadvictimas.gov.co

| | | | |
|---|---|----------------------|--------------|
|  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | FORMATO DE ESTRUCTURA TÉCNICA - PISC | Código: | 310.03.15-19 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | Versión: | 01 |
| | PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | Fecha de Aprobación: | 6/10/2015 |
| | | Pág: | 5 de 5 |

REGISTRO FOTOGRAFICO

CÓDIGO DEL PROYECTO

Estado actual del predio () y/o infraestructura física a intervenir (), se presenta el siguiente registro fotográfico:
 Como resultado parcial () y/o final () la Alcaldía Municipal, se presenta el siguiente registro fotográfico:

| DESCRIPCION | FOTOGRAFIA | DESCRIPCION | FOTOGRAFIA |
|--|---|---|---|
| 1.1 Demolición de piso en baldosa |  | 1.2 Demolición de baldosin en baño |  |
| 1.3 Retiro de herrajes existentes en tanques de sanitario | TOMAR FOTO HERRAJE DE TANQUE | 1.4 Desmonte de sanitario |  |
| 2.1 Suministro y colocación de concreto 3000psi para cuneta de en U |  | 3.1 Suministro y colocación de piso en cemento E=0,05m |  |
| 3.2 Suministro y colocación de piso en baldosa monocolor |  | 4.1 Suministro y colocación de ceramica de 0.20 x 0.20 |  |
| 5.1 Retiro de marcos en madera |  | 5.2 Desmonte de puertas de madera |  |
| 5.3 Reparación de puertas en madera |  | 5.4 Suministro y colocación de marcos de madera muro 0.10 |  |
| 5.5 Suministro y colocación de puertas de madera incluye marco (triplex) chapa de seguridad yale |  | 5.6 Suministro y colocación de marcos de madera muro 0.10 | |

| | | | | | |
|-----|--|---|------|---|---|
| 6.1 | Suministro y colocacion de estuco |  | 6.2 | Suministro y colocación de pintura a base de agua (Dos manos) |  |
| 6.3 | Suministro y colocación de pintura a base de aceite en puertas (Dos manos) |  | 6.4 | Suministro y colocación de pintura a base de aceite en Zocalos (Dos manos) |  |
| 6.5 | Suministro y colocacion de pintura en bajantes |  | 6.6 | Suministro y colocación de pintura a base de aceite en canoas de zinc(Dos manos) | FALTA FOT |
| 6.7 | Suministro y colocación de pintura a base de agua en techos y cielos |  | 6.8 | Suministro y colocacion de pintura a base de aceite en cerchas metalicas(Dos manos) |  |
| 6.9 | Suministro y colocacion de pintura en ventanas de vidrio(Dos manos) |  | 6.10 | Suministro y colocacion de pintura a base de aceite en pasamanos y postes (dos manos) | F.F |
| 7.1 | Suministro y colocación de tejas de eternit numero 6 |  | 7.2 | Suministro y colocación de canoas en lamina de zinc calibre 20 |  |
| 7.3 | Suministro y colocación de bajantes de 3" Pvc |  | 8.1 | Suministro y colocación de juego de herraje para sanitarios | TOMAR FOTO TANQUE |
| 8.2 | Suministro y colocación de inodoros |  | 9.1 | Suministro y colocación de switch sencillo de caja |  |
| 9.2 | Suministro y colocación de luminarias | TOMAR FOTO PLAFON SOLO | | | |

Fecha de elaboración: 30/10/2018
Representante Encargado de MUNICIPIO
Nombre Representante Legal:

Darwin Fernando Duque Quintero
Johan Alberto Ramírez Mejía
3183498851
enlacevictimas@cocorna-antioquia.gov.co

Representante Encargado de EJECUCION
Nombre Representante:
Firma:
Teléfono (obligatorio):
correo electrónico (obligatorio)

Darwin Fernando Duque Quintero
3166186985
dfduque@gmail.com

Firma: _____
Teléfono (obligatorio): _____

Presupuesto

Adecuación y mantenimiento del HOGAR JUVENIL CAMPESINO del Municipio de Cocorr

| item | Descripción de actividades | Unidad | Vr. Unit | Cantidad |
|------------|--|--------|--------------|----------|
| 1 | DEMOLICIONES ,DESMONTES Y RETIROS | | | |
| 1.1 | Demolición de piso en baldosa | m2 | 6.064 | 66 |
| 1.2 | Demolición de baldosin en baño | m2 | 15.159 | 4 |
| 1.3 | Retiro de herrajes existentes en tanques de sanitario | Unidad | 12.128 | 6 |
| 1.4 | Desmonte de sanitario | Unidad | 12.128 | 6 |
| 2 | CONCRETOS Y MORTEROS | | | |
| 2.1 | Suministro y colocación de concreto 3000psi para cuneta de en U | ml | 66.036,96 | 23,00 |
| 3 | PISOS | | | |
| 3.1 | Suministro y colocación de piso en cemento E=0,05m | m2 | 51.328,90 | 106,00 |
| 3.2 | Suministro y colocación de piso en baldosa monocolor | m2 | 62.251,56 | 42,00 |
| 4 | ENCHAPES | | | |
| 4.1 | Suministro y colocación de ceramica de 0.20 x 0.20 | m2 | 70.090,28 | 6,00 |
| 5 | CARPINTERIA DE MADERA | | | |
| 5.1 | Retiro de marcos en madera | Un | 12.127,50 | 4,00 |
| 5.2 | Desmonte de puertas de madera | Un | 20.212,50 | 4,00 |
| 5.3 | Reparación de puertas en madera | Un | 171.757,27 | 4,00 |
| 5.4 | Suministro y colocación de marcos de madera muro 0.10 | Un | 126.618,56 | 4,00 |
| 5.5 | Suministro y colocación de puertas de madera incluye marco (triplex) chapa de seguridad yale | Un | 748.312,89 | 4,00 |
| 5.6 | Suministro y colocación de marcos de madera muro 0.10 | Un | 156.841,61 | 4,00 |
| 6 | ESTUCO Y PINTURA | | TOTAL | |
| 6.1 | Suministro y colocacion de estuco | m2 | 8.020 | 230 |
| 6.2 | Suministro y colocación de pintura a base de agua (Dos manos) | m2 | 3.726 | 3.260 |
| 6.3 | Suministro y colocación de pintura a base de aceite en puertas (Dos manos) | Un | 57.638 | 26 |
| 6.4 | Suministro y colocación de pintura a base de aceite en Zocalos (Dos manos) | m2 | 8.083 | 520 |
| 6.5 | Suministro y colocacion de pintura en bajantes | ml | 6.350 | 120 |
| 6.6 | Suministro y colocacion de pintura a base de aceite en canoas de zinc(Dos manos) | ml | 8.277 | 160 |
| 6.7 | Suministro y colocación de pintura a base de agua en techos y cielos | m2 | 7.317 | 360 |
| 6.8 | Suministro y colocacion de pintura a base de aceite en cerchas metalicas(Dos manos) | ml | 5.232 | 112 |
| 6.9 | Suministro y colocacion de pintura en ventanas de vidrio(Dos manos) | Un | 47.804 | 36 |
| 6.10 | Suministro y colocacion de pintura a base de aceite en pasamanos y postes (dos manos) | ml | 8.191 | 56 |
| 7 | TECHOS | | TOTAL | |
| 7.1 | Suministro y colocación de tejas de eternit numero 6 | m2 | 46.667,55 | 12 |
| 7.2 | Suministro y colocación de canoas en lamina de zinc calibre 24 | m | 41.690,47 | 120 |
| 7.3 | Suministro y colocación de bajantes de 3" Pvc | m | 23.275,46 | 46 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|------------|----|
| 8 | APARATOS SANITARIOS | TOTAL | | |
| 8.1 | Suministro y colocaciòn de juego de herraje para sanitarios | Un | 58.832,60 | 6 |
| 8.2 | Suministro y colocaciòn de inodoros | Un | 322.618,63 | 2 |
| 9 | ELECTRICOS | TOTAL | | |
| 9.1 | Suministro y colocaciòn de switche sencillo de caja | Un | 22.323,45 | 5 |
| 9.2 | Suministro y colocaciòn de luminarias | Un | 21.268,10 | 12 |
| | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | |
| MENOS | MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR O EQUIPO | | | |
| | VALOR DESPERDICIO | | | |
| | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | | |

Presupuesto realizado por
LUIS ANGEL CARVAJAL ZULUAGA
Tecnico en construcciones civiles SENA

No imprimir basta con el presupuesto de la prosa

1á

| |
|---------------------|
| Vr. Total |
| 606.375,00 |
| 400.207,50 |
| 60.637,50 |
| 72.765,00 |
| 72.765,00 |
| 1.518.849,99 |
| 1.518.849,99 |
| 8.055.428,68 |
| 5.440.863,10 |
| 2.614.565,57 |
| 420.541,67 |
| 420.541,67 |
| 4.943.481,28 |
| 48.510,00 |
| 80.850,00 |
| 687.029,08 |
| 506.474,22 |
| 2.993.251,55 |
| 627.366,43 |
| 27.180.220,82 |
| 1.844.713,35 |
| 12.147.429,00 |
| 1.498.591,05 |
| 4.203.372,31 |
| 761.988,46 |
| 1.324.366,37 |
| 2.634.098,04 |
| 586.030,55 |
| 1.720.926,40 |
| 458.705,30 |
| 6.633.538,21 |
| 560.010,66 |
| 5.002.856,46 |
| 1.070.671,09 |

| |
|----------------------|
| 998.232,85 |
| 352.995,59 |
| 645.237,26 |
| 366.834,42 |
| 111.617,26 |
| 255.217,16 |
| 50.723.502,91 |
| 12.655.600,83 |
| 708.110,60 |
| 1.744.592,49 |
| 35.615.198,99 |



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DIRECCIÓN DE REPARACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN O DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA ISC A TRAVÉS DEL OPERADOR SPAE
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|--|
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR JUVENIL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE COCOMÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| TIPO DE INVERSIÓN: | Suministro de materiales de construcción para infraestructura social comunitaria |
| SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA | Jóvenes y adolescentes campesinos del Municipio de Cocomá, Departamento de Antioquia |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL: | Antioquia |
| DEPARTAMENTO: | Antioquia |
| MUNICIPIO: | Cocomá |
| VEREDA: | Cocomá |
| FECHA DE ENTREGA: | |
| FECHA DE REVISIÓN: | |
| REVISÓ: | Christiam Soto Núñez |
| ESTADO DEL PROYECTO: | En revisión |

El equipo técnico de la Subdirección de Reparación Colectiva a nivel nacional, procedió a realizar la revisión de la información predial, administrativa y técnica del proyecto entregado por el municipio a la dirección territorial de ANTIOQUIA, del proyecto cuyo objeto es "LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR JUVENIL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE COCOMÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

| CONDICIONES ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO. (Certificaciones entregadas). | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------------------|---|--|
| SOPORTE | APLICA (SÍ / N.A.) | CUMPLE (SÍ / NO) | ENTIDAD (ES) RESPONSABLE | FECHA DE EXPEDICIÓN | OBSERVACIONES | |
| 1 | Formato de estructura técnica - FET completamente diligenciado y suscrito por las partes; sin modificación en la estructura del mismo. | SÍ | NO | Alcaldía de Cocomá | Actualizar según revisión y conciliación de cantidades y valor del proyecto | |
| 2 | Carta de intención o presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal. (ver Anexo - Carta de presentación proyecto ISC) | SÍ | NO | Alcaldía de Cocomá | Actualizar según revisión y conciliación de cantidades y valor del proyecto | |
| 3 | Certificado de tradición y libertad, copia de la escritura del lote y certificado de usos del suelo donde se desarrollará el proyecto, el cual debe estar a nombre del municipio. | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 4 | Título colectivo para SRC Étnicos | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 5 | Certificación donde se determine que el lote no está ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales, expedido por la Oficina de Planeación Municipal. | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 6 | Certificado de disponibilidad de servicios públicos, emitido por el municipio o la empresa de servicios respectiva. | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 7 | Certificación de viabilidad del proyecto, emitida por el municipio. | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 8 | Compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio. | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 9 | Acta de socialización firmada por personas y/o líderes de la comunidad o de las juntas de acción comunal que certifiquen estar de acuerdo con la ejecución del proyecto en las condiciones acordadas y en donde manifiestan su interés de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y mantenimiento periódico de los proyectos según, sea el caso. | SI | NO | Alcaldía de Cocomá | No se envió documento | |
| 10 | Censo de población a beneficiar, de acuerdo con el Formato único de Censo, deberá incluir la totalidad de la información solicitada. | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 11 | Certificación de la capacidad del número de personas en función al área (m2) efectiva de uso, la cual debe ser acorde con las cantidades de mobiliario solicitado. | N.A. | | Alcaldía de Cocomá | | |
| 12 | Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), como soporte de la contrapartida por parte del municipio para la contratación de la totalidad de mano de obra requerida para la ejecución del proyecto. | SI | SI | Alcaldía de Cocomá | | |
| 13 | Certificado de ejecución y supervisión de obra para los SRC Étnicos | | | | | |
| 14 | Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), para los casos en los que se requiera realizar la entrega de materiales de construcción y sea necesario contar con transportes adicionales (Inter veredales y/o fluviales); soporte adicional por parte del municipio. Certificación de transportes adicionales para los SRC Étnicos. | | | Alcaldía de Cocomá | Verificar si se requiere o no transporte adicional | |
| 15 | Certificación de que los estudios y diseños que se remiten con el proyecto cumplen con las normas vigentes de construcción (NSR-10 sismo resistencia, agua potable y saneamiento básico, código colombiano de fontanería, instalaciones eléctricas RETIE) y las demás que se consideren. Suscrita por el responsable de los diseños (Ente territorial o diseñadores contratados) | SI | NO | Alcaldía de Cocomá | | |
| 16 | Planos de localización geográfica del proyecto, diseño arquitectónico y detalles constructivos debidamente firmados, diseños y estudios técnicos que apliquen (estructural, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, ambientales) debidamente firmados, especificaciones técnicas de la construcción, LISTA COMPLETA DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO CONFORME A LA LISTA SPAE 2019, MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES DE OBRA SOLICITADOS, presupuesto detallado debidamente firmado, Análisis de Precios Unitarios - A.P.U. de todos los ítems del proyecto. Los estudios y diseños solicitados deben ser acordes con el alcance técnico del proyecto. | SI | NO | Alcaldía de Cocomá | Falta plano de Levantamiento Arquitectonico N° 2 de 3 | |
| 17 | Para las intervenciones correspondientes a reparaciones o mejoras locativas (obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas). Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas), como mínimo se debe contar con: LISTA COMPLETA DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO CONFORME A LA LISTA SPAE 2019 y las MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES DE OBRA SOLICITADOS. | N.A. | | Alcaldía de Cocomá | | |
| 18 | CONTRATO DE MANO DE OBRA (Posterior a la aprobación del proyecto por parte de la UARIV) | SI | NO | Alcaldía de Cocomá | PENDIENTE a la aprobación del proyecto. | |

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS.

NO SE ESPECIFICA EL AREA TOTAL QUE REQUIERE DE APLICACIÓN DE ESTUCCO Y PINTURA PARA SU VERIFICACIÓN, SE SEÑALAN EN SU TOTALIDAD LOS BLOQUES 1, 2 Y 3, PERO AL CALCULAR EL AREA TOTAL DE PARED EN ESTOS TRES BLOQUES, ES MUCHO MENOR EL AREA A INTERVENIR CUANTIFICADA EN LOS RESPECTIVOS ITEM DE APU'S.

MONTAJE ELECTRICO (ITEM 9.2 Y 9.1): EL NUMERO DE SWITCHES SOLICITADOS NO CONCUERDA CON LO MARCADO SOBRE PLANOS (4 UNIDADES), FALTA MARCAR PARA PISO 1 - BLOQUE 3, SE NECESITARIAN MAS. EL NUMERO DE LUMINARIAS PEDIDAS TAMPOCO COINCIDE CON LAS MARCADAS EN PLANOS (6), REVISAR

NO HAY UN PLANO DE DETALLE DE LA CAÑUELA EN CONCRETO, PARA ESTIMACION DE CANTIDADES SE SUPUSO QUE TENDRA UN ANCHO DE 0,2 M Y UN ESPESOR EN SU SECCION TRANSVERSAL DE 0,10 M

Aprobado

No Aprobado

En Revisión

REVISÓ

Nombres y Apellidos:

Christiam Soto Núñez

Firma:

|  El futuro es de todos | | ORDEN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O MOBILIARIO | | | | | | | | <small>Código: 310.03.15-21 Versión: 03 Fecha: 18/07/2019 Página: 1 de 1</small> | |
|--|--------|--|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES | | | | | | | | | | | |
| PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | |
| FECHA SOLICITUD: | | | | | | | | | | ETAPA DE ATENCIÓN: | |
| PROVEEDOR: | | SOLUCIONES INTEGRALES UNIOR SAS | | | | | | | | ORDEN No.: | |
| DIRECCIÓN: | | CALLE 17 No: 22 - 30 | | | | | | | | NIT: | |
| CONTACTO PROVEEDOR: | | 3600561 | | | | | | | | CORREO: | |
| | | | | | | | | | | CELULAR: | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | | | | | | | | | | |
| LUGAR(ES) DE ENTREGA: | | | | | | | | | | FECHA DE ENTREGA: | |
| DEPARTAMENTO: | | MUNICIPIO: | | VEREDA / CORREGIMIENTO: | | POBLACION | | | | | |
| CONTACTO: | | | | | | | | | | | |
| CONTACTO: | | | | | | | | | | | |
| No. | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | VALOR TOTAL CON IVA | OBSERVACIONES | |
| 1 | 504 | Cemento gris buito x 50 kilogramos | bulto | 57 | \$ 20.044,38 | \$ 3.808,43 | \$ 23.852,81 | \$ 1.142.529,66 | \$ 1.359.610,17 | | |
| 2 | 55 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 6 mm | Metro cuadrado | 92 | \$ 12.130,76 | \$ 2.304,84 | \$ 14.435,60 | \$ 1.116.029,92 | \$ 1.328.075,20 | | |
| 3 | 75 | Acero al fierro | Metro cubico | 5,5 | \$ 155.926,77 | \$ 29.626,09 | \$ 185.552,86 | \$ 857.597,24 | \$ 1.020.540,73 | | |
| 4 | 81 | Gravilla | Metro cubico | 1,5 | \$ 171.293,55 | \$ 32.545,77 | \$ 203.839,32 | \$ 256.940,33 | \$ 305.758,98 | | |
| 5 | 811 | Cemento blanco | kilogramo | 77 | \$ 1.635,30 | \$ 310,71 | \$ 1.946,01 | \$ 125.918,10 | \$ 149.842,77 | | |
| 6 | 17 | Mortero listo seco para pisos | kilogramo | 17 | \$ 1.206,42 | \$ 229,22 | \$ 1.435,64 | \$ 20.509,14 | \$ 24.405,88 | | |
| 7 | 791 | Baldosa cemento lisa 20 cm x 20 cm x 2 mm | Metro cuadrado | 77 | \$ 27.610,69 | \$ 5.246,03 | \$ 32.856,72 | \$ 2.126.023,13 | \$ 2.529.967,44 | | |
| 8 | 644 | Puntilla con cabeza de 1" caja x 500 gr. | unidad | 1 | \$ 3.379,47 | \$ 642,10 | \$ 4.021,57 | \$ 3.379,47 | \$ 4.021,57 | | |
| 9 | 815 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 20 x 20 cm. | Metro cuadrado | 13 | \$ 34.692,51 | \$ 6.591,58 | \$ 41.284,09 | \$ 451.002,63 | \$ 536.693,17 | | |
| 10 | 162 | Cerradura de sobrepener con caja, cantonera, pestillos en acero, para puertas izquierdas o derechas. | Unidad | 8 | \$ 108.884,84 | \$ 20.688,12 | \$ 129.572,96 | \$ 871.078,72 | \$ 1.036.583,68 | | |
| 11 | 140 | Marco de puerta en madera ancho 12 cm. | Metro Lineal | 20 | \$ 92.091,68 | \$ 17.497,42 | \$ 109.589,10 | \$ 1.841.833,60 | \$ 2.191.782,00 | | |
| 12 | 143 | Puerta entabornada en madera incluye marco y pintura | Metro cuadrado | 8 | \$ 305.612,84 | \$ 58.066,44 | \$ 363.679,28 | \$ 2.444.902,72 | \$ 2.909.434,24 | | |
| 13 | 835 | Estuco plastico listo para interiores (oolvo) | kilogramo | 575 | \$ 1.565,37 | \$ 297,42 | \$ 1.862,79 | \$ 900.087,75 | \$ 1.071.104,25 | | |
| 14 | 602 | Lija seca grano 150 | Unidad | 70 | \$ 1.553,01 | \$ 295,07 | \$ 1.848,08 | \$ 108.710,70 | \$ 129.365,60 | | |
| 15 | 744 | Walne o caoaca | kilogramo | 30 | \$ 8.723,36 | \$ 1.657,44 | \$ 10.380,80 | \$ 261.700,80 | \$ 311.424,00 | | |
| 16 | 686 | Thinner | Unidad | 30 | \$ 17.489,95 | \$ 3.323,09 | \$ 20.813,04 | \$ 524.698,50 | \$ 624.391,20 | | |
| 17 | 874 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | cullete | 47 | \$ 194.873,40 | \$ 37.025,95 | \$ 231.899,35 | \$ 9.159.049,80 | \$ 10.899.269,45 | | |
| 18 | 872 | Pintura a base de agua para uso exterior Koraza cualquier color | cullete | 18 | \$ 253.049,11 | \$ 48.079,33 | \$ 301.128,44 | \$ 4.554.883,98 | \$ 5.420.311,92 | | |
| 19 | 870 | Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color | Galón | 50 | \$ 75.978,98 | \$ 14.436,01 | \$ 90.414,99 | \$ 3.798.949,00 | \$ 4.520.749,50 | | |
| 20 | 830 | Esmalte lista madera y metal | Galón | 41 | \$ 42.983,91 | \$ 8.166,94 | \$ 51.150,85 | \$ 1.762.340,31 | \$ 2.097.184,85 | | |
| 21 | 207 | Teja plástica No. 6. Dimensiones 92 x 183 cm. | Unidad | 12 | \$ 30.206,56 | \$ 5.739,25 | \$ 35.945,81 | \$ 362.478,72 | \$ 431.349,72 | | |
| 22 | 175 | Gancho para teja de fibrocemento | Unidad | 48 | \$ 552,87 | \$ 105,05 | \$ 657,92 | \$ 26.537,76 | \$ 31.580,16 | | |
| 23 | 170 | Canaleta galvanizada calibre 24 | Metro Lineal | 81 | \$ 27.819,50 | \$ 5.285,71 | \$ 33.105,21 | \$ 2.253.379,50 | \$ 2.681.522,01 | | |
| 24 | 1199 | Tubo sanitario PVC. Diámetro 3" x 6m | Unidad | 13 | \$ 72.109,68 | \$ 13.700,84 | \$ 85.810,52 | \$ 937.425,84 | \$ 1.115.536,76 | | |
| 25 | 172 | Codo Bajante 45° | Unidad | 12 | \$ 6.189,26 | \$ 1.175,96 | \$ 7.365,22 | \$ 74.271,12 | \$ 88.382,64 | | |
| 26 | 173 | Codo Bajante 90° | Unidad | 12 | \$ 6.937,97 | \$ 1.318,21 | \$ 8.256,18 | \$ 83.255,64 | \$ 99.074,16 | | |
| 27 | 829 | Combo sanitario, incluye: taza, tanque, asiento, lavamanos, incrustaciones, grifería (institucional, Referencia acucacer, acuplus o equivalente) | Unidad | 2 | \$ 231.534,28 | \$ 43.991,51 | \$ 275.525,79 | \$ 463.068,56 | \$ 551.051,58 | | |
| 28 | 315 | Interruptor sencillo | Unidad | 5 | \$ 5.588,29 | \$ 1.061,78 | \$ 6.650,07 | \$ 27.941,45 | \$ 33.250,35 | | |
| 29 | 242 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color | Metro Lineal | 54 | \$ 1.869,83 | \$ 355,27 | \$ 2.225,10 | \$ 100.970,82 | \$ 120.155,40 | | |
| 30 | 245 | Bombillo ahorrador espiral 15 w | Unidad | 12 | \$ 8.743,28 | \$ 1.661,22 | \$ 10.404,50 | \$ 104.919,36 | \$ 124.854,00 | | |
| 31 | 1283 | Plafon o roseta de losa | Unidad | 12 | \$ 2.392,49 | \$ 454,57 | \$ 2.847,06 | \$ 28.709,88 | \$ 34.164,72 | | |
| 32 | 671 | Rodillo de felpa 9 pulgadas | Unidad | 24 | \$ 5.074,46 | \$ 964,15 | \$ 6.038,61 | \$ 121.787,04 | \$ 144.926,64 | | |
| 33 | 487 | Brocha barniz 1" | Unidad | 39 | \$ 2.794,56 | \$ 530,97 | \$ 3.325,53 | \$ 108.987,84 | \$ 129.695,67 | | |
| 34 | 489 | Brocha barniz 2" | Unidad | 28 | \$ 4.276,76 | \$ 812,58 | \$ 5.089,34 | \$ 119.749,28 | \$ 142.501,52 | | |
| 35 | 490 | Brocha barniz 3" | Unidad | 13 | \$ 7.561,15 | \$ 1.438,62 | \$ 8.999,77 | \$ 98.294,95 | \$ 116.971,01 | | |
| 36 | 484 | Brida sanitaria flexible | Unidad | 6 | \$ 31.806,14 | \$ 6.043,17 | \$ 37.849,31 | \$ 190.836,84 | \$ 227.095,86 | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 1.976.183,38 | \$ 378.478,86 | \$ 2.354.662,24 | \$ 37.430.780,01 | \$ 44.542.628,80 | | |
| JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: | | | | | | | | | | | |
| Nombre de quien elabora la solicitud: _____ Cargo: _____ | | | | | | | | | | | |
| Vo. Bo. MARIA CRISTINA CARREÑO SANTOYO SUBDIRECTORA TECNICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | |
| NOTA: <ol style="list-style-type: none"> EL CONTENENTE VENDEDOR DEBERÁ INFORMAR A LA UARY CUALQUIER ANOMALIA O DIFICULTAD PARA LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS MATERIALES Y/O MOBILIARIO LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LOS USUARIOS ESTABLECIDOS EN LOS ORDENES DE SUMINISTRO TODA SOLICITUD DEBE REALIZARSE UTILIZANDO ESTE FORMATO. | | | | | | | | | | | |

ANEXO 14. Anexo 4 de segundo informe parcial de práctica

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Elaboró y revisó:

CHRISTIAM SOTO NÚÑEZ
Comité Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUIJANO HERNÁNDEZ
Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRIETO HILARIÓN
Comité Técnico Evaluador

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO 'ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS'

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal Propuesto.

Table with columns: CARGO, CANTIDAD, FORMACIÓN PROFESIONAL, DEDICACIÓN AL PROYECTO, EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA, EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Objeto, No. Proyectos, Requirimiento Particular), PROPONENTE, EXPERIENCIA ESPECÍFICA (NOMBRE DEL PROFESIONAL, PROFESIÓN, CERTIFICACIÓN, NÚMERO DE PROYECTOS, NÚMERO DE CONTRATOS), CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN (ITEM, SI/NO), CUMPLE FOLIOS, OBSERVACIONES, SUBSANO (SI/NO), CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN (SI/NO/PARCIAL), OBSERVACIONES SUBSANACIÓN, CUMPLE (SI/NO)

Elaboró y revisó:

CHRISTIAN BOTO NUNEZ
Comité Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUIMANO HERNANDEZ
Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO FRIETO HILARON
Comité Técnico Evaluador

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal propuesto.

| CARGO | CANTIDAD | FORMACIÓN PROFESIONAL | DEDICACIÓN AL PROYECTO | EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA (contada a partir de la expedición de la matrícula profesional / licencia) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | PROPONENTE | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | | | CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN | | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | SUBSEÑO (SÍ / NO) | CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN (SÍ / NO / PARCIAL) | OBSERVACIONES SUBSANACIÓN | CUMPLE (SÍ / NO) |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|--|-----------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------|--------|--------|---------------|-------------------|--|---------------------------|------------------|
| | | | | | Objeto | No. Proyectos por certificar | Requisitamiento Particular | | NOMBRE DEL PROFESIONAL | PROFESIÓN | CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS | NÚMERO DE CONTRATO CERTIFICADO | ITEM | SÍ / NO | | | | | | | |
| Residente de interventoría | 4 | Ingeniero eléctrico o electrónica | 100% | 5 años | Ingeniero eléctrico o electrónica, quien actúará como coordinador y será la persona responsable de supervisar la ejecución de las actividades en cada uno de los registros en donde se instalan los sistemas de energía solar fotovoltaico. Este profesional deberá tener una dedicación de tiempo completo | Debe acreditar su experiencia específica con dos (2) certificaciones en las que se indique que actuó como supervisor o residente de interventoría en trabajos en los que se hayan ejecutado actividades relacionadas con la instalación de sistemas eléctricos. | Especificar en las respectivas certificaciones, cargo de director o residente de interventoría en trabajos en los que se hayan ejecutado actividades relacionadas con la instalación de sistemas eléctricos. | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró y revisó:

CHRISTIAN BOTO NUNEZ
 ComM Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUIMANO HERNANDEZ
 ComM Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRIETO HILARON
 ComM Técnico Evaluador

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal propuesto.

| CARGO | CANTIDAD | FORMACIÓN PROFESIONAL | DEDICACIÓN AL PROYECTO | EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA (contada a partir de la expedición de la matrícula profesional / licencia) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | PROPONENTE | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | | | CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN | | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | SUBSEÑO (SÍ / NO) | CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN (SÍ / NO / PARCIAL) | OBSERVACIONES SUBSANACIÓN | CUMPLE (SÍ / NO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|---|--|---|---|------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|-----------------|--|-----------|
| | | | | | Objeto | No. Proyectos por certificar | Requerimiento Particular | | NOMBRE DEL PROFESIONAL | PROFESIÓN | CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS | NÚMERO DE CONTRATO CERTIFICADO | ITEM | SÍ / NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residente de interventoría | 4 | Ingeniero eléctrico o electrónica | 100% | 5 años | Ingeniero eléctrico o electrónica, quien actúará como coordinador y será la persona responsable de supervisar la ejecución de las actividades en cada una de las regiones en donde se realizan los sistemas de energía solar fotovoltaico. Este profesional deberá tener una dedicación de tiempo completo | Debe acreditar su experiencia específica con dos (2) certificaciones en las que se indique que actuó como supervisor de actividades en cada una de las regiones de interventoría en donde se realizan los sistemas de energía solar fotovoltaico. Este profesional deberá tener una dedicación de tiempo completo | Especificar en las respectivas certificaciones, cargo de director o residente de interventoría en los contratos en los que se hayan ejecutado actividades relacionadas con la instalación de sistemas eléctricos. | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | DIRECCIÓN Y TELÉFONO | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | FECHA DE INICIO DE LABORES | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | DIRECCIÓN Y TELÉFONO | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | FECHA DE INICIO DE LABORES | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | DIRECCIÓN Y TELÉFONO | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | FECHA DE INICIO DE LABORES | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | DIRECCIÓN Y TELÉFONO | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | FECHA DE INICIO DE LABORES | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | ESPECÍFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PROYECTOS | | NO CUMPLE |

Elaboró y revisó:

CHRISTIAN BOTO NUNEZ
Comité Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUIMANO HERNANDEZ
Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRIETO HILARON
Comité Técnico Evaluador

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal propuesto.

| CARGO | CANTIDAD | FORMACIÓN PROFESIONAL | DEDICACIÓN AL PROYECTO | EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA (contada a partir de la expedición de la matrícula profesional / licencia) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | PROPONENTE | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | | | CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN | | CUMPLE | FOLIO(S) | OBSERVACIONES | SUBSANÓ (SI / NO) | CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN (SI / NO / PARCIAL) | OBSERVACIONES SUBSANACIÓN | CUMPLE (SI / NO) | |
|--|----------|------------------------------------|------------------------|---|---|--|---|------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--------|----------|---------------|-------------------|--|---------------------------|------------------|--|
| | | | | | Objeto | No. Proyectos por certificar | Requerimiento Particular | | NOMBRE DEL PROFESIONAL | PROFESIÓN | CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS | NÚMERO DE CONTRATO CERTIFICADO | ÍTEM | SI / NO | | | | | | | | |
| Residente de Interventoría | 4 | Ingeniero eléctrico o electricista | 100% | 5 años | Ingeniero eléctrico o electricista, quien actuará como coordinador y será la persona responsable de supervisar la ejecución de las actividades en cada una de las regiones en donde se instalarán los sistemas de energía solar fotovoltaico. Este profesional deberá tener una dedicación de tiempo completo | Deberá acreditar su experiencia específica con dos (2) certificaciones en las que se indique que actuó como director o residente de interventoría en contratos en los que se hayan ejecutado actividades relacionadas con la instalación de sistemas eléctricos. | Especificar en las respectivas certificaciones, cargo de director o residente de interventoría en contratos en los que se hayan ejecutado actividades relacionadas con la instalación de sistemas eléctricos. | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN Y TELÉFONO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FECHA DE INICIO DE LABORES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ESPECIFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN Y TELÉFONO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO. | | | | | | | | |
| CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICA CARGO DE DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN Y TELÉFONO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal propuesto.

| CARGO | CANTIDAD | FORMACIÓN PROFESIONAL | DEDICACIÓN AL PROYECTO | EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA (contará a partir de la expedición de la matrícula profesional / técnica) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | PROFESIONISTA | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | | | CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN | | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | SUBSANO (SI/NO) | CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANCIÓN (SI/NO) PARCIAL | OBSERVACIONES SUBSANCIÓN | CUMPLE (SI/NO) | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|------------------------|--|---|--|--|------------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|---------------|-----------------|---|--------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Objeto | No. Proyectos por certificar | Requerimiento Particular | | NOMBRE DEL PROFESIONAL | PROFESIÓN | CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS | NÚMERO DE CONTRATO CERTIFICADO | ÍTEM | SI/NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnicos o Tecnólogos | 4 | Técnicos o Tecnólogos Eléctricos o Electricistas | 50% | 2 años | Técnicos o Tecnólogos Eléctricos o Electricistas con experiencia específica en manejo de redes eléctricas en proyectos de interventoría | Deberá acreditar su experiencia específica con dos (2) certificaciones de experiencia específica en manejo de redes eléctricas en proyectos de interventoría suscritas por el contratante en las que se indique que actuó como técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | Especificar participación como técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró y revisó:

CHRISTIAN SOTO NÁJES
 Comité Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUAJANO HERNÁNDEZ
 Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRETO HILARÓN
 Comité Técnico Evaluador

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal propuesto.

| CARGO | CANTIDAD | FORMACIÓN PROFESIONAL | DEDICACIÓN AL PROYECTO | EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA (contará a partir de la expedición de la matrícula profesional / técnica) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | PROFONTE | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | | | CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN | | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | SUBSANO (SI/NO) | CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANCIÓN (SI/NO) PARCIAL | OBSERVACIONES SUBSANCIÓN | CUMPLE (SI/NO) | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------|--|--|--|--------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|---------------|-----------------|---|--------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Objeto | No. Proyectos por certificar | Requerimiento Particular | | NOMBRE DEL PROFESIONAL | PROFESIÓN | CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS | NÚMERO DE CONTRATO CERTIFICADO | ITEM | SI/NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnicos o Tecnólogos | 4 | Técnicos o Tecnólogos Electricistas o Electricistas | 50% | 2 años | Deberá acreditar su experiencia específica con dos (2) certificaciones de experiencia específica en manejo de redes eléctricas en proyectos de interventoría suscritas por el contratante en las que se indique que actuó como técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | Especificar participación como técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró y revisó:

CHRISTIAN SOTO NÁJES
 Comité Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUAJANO HERNÁNDEZ
 Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRETO HILARÓN
 Comité Técnico Evaluador

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal propuesto.

| CARGO | CANTIDAD | FORMACIÓN PROFESIONAL | DEDICACIÓN AL PROYECTO | EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA (contada a partir de la expedición de la matrícula profesional / licencia) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | PROPONENTE | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | | CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN | | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | SUBSANO (SI / NO) | CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN (SI / NO / PARCIAL) | OBSERVACIONES SUBSANACIÓN | CUMPLE (SI / NO) | |
|---|----------|--|------------------------|---|---|---|--|------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------|--|---------------------------|------------------|---------|
| | | | | | Objeto | No. Proyectos por certificar | Requerimiento Particular | | NOMBRE DEL PROFESIONAL | PROFESIÓN | CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS | NÚMERO DE CONTRATO CERTIFICADO | ÍTEM | | | | | | | | SI / NO |
| Técnicos o Tecnólogos | 4 | Técnicos o Tecnólogos Eléctricos o Electricistas | 50% | 2 años | Técnicos o Tecnólogos Eléctricos o Electricistas con experiencia específica en manejo de redes eléctricas en proyectos de intervención. | Deberá acreditar su experiencia específica con énfasis (2) certificaciones de experiencia específica en manejo de redes eléctricas en proyectos de intervención por el contratante en las que se integre que el técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | Especificar participación como técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN Y TELÉFONO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN Y TELÉFONO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN Y TELÉFONO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN Y TELÉFONO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboro y reviso:

CHRISTIAN SOTO NÚÑEZ
Comité Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUIJANO HERNÁNDEZ
Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRIETO HILARÓN
Comité Técnico Evaluador

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

Evaluación de la Experiencia del Personal propuesto.

| CARGO | CANTIDAD | FORMACIÓN PROFESIONAL | DEDICACIÓN AL PROYECTO | EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA (contará a partir de la expedición de la matrícula profesional / técnica) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | PROFESIONISTA | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | | | | | CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN | | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | SUBSANO (SI/NO) | CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANCIÓN (SI/NO) PARCIAL | OBSERVACIONES SUBSANCIÓN | CUMPLE (SI/NO) | | | | |
|------------------------|----------|--|------------------------|--|---|--|--|---------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------|--------|--------|---------------|-----------------|---|--------------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | Objeto | No. Proyectos por certificar | Requerimiento Particular | | NOMBRE DEL PROFESIONAL | PROFESIÓN | CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS | NÚMERO DE CONTRATO CERTIFICADO | ITEM | SI/NO | | | | | | | | | | | |
| Técnicos o Tecnólogos | 4 | Técnicos o Tecnólogos Eléctricos o Electricistas | 50% | 2 años | Técnicos o Tecnólogos Eléctricos o Electricistas con experiencia específica en manejo de redes eléctricas en proyectos de interventoría | Deberá acreditar su experiencia específica con dos (2) certificaciones de experiencia específica en manejo de redes eléctricas en proyectos de interventoría suscritas por el contratante en las que se indique que actuó como técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | Especificar participación como técnico o tecnólogo en contratos de obra o interventoría ya finalizados | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CARGO DESEMPEÑADO Y FUNCIONES FECHA DE INICIO DE LABORES FECHA DE FINALIZACIÓN DE LABORES ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN COMO TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONTRATOS DE OBRA O INTERVENTORÍA YA FINALIZADOS FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró y revisó:

CHRISTIAN SOTO NÁJES
 Comité Técnico Evaluador

DIANA ELIZABETH QUAJANO HERNÁNDEZ
 Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRETO HILARÓN
 Comité Técnico Evaluador

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA



CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. UARIV-CM-003-2019

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA-PIRC DE SUJETOS COLECTIVOS IDENTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Fecha: Septiembre de 2019

EVALUACIÓN CRITERIO INDUSTRIA NACIONAL

| CRITERIO DE CALIFICACION DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. | PROPONENTE | CRITERIO DE CALIDAD | % NACIONAL | % EXTRANJERO | PUNTAJE |
|---|------------|--|------------|--------------|---------|
| <p>Se asignarán el mayor puntaje es decir cien (100) puntos, a las propuestas cuyo componente de operarios, supervisor y coordinador en su totalidad sea colombiano, de conformidad con lo consagrado por la Ley 816 de 2003 en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo segundo, numeral 3. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 11 del Decreto 679 de 1994 y 4 del Decreto 3806 de 2009, que delimitan lo relacionado con bienes y con servicios de origen nacional, para lo cual deberán diligenciar el Formato "Apoyo a la Industria Nacional" del Pliego de Condiciones, el cual hace parte integral del presente estudio, en el cual se indique la procedencia nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato.</p> <p>De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, se otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana.</p> <p>Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, deberá contar dentro de sus miembros con por lo menos una persona o empresa nacional colombiana, bajo los parámetros dispuestos en el artículo 11 del Decreto 679 de 1994, para que su propuesta obtenga la calificación de cien (100) puntos en este factor. Si no se diligencia o lo diligencia marcando las dos posibilidades del FORMATO No. 7 – Incentivo a la Industria Nacional del Pliego de Condiciones, el oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor.</p> <p>El puntaje se asignará de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el proponente oferte el servicio con personal cien por ciento (100%) Nacional para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, se le asignarán 100 puntos. • Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, se le asignarán 50 puntos. • Cuando el proponente oferte el servicio con personal cien por ciento (100%) extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, se le asignará cero (0) puntos en este factor. | | <p>Cuando el proponente oferte el servicio con personal cien por ciento (100%) Nacional para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, se le asignarán 100 puntos.</p> | | | |
| | | <p>Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, se le asignarán 50 puntos.</p> | | | |
| | | <p>Cuando el proponente oferte el servicio con personal cien por ciento (100%) extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, se le asignará cero (0) puntos en este factor.</p> | | | |

Elaboró y revisó:

CHRISTIAM SOTO NÚÑEZ
Comité Técnico Evaluador

DIANA E. QUIJANO HERNÁNDEZ
Comité Técnico Evaluador

LUIS EDUARDO PRIETO HILARIÓN
Comité Técnico Evaluador

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA - ISC DE LA SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA

Fecha: Junio 20 de 2019

| No. GENERAL | No. ESPECÍFICA | VIGENCIA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | TIPO DE SUJETO | ID SUJETO | SUJETO | ID MEDIDA | MEDIDA | ID ACCIÓN | ACCIÓN | PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | INVERSIÓN UNITARIA | INVERSIÓN ANUAL |
|-------------|----------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|---|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 1 | 2013 | MAGDALENA | Chibolo | NE | 66 | Corregimiento de La Pola | 672 | Estrategia Entrelazando | 2498 | Transformación de espacios locales: Acercar a la comunidad a lugares como la Casa del Balcón, resignificar espacios y lugares. | Adecuación Casa del Balcón | CONSTRUCCIÓN / DOTACIÓN | \$ 344.415.900 | |
| 2 | 2 | 2013 | BOLÍVAR | María La Baja | NE | 334 | San José del Playón | 28430 | Satisfacción | 28432 | Adecuar kioscos comunales en las tres Veredas Palo Blanco, Sucesión y Cúcut. | Apoyo en la adecuación de lote de terreno para construcción de kiosco comunitario - Escuela Talles de Morpox. | CONSTRUCCIÓN | \$ 3.600.000 | |
| 3 | 3 | 2013 | ANTIOQUIA | BAGRE | E | 226 | CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ- CONSEJOS COMUNITARIOS VILLAGRANDE, LA ESPERANZA Y CHAPARRORSA | 31054 | Restitución | 31068 | 6. Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrorsa y Villagrando (muebles, sillas, alfombra, mesa, congeladores, vajillas, cámara, baños). | Construcción y dotación de kiosco | CONSTRUCCIÓN / DOTACIÓN | \$ 111.689.662 | \$ 461.619.562 |
| 4 | 4 | 2013 | BOLÍVAR | San Juan Nepomuceno | OMG | 21 | NARRAR PARA VIVIR | 409 | M1 Pago valor sede para la organización "Namar para Vivir" ubicada en el municipio de San Juan Nepomuceno dotada y adecuada. | 1972 | Identificación de las posibles ofertas. Análisis y concepto técnico del inmueble. Contrato Jurídico sobre la compra del inmueble. Recepción de documentación legal del inmueble (certificado de tradición y libretas, certificado uso del suelo). Suscripción del instrumento jurídico que permita la adquisición y adecuación del inmueble. Dotación del inmueble, previa concertación con la organización Namar para Vivir. Entrega del inmueble por parte de la Unidad para las Víctimas a la organización. Construcción conjunta del Plan de Sostenibilidad | Availo para efectuar el pago del inmueble que adquiere el sujeto de reparación colectiva "Namar para Vivir" para uso exclusivo de la sede de esta organización. | CONSULTORÍA | \$ 1.914.000 | |
| 5 | 1 | 2014 | BOLÍVAR | San Jacinto | NE | 312 | CORREGIMIENTO LAS PALMAS - SAN JACINTO, BOLÍVAR | 478 | Reconstrucción de la Casa de la Cultura | 2105 | Reconstrucción de la Casa de la Cultura - Cermentero casa de la cultura. | Mejoramiento de la Casa de La Cultura. | CONSTRUCCIÓN | \$ 307.334.661 | |
| 6 | 2 | 2014 | SANTANDER | Barancabermeja | OMG | 31 | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR | 344 | PROGRAMA DE REPARACION DE PERJUICIOS MATERIALES Y ECONOMICOS | 1815 | CASAS DE LAS MUJER Y SALAS DE INTERNET: Dotación de oficinas, mejoramiento locativo y estructural de las Casas de la Mujer en los municipios y restitución de casa destruida a través de la restitución de la Casa de la Mujer de Torcoroma | Adecuación de la sede OPP Torcoroma | CONSTRUCCIÓN | \$ 56.040.107 | |
| 7 | 3 | 2014 | BOLÍVAR | San Juan Nepomuceno | OMG | 21 | NARRAR PARA VIVIR | 409 | M1 Pago valor sede para la organización "Namar para Vivir" ubicada en el municipio de San Juan Nepomuceno dotada y adecuada. | 1972 | Identificación de las posibles ofertas. Análisis y concepto técnico del inmueble. Contrato Jurídico sobre la compra del inmueble. Recepción de documentación legal del inmueble (certificado de tradición y libretas, certificado uso del suelo). Suscripción del instrumento jurídico que permita la adquisición y adecuación del inmueble. Dotación del inmueble, previa concertación con la organización Namar para Vivir. Entrega del inmueble por parte de la Unidad para las Víctimas a la organización. Construcción conjunta del Plan de Sostenibilidad | Realizar trámites pertinentes para efectuar el pago del inmueble que adquiere el sujeto de reparación colectiva "Namar para Vivir" para uso exclusivo de la sede de esta organización. | ACTO ADMINISTRATIVO | \$ 142.600.000 | |
| 8 | 4 | 2014 | NARIÑO | Leiva | NE | 127 | El Palmar | 429 | Implementar un programa de restitución colectiva de insumos productivos, comerciales y económicos que permitan generar alternativas de desarrollo para la comunidad de El Palmar. | 2005 | Dotación de equipos y maquinaria tales como: lavadora tostadora, molino industrial, maquinaria de transporte neumático, equipo s/c, lavadora portátil, molino para laboratorio, colorímetro digital, mallas, cuchara de catálisis, balanza electrónica, medidor de humedad, filtrador para laboratorio y equipo de control automático que permitan transformar y darle un valor agregado al café, principal cultivo de la región. | Adecuación y entrega de maquinaria y equipos para el proceso y comercialización del café. | CONSTRUCCIÓN | \$ 89.887.199 | |
| 9 | 5 | 2014 | CHOCÓ | Itagadó | E | 183 | RESGUARDO NIKIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. | Construcción de alojamientos temporales Dearados, para las comunidades indígenas Embeba Katíos retornados al Alto Andágueda. | CONSTRUCCIÓN | \$ 1.478.636.687 | \$ 2.621.816.848 |
| 10 | 6 | 2014 | NARIÑO | San Andrés de Tumaco | E | 210 | Consejo Comunitario Bajo Mira y Fronteras. | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. | Construcción del tercer piso de la sede del Consejo Comunitario Bajo Mira y Fronteras. | CONSTRUCCIÓN | \$ 124.611.537 | |
| 11 | 7 | 2014 | PUTUMAYO | Valle de Guamuez | NE | 60 | EL TIGRE | 259 | Garantizar el goce efectivo del derecho a la educación en niños y niñas, así y los adolescentes afectados por el conflicto armado en la Inspección del Tigre | 1612 | Construcción y dotación de una biblioteca y laboratorio de física y química para la IER Marwetic. | Construcción de dos (2) aulas en la Inspección de Policía de El Tigre. | CONSTRUCCIÓN | \$ 76.367.630 | |
| 12 | 8 | 2014 | SANTANDER | Landsuri | OMG | 306 | ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE - ATCC | 198 | 30. Realizar una (1) dotación de elementos necesarios para el mejoramiento del mobiliario en las escuelas | 1480 | 30. Realizar una (1) dotación de elementos necesarios para el mejoramiento del mobiliario en las escuelas | Realizar una (1) dotación de elementos necesarios para el mejoramiento de mobiliario de escuelas | DOTACIÓN | \$ 82.859.027 | |
| 13 | 10 | 2014 | BOLÍVAR | San Jacinto | NE | 312 | CORREGIMIENTO LAS PALMAS - SAN JACINTO, BOLÍVAR | 473 | Recuperación y protección de las fuentes de agua del corregimiento | 2100 | Recuperación y protección de las fuentes de agua del corregimiento | Diseños de proyectos integrales de abastecimiento de agua potable. | CONSULTORÍA | \$ 60.225.000 | |
| 14 | 11 | 2014 | BOLÍVAR | María La Baja | NE | 334 | San José del Playón | 28436 | Restitución | 29669 | Financiar la realización de una cartografía del agua y ejecutar programas para la recuperación de áreas de humedales y arroyos en los dos corregimientos y sus veredas. | Diseños de proyectos integrales de abastecimiento de agua potable. | CONSULTORÍA | \$ 49.275.000 | |
| 15 | 12 | 2014 | ANTIOQUIA | Turbo | NE | 189 | Pueblo Bello | 564 | Implementar acciones que permitan la dignificación de las víctimas. | 2268 | Construcción de un centro social comunitario en el corregimiento que permita la resignificación de la comunidad, el fortalecimiento comunitario y cultural y que se convierta en espacio de encuentro. | Construcción del centro social comunitario. | CONSTRUCCIÓN | \$ 100.000.000 | |
| 16 | 13 | 2014 | SANTANDER | Barancabermeja | OMG | 31 | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR | 344 | PROGRAMA DE REPARACION DE PERJUICIOS MATERIALES Y ECONOMICOS | 1815 | CASAS DE LAS MUJER Y SALAS DE INTERNET: Dotación de oficinas, mejoramiento locativo y estructural de las Casas de la Mujer en los municipios y restitución de casa destruida a través de la restitución de la Casa de la Mujer de Torcoroma | Elaborar los diseños, planos y estudios que permitan determinar el estado actual de los tres (3) inmuebles de las sedes de la Organización Femenina Popular, OPP, ubicadas en la Carrera 21 No. 12A, 36 Carrera 22 Antigua Barrio Torcoroma, y sede Sur Oriente carrera 38 E No. 23-27, de Bogotá en el Municipio de Barancabermeja (Santander) y la Sede San Pablo ubicada en la Carrera 18 No. 16C-53 Manrique H Loba 1, Carrera 16 No. 19-69 Manrique H, en el sur del Departamento de Bolívar. Los estudios determinarán el alcance de los trabajos a ejecutar en cada uno de ellos, el cual debe corresponder a adecuaciones generales y reparaciones locativas de mantenimiento de los tres (3) sedes de la Organización Femenina Popular, OPP. | CONSULTORÍA | \$ 54.000.000 | |
| 17 | 1 | 2015 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo (o planes de vida) y/o proyectos de etnodesarrollo | 1658 | Mantenimiento de la batería sanitaria, reparación de paredes y techos de la escuela de la vereda El Cuchillo (la que está en funcionamiento) | Suministro de materiales de construcción - Centro Educativo Rural El Cuchillo | CONSTRUCCIÓN | \$ 19.809.566 | |
| 18 | 2 | 2015 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo (o planes de vida) y/o proyectos de etnodesarrollo | 1663 | Construcción de aulas de clase o salones en la escuela de la vereda Llanogrande-Urama | Suministro de materiales de construcción - Centro Educativo Rural La Aguada | CONSTRUCCIÓN | \$ 14.461.182 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|--------------------|------------------|-----|-----|--|-------|--|-------|---|---|---------------------|----------------|
| 19 | 3 | 2015 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento. | 1659 | Mantenimiento de las paredes (revoque) y baños sanitarios de la escuela de la Vereda Argelia | Suministro de materiales de construcción - Centro Educativo Rural La Argelia | CONSTRUCCIÓN | \$ 14.481.182 |
| 20 | 4 | 2015 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento. | 1660 | Reparación de la cocina y las puertas de la escuela de la vereda La Balsita | Suministro de materiales de construcción - Centro Educativo Rural La Balsita | CONSTRUCCIÓN | \$ 17.428.557 |
| 21 | 5 | 2015 | PUTUMAYO | Valle del Guamez | NE | 59 | EL PLACER | 239 | FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE EL PLACER | 1556 | Promoción de programas de Colofundación a iniciativas de emprendimiento, dirigidos a mujeres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad a través del Centro de Formación y Cultura Ciudadana | Fortalecimiento de organización de personas con discapacidad Ayudando con el Corazón | DOTACIÓN | \$ 3.684.897 |
| 22 | 6 | 2015 | PUTUMAYO | Valle del Guamez | NE | 59 | EL PLACER | 239 | FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE EL PLACER | 1556 | Promoción de programas de Colofundación a iniciativas de emprendimiento, dirigidos a mujeres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad a través del Centro de Formación y Cultura Ciudadana | Fortalecimiento y dotación de mobiliario para la organización de mujeres artesanas ASBVMARN | DOTACIÓN | \$ 3.527.834 |
| 23 | 7 | 2015 | PUTUMAYO | Valle del Guamez | NE | 59 | EL PLACER | 231 | Recuperación y fortalecimiento de la organización política y comunitaria de la Comunidad de El Placer | 1540 | Garantizar el fortalecimiento y recuperación de los espacios de organización comunitaria. | Fortalecimiento y dotación de mobiliario para las Juntas de Acción Comunal de la Inspección de Policía El Placer | DOTACIÓN | \$ 29.851.275 |
| 24 | 8 | 2015 | PUTUMAYO | Valle del Guamez | NE | 59 | EL PLACER | 244 | BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | 1568 | Dotación, adecuación y funcionamiento de los puestos de salud de la Inspección de Policía de El Placer. | Dotación de mobiliario para Puesto de Salud de San Isidro, El Placer | DOTACIÓN | \$ 5.000.728 |
| 25 | 9 | 2015 | ATLÁNTICO | Repelón | NE | 70 | PITA - CORREGIMIENTO LAS TABLAS MUN DE REPELÓN | 399 | Reconstrucción de la Escuela y dotación de la misma. Adecuación del servicio de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, Construcción del Salón Comunal y del Parque, construcción del Acueducto y reparación de la vía. | 1958 | Elaboración Proyecto Dinamizador "Construcción Acueducto de Pita" Proceso Retorno y Realización y Alcaldía Municipal de Repelón. | Dotación de Mobiliario de Infraestructura Social y Comunitaria del Municipio de Repelón. | DOTACIÓN | \$ 21.307.927 |
| 26 | 10 | 2015 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento. | 1663 | "Mejoramiento de baterías sanitarias y paredes en el Centro Educativo Rural la Aguada, ubicado en la Vereda Llano grande Urama" y "Complementar la dotación del Centro Educativo Rural la Aguada, ubicada en la Vereda Llano grande Urama y del restaurante escolar" | Dotación de mobiliario - Centro Educativo Rural La Aguada | DOTACIÓN | \$ 3.488.089 |
| 27 | 11 | 2015 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento. | 1659 | "Complementar la dotación del Centro Educativo Rural la Argelia y el restaurante escolar" | Dotación de mobiliario - Centro Educativo Rural La Argelia | DOTACIÓN | \$ 2.912.654 |
| 28 | 12 | 2015 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento. | 1660 | "Mejoramiento de la cocina, paredes, baterías sanitarias y cubierta en el Centro Educativo Rural la Balsita" y "Complementar la dotación del Centro Educativo Rural la Balsita y del restaurante escolar" | Dotación de mobiliario - Centro Educativo Rural La Balsita | DOTACIÓN | \$ 4.721.483 |
| 29 | 13 | 2015 | NORTE DE SANTANDER | El Zulia | OMG | 308 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIENAS DE COLOMBIA -AMUJIC (EL ZULIA NORTE DE SANTANDER) | 318 | Acompañamiento para los trámites pendientes a la aclaración de la situación legal del predio el mesizo. | 1766 | Acompañamiento para los trámites pendientes a la aclaración de la situación legal del predio el mesizo. | Availo para efectuar el pago del inmueble que adquiere el sujeto de reparación colectiva "AMUJIC" para uso exclusivo de la sede de esta organización | CONSULTORIA | \$ 3.933.000 |
| 30 | 14 | 2015 | NORTE DE SANTANDER | El Zulia | OMG | 308 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS E INDIENAS DE COLOMBIA -AMUJIC (EL ZULIA NORTE DE SANTANDER) | 320 | Realizar los trámites pertinentes para efectuar el pago del inmueble que adquiere el sujeto de reparación colectiva "AMUJIC EL ZULIA" para uso exclusivo de la sede de esta organización, previo cumplimiento de la normatividad aplicable para la materia y dotación de la misma. | 1769 | Realizar los trámites pertinentes para efectuar el pago del inmueble que adquiere el sujeto de reparación colectiva "AMUJIC EL ZULIA" para uso exclusivo de la sede de esta organización, previo cumplimiento de la normatividad aplicable para la materia y dotación de la misma. | Realizar trámites pertinentes para efectuar el pago del inmueble que adquiere el sujeto de reparación colectiva "Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas -AMUCI de El Zulia" para uso exclusivo de la sede de esta organización. | ACTO ADMINISTRATIVO | \$ 200.000.000 |
| 31 | 1 | 2016 | NORTE DE SANTANDER | Tibu | NE | 240 | LA GABARRA | 829 | Programa de recuperación de oportunidades productivas y participativas para la mujer, mediante la creación de un Fondo Especial de Fomento para el trabajo de la Mujer, que financie iniciativas productivas de las mujeres individualmente o por medio de las organizaciones en las que participan. Apoyo técnico y capacitación. | 2679 | Programa de recuperación de oportunidades productivas y participativas para la mujer, mediante la creación de un Fondo Especial de Fomento para el trabajo de la Mujer, que financie iniciativas productivas de las mujeres individualmente o por medio de las organizaciones en las que participan. Apoyo técnico y capacitación. | Suministro de materiales de construcción para la construcción del cerramiento de la planta de AMUCANEFU | CONSTRUCCIÓN | \$ 119.075.901 |
| 32 | 2 | 2016 | PUTUMAYO | Valle del Guamez | NE | 60 | EL TIGRE | 259 | Garantizar el goce efectivo del derecho a la educación en niños y niñas, así y las adolescentes afectadas por el conflicto armado en la Inspección de Tigre | 1615 | Implementación de ludotecas de primera infancia permanente para niños y niñas de zonas rurales, donde el juego es un medio lúdico y educativo que contribuye al crecimiento integral de los niños y las niñas que han sido afectados por situaciones del conflicto. | Dotación de mobiliario para planteles educativos Inspección de Policía El Tigre (Valle del Guamez Putumayo) | DOTACIÓN | \$ 82.919.287 |
| 33 | 3 | 2016 | CAUCA | Popayán | NE | 255 | La Rejaya | 853 | Dotación de los insumos para el funcionamiento de la cocina del Salón Comunal | 2717 | Dotación de los insumos para el funcionamiento de la cocina del Salón Comunal | Dotación de mobiliario para la cocina del salón comunal de la vereda La Rejaya (Municipio de Popayán - Cauca) | DOTACIÓN | \$ 14.868.857 |
| 34 | 4 | 2016 | CAUCA | Popayán | NE | 255 | La Rejaya | 851 | Reactivar el acompañamiento institucional, garantizando el acceso a los derechos básicos de la comunidad | 2708 | Dotación de una biblioteca veredal que cuente con libros y muebles necesarios para su funcionamiento en la Institución Educativa Francisco José Chaux | Dotación de mobiliario para la biblioteca de la vereda La Rejaya (Municipio de Popayán - Cauca) | DOTACIÓN | \$ 79.749.448 |
| 35 | 5 | 2016 | ANTIOQUIA | Apartadó | NE | 134 | LA CHRITA | 284 | Fortalecimiento de los escenarios políticos y de participación | 1708 | Adequar y dotación de la Junta de Acción Comunal | Dotación de mobiliario para la Junta de Acción Comunal del barrio La Chrita (Apartadó - Antioquia) | DOTACIÓN | \$ 3.877.078 |
| 36 | 6 | 2016 | PUTUMAYO | San Miguel | NE | 58 | LA DORADA | 28048 | Garantizar el Derecho a la Educación perdido en el marco del conflicto armado, de los NNA | 28049 | Dotar el mobiliario de la Institución educativa TI La Dorada y sus sedes | Dotación de mobiliario para la Institución Educativa del Municipio de San Miguel (Putumayo) | DOTACIÓN | \$ 75.580.032 |
| 37 | 7 | 2016 | ANTIOQUIA | Turbo | NE | 136 | EL TRES | 928 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de desarrollo. | 2882 | Dotación de las escuelas: Casco urbano El Tres, Celdosa, La Trianga, La esperanza, Tachuela y Limón Medio, Monteverde 1, Guatullo, El Estrecho | Dotación de mobiliario para Instituciones Educativas en el corregimiento El Tres (Turbo - Antioquia) | DOTACIÓN | \$ 148.957.076 |
| 38 | 8 | 2016 | ANTIOQUIA | Turbo | NE | 138 | NUEVA COLONIA (TODAS VEREDAS EXCEPTO NUEVA UNIÓN Y ASOTECÁ) | 973 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo regulando escenarios y espacios que fortalezcan la educación en el corregimiento | 3001 | Gestionar ante las instituciones encargadas la ampliación de la escuela de la Vereda Nueva Unión. En esta escuela estudian aproximadamente 150 niños y niñas pre-escolar y primaria y solamente se cuenta con una sala aula. La comunidad pide que se estudie la posibilidad de generar una ampliación de por lo menos dos salones más, una oficina para la parte administrativa, unidades sanitarias, y el comedor para los niños y las niñas. | Dotación de mobiliario para Instituciones Educativas del corregimiento Nueva Colonia (Turbo - Antioquia) | DOTACIÓN | \$ 148.957.076 |
| 39 | 9 | 2016 | ANTIOQUIA | Turbo | NE | 135 | TULAPAS | 918 | Promover y garantizar el goce efectivo del derecho a la educación y al acceso a la cultura en las direcciones en que pudo haberse limitado por causa del conflicto armado. | 2852 | Dotación de los planteles educativos de las veredas: San Pablo, Nueva Tulapas, Paraiso, Poverri, San Andrés, La Pita, La Pita Arriba, la Yoya, las Mercedes (2 plantales), Santa Bárbara Arriba, Santa Bárbara Abajo, Bisco Izquierdo la grta, Isas, Caba Azul, La Concha, El Indio y Yoki Machera. | Dotación de mobiliario para Instituciones Educativas de la vereda Tulapas (Turbo - Antioquia) | DOTACIÓN | \$ 193.779.807 |
| 40 | 10 | 2016 | ANTIOQUIA | Apartadó | NE | 134 | LA CHRITA | 278 | Reconstrucción Del Proyecto De Vida Colectivo | 1707 | Adequar el centro social del adulto mayor del barrio obrero | Dotación de mobiliario para el Centro del Adulto Mayor - CAM en La Chrita (Apartadó - Antioquia) | DOTACIÓN | \$ 1.360.268 |

\$ 344.288.424

\$ 872.711.973

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|--------------------|--------------------|-----|-----|--|------------------------|---|------------------------|---|--|--------------|----------------|
| 41 | 11 | 2016 | ANTIOQUIA | Mutata | NE | 140 | VEREDA CAUCHERAS | 942 | Construcción y dotación (escritorio, archivador, computador, impresora, vitas y demás equipos de oficina) de una caseta comunal para la comunidad de Caucheras. (Propender por el fortalecimiento y recuperación de los encuentros organizativos y comunitarios y el tejido social) | 2520 | Construcción y dotación (escritorio, archivador, computador, impresora, vitas y demás equipos de oficina) de una caseta comunal para la comunidad de Caucheras. (Propender por el fortalecimiento y recuperación de los encuentros organizativos y comunitarios y el tejido social) | Dotación de mobiliario para la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Caucheras (Mutata - Antioquia). | DOTACIÓN | \$ 4.187.245 |
| 42 | 1 | 2017 | VALLE DEL CAUCA | Palmira | NE | 230 | ARENILLO | 452 | Fortalecimiento al tejido social que promueva el trabajo comunitario. | 2067 | Dotar de equipos de trabajo como computadores e impresoras a las organizaciones de la vereda como son ANCONCAR y Junta de Acción Comunal. | Dotación de mobiliario para ANCONCAR y la Junta de Acción Comunal. | DOTACIÓN | \$ 10.201.091 |
| 43 | 2 | 2017 | BOGOTÁ D.C. | Bogotá D.C. | OMG | 163 | ANMUIC NACIONAL | 3273 | Restitución y dotación de SEDES de Anmuic, afectadas por el conflicto armado interno. | 3274 | Restitución y dotación de SEDES de Anmuic, afectadas por el conflicto armado interno. | Dotación de mobiliario los espacios de reunión de la organización ANMUIC, en el marco de la implementación del PIRC. | DOTACIÓN | \$ 45.144.044 |
| 44 | 3 | 2017 | VALLE DEL CAUCA | Guadalupe de Buga | NE | 228 | LA HABANA | 440 | Fortalecimiento del proceso organizativo y político comunitario. | 2030 | Adecuación, Dotación a Juntas de Acción Comunal del corregimiento La Magdalena. | Dotación de mobiliario para fortalecer Moricamenta a las organizaciones constituidas para la generación de ingresos que hacen parte del SRC La Habana. | DOTACIÓN | \$ 43.791.244 |
| 45 | 4 | 2017 | BOLÍVAR | Turbaco | OMG | 164 | LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | Dotación de mobiliario para el refugio "El corazón de las mujeres", de la organización Liga de Mujeres Desplazadas, en el marco de la implementación del PIRC. | DOTACIÓN | \$ 35.810.838 |
| 46 | 5 | 2017 | VALLE DEL CAUCA | Trijillo | NE | 234 | CORREGIMIENTOS DE LA SONORA, EL TABOR Y VEREDAS BETULIA Y MARACABO | 459 | Recuperar y Fortalecer las dinámicas comunitarias así como los espacios de encuentro para el desarrollo de las actividades propias del colectivo. | 2094 | Adecuación de las casetas comunales de la vereda la sonora área de 100 mts y la VEREDA LA BETULIA área 50 mts aproximadamente. Bañeros sanitarios. Equipos: 1 Computador 1 Impresora 1 Video-Beam- 1 Megafono- 100 Sillas - 24 Mesas - 1 Estabilizador - 2 Columnas de Sonido. | Dotación de mobiliario para las casetas comunales de las veredas del SRC La Sonora. | DOTACIÓN | \$ 30.096.425 |
| 47 | 6 | 2017 | BOLÍVAR | Villanueva | NE | 227 | ZIPACOA | 605 | Mejoramiento de la calidad educativa del sujeto de reparación colectiva de Zipacoa | 2347 | Dotación de muebles y enseres de la Institución Educativa de Zipacoa | Dotación de mobiliario para IER Zipacoa. | DOTACIÓN | \$ 110.425.208 |
| 48 | 7 | 2017 | CAUCA | Timbó | E | 173 | CABILDO KITEK KIWE | 3216 | Posibilitar el retorno a los territorios de origen y la posesión efectiva del territorio ancestral de las comunidades | 3245 | Dotación para la construcción y adecuación del centro Educativo Elisa Trochez con dotación de mobiliario y dotación de la sala de sistemas (proyecto dinamizador) | Dotación de mobiliario y material pedagógico necesarios para el mejoramiento de la calidad educativa en la Institución Educativa Elisa Trochez de la vereda San Pedro, Finca La Laguna, territorio del cabildo Kitek Kiwe. | DOTACIÓN | \$ 41.535.719 |
| 49 | 8 | 2017 | CAUCA | Torbío | E | 285 | RESGUARDOS DE TORBIO, TACUEYO Y SAN FRANCISCO - PROYECTO NASA | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. | Dotación del mobiliario del centro de revitalización del Haza Yusa, Waashwa We ta del Sujeto de Reparación Colectiva Resguardos de Torbio, Tacueyo y San Francisco - Proyecto Nasa. | DOTACIÓN | \$ 50.808.745 |
| 50 | 9 | 2017 | CAUCA | Timbó | E | 173 | CABILDO KITEK KIWE | 3216 | Posibilitar el retorno a los territorios de origen y la posesión efectiva del territorio ancestral de las comunidades | 3246 | Dotación del Val (W&A con mobiliario para infraestructuras sociales y comunitarias (proyecto dinamizador) | Dotación de mobiliario para el yateval del SRC de Kitek Kiwe | DOTACIÓN | \$ 5.859.631 |
| 51 | 10 | 2017 | ANTIOQUIA | San Carlos | NE | 108 | FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 507 | Implementación de acciones encaminadas a la reparación simbólica del municipio | 2172 | Fortalecimiento Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) | Dotación de mobiliario para el fortalecimiento del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación - CARE | DOTACIÓN | \$ 4.950.667 |
| 52 | 11 | 2017 | CAUCA | Torbío | E | 285 | RESGUARDOS DE TORBIO, TACUEYO Y SAN FRANCISCO - PROYECTO NASA | 19664 | Reconocimiento y garantías para el fortalecimiento de las prácticas y saberes medicinales orientados por los Kwee. This como garantía del territorio, armonía física y espiritual de la comunidad y el territorio, mediante acciones de revitalización de la medicina tradicional | 19812 | Adecuación y dotación de los espacios de atención en medicina tradicional existente en los tres Resguardos (Comunidad de tipo tradicional El Marzaco (Torbio), Piyo y CECODIC (San Fe.) y El Cruceño (Tacueyo) | Suministro de materiales de construcción para la adecuación de la infraestructura de dos tajales ubicados en la vereda El Marzaco - Resguardo de Torbio y en la vereda El Piyo, Resguardo de San Francisco del SRC Resguardos de Torbio, Tacueyo y San Francisco - Proyecto Nasa. | CONSTRUCCIÓN | \$ 43.010.026 |
| 53 | 12 | 2017 | ANTIOQUIA | San Carlos | NE | 108 | FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 507 | Implementación de acciones encaminadas a la reparación simbólica del municipio | 2172 | Fortalecimiento Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) | Dotación de mobiliario para la IER Samaná | DOTACIÓN | \$ 22.417.598 |
| 54 | 13 | 2017 | CUNDINAMARCA | El Peñón | NE | 12 | LA COMUNIDAD DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL DE TOLEDO DEL MUNICIPIO DEL PEÑÓN | 3445 | Garantizar el goce efectivo del derecho a la Educación de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto en el centro poblado Guayabal de Toledo. | 3446 | Dotación con la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación la dotación de las cuatro (4) escuelas: Samaná, Tendidos, Centro y Quita Sol (con material) y equipos que permitan el goce efectivo del derecho a la educación de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad de Guayabal de Toledo. | Suministro de materiales de construcción y dotación de mobiliario para cuatro (4) escuelas: Samaná, Tendidos, Centro y Quita Sol ubicadas en el centro poblado de Guayabal de Toledo. | CONSTRUCCIÓN | \$ 13.091.595 |
| 55 | 14 | 2017 | NORTE DE SANTANDER | Tibú | NE | 240 | LA GABARRA | 831 | Fortalecimiento las organizaciones que existen en la comunidad y apoyo a las que surgen dentro del proceso con las víctimas | 2681 | Fortalecimiento las organizaciones que existen en la comunidad y apoyo a las que surgen dentro del proceso con las víctimas | Dotación de mobiliario para fortalecer las capacidades comunitarias de las asociaciones ANUCAMERU, AMUCO, ASOCIADA, ASOPESCA, VETERANOS EN ACCIÓN, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, ASOCIACIÓN DE PESEROS, ASOVIT, ASOJUNTAS COMUNALES, ASOCIACIÓN DE BOGAS, del corregimiento de La Gabarra municipio de Tibú (Norte de Santander) | DOTACIÓN | \$ 45.733.000 |
| 56 | 15 | 2017 | BOLÍVAR | Villanueva | NE | 227 | ZIPACOA | 610 | Recuperación de la organización de la comunidad de Zipacoa, construcción de la casa del Sindicato y la Sala de Junta de la Cooperativa Coopobol en la Finca Santa Ana y Los Cocos | 2352 | Fortalecer la organización sindical de Zipacoa, construcción de la casa del sindicato de Zipacoa. Gestión ante el Ministerio de cultura el programa "espacios de vida para la comunidad" y la Sala de Junta de la Cooperativa COAGROSALCOS en la Finca Santa Ana de los Cocos | Dotación de mobiliario para la Casa de la Cultura del corregimiento de Zipacoa | DOTACIÓN | \$ 74.823.450 |
| 57 | 16 | 2017 | PUTUMAYO | San Miguel | NE | 58 | LA DORADA | 28956 | Propiciar espacios de formación y fortalecimiento en liderazgo político y social que permita armonizar liderazgo, genere participación | 28958 | La unidad dotó con mobiliario a las 8 JAC de la cabecera municipal y algunas organizaciones de mujeres, víctimas y NNAJ. La Alcaldía realiza acompañamiento y asistencia técnica | Dotación de mobiliario para ocho (8) JAC, oficina de ASOJUNTAS, grupo de comité de impulso y Organizaciones de Mujeres y Jóvenes | DOTACIÓN | \$ 78.447.296 |
| 58 | 17 | 2017 | PUTUMAYO | Villagarzón | NE | 11 | CABECERA MUNICIPAL VILLAGARZÓN | 27361 | Construcción y dotación de un Centro de Formación Ciudadana para la formación en liderazgo y la participación política y ciudadana. | 27362 | Construir y dotar un espacio de integración y formación ciudadana | Dotación casa campesina y ASOJUNTAS | DOTACIÓN | \$ 63.181.996 |
| 59 | 18 | 2017 | PUTUMAYO | Valle del Guamez | NE | 60 | EL TIGRE | 271 | Fortalecimiento a la organización Junta de Vivienda Urbanización Villas Marianas a través de apoyo para la organización comunitaria y gestión de apoyos - subsidios para vivienda de interés social. | 1656 | Fortalecimiento a la organización Junta de vivienda Urbanización Villas Marianas. | Dotación de mobiliario administrativo y escolar | DOTACIÓN | \$ 143.364.564 |
| 60 | 19 | 2017 | BOLÍVAR | San Juan Neguazero | OMG | 21 | NARRAR PARA VIVIR | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | Dotación de sede principal y nodos de María la Baja, el Guamo, Carmen de Bolívar y Zambrano | DOTACIÓN | \$ 52.209.565 |
| 61 | 20 | 2017 | SUCRE | Ovejas | OMG | 21 | NARRAR PARA VIVIR | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | Dotación de mobiliario en los nodos de los proyectos en los municipios de Ovejas, Palmiro, Chobón, Colobó, San Antonio de Palmito y Tolú Viejo | DOTACIÓN | \$ 48.234.828 |
| 62 | 21 | 2017 | ANTIOQUIA | Granada | NE | 169 | FOCALIZADO MUNICIPIO DE GRANADA | 349 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento | 1860 | Reconstrucción y/o adecuación de las casetas comunales y salones culturales en las veredas La Merced, La Aguada, La Quebra, La Gavilota, El Morro, La Linda, San Francisco, El Roble. | Suministro de materiales de construcción para la construcción del salón comunitario en la escuela de la vereda El Roble. | CONSTRUCCIÓN | \$ 36.770.996 |
| 63 | 22 | 2017 | CESAR | Curumani | NE | 300 | CORREGIMIENTO SANTA ISABEL | 3452 | Reconstrucción, mejoramiento, adecuación y dotación de la infraestructura social comunitaria | 3462 | Mejoramiento del Sistema Educativo del Corregimiento de Santa Isabel, que comprende las veredas de Lamasverde, torobolan, las nubes. | Dotación de mobiliario para cuatro (4) aulas escolares en la institución educativa de Santa Isabel, así como dotación y adecuación de los laboratorios de química, física y sistemas. | DOTACIÓN | \$ 25.613.478 |
| 64 | 23 | 2017 | NARIÑO | Lelva | NE | 127 | EL PALMAR | 427 | Promover y garantizar el goce efectivo del Derecho a la Educación, el cual se vio afectado en cuanto a la deserción escolar que se presenta ante el miedo del uso de el colegio como una zona de combates. | 2003 | Rehabilitación del Colegio, esto implica la construcción de una nueva sede educativa y la dotación de la misma. | Suministro de materiales de construcción para la adecuación del colegio y la construcción de dos aulas escolares | CONSTRUCCIÓN | \$ 152.886.207 |
| 65 | 24 | 2017 | CESAR | Curumani | NE | 300 | CORREGIMIENTO SANTA ISABEL | 3455 | Protección, conservación y reposición de recursos naturales y del medio ambiente | 3465 | Implementar proyectos de reforestación para la conservación de fuentes hídricas y la recuperación del cauce del río ANAIE. | Dotación del Bosque de la Memoria SRC Santa Isabel, municipio de Curumani Cesar | DOTACIÓN | \$ 3.860.324 |
| 66 | 25 | 2017 | ANTIOQUIA | Granada | NE | 169 | FOCALIZADO MUNICIPIO DE GRANADA | 349 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento | 1847 | Reactivación, ampliación y dotación del centro de acopio de la zona urbana. | Suministro de materiales para adecuación del centro de acopio panelero | CONSTRUCCIÓN | \$ 34.201.943 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|---|--|-----|-----|---|------------------------|--|------------------------|--|--|--------------|------------------|
| 67 | 26 | 2017 | SUCRE | San Ochofe | NE | 24 | COMUNIDAD DE LIBERTAD | 390 | Programa para la recuperación de la convivencia y el desarrollo social | 1924 | Construcción de cancha deportiva múltiple, dotándola con implementos deportivos, nombrando personal calificado en esa área que forme al comité de deportes que realiza las actividades de manera empírica. | Suministro de materiales de construcción para la construcción de la cancha múltiple | CONSTRUCCIÓN | \$ 74.047.575 |
| 69 | 28 | 2017 | PUTUMAYO | Valle del Guazac | NE | 60 | EL TIGRE | 268 | Garantizar el fortalecimiento y recuperación de los espacios organizativos comunitarios de la Inspección de El Tigre | 1646 | Fortalecimiento en dotación, formación y protección a la organización comunitaria y comunal Ley 743 de las UIC de la Inspección como estrategia para mejorar la participación ciudadana, los espacios democráticos y la organización vereda político administrativa. | Suministro de materiales de construcción para la construcción de gradenas en la IER Maravelez | CONSTRUCCIÓN | \$ 65.598.253 |
| 70 | 29 | 2017 | SANTANDER - BOLIVAR | Barancaberméjia - Bolívar | OMG | 31 | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR | 344 | PROGRAMA DE REPARACION DE PERJUICIOS MATERIALES Y ECONOMICOS | 1815 | CASAS DE LAS MUJER Y SALAS DE INTERNET; Dotación de oficinas, mejoramiento locativo y estructural de las Casas de la Mujer en los municipios y restitución de casa destruida a través de la reestructuración de la Casa de la Mujer de Torontoma | Implementar las medidas de reparación colectiva para el sujeto de reparación colectiva "Organización Femenina Popular" mediante las adecuaciones y reparaciones locativas y de mantenimiento bajo el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste de tres (3) inmuebles de las sedes de la Organización Femenina Popular, OFP, ubicadas en la carrera 22 No. 528 - 36 barrio Torontoma y en la carrera 36E No. 53-37 Sur Oriente, en el Municipio de Barancaberméjia (Departamento de Santander), y en la Sede del Municipio de San Pablo (Bolívar) ubicada en la carrera 16 No. 16A-69 marzaca H lote 1 dirección actual según el I.G.A.C. - carrera 16 No. 16C-53 marzaca H lote 1. | CONSTRUCCIÓN | \$ 1.216.950.729 |
| 71 | 30 | 2017 | SANTANDER - BOLIVAR | Barancaberméjia - Bolívar | OMG | 31 | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR | 344 | PROGRAMA DE REPARACION DE PERJUICIOS MATERIALES Y ECONOMICOS | 1815 | CASAS DE LAS MUJER Y SALAS DE INTERNET; Dotación de oficinas, mejoramiento locativo y estructural de las Casas de la Mujer en los municipios y restitución de casa destruida a través de la reestructuración de la Casa de la Mujer de Torontoma | Contratar la Interventoría Técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental del contrato de obra para implementar las medidas de reparación colectiva para el sujeto de reparación colectiva "Organización Femenina Popular" mediante las adecuaciones y reparaciones locativas y de mantenimiento bajo el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste de tres (3) inmuebles de las sedes de la Organización Femenina Popular, OFP, ubicadas en la carrera 22 No. 528 - 36 barrio Torontoma y en la carrera 36E No. 53-37 Sur Oriente, en el Municipio de Barancaberméjia (Departamento de Santander), y en la Sede del Municipio de San Pablo (Bolívar) ubicada en la carrera 16 No. 16A-69 marzaca H lote 1 dirección actual según el I.G.A.C. - carrera 16 No. 16C-53 marzaca H lote 1. | CONSULTORIA | \$ 138.464.859 |
| 72 | 1 | 2018 | CAUCA | Jambaló | E | 331 | Comunidad Indígena Nasa del Resguardo Jambaló | 29721 | Restitución | 29741 | Crear el Banco de semillas propias a través de la investigación y construcción de un inventario que permita conservar las propiedades de las semillas que se estaban desapareciendo por la dinámica del conflicto armado. | Crear el Banco de semillas propias a través de la investigación y construcción de un inventario que permita conservar las propiedades de las semillas que se estaban desapareciendo por la dinámica del conflicto armado. | CONSTRUCCIÓN | \$ 35.861.488 |
| 73 | 2 | 2018 | CAUCA | Torbio | E | 285 | Resguardos de Torbio, Tacuyó y San Francisco - Proyecto Nasa | 19661 | Fortalecimiento de los valores propios, los espacios de encuentro y la identidad que fueron debilitados y afectados como consecuencia de los daños causados por el conflicto armado al vínculo cultural y espiritual del nasa con su territorio y la organización social. | 19784 | Adecuación y dotación de los espacios para el encuentro, la construcción de pensamiento colectivo y el fortalecimiento de los valores propios de la cultura nasa (Tijapas de pensamiento). | Adecuación y dotación de los espacios para el encuentro, la construcción de pensamiento colectivo y el fortalecimiento de los valores propios de la cultura nasa (Tijapas de pensamiento). | CONSTRUCCIÓN | \$ 90.503.385 |
| 74 | 3 | 2018 | CÓRDOBA | San José de Uré | E | 349 | Consejo Comunitario San José de Uré | 29830 | Restitución | 29840 | Dotar el mobiliario comunitario de los lugares de reunión de los dos juntas de gobierno y la Organización Justo Chávez. | Dotar el mobiliario comunitario de los lugares de reunión de los dos juntas de gobierno y la Organización Justo Chávez. | DOTACIÓN | \$ 126.914.017 |
| 75 | 5 | 2018 | CHOCÓ | Ungulá | E | 40 | Resguardo Taneta | 28478 | Restitución | 28489 | Construir y dotar un banco colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como mingas, palenques, bailes, actividades de carnos, prácticas de medicina propia, reuniones institucionales y demás. | Construir y dotar un banco colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como mingas, palenques, bailes, actividades de carnos, prácticas de medicina propia, reuniones institucionales y demás. | CONSTRUCCIÓN | \$ 278.268.930 |
| 76 | 6 | 2018 | CAUCA | Torbio | E | 285 | Resguardos de Torbio, Tacuyó y San Francisco - Proyecto Nasa | 19670 | Fortalecer el Programa de Jóvenes en cada uno de los resguardos, con el objetivo de brindar oportunidades educativas, recreativas, productivas y laborales que permitan a los jóvenes indígenas víctimas del reclutamiento forzado construir sus sueños y aportar al Plan de Vida comunitario. | 19789 | Dotación de la sede del movimiento juvenil que fue afectado por la chiva bomba | Dotación de la sede del movimiento juvenil que fue afectado por la chiva bomba | DOTACIÓN | \$ 200.428.584 |
| 77 | 7 | 2018 | VICHADA | Puerto Carreño | E | 8 | Comunidad de Karalló (Pueblos Sikant, Amocá y Salva) | 29801 | Restitución | 29810 | Mejoramiento de la sede educativa de la comunidad y dotación de implementos tecnológicos y escolares. 2018. Entrega de dotación. Urgente para el mejoramiento de la escuela para la comunidad. DOTACIÓN: Insumos tecnológicos: computador, video beam, entre otros. RECURSO HUMANO: la comunidad aportando mano de obra. Logística Para la entrega de mejoramiento de la escuela. | Mejoramiento de la sede educativa de la comunidad y dotación de implementos tecnológicos y escolares. | CONSTRUCCIÓN | \$ 43.517.344 |
| 78 | 8 | 2018 | CAUCA | Playó | E | 295 | Resguardo de Playó | 28580 | Restitución | 28596 | Construir una lupa comunitaria que permita acoger a la comunidad. | Construir una lupa comunitaria que permita acoger a la comunidad. | CONSTRUCCIÓN | \$ 45.250.182 |
| 79 | 9 | 2018 | CAUCA | Playó | E | 295 | Resguardo de Playó | 28580 | Restitución | 28587 | Construir, adecuar y dotar la casa del cabildo / centro cultural del territorio ancestral del Playó | Construir, adecuar y dotar la casa del cabildo / centro cultural del territorio ancestral del Playó | CONSTRUCCIÓN | \$ 629.237.628 |
| 80 | 10 | 2018 | CHOCÓ | Acandí | E | 36 | Resguardo Chidma Toó - Embera Katios | 30968 | Restitución | 30971 | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que los NNA de la comunidad puedan realizar las actividades escolares de manera digna y acorde a las condiciones de comunidad, incluyendo la dotación de la cocina comunitaria escolar con el menaje necesario. | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que los NNA de la comunidad puedan realizar las actividades escolares de manera digna y acorde a las condiciones de comunidad, incluyendo la dotación de la cocina comunitaria escolar con el menaje necesario. | DOTACIÓN | \$ 30.285.713 |
| 81 | 11 | 2018 | CHOCÓ | Acandí | E | 37 | Resguardo Pescado - Embera Dobáa | 31025 | Restitución | 31029 | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que los NNA de la comunidad puedan realizar las actividades escolares de manera digna y acorde a las condiciones de comunidad. Adecuar y dotar cocina comunitaria escolar. | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que los NNA de la comunidad puedan realizar las actividades escolares de manera digna y acorde a las condiciones de comunidad. Adecuar y dotar cocina comunitaria escolar. | DOTACIÓN | \$ 30.285.713 |
| 82 | 12 | 2018 | BOGOTÁ D.C. | Bogotá D.C. | OMG | 238 | ANUC | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA MEDIDA | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | NO SE ENCUENTRA ACCIÓN | Dotación de mobiliario - Sede nacional ANUC | DOTACIÓN | \$ 36.397.013 |
| 83 | 13 | 2018 | ARAUCA, VICHADA, GUANÍA, VALPES, CHOCÓ | Arauca, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Misi, Quibío | OMG | 156 | CONCEJALES Y DIPUTADOS CONFEDICOL | 3200 | Adecuación de congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado 3.E. Adecuación de congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado. | 3314 | Adecuación de los congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado con base al plan de trabajo de priorización. | Dotación de mobiliario - Asambleas departamentales (Confedicol) | DOTACIÓN | \$ 74.196.063 |
| 84 | 14 | 2018 | CUNDINAMARCA, META, NARIÑO | Cabera, Abán, Leguías, Mapazan, Nagá Piján | OMG | 156 | CONCEJALES Y DIPUTADOS CONFENACOL | 3200 | Adecuación de congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado 3.E. Adecuación de congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado. | 3314 | Adecuación de los congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado con base al plan de trabajo de priorización. | Dotación de mobiliario - Conferencol | DOTACIÓN | \$ 78.428.898 |
| 85 | 16 | 2018 | NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | OMG | 316 | LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL SAN JOSÉ DE CUCUTA. | 26455 | Estrategias, planes, programas y acciones de carácter psicológico político y social dirigidos al resqueamiento de derechos y de las condiciones físicas y psicosociales de los integrantes a la FEDECOMUNAL CUCUTA. | 26456 | Construcción de las instalaciones de la "SEDE FEDECOMUNAL CUCUTA", en la que se requiere que sea estructuralmente de dos plantas, con capacidad funcional de 10 salones para la formación de sus afiliados, 4 oficinas directivas, salón de juntas con capacidad para 400 personas para las asambleas y reuniones de junta directivas, con dotación y destinação de recursos económicos para garantizar el mantenimiento de la sede y del centro de desarrollo y de memoria histórica comunal. | Dotación de mobiliario - Fedecomunal Cúcuta | DOTACIÓN | \$ 29.444.240 |
| 86 | 17 | 2018 | BOLIVAR, CUNDINAMARCA, NARIÑO, ANTIOQUIA, SUCRE | Río Viejo, Abelebén, Barbacoa, Turbo, Sampues | OMG | 156 | CONCEJALES Y DIPUTADOS FENACON | 3200 | Adecuación de congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado 3.E. Adecuación de congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado. | 3314 | Adecuación de los congresos y asambleas departamentales afectadas por el conflicto armado con base al plan de trabajo de priorización. | Dotación de mobiliario - Fenacón | DOTACIÓN | \$ 76.832.683 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|--------------------|-------------------|-----|-----|---|-------|--|-------|--|---|---------------------|----------------|
| 87 | 18 | 2018 | QUINDIO | Génova | NE | 182 | MUNICIPIO DE GÉNOVA (CABECERA MUNICIPAL) | 28703 | Suministrar un servicio de calidad y digno que brinde la protección integral a los niños, niñas y adolescentes de la sociedad genovesa, garantizando la atención y el cuidado que requieren para el goce efectivo de sus derechos y bienestar. | 28704 | Diseñar la dotación de elementos para la prestación del servicio del Hogar Infantil "La Isla" los cuales se requieren para el funcionamiento escolar en condiciones de dignidad | Dotación de mobiliario - Hogar Infantil "La Isla" en Génova | DOTACIÓN | \$ 52.250.541 |
| 88 | 19 | 2018 | ANTIOQUIA | Granada | NE | 169 | FOCALIZADO MUNICIPIO DE GRANADA | 349 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y planes de vida y/o proyectos de emprendimiento. | 1690 | Reconstrucción y/o adecuación de los casales comunales y salones culturales en las veredas La Merced, La Aguada, La Quebra, La Cañona, El Moro, La Lina, San Francisco, El Roble. | Suministro de materiales - Salón comunal de la vereda La Aguada | CONSTRUCCIÓN | \$ 44.652.598 |
| 89 | 20 | 2018 | NORTE DE SANTANDER | Villa del Rosario | NE | 49 | LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE JUAN FRIO | 286 | Garantías para el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición mediante el fortalecimiento de los diferentes planes y programas que conforman la política pública de prevención y protección de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 | 1712 | Encorramiento y dotación del Instituto Técnico Agrario Juan Frío municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander | Suministro de materiales - Ceramiento IER Juan Frío | CONSTRUCCIÓN | \$ 979.136.789 |
| 90 | 21 | 2018 | NORTE DE SANTANDER | Villa del Rosario | NE | 49 | LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE JUAN FRIO | 287 | Garantías para el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición mediante el fortalecimiento de los diferentes planes y programas que conforman la política pública de prevención y protección de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 | 1713 | Encorramiento y dotación del Instituto Técnico Agrario Juan Frío municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander | Dotación de mobiliario - IER Juan Frío | DOTACIÓN | \$ 148.165.688 |
| 91 | 22 | 2018 | SANTANDER | Suratá | NE | 119 | LA COMUNIDAD DE LOS CORREGIMIENTOS DE TURBAY Y EL MOHÁN | 520 | Remodelar, adecuar y dotar el Centro de Salud del Corregimiento del Mohán para prestar la Atención en salud primari, de acuerdo a los requerimientos de salud establecidos. Adicionalmente, asignar recurso humano de atención primaria (profesora) para este centro de salud. | 2218 | Solicitar certificados y permisos necesarios entidades y municipio. Certificado de sostenibilidad. Solicitar diseño con Comité de Impulso. Realizar estudios técnicos. Solicitar coordinación y apoyo entidades, municipio, gobernación y UARIV. Logística, agitación, inauguración y entrega de medida a la comunidad (acta, asistencia y registro fotográfico). Convocar a la comunidad y entidades. Seguimiento y monitoreo. | Suministro de materiales - Centro de Salud el Mohán | CONSTRUCCIÓN | \$ 20.968.694 |
| 92 | 23 | 2018 | QUINDIO | Génova | NE | 182 | MUNICIPIO DE GÉNOVA (CABECERA MUNICIPAL) | 28707 | Propiciar condiciones favorables para el desarrollo de actividades culturales, artísticas recreativas y deportivas que promuevan la participación activa de la comunidad y el buen uso del tiempo libre entre los miembros del colectivo y contribuyan al fortalecimiento del tejido social de la sociedad genovesa. | 28708 | Dotación necesaria para reactivar el Cine en la Casa de la Cultura, y que tenga la comunidad y el cual dejó de funcionar a causa de la presencia de actores armados y la desconfianza instaurada al interior de la comunidad. Además, de apoyar un Cine Foro con un ciclo de películas que aporten a la reflexión sobre los temas de paz y reconciliación. Dotación requerida: 1 Proyector o Video Beam, 1 Computador portátil con unidad de DVD, 1 Tán de proyección, 50 fillos de plástico y 20 mesas de plástico. | Suministro de materiales - Casa de la Cultura en Génova | CONSTRUCCIÓN | \$ 16.698.248 |
| 93 | 24 | 2018 | ANTIOQUIA | Aparadó | NE | 134 | LA CRISTA | 284 | Fortalecimiento de los escenarios políticos y de participación | 1709 | Adeuar la infraestructura comunitaria del parque "Sendero de la Reparación colectiva" | Suministro de materiales - Parque La Crista | CONSTRUCCIÓN | \$ 37.833.104 |
| 94 | 25 | 2018 | PUTUMAYO | Villagarzón | NE | 11 | CABECERA MUNICIPAL VILLAGARZON | 27361 | Construcción y dotación de un Centro de Formación Ciudadana para la formación en liderazgo y la participación política y ciudadana. | 27362 | Construir y dotar un espacio de integración y formación ciudadana | Dotación de mobiliario - Plaza Biblioteca Villagarzón | DOTACIÓN | \$ 77.481.708 |
| 95 | 26 | 2018 | CALDAS | Samaná | NE | 332 | CABECERA MUNICIPAL DE SAMANÁ | 76 | Implementar acciones que permitan la dignificación de las víctimas. | 1128 | Fortalecer (incluye la construcción de un Horno comunitario) el "BOSQUE DE LAS MEMORIAS EN HONOR A LAS VICTIMAS". | Suministro de materiales - Bosque de la Memoria en Samaná | CONSTRUCCIÓN | \$ 63.506.136 |
| 96 | 27 | 2018 | ANTIOQUIA | Dabeiba | NE | 104 | CENTRO POBLADO LA BALSITA | 272 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de emprendimiento. | 1666 | Adeuación y reparación de las porterías, arcos, iluminación, gradas, piso y enmallado en las canchas de las veredas Cochón, Chambacado, Murisbelo, La Balsita, La Palma, Chacabuel. | Suministro de materiales - Placa y ceramiento La Balsita | CONSTRUCCIÓN | \$ 78.952.369 |
| 97 | 28 | 2018 | NORTE DE SANTANDER | Tibú | NE | 330 | COMUNIDAD DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ | 16593 | Generar acciones que permitan el fortalecimiento organizacional de las asociaciones existentes en el casco urbano del Municipio de Tibú, en áreas de que pueden ejercer incidencia política y social en su territorio. | 16620 | Generar acciones que permitan el fortalecimiento organizacional de las asociaciones existentes en el casco urbano del Municipio de Tibú, en áreas de que pueden ejercer incidencia política y social en su territorio. | Dotación de mobiliario - Asociaciones de Tibú | DOTACIÓN | \$ 46.600.143 |
| 98 | 29 | 2018 | NARIÑO | Leiva | NE | 127 | EL PALMAR | 425 | Implementar acciones que propendan a la construcción de la memoria histórica y dignificación de las víctimas desde las perspectivas y visión del colectivo. | 2000 | Reconstrucción e mejoramiento de escenarios deportivos, principalmente de la cancha de fútbol de El Palmar | Suministro de materiales para reconstrucción de la cancha de fútbol el palmar | CONSTRUCCIÓN | \$ 245.657.726 |
| 99 | 30 | 2018 | BOGOTÁ D.C. | Bogotá D.C. | OMG | 282 | AFROMUPAZ | 870 | Fortalecimiento a la organización por medio de la adaptación de la Sede o Casa Cultural de AFROMUPAZ, en la que se desarrollen de forma continua las iniciativas productivas y culturales y los programas dirigidos a la comunidad (madres cabeza de hogar, Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores). | 2776 | Adeuación, adecuar y dotar un espacio físico para el funcionamiento de la sede o casa cultural de la organización, que le permita entre otras: Reactivación del espacio de memoria y lucha para Niños, Niñas y Adolescentes. Recuperación del comedor comunitario y las ferias productivas. Reactivación de programas dirigidos a las y los jóvenes. | Adaptación de una casa para el desarrollo de las prácticas colectivas y objetivos organizativos de AFROMUPAZ | ACTO ADMINISTRATIVO | \$ 262.000.000 |
| 100 | 1 | 2019 | SANTANDER | SIMACOTA | NE | 117 | LA COMUNIDAD DE SIMACOTA SECTOR BAJO | 365 | 4. Entrega de dotación de equipo biomédico y materiales para la adecuación del puesto de salud de la vereda El Guamo. | 1883 | 4. Entrega de dotación de equipo biomédico y materiales para la adecuación del puesto de salud de la vereda El Guamo. | Puesto de salud El Guamo | CONSTRUCCIÓN | \$ 69.833.708 |
| 101 | 2 | 2019 | SANTANDER | SIMACOTA | NE | 117 | LA COMUNIDAD DE SIMACOTA SECTOR BAJO | 382 | 21. Realizar por parte de la UARIV la entrega de los materiales para la adecuación del piso de la cancha del Guamo. | 1905 | 21. Realizar por parte de la UARIV la entrega de los materiales para la adecuación del piso de la cancha del Guamo. | Construcción de la placa en concreto para la cancha múltiple del colegio El Guamo del Municipio de Simacota Santander | CONSTRUCCIÓN | \$ 53.451.326 |
| 102 | 3 | 2019 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMÉZ | NE | 59 | EL PLACER | 242 | FACILITAR LA RECUPERACION DE LA CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL ESTADO. Recuperación de la institucionalidad (nivel del Estado Social de Derecho) a través de acciones y medidas tendientes a fortalecer la presencia permanente de las instituciones, con fundamento en el respeto y promoción de los derechos humanos, la capacidad de respuesta local para la garantía de derechos, la transformación de la cultura institucional, así como los mecanismos ciudadanos e institucionales de control y participación. | 1563 | Recuperación e intervención de la oficina de la inspección de policía. | Reparaciones de la oficina de la Inspección de Policía | CONSTRUCCIÓN | \$ 45.442.689 |
| 103 | 4 | 2019 | META | EL DORADO | NE | 204 | EL DORADO | 589 | a) Reconstruir la vía de acceso a la vereda de Cacho Amarillo. | 2357 | a) Reconstruir la vía de acceso a la vereda de Cacho Amarillo. | Construcción de placa huella | CONSTRUCCIÓN | \$ 422.838.742 |
| 104 | 5 | 2019 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | NE | 58 | LA DORADA | 28066 | Propiciar espacios de formación y fortalecimiento en liderazgo político y/o social que permita reinar liderazgos, generar participación | 28067 | Fortalecer la casa de la cultura de Puerto Colón mediante dotación de mobiliario y elementos tecnológicos. | MOBILIARIO SPAE CASA DE LA CULTURA PUERTO COLON | DOTACIÓN | \$ 53.493.274 |

\$ 3.379.812.828

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----------|-------------------|----|-----|--|-------|---|-------|---|--|--------------|-------------------|
| 105 | 6 | 2019 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | NE | 59 | EL PLACER | 242 | FACILITAR LA RECUPERACION DE LA CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL ESTADO Recuperación de la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho a través de acciones y medidas tendientes a fortalecer la presencia permanente de las instituciones, con énfasis en el respeto y promoción de los derechos humanos, la capacidad de respuesta local para la garantía de derechos, la transformación de la cultura institucional, así como los mecanismos ciudadanos e institucionales de control y participación. | 1563 | Recuperación e intervención de la oficina de la inspección de policía. | PROYECTO DOTACION DE MOBILIARIO OFICINA INSPECCION DE POLICIA SRC EL PLACER | DOTACIÓN | \$ 6.374.057 |
| 106 | 7 | 2019 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | NE | 10 | CABECERA MUNICIPAL PUERTO CAICEDO | 27040 | Facilitar la creación y/o fortalecimiento de las unidades de negocios orientadas a generar ingresos, empleo y autoempleo, priorizando organizaciones de mujeres, grupo de jóvenes, discapacitados y población en general. | 27043 | Fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento, asociaciones y organizaciones productivas orientadas a generación de empleo y autoempleo, priorizando la población mujeres, jóvenes, adultos mayores y discapacitados. | PROYECTO DOTACION MOBILIARIO ASOCIACIONES DE MUJERES SRC PUERTO CAICEDO | DOTACIÓN | \$ 50.673.882 |
| 107 | 8 | 2019 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | NE | 10 | CABECERA MUNICIPAL PUERTO CAICEDO | 27035 | Fortalecimiento de espacios para la memoria histórica. | 27036 | Dotación de mobiliario y equipos tecnológicos para espacios de promoción de la memoria histórica. | Dotación de mobiliario para el Centro de Convivencia de Puerto Caicedo | DOTACIÓN | \$ 49.427.590 |
| 108 | 9 | 2019 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | NE | 103 | CABECERA MUNICIPAL DE COCORNÁ | 80 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de abodeo/arrollo. | 1143 | Adecuación a la infraestructura y dotación al hogar juvenil campesino. | Dotar con mobiliario el hogar juvenil campesino | DOTACIÓN | \$ 44.614.336 |
| 109 | 10 | 2019 | CHOCÓ | ACANDÍ | E | 36 | RESGUARDO CHIDMA TOLÓ - EMBERA KATIOS | 30968 | Restitución | 30969 | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | CONSTRUCCIÓN | \$ 183.497.815,10 |
| 110 | 11 | 2019 | CHOCÓ | ACANDÍ | E | 37 | RESGUARDO PESCAIDO - EMBERA DOBIDA | 31026 | Restitución | 31027 | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | CONSTRUCCIÓN | \$ 183.497.815,10 |
| 111 | 12 | 2019 | CHOCÓ | BAGADÓ | E | 183 | RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA | 31275 | Satisfacción | 31283 | Adecuar y dotar 4 (Tambos) colectivos comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias del pueblo embera katio, palabros, balles, actividades de cartas, prácticas de medicina ancestral del pueblo katio, reuniones institucionales y demás. Uno (1) en cada una de las cuatro (4) zonas que conforman el resguardo. | Adecuar y dotar 4 (Tambos) colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias del pueblo embera katio, palabros, balles, actividades de cartas, prácticas de medicina ancestral del pueblo katio, reuniones institucionales y demás. Uno (1) en cada una de las cuatro (4) zonas que conforman el resguardo. | CONSTRUCCIÓN | \$ 733.991.260,39 |
| 112 | 13 | 2019 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | E | 236 | CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA | 29815 | Restitución | 29824 | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arboleda. A. Adecuación de aulas, restaurante escolar y unidad sanitaria. | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arboleda. B. Dotación tecnológica de las aulas escolares. | CONSTRUCCIÓN | \$ 12.669.713,09 |
| 113 | 14 | 2019 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | E | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUI | 31223 | Restitución | 31233 | Apoyo al mejoramiento y reacondicionamiento de los senderos en pafellos que conectan las casas de la comunidad y el acceso a el centro de salud y las instituciones educativas. | Apoyo el mejoramiento y reacondicionamiento de los senderos en pafellos que conectan las casas de la comunidad y el acceso a el centro de salud y las instituciones educativas. | CONSTRUCCIÓN | \$ 239.441.527,14 |
| 114 | 15 | 2019 | CAUCA | JAMBALÓ | E | 331 | COMUNIDAD INDIGENA NASA DEL RESGUARDO JAMBALÓ | 29721 | Restitución | 29741 | Crear el Banco de semillas propias a través de la investigación y construcción de un inventario que conserve las propiedades de las semillas que se estaban desapareciendo por la dinámica del conflicto armado. | Construcción banco de semillas del Resguardo Jambaló | CONSTRUCCIÓN | \$ 5.256.702,39 |
| 115 | 16 | 2019 | CHOCÓ | UNGUÍA | E | 39 | RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS | 28446 | Restitución | 28448 | Construir y dotar un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como mingas, palabros, balles, actividades de cartas, prácticas de medicina propia, reuniones institucionales y demás. | Construir y dotar un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como mingas, palabros, balles, actividades de cartas, prácticas de medicina propia, reuniones institucionales y demás. | CONSTRUCCIÓN | \$ 183.497.815,10 |
| 116 | 17 | 2019 | CHOCÓ | BOJAYÁ | E | 414 | COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DOBIDA DE BOJAYÁ | 31302 | Restitución | 31316 | Adecuar y dotar, por cada zona, un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas de medicina propia. CAMARÓ (Comunidad de Inari) DRUJA WANDRA (Comunidad Puro Centro) ACRUPU(Comunidad Tagua) | Adecuar y dotar, por cada zona, un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas de medicina propia. CAMARÓ (Comunidad de Inari) DRUJA WANDRA (Comunidad Puro Centro) ACRUPU(Comunidad Tagua) | CONSTRUCCIÓN | \$ 500.493.445,26 |
| 117 | 18 | 2019 | CHOCÓ | BOJAYÁ | E | 186 | COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA | 30494 | Restitución de capacidades organizativas, comunitarias y políticas. | 30502 | Fortalecer el Comité Dos de Mayo a través de dotación de mobiliario. | Fortalecer el Comité Dos de Mayo a través de dotación de mobiliario. | DOTACIÓN | \$ 43.961.978,05 |
| 118 | 19 | 2019 | BOLÍVAR | MAHATES | E | 125 | PALENQUE DE SAN BASILIO - LA BONGA | 31167 | Restitución | 31169 | Adecuación, mejoramiento y dotación de mobiliario escolar a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de San Basilio de Palenque de la Institución educativa y sus sedes (según reporte secretaria de educación municipal) | Adecuación, mejoramiento y dotación de mobiliario escolar a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de San Basilio de palenque de la Institucion educativa y sus sedes (segun reporte secretaria de educacion municipal) | DOTACIÓN | \$ 6.831.102,52 |
| 119 | 20 | 2019 | BOLÍVAR | MAHATES | E | 125 | PALENQUE DE SAN BASILIO - LA BONGA | 31167 | Restitución | 31177 | Mejoramiento de la infraestructura y dotación del Jardín Comunitario de San Basilio de Palenque, sector La Bonga que permita contar con un lugar que garantice el encuentro comunitario | Mejoramiento de la infraestructura y dotación del jardín comunitario de San Basilio de Palenque, sector La Bonga que permita contar con un lugar que garantice el encuentro comunitario | DOTACIÓN | \$ 56.788.318,76 |
| 120 | 21 | 2019 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARÉN | E | 145 | CIENCAS DE JOLIAMANDO | 31100 | Satisfacción | 31105 | Apoyar la revitalización y dotación de la casa de los ancestros. | Apoyar la revitalización y dotación de la casa de los ancestros. | DOTACIÓN | \$ 7.533.934,25 |
| 121 | 22 | 2019 | CHOCÓ | UNGUÍA | E | 146 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO - COCOMANGUIA | 31202 | Restitución | 31207 | Dotar con mobiliario comunitario el centro social comunitario con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna. Esta dotación incluirá el manejo necesario para los encuentros comunitarios. | Dotar con mobiliario comunitario el centro social comunitario con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna. Esta dotación incluirá el manejo necesario para los encuentros comunitarios. | DOTACIÓN | \$ 40.711.893,75 |
| 122 | 23 | 2019 | CHOCÓ | BAGADÓ | E | 183 | RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA | 31274 | Restitución | 31285 | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de la comunidad, y apoyar el fortalecimiento de la construcción de espacio intergeneracionales con fines de recuperar la memoria como pueblo embera katio. | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de la comunidad, y apoyar el fortalecimiento de la construcción de espacio intergeneracionales con fines de recuperar la memoria como pueblo embera katio. | DOTACIÓN | \$ 19.967.474,88 |
| 123 | 24 | 2019 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | E | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUI | 31223 | Restitución | 31224 | Adecuación y dotación de mobiliario para las casa comunitaria, como aporte al fortalecimiento de la gobernabilidad. | Adecuación y dotación de mobiliario para las casa comunitaria, como aporte al fortalecimiento de la gobernabilidad. | DOTACIÓN | \$ 11.104.467,26 |
| 124 | 25 | 2019 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | E | 226 | CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ- CONSEJOS COMUNITARIOS VILLAGRANDE, LA ESPERANZA Y CHAPARROSA | 31050 | Satisfacción | 31076 | 22. Mejoramiento y dotación de las 3 escuelas | Fortalecer los comités juveniles a través de asistencia / capacitación técnica y dotación en materiales tecnológicos y de comunicaciones | DOTACIÓN | \$ 3.214.636,48 |
| 125 | 26 | 2019 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | E | 226 | CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ- CONSEJOS COMUNITARIOS VILLAGRANDE, LA ESPERANZA Y CHAPARROSA | 31054 | Restitución | 31068 | El. Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrosa y Villagrande. | Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrosa y Villagrande. | DOTACIÓN | \$ 27.970.365,20 |
| 126 | 27 | 2019 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | E | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUI | 31223 | Restitución | 31232 | Suministro material y dotación de dos espacios comunitarios de practicas culturales, uno para los adultos mayores y el otro para las mujeres. | Suministro material y dotación de dos espacios comunitarios de practicas culturales, uno para los adultos mayores y el otro para las mujeres. | DOTACIÓN | \$ 2.815.579,12 |

\$ 3.419.893.644

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------|---------|--------|-----|----|---|-----|---|------|--|--|--------------|--------------------------|
| 127 | 28 | 2019 | BOLÍVAR | SIMITI | OMG | 42 | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL HOGAR JUVENIL DE MONTERREY | 654 | 1. Implementar la Estrategia Reparación con sentido del ICEP, para 60 NNA del Hogar Juvenil de Monterrey durante primer año de ejecución del plan. A través de tres (03) talleres de formación dirigidos a niñas, niños y adolescentes. | 2463 | 7. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura donde se encuentra ubicado el Hogar Juvenil de Monterrey. | Suministrar materiales de construcción para la construcción del Hogar Juvenil de Monterrey (Simil-Bolívar) | CONSTRUCCIÓN | \$ 218.427.591 |
| 128 | 29 | 2019 | BOLÍVAR | SIMITI | OMG | 42 | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL HOGAR JUVENIL DE MONTERREY | 654 | 1. Implementar la Estrategia Reparación con sentido del ICEP, para 60 NNA del Hogar Juvenil de Monterrey durante primer año de ejecución del plan. A través de tres (03) talleres de formación dirigidos a niñas, niños y adolescentes. | 2463 | 7. Gestionar el mobiliario del Hogar Juvenil de Monterrey. - Construcción hogar juvenil | Dotar mobiliario para el Hogar Juvenil de Monterrey (Simil-Bolívar) | DOTACIÓN | \$ 105.524.298 |
| TOTAL INVERSIÓN SRC | | | | | | | | | | | | | | \$ 13.818.697.611 |

ANEXO 15. Anexo 5 de segundo informe parcial de práctica



El futuro
es de todos

Unidad con la información
y el conocimiento
a los servicios

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: 710.14.15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 03

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SIG

Fecha: 18/02/2019

Página 3 de 3

No. de Acta:

Fecha de Reunión: 29-08-19

Objetivo: Jornada de capacitación Diagnóstico del daño

| No. | Nombre | * Género M/F | ** Etnia A/I/G/NA | Entidad o Dependencia | E-mail | Teléfono | Firma |
|-----|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| 1 | Diana M Pedraza P | F | NA | Sub de Rep Colectivo - No Etnico | diana.pedraza@ | 3112008642 | |
| 2 | Daniela Jimeno Solarte | F | N/A | Dirección de Represión | daniela.jimeno@ | 3732623340 | |
| 3 | Miguel José Acosta Díaz | M | N/A | Sub de Rep. Colectivo | miguel.acosta@ | 3112535971 | |
| 4 | Caterine Milano | F | NA | Sub Rep Colectivo OG | caterine.milano@ | 3202937240 | |
| 5 | Julian Cabra | M | N/A | SR C | Julian.cabra@ | 3105977772 | |
| 6 | Paola Moreno | F | NA | SRC | paola.moreno@ | 314398207 | |
| 7 | Alejandro Jaramillo C | M | N/A | Subdirección R.C | alejandra.jaramillo@ | 7202430223 | |
| 8 | Catalina Velásquez Millán | F | N/A | SRC - Etnico | catalina.velasquez@ | 3132259809 | Catalina V. |
| 9 | Jairo Alvaro Segura Pulido | M | N.A. | Sub de Rep. Colectiva | jairo.segura@ | 3124703781 | |
| 10 | Andrea Camacho | F | N/A | Dirección Represión | andrea.camacho@ | 3212957336 | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

* Género: M: Masculino / F: Femenino

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA: No aplica

ANEXO 16. Tercer informe parcial de práctica

TERCER INFORME PARCIAL DE PASANTÍA EN LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

| | |
|--|--|
| Nombres completo del practicante | Jairo Alonso Segura Pulido |
| Documento de identidad del practicante | 1023917216 |
| Institución de Educación Superior | Universidad Antonio Nariño |
| Programa académico | Ingeniería Civil |
| Entidad pública donde desarrolla la práctica | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas |
| Caja de Compensación Familiar | Compensar |
| Objetivo general de la práctica | Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad |
| Duración de la práctica | (5) meses |
| Número de informe | 3 (Octubre de 2019) |

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|---|
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 57,89 % | Archivo .xlsx con la determinación de cantidades de pintura requerida para el desarrollo de proyecto de reparación colectiva en escuelas de San Basilio de Palenque, Bolívar | ANEXO 1 |
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 66,66 % | No se generó producto para el mes de octubre, dado que en este mes no se contempló el desarrollo de esta actividad | Se informan las modificaciones a las que está sujeta la programación de esta actividad en el plan de practica |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 57,89 % | Carpetas de archivos .xlsx con organización documental de "formatos de coordinación de entrega" y "actas de entrega" a satisfacción de proyectos de reparación colectiva implementados en el año 2019. Carpets de archivos .xlsx con organización documental de soportes jurídicos y técnicos que sustentan la viabilidad para ejecución de proyectos de reparación colectiva desarrollados en el | ANEXO 2 |


| | | | |
|--|---------|--|-----------------------------------|
| | | año 2019. Carpetas de archivos .xlsx con organización documental de proyectos del año 2018 | |
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 57,89 % | Archivo .xlsx con complementación de la matriz "Estado de remisión proyectos de Infraestructura". Informe en archivo .xlsx con el resumen de estado documental de proyectos de infraestructura del año 2019. | ANEXO 3 |
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 50% | No se generó producto para el mes de octubre, dado que en este mes no se contempló el desarrollo de esta actividad | Se informó en el plan de practica |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 57,89 % | Archivo .xlsx con la determinación de cantidades de materiales de obra requeridos para la construcción de baterías sanitarias en escuela de Kanalitojo, Vichada | ANEXO 4 |

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA

| ITEM | ACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MESES Y SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Meses del año 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | | | | | | | | |
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | | | | | |
| 1 | Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 57,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 33,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 57,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 57,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 57,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: La tarea de creación de carpetas de archivos .xlsx con organización documental de proyectos del año 2018, correspondiente al ítem 3 del cronograma de actividades se realizó hasta el día 22 de Octubre, y se suspendió su ejecución dado que el pasante a partir del 23 de Octubre apoyará la gestión del grupo financiero de la subdirección de reparación colectiva.

APRUEBAN



JUANITA IBÁÑEZ SANTAMARÍA
TUTOR DE PRÁCTICA
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS




JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO
PRACTICANTE
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



ALEXANDRA MORALES
SUPERVISOR DE PRÁCTICA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ANEXO 17. Anexo 1 de tercer informe parcial de práctica


COLEGIO DE BACHILLERATO BENKO BIOJO PALENQUE

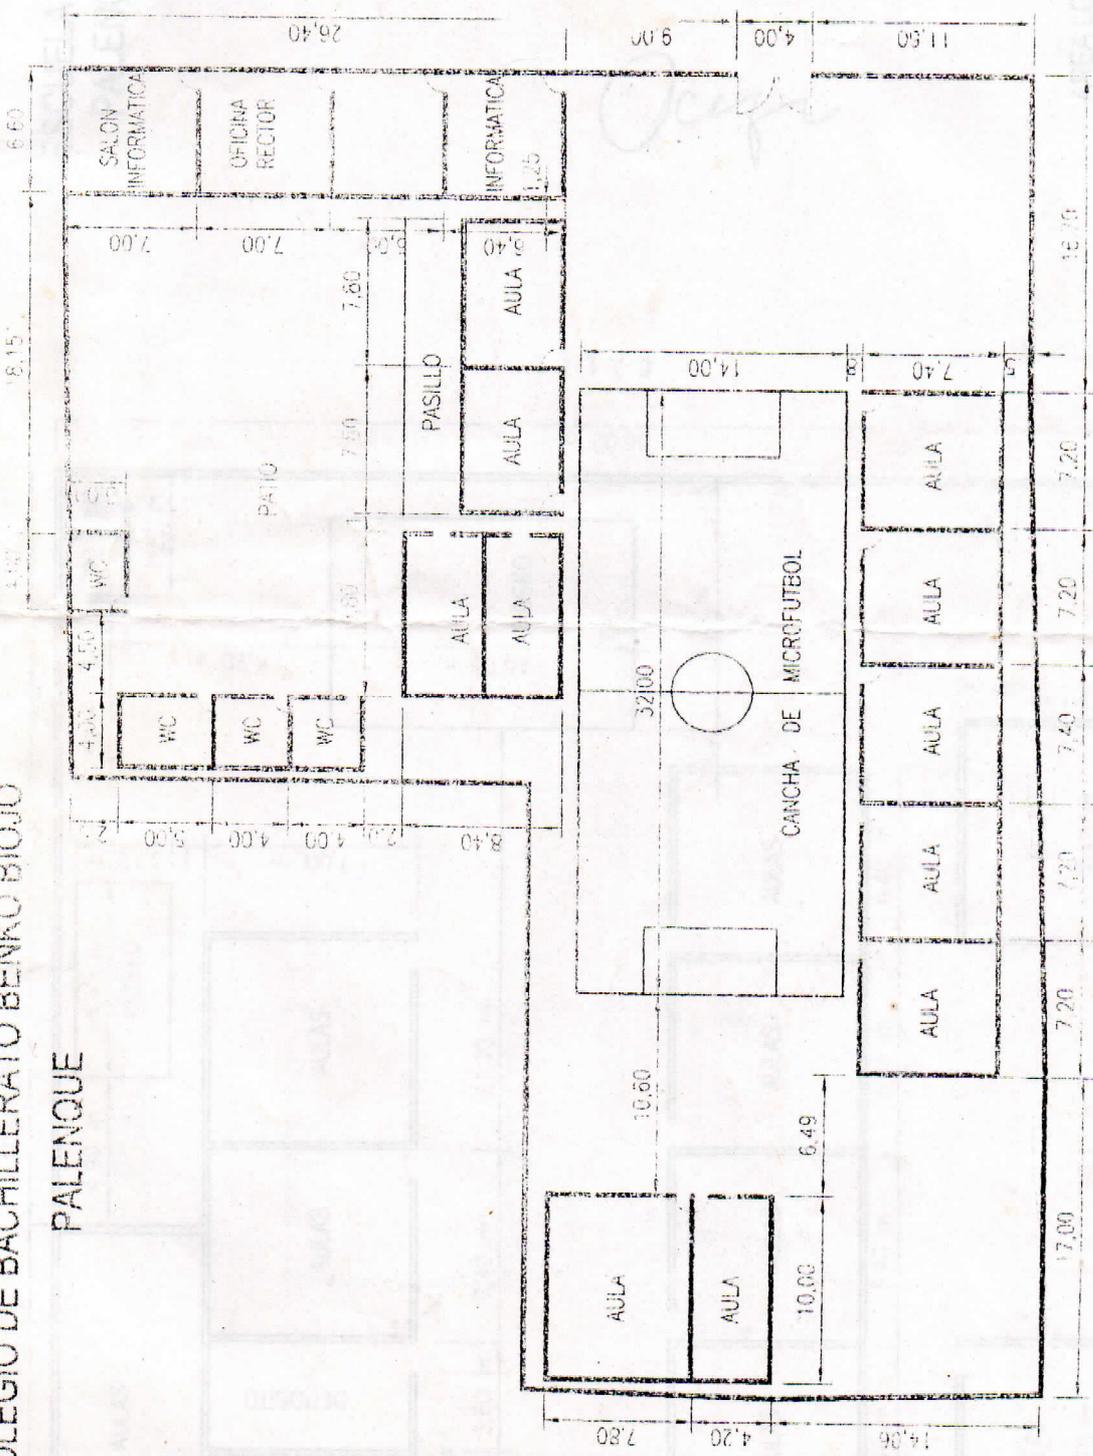

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|------------|
| ALCALDIA DE MIRAFLORES | PROYECTO: | FECHA: | PLANO NO.: |
| FRANCISCO MORENO GALVIS | ESTUDIO DE PRELIMINARES | OCT. DE 2000 | 1 |
| SECRETARIA DE PLANEACION | DISEÑO | CONTENIDO | ESCALA |
| ANIBAL CARRASCAL LUNA | MAG. ANTONIO E. FUENTES | BACHILLERATO BENKO BIOJO - PALENQUE | 1:400 |

AREA LOTE = 2677.28 m²
 AREA CONSTRUIDA = 1265.16 m²

CALLE PRINCIPAL

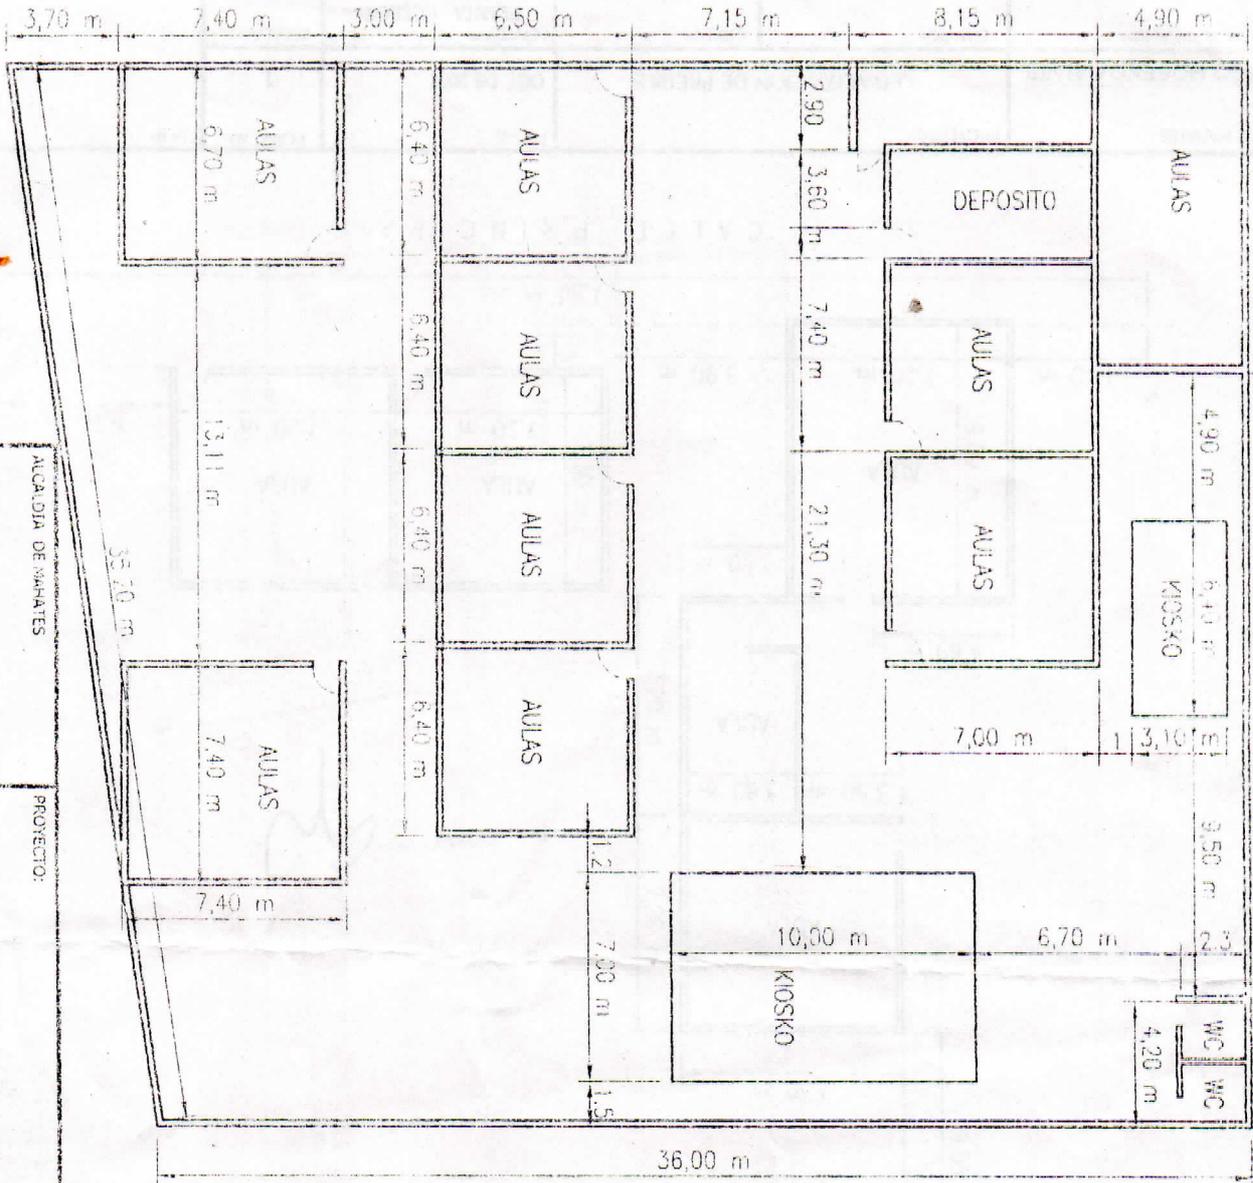

10.30 m
ALEJANDRO OMAÑA 5.07 m

CALLE


ESCUELA MIXTA
PALENQUE

Over

AREA LOTE = 1177.92 m²
AREA CONSTRUIDA = 562.32 m²

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| ALCALDIA DE MANATES | PROYECTO: | URBANIZACION DE PIEDROS | FECHA: | PLANO No. | Vº Bº |
| FRANCISCO MORENO GALVIS | SECRETARIA DE PLANEACION | DEPARTO | OCT. DE 2003 | 1 | ING. PEDRO VILLAF |
| ERASCAL TENA | ING. ANTONIO E. FUENTES | DIBUJO: | CONTIENE | ESCALA: | |
| | | MARIA | PLANTA | 1 : 200 | |
| | | | ESCUELA MIXTA | | |
| | | | PALENQUE | | |

COLEGIO DE PRIMARIA BENKO BIOJO PALENQUE

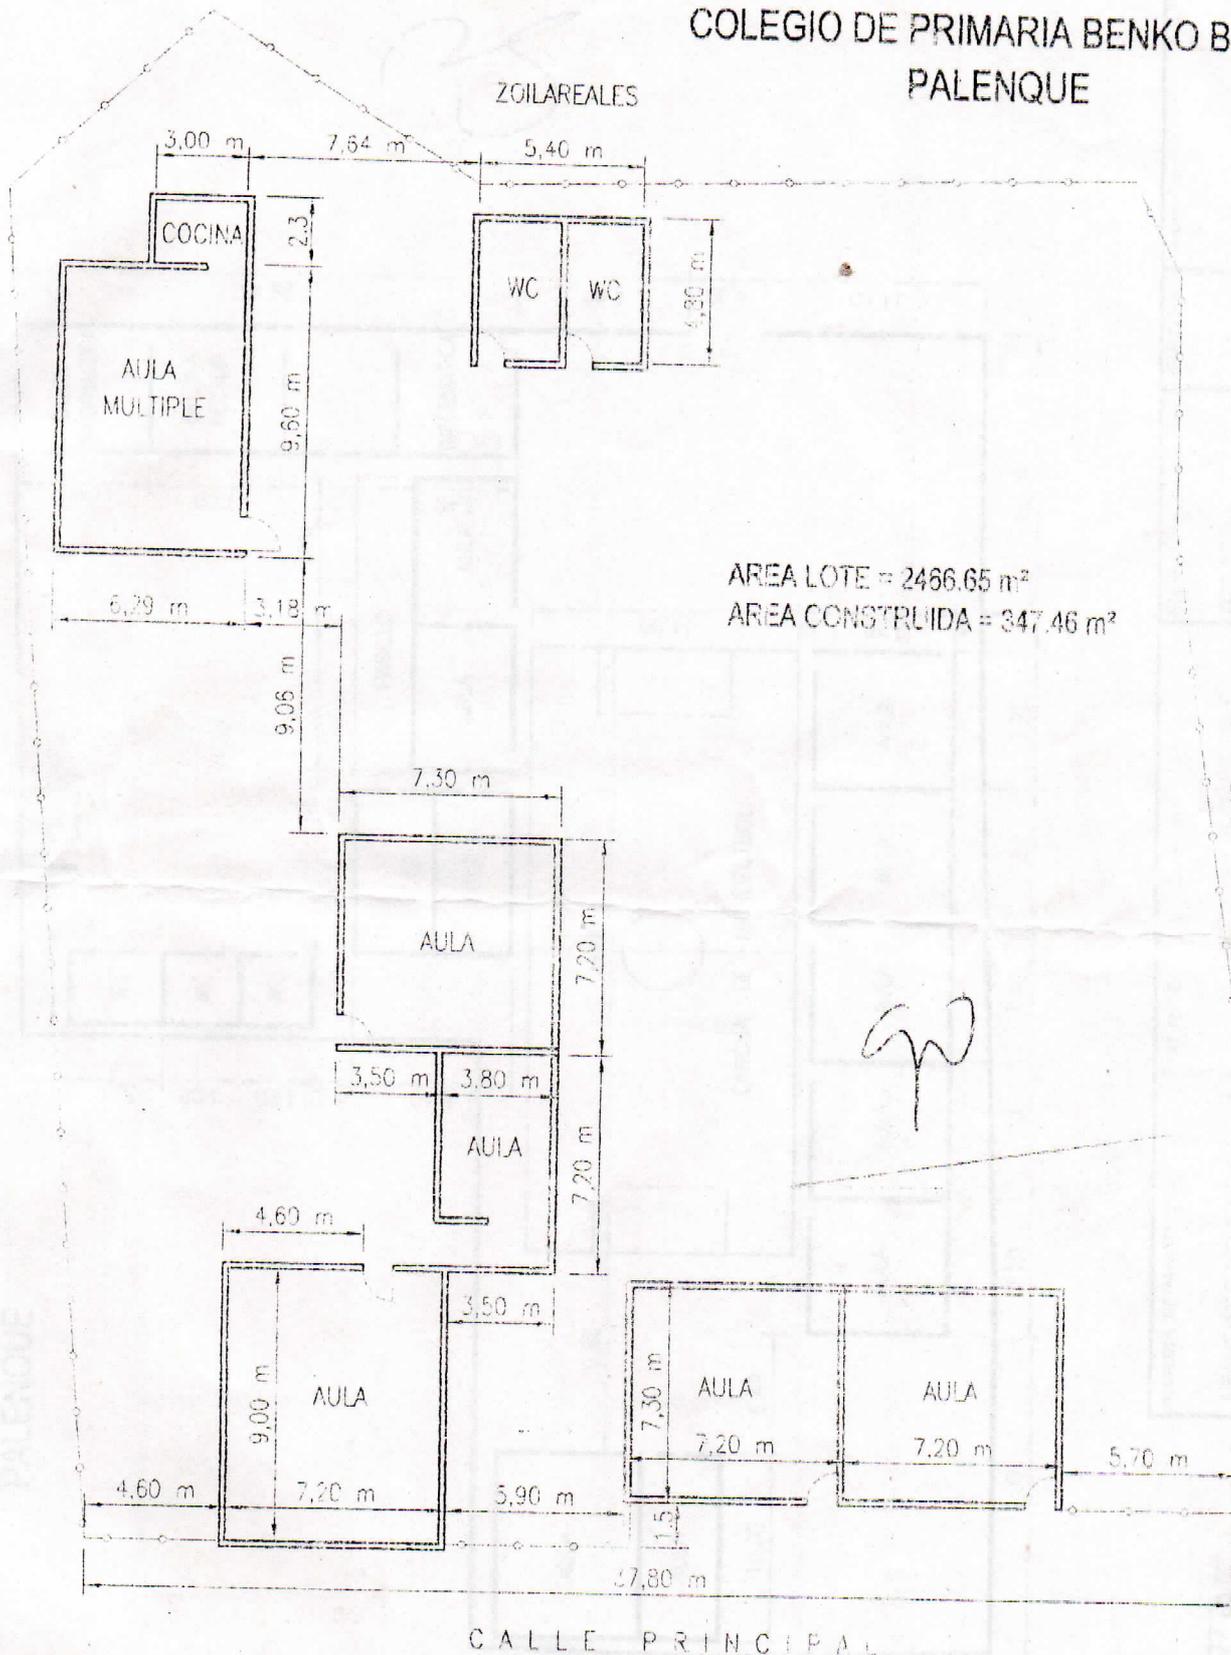

AREA LOTE = 2466.65 m²
 AREA CONSTRUIDA = 347.46 m²


MANUEL HERNANDEZ

PALENQUE

CALLE PRINCIPAL

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------------|
| ALCALDIA DE MAHATES | PROYECTO: | FECHA: | PLANO No. | vº bº |
| FRANCISCO MORENO GALVIS | LEGALIZACION DE PREDIOS | OCT. DE 2003 | 1 | |
| SECRETARIA DE PLANEACION | LEVANTO: | DIBUJO: | CONTIENE: | ESCALA: |
| ANIBAL CARRASCAL LUNA | ING. ANTONIO E. FUENTES | MARIA GONZALEZ A. | PLANTA - COLEGIO PRIMARIA - BENKO BIOJO PALENQUE | 1 : 250 |
| | | | | ING. PEDRO VILLAFANE |


Calle.

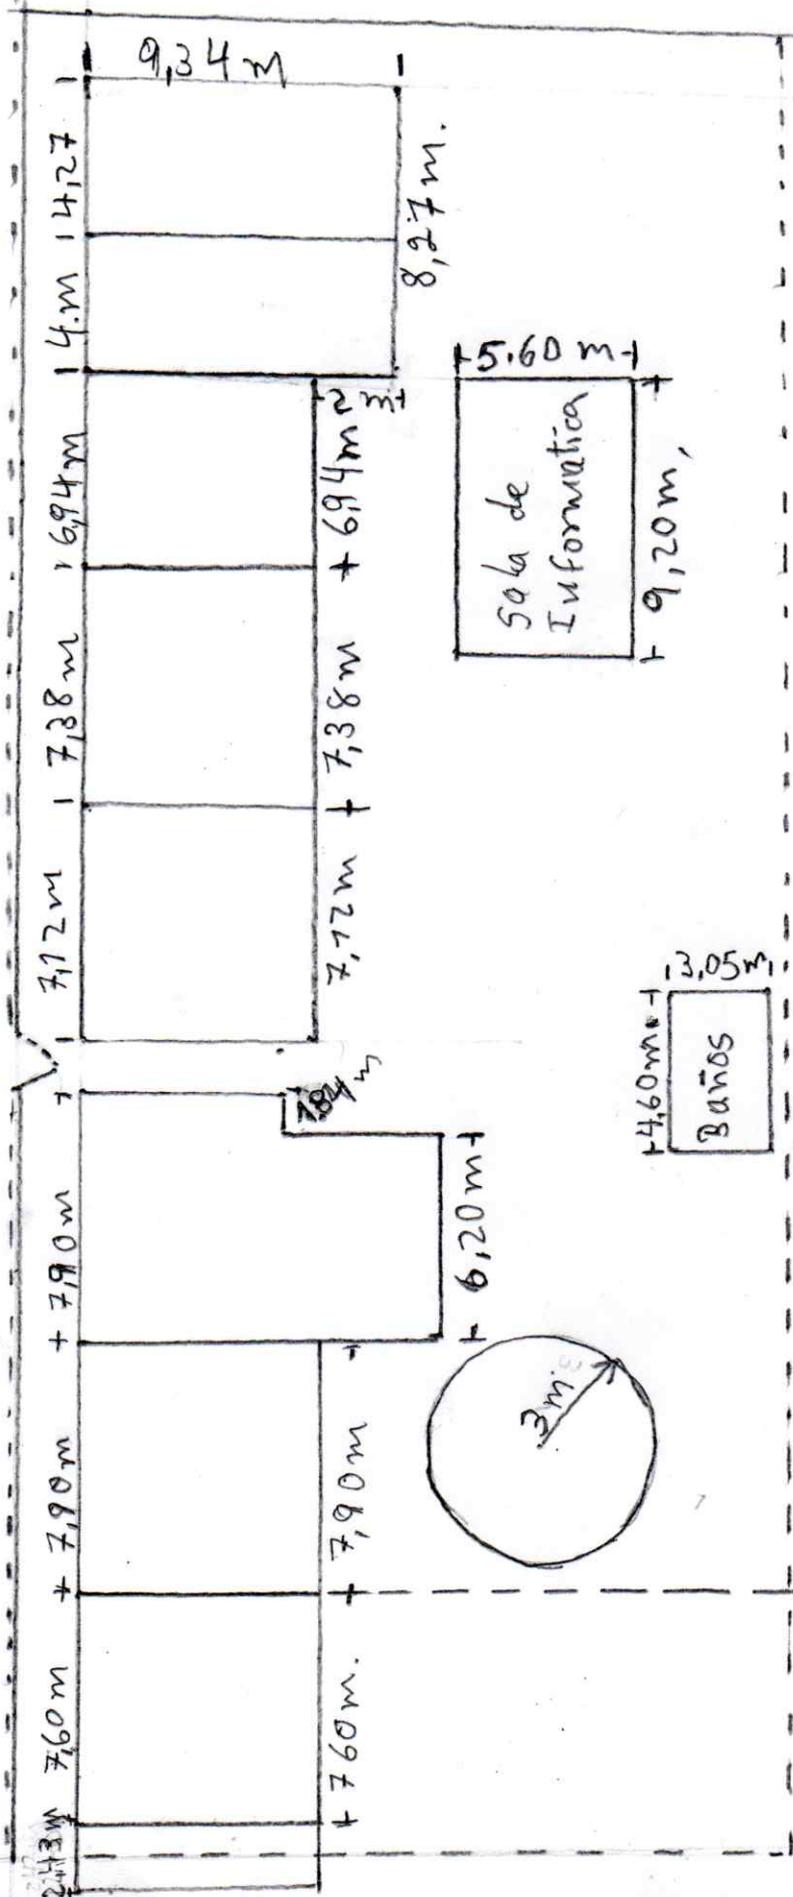

Altura: 3,20 m.

Sede Primero de Julio.

San Juan de los Rios

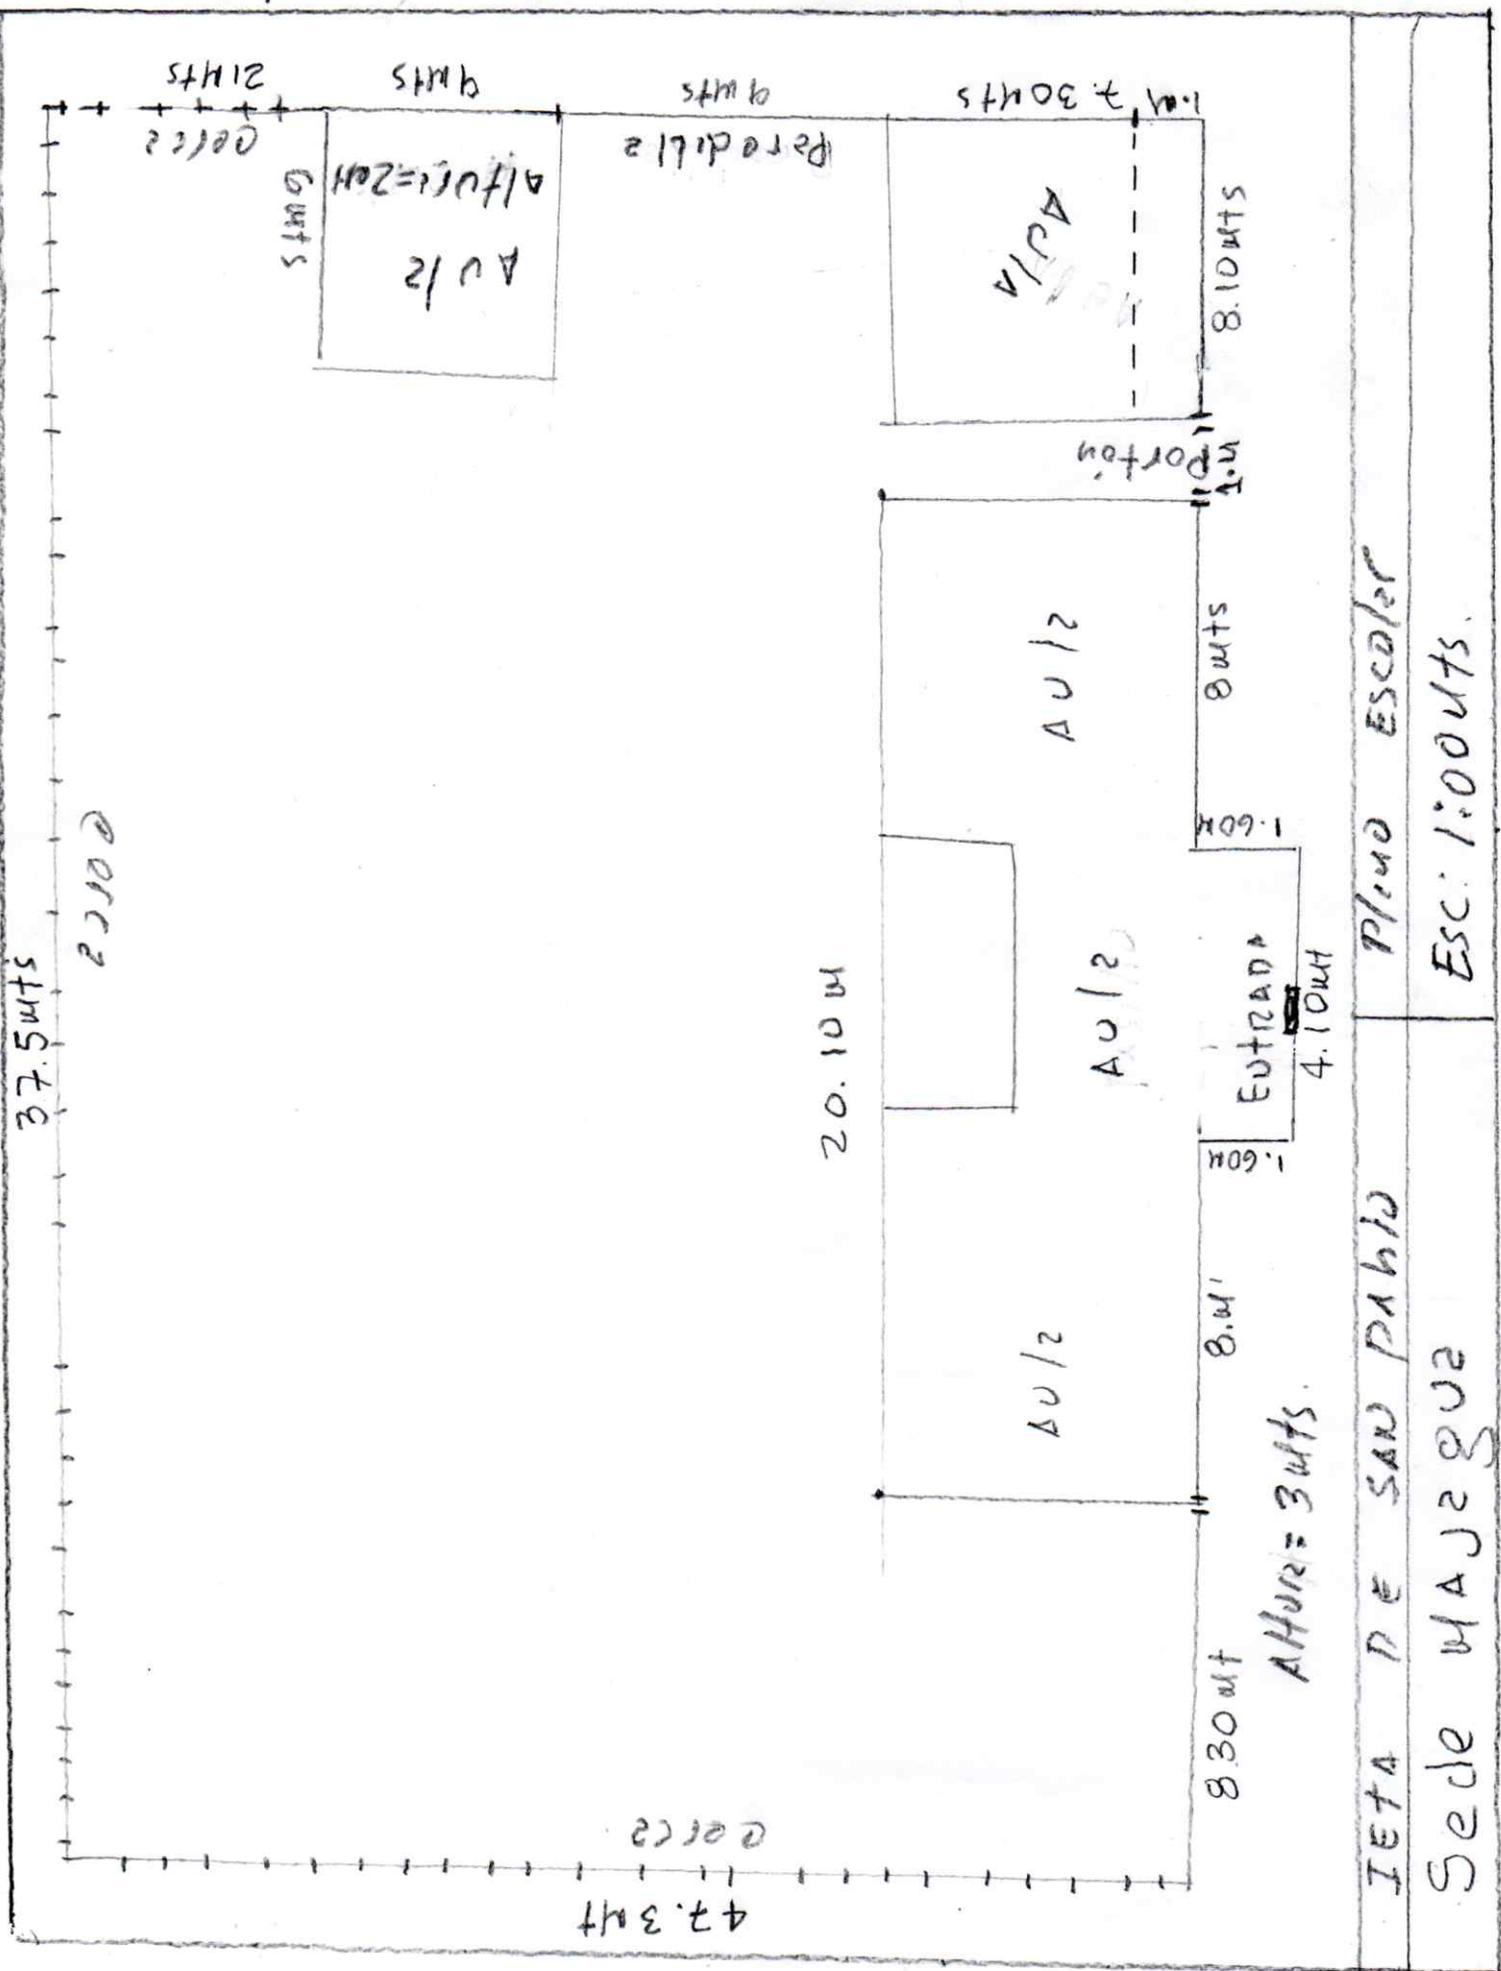

Plano Escalera

IETA DE SAN PABLO


Esc: 1:00mts.

Sede MAJEGUA

ESCUELA PARAISO

JULIO HURTADO

21.00

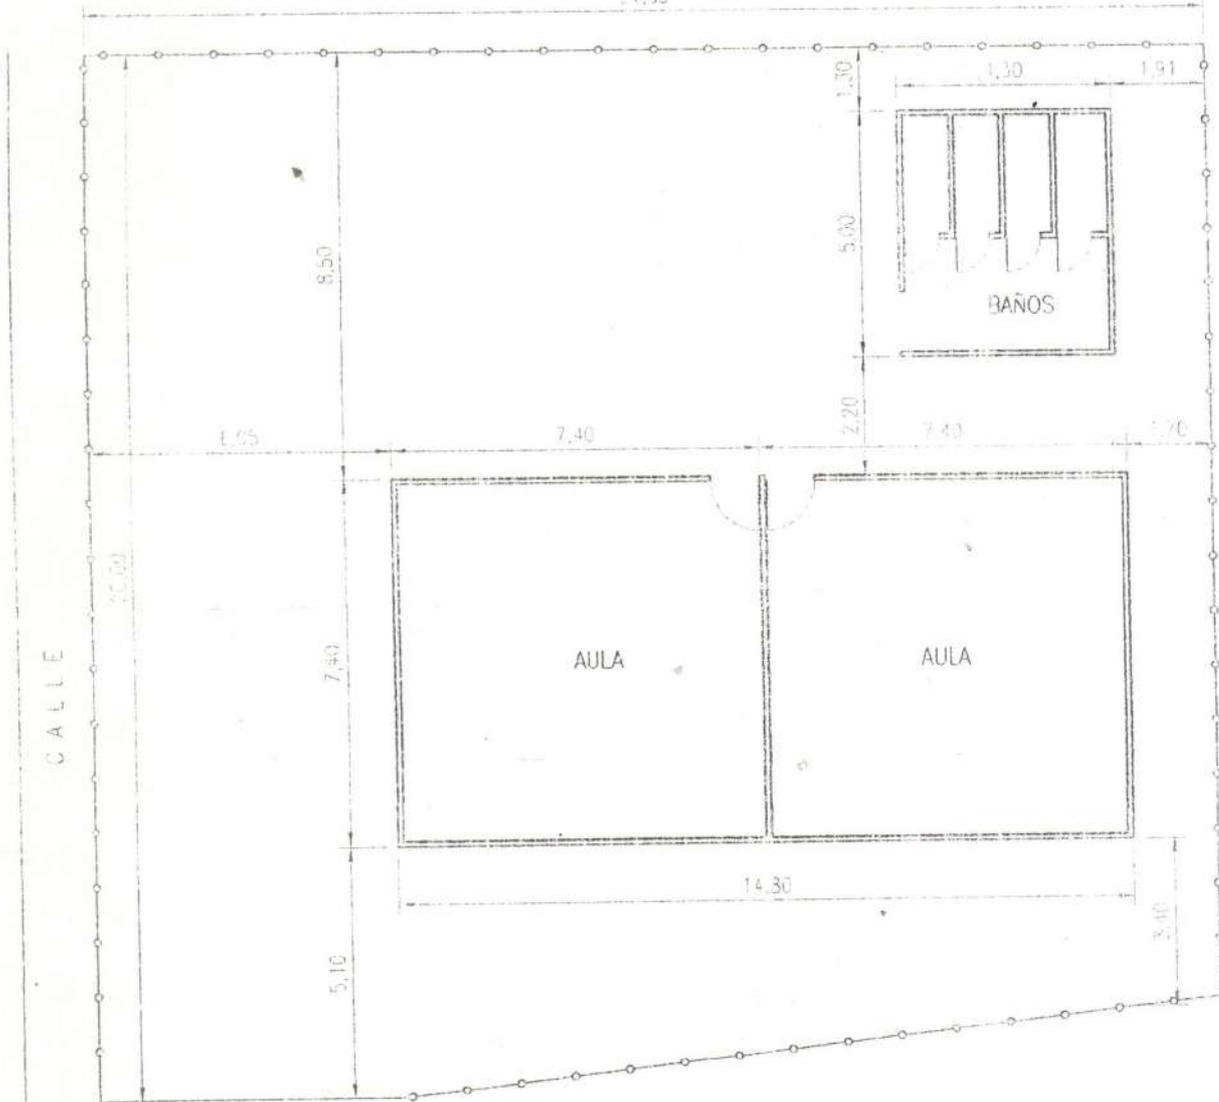



JULIO HURTADO

CALLE CANTERA


AREA LOTE = 420 m²
 AREA CONSTRUIDA = 131.02 m²

Handwritten signature

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| ALCALDIA DE MAHATES | PROYECTO: | FECHA: | PLANO No | 1° B° |
| FRANCISCO MORENO GALVIS | LEGALIZACION DE PREDIOS | OCT. DE 2003 | 1 | |
| SECRETARIA DE PLANSACION | LEVANTO: | DIRUJO: | CONTIENE: | ESCALA: |
| ANIBAL CARRASCAL LUNA | ING. ANTONIO E. FUENTES | MARIA GONZALEZ A. | PLANTA ESCUELA PARAISO | 1:150 |
| | | | | ING. PEDRO VILLAFANE |



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROINDUSTRIAL DE SAN PABLO
SEDE PRINCIPAL



COLEGIO TODO SONRISA MANDINGA

JUAN MANUEL CASTAÑO



11.50 m

7.45 m

LOTE

AREA LOTE = 185.9 m²
AREA CONSTRUIDA = 55.51 m²

ANIDEN

7.45 m

16.17 m

JUAN MANUEL
CASTAÑO

11.50 m

CAPRETERA

JUAN MANUEL
CASTAÑO

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ALIA DE MAHATES | PROYECTO: | FECHA: | PLANO No. | 1 ^o B ^o |
| OSCO MORENO GALVIS | LEGALIZACION DE PREDIOS | OCT. DE 2003 | 1 | |
| STA DE PLANERACION | DESARROLLO: | DIBUJO: | CONTIENE: | ESCALA: |
| | ING. ANTONIO E. JIMENEZ | MARIA GONZALEZA | PLANTA - COLEGIO TODO SONRISA | 1:100 |
| | | | | ING. PEDRO VILLAFANE |

| RECINTO | LONG. MUROS (M) | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANECAS) | |
|------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------------|---------|
| | INTERNOS | EXTERNOS | | | | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA |
| AULAS-ENTRADA | 82,2 | 58 | 3 | 246,6 | 174 | 25 | 15 | 9,9 | 11,6 | 2,0 | 2,3 |
| AULA-PÓRTON | 47 | 30,8 | 3 | 141 | 92,4 | 25 | 15 | 5,6 | 6,2 | 1,1 | 1,2 |
| AULA | 30 | 30 | 2 | 60 | 60 | 25 | 15 | 2,4 | 4,0 | 0,5 | 0,8 |
| PARED PERIMETRAL | | 34,6 | 3 | | 103,8 | | 15 | | 6,9 | | 1,4 |
| TOTALES | | | | | | | | 17,9 | 28,7 | 3,6 | 5,7 |

CERRAMIENTO EN CERCA

| CANTIDAD CON DERPERDICIO | 18,80 | 30,11 | 3,76 | 6,02 |
|--------------------------|-------|-------|------|------|
|--------------------------|-------|-------|------|------|

EN INTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos. | | |

| RECINTO | LONG. MUROS (M) | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA (M2/GALON) | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANECAS) | |
|------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------|------------------------------|------------|
| | INTERNOS | EXTERNOS | | | | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA |
| BLOQUE IZQ. | 128,94 | 80,94 | 3,2 | 412,608 | 259,008 | 25 | 15 | 16,5 | 17,3 | 3,3 | 3,5 |
| BLOQUE DER. | 140,82 | 78,1 | 3,2 | 450,624 | 249,92 | 25 | 15 | 18,0 | 16,7 | 3,6 | 3,3 |
| AREA CIRCULAR | 28,27 | 28,27 | 3,2 | 90,47786842 | 90,47786842 | 25 | 15 | 3,6 | 6,0 | 0,7 | 1,2 |
| SALA INFORMATICA | 29,6 | 29,6 | 3,2 | 94,72 | 94,72 | 25 | 15 | 3,8 | 6,3 | 0,8 | 1,3 |
| BAÑOS | 15,3 | 15,3 | 3,2 | 48,96 | 48,96 | 25 | 15 | 2,0 | 3,3 | 0,4 | 0,7 |
| TOTALES | | | | | | | | 43,9 | 49,5 | 8,8 | 9,9 |

CERRAMIENTO EN CERCA

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| CANTIDAD CON DERPERDICIO | 46,09 | 52,02 | 9,22 | 10,40 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|

EN INTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos. | | |

| RECINTO | COMPUESTO POR | LONG. MUROS (M) | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA (M2/GALON) | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANECAS) | |
|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------|------------------------------|------------|
| | | INTERNOS | EXTERNOS | | | | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA |
| BLOQUE 1 | COCINA-AULA MULT. | 42,4 | 36,4 | 3,2 | 135,68 | 116,48 | 25 | 15 | 5,4 | 7,8 | 1,1 | 1,6 |
| BLOQUE 2 | 3 AULAS | 83,1 | 75,5 | 3,2 | 265,92 | 241,6 | 25 | 15 | 10,6 | 16,1 | 2,1 | 3,2 |
| BLOQUE 3 | 2 AULAS | 58,00 | 43,40 | 3,2 | 185,6 | 138,88 | 25 | 15 | 7,4 | 9,3 | 1,5 | 1,9 |
| BAÑOS | 2 BAÑOS | 36 | 23,4 | 3,2 | 115,2 | 74,88 | 25 | 15 | 4,6 | 5,0 | 0,9 | 1,0 |
| TOTALES | | | | | | | | | 28,1 | 38,1 | 5,6 | 7,6 |

CERRAMIENTO EN CERCA

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| CANTIDAD CON DERPERDICIO | 29,50 | 40,03 | 5,90 | 8,01 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

EN INTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIOES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos. | | |

| RECINTO | COMPUESTO POR | LONG. MUROS (M) | | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA (M2/GALON) | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANECAS) | |
|----------------|--------------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------|--|
| | | INTERNOS | EXTERNOS | INTERNOS | | | | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | |
| BLOQUE 1 | 3 AULAS - DEPOSITO | 131,25 | 43,8 | 3,2 | 420 | 140,16 | 25 | 15 | 16,8 | 9,3 | 3,4 | 1,9 | |
| BLOQUE 2 | 4 AULAS | 103,2 | 57,7 | 3,2 | 330,24 | 184,64 | 25 | 15 | 13,2 | 12,3 | 2,6 | 2,5 | |
| BLOQUE 3 | 1 AULA | 28,20 | 20,80 | 3,2 | 90,24 | 66,56 | 25 | 15 | 3,6 | 4,4 | 0,7 | 0,9 | |
| BLOQUE 4 | 1 AULA | 29,6 | 29,6 | 3,2 | 94,72 | 94,72 | 25 | 15 | 3,8 | 6,3 | 0,8 | 1,3 | |
| BLOQUE 5 | KIOSKO | 23,6 | 23,6 | 3,2 | 75,52 | 75,52 | 25 | 15 | 3,0 | 5,0 | 0,6 | 1,0 | |
| BLOQUE 6 | KIOSKO | 34 | 34 | 3,2 | 108,8 | 108,8 | 25 | 15 | 4,4 | 7,3 | 0,9 | 1,5 | |
| BAÑOS | 2 BAÑOS | 17,6 | 6,5 | 3,2 | 56,32 | 20,8 | 25 | 15 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | |
| | MURO CERRAMIENTO | | 335,54 | 3,2 | | 1073,728 | 25 | 15 | | 71,6 | | 14,3 | |
| TOTALES | | | | | | | | | 47,0 | 46,1 | 9,4 | 9,2 | |

EN INTERIORES PINTUCO:

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| CANTIDAD CON DERPERDICIO | 49,39 | 48,38 | 9,88 | 9,68 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--------------------------|--------------|-------------|
|--------------------------|--------------|-------------|

- En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos.
- En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos.
- En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos.

| RECINTO | COMPUESTO POR | LONG. MUROS (M) | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA (M2/GALON) | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANECAS) | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | INTERNOS | EXTERNOS | | | | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | |
| BLOQUE 1 | SALONES INFOR. - OFICINA RECTOR | 105,6 | 66 | 3,2 | 337,92 | 211,2 | 25 | 15 | 13,5 | 14,1 | 2,7 | 2,8 | |
| BLOQUE 2 | 2 AULAS | 56,8 | 44 | 3,2 | 181,76 | 140,8 | 25 | 15 | 7,3 | 9,4 | 1,5 | 1,9 | |
| BLOQUE 3 | 2 AULAS | 48,00 | 32,40 | 3,2 | 153,6 | 103,68 | 25 | 15 | 6,1 | 6,9 | 1,2 | 1,4 | |
| BLOQUE 4 | 2 AULAS | 64 | 44 | 3,2 | 204,8 | 140,8 | 25 | 15 | 8,2 | 9,4 | 1,6 | 1,9 | |
| BLOQUE 5 | 5 AULAS | 146,4 | 87,2 | 3,2 | 468,48 | 279,04 | 25 | 15 | 18,7 | 18,6 | 3,7 | 3,7 | |
| BAÑOS | 4 BAÑOS | 64 | 48 | 3,2 | 204,8 | 153,6 | 25 | 15 | 8,2 | 10,2 | 1,6 | 2,0 | |
| | MURO CERRAMIENTO | | 407,5 | 3,2 | | 1304 | 25 | 15 | | 86,9 | | 17,4 | |
| | | | | | | | | | TOTALES | 62,1 | 68,6 | 12,4 | 13,7 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CANTIDAD CON DERPERDICIO | 65,16 | 72,04 | 13,03 | 14,41 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

EN INTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--------------------------|--------------|-------------|
|--------------------------|--------------|-------------|

- En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos.
- En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos.
- En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos.

| RECINTO | COMPUESTO POR | LONG. MUROS (M) | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA (M2/GALON) | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANECAS) | |
|----------------|---------------|-----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------|------------------------------|------------|
| | | INTERNOS | EXTERNOS | | | | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA |
| BLOQUE 1 | 2 AULAS | 59,2 | 44,4 | 3,2 | 189,44 | 142,08 | 25 | 15 | 7,6 | 9,5 | 1,5 | 1,9 |
| BAÑOS | 4 BAÑOS | 34,8 | 18,6 | 3,2 | 111,36 | 59,52 | 25 | 15 | 4,5 | 4,0 | 0,9 | 0,8 |
| TOTALES | | | | | | | | | 12,0 | 13,4 | 2,4 | 2,7 |

CERRAMIENTO EN CERCA

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| CANTIDAD CON DERPERDICIO | 12,63 | 14,11 | 2,53 | 2,82 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

EN INTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. • En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. • En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos. • En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos. • En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos. | | |

| RECINTO | COMPUESTO POR | LONG. MUROS (M) | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA (M2/GALON) (A 2 MANOS) | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANECAS) | |
|----------------|---------------|-----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--|---------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| | | INTERNOS | EXTERNOS | | | | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA |
| BLOQUE 1 | 13 AULAS | 488,56 | 326,32 | 3,2 | 1563,392 | 1044,224 | 25 | 15 | 62,5 | 69,6 | 12,5 | 13,9 |
| BLOQUE 2 | 12 AULAS | 386,8 | 204,2 | 3,2 | 1237,76 | 653,44 | 25 | 15 | 49,5 | 43,6 | 9,9 | 8,7 |
| BLOQUE 3 | 3 AULAS | 98,00 | 67,60 | 3,2 | 313,6 | 216,32 | 25 | 15 | 12,5 | 14,4 | 2,5 | 2,9 |
| BLOQUE 4 | 2 AULAS | 46,6 | 32,2 | 3,2 | 149,12 | 103,04 | 25 | 15 | 6,0 | 6,9 | 1,2 | 1,4 |
| BLOQUE 5 | 1 AULA | 18 | 18 | 3,2 | 57,6 | 57,6 | 25 | 15 | 2,3 | 3,8 | 0,5 | 0,8 |
| BLOQUE 6 | 1 AULA | 16 | 16 | 3,2 | 51,2 | 51,2 | 25 | 15 | 2,0 | 3,4 | 0,4 | 0,7 |
| BLOQUE 7 | 1 AULA | 15 | 15 | 3,2 | 48 | 48 | 25 | 15 | 1,9 | 3,2 | 0,4 | 0,6 |
| TOTALES | | | | | | | | | 136,8 | 144,9 | 27,4 | 29,0 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| CANTIDAD CON DERPERDICIO | 143,67 | 152,17 | 28,73 | 30,43 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|

EN INTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos. | | |

| RECINTO | LONG. MUROS (M) | | ALTURA (M) | AREA INTERNA (M2) | AREA EXTERNA (M2) | RENDIMIENTO PINTURA | | CANTIDAD (GALONES) | | CANTIDAD (CUÑETES - CANEC) | |
|---------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | INTERNOS | EXTERNOS | | | | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA | INTERNA | EXTERNA |
| AREA CONSTRUIDA | 27,8 | 27,8 | 3,2 | 88,96 | 88,96 | 25 | 15 | 3,6 | 5,9 | 0,7 | 1,2 |
| TOTALES | | | | | | | | 3,6 | 5,9 | 0,7 | 1,2 |
| CANTIDAD CON DERPERDICIO | | | | | | | | 3,74 | 6,23 | 0,75 | 1,25 |

EN INTERIORES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Sobre Estuco Profesional Pintuco : de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferente: de 25 a 30 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similar: de 30 a 35 m2/galón a dos manos. | | |

EN EXTERIOES PINTUCO:

| Descripción del producto | Modos de Uso | Rendimiento |
|--|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> En obra nueva sobre Estuco Profesional Pintucode 8 a 10 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color diferentede 15 a 20 m2/galón a dos manos. En repinte sobre color igual o similarde 20 a 25 m2/ galón a dos manos. | | |

ANEXO 18. Anexo 2 de tercer informe parcial de práctica

Se crearon las carpetas para la organizacion documental asociada a proyectos de infraestructura social y comunitaria.

Archivo Inicio Compartir Vista

Portapapeles: Anclar al Acceso rápido, Copiar, Pegar, Cortar, Copiar ruta de acceso, Pegar acceso directo

Organizar: Mover a, Copiar a, Eliminar, Cambiar nombre

Nuevo: Nueva carpeta, Nuevo elemento, Fácil acceso

Abrir: Propiedades, Abrir, Modificar, Historial

Seleccionar: Seleccionar todo, No seleccionar nada, Invertir selección

« INFORMES_PASANTIA » TERCER_INFORME_PARCIAL » ANEXO_2 » Formatos de Coordinación de Entrega firmados 2019 » No étnicos »

Buscar en No étnicos

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|--|------------------------|---------------------|--------|
| NE 2_Simacota - Santander_Puesto de sal... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 3_Simacota - Santander_Cubierta can... | 18/10/2019 10:16 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 4_Simacota - Santander_Placa deporti... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 5_Algarrobo - Magdalena_Salón com... | 7/10/2019 10:36 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 6_Chivolo - Magdalena_Centro de ac... | 7/10/2019 10:36 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 7_San Francisco - Antioquia_Cancha ... | 7/10/2019 10:36 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 8_Argelia - Antioquia_Centro de acopio | 7/10/2019 10:36 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 9_Cocorná - Antioquia_Cancha de fút... | 7/10/2019 10:36 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 10_Albán - Nariño_Parques infantiles | 7/10/2019 10:36 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 11_Nariño - Antioquia_Caseta comunal | 7/10/2019 10:37 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 12_Granada - Antioquia_Campo depo... | 7/10/2019 10:37 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 13_Charalá - Santander_Puesto de sal... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 14_Charalá - Santander_Parque Público | 7/10/2019 10:37 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 15_Cocorná - Antioquia_Hogar juvenil | 7/10/2019 10:37 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 16_San Miguel - Putumayo_CEFUCU | 7/10/2019 10:37 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 17_Puerto Caicedo - Putumayo_Plazo... | 7/10/2019 10:37 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 18_Valle del Guamuez - Putumayo_M... | 24/10/2019 3:12 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 19_Cocorná - Antioquia_Casa campes... | 7/10/2019 10:37 a. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 20_El Dorado - Meta_Placa huella | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 21_San Miguel - Putumayo_Dotación ... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 22_Valle del Guamuez - Putumayo_Do... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 23_Puerto Caicedo - Putumayo_Dota... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 24_Puerto Caicedo - Putumayo_Dota... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |
| NE 25_Cocorná - Antioquia_Dotación Ho... | 7/01/2020 3:52 p. m. | Carpeta de archivos | |

ANEXO 19. Anexo 3 de tercer informe parcial de práctica

| ID REVISIÓN | DT | DPTO. | MPIO | ID SUJETO | NOMBRE SUJETO | ID MEDIDA | MEDIDA | ID ACCIÓN | ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | ESTADO DOCUMENTAL | OTROS DOCUMENTOS DISPONIBLES | DOCUMENTOS FALTANTES |
|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|--|------------------|-------------------|---|--------------------------|
| NE1 | Magdalena | MAGDALENA | Remolino | 222 | CORREGIMIENTO DE SANTA RITA | 7 | Resignificación del Jawey comunitario Santo Domingo como un espacio de producción colectiva (Piscicultura) | 1011 | Proyecto para la construcción de un Jawey comunitario para garantizar la producción pesquera, fortaleciendo la economía familiar. | El proyecto no corresponde a la construcción de un jagley, corresponde a la construcción de un pafaito como salón de eventos y depósitos | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE2 | Santander | SANTANDER | Simacota | 117 | LA COMUNIDAD DE SIMACOTA SECTOR BAJO | 365 | 4. Remodelar y adecuar el Puesto de Salud de la Vereda El Guamo, de acuerdo a los requerimientos de salubridad establecidos, y que asegure su dotación de equipos, instrumentos y elementos necesarios para prestar atención integral en salud. | 1883 | 4. Remodelar y adecuar el Puesto de Salud de la Vereda El Guamo, de acuerdo a los requerimientos de salubridad establecidos, y que asegure su dotación de equipos, instrumentos y elementos necesarios para prestar atención integral en salud. | Puesto de salud El Guamo | Materiales | COMPLETO | Acta de entrega de materiales, Compromiso de mano de obra no calificada, Copia cédulas mano de obra no calificada, Ficha de Evaluación de Proyecto, Formato Coordinación de Entrega, Formato de Orden de Suministro de Materiales | NO APLICA |
| NE3 | Santander | SANTANDER | Simacota | 117 | LA COMUNIDAD DE SIMACOTA SECTOR BAJO | 383 | 22. Gestionar la construcción de la cubierta de la cancha múltiple del Colegio Agroindustrial de la vereda Puerto Nuevo | 1906 | 22. Gestionar la construcción de la cubierta de la cancha múltiple del Colegio Agroindustrial de la vereda Puerto Nuevo | Gestionar la construcción de la cubierta de la cancha múltiple del Colegio Agroindustrial de la vereda Puerto Nuevo - Cubierta cancha | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE4 | Santander | SANTANDER | Simacota | 117 | LA COMUNIDAD DE SIMACOTA SECTOR BAJO | 382 | 21. Gestionar la construcción de un coliseo cubierto en la vereda el Guamo, para fomentar el desarrollo deportivo, artístico, cultural y recreativo de la comunidad. | 1905 | 21. Gestionar la construcción de un coliseo cubierto en la vereda el Guamo, para fomentar el desarrollo deportivo, artístico, cultural y recreativo de la comunidad. | Construcción de la placa en concreto para la cancha múltiple del colegio El Guamo del Municipio de Simacota Santander | Materiales | COMPLETO | Acta de entrega de materiales, Compromiso de mano de obra no calificada, Ficha de Evaluación de Proyecto, Formato Coordinación de Entrega, Formato de Orden de Suministro de Materiales | NO APLICA |
| NE5 | Magdalena | MAGDALENA | Algarrobo | 93 | BELLAVISTA | 499 | Construcción / Adecuación de un salón comunal | 2150 | Legalización del Lote / Elaboración de diseño, presupuesto / Ejecución | Salón Comunal | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE6 | Magdalena | MAGDALENA | Chivolo | 66 | CORREGIMIENTO LA POLA | 676 | Construcción de acueducto veredal. | 2502 | Construcción de acueducto veredal. | Construcción de Centro de Acopio de Leche | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE7 | Antioquia | ANTIOQUIA | San Francisco | 165 | FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 83 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1156 | Adecuación y/o reconstrucción de la placa polideportiva de las veredas Cañada Honda, Palania, Pocitos, La Holanda y La Cristalina | Cancha Múltiple Los Pocitos - SRC- San Francisco - Predio la Cristalina | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE8 | Antioquia | ANTIOQUIA | Argelia | 102 | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA | 22 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1033 | Construcción de un centro de acopio en el área urbana que tenga en cuenta la producción agrícola del área rural del municipio de Argelia, lo que beneficiaría directamente a los consumidores del área urbana. | Construcción del Centro de Acopio | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE9 | Antioquia | ANTIOQUIA | Cocomá | 103 | CABECERA MUNICIPAL DE COCORNA | 80 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1145 | Reparar la cancha de fútbol "Jose Maria Garcia" | Reparar cancha de fútbol "Jose Maria Garcia" | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE10 | Nariño | NARIÑO | Albán | 129 | CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE ALBAN | 27444 | Recuperación del lugar de encuentro comunitario y las prácticas para los distintos grupos poblacionales que ahí se realizaban | 27446 | Apoyar la construcción de dos parques uno en la zona rural y otro en el casco urbano que incluyan la dotación de juegos infantiles y las canchas | Parques infantiles | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE11 | Antioquia | ANTIOQUIA | Nariño | 107 | CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS Y LAS VEREDAS DE: EL ZAFIRO, LA HERMOSA, LA IGUANA, AGUACATAL, EL PINAL, GUADALITO, EL BOSQUE, MONTECRISTO, PEDREGAL, VENECIA, QUEBRADA NEGRA | 38 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1064 | Construcción de caseta comunal en la vereda El Zafiro con capacidad para 150 personas mas o menos con dotación de mesas y sillas. | Construcción Caseta El Zafiro | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE12 | Antioquia | ANTIOQUIA | Granada | 169 | FOCALIZADO MUNICIPIO DE GRANADA | 349 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1858 | Reparación del techo del coliseo | Mejoramiento del Campo Deportivo el Carmelo del municipio de Granada - Antioquia | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE13 | Santander | SANTANDER | Charalá | 121 | LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE RIACHUELO | 27998 | 3. Mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud de Riachuelo y de la vereda de la Falda centrada en un sistema de salud comunitaria que incluya un programa de salud física, mental, salud emocional, un programa de derechos sexuales y reproductivos y a su vez dinamiza la economía de Riachuelo (componente salud) | 28015 | Reconstruir el puesto de salud la vereda la Falda | Puesto de Salud la Falda | Materiales | INCOMPLETO | Certificaciones mano de obra y maquinaria, certificado de uso del suelo, Ficha evaluación de proyecto, Formato de orden de suministro de materiales, Formato de coordinación de entrega | Contrato de mano de obra |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|-------------------|-----|---|-------|---|-------|---|---|------------|-----------|---|-----------|
| NE14 | Santander | SANTANDER | Charalá | 121 | LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE RIACHUELO | 27996 | 1. Recuperar y fortalecer las relaciones de confianza entre la comunidad y la institucionalidad, como una contribución a la reconciliación, la convivencia pacífica y la no repetición (componente político) | 28008 | Gestionar la adecuación del polideportivo de Riachuelo con cubierta y desarrollo de un espacio recreativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que favorezca el encuentro, la convivencia e intercambio comunitario. | Mejoramiento y dotación del parque principal del sector de Riachuelo | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE15 | Antioquia | ANTIOQUIA | Cocomá | 103 | CABECERA MUNICIPAL DE COCORNA | 80 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1143 | Adecuación a la infraestructura y dotación al hogar juvenil campesino | Reparar el hogar juvenil campesino | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE16 | Putumayo | PUTUMAYO | San Miguel | 58 | LA DORADA | 28056 | Propiciar espacios de formación y fortalecimiento en liderazgo político y/o social, que permita retomar liderazgos, generar participación | 28057 | Recuperar y reconstruir la infraestructura del Centro Fronterizo de Formación Comunitaria - CEFCU, como espacio que permita la formación académica superior, el desarrollo organizativo y comunitario y la práctica cultural y deportiva. | Recuperar y reconstruir la infraestructura del Centro Fronterizo de Formación Comunitaria - CEFCU | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE17 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Caicedo | 10 | CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO | 27060 | Reconstrucción de la memoria histórica del municipio a través de infraestructura social y comunitaria, actos de dignificación de las víctimas y la promoción del arte y la cultura local. | 27063 | Construcción de plazoleta de la memoria y monumento que simbolice el desplazamiento, un lugar de encuentro, memoria de los hechos sucedidos en el conflicto y dignificación de las víctimas. Arquitectura conmemorativa de la memoria y el desplazamiento, se dispondrá de un predio de la Alcaldía cerca al parque principal y al parque de la Iglesia Católica. | Construcción de plazoleta de la memoria y monumento que simbolice el desplazamiento | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE18 | Putumayo | PUTUMAYO | Valle del Guamuez | 59 | EL PLACER | 242 | FACILITAR LA RECUPERACION DE LA CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL ESTADO. Recuperación de la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho a través de acciones y medidas tendientes a fortalecer la presencia permanente de las instituciones, con fundamento en el respeto y promoción de los derechos humanos, la capacidad de respuesta local para la garantía de derechos, la transformación de la cultura institucional, así como los mecanismos ciudadanos e institucionales de control y participación. | 1563 | Recuperación e intervención de la oficina de la inspección de policía | Reparaciones de la oficina de la Inspección de Policía | Materiales | COMPLETO | Acta de entrega de materiales, certificación mano de obra calificada, certificación mano de obra no calificada, certificación uso del suelo, ficha de aprobación de proyecto, formato de coordinación de entrega, Orden de suministro de materiales | NO APLICA |
| NE19 | Antioquia | ANTIOQUIA | Cocomá | 103 | CABECERA MUNICIPAL DE COCORNA | 80 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1142 | Adecuación física y dotación a la Casa campesina que permita el desarrollo de programas de capacitación y formación para la comunidad | Adecuación de la casa campesina | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NE20 | Meta y Llanos orientales | META | Ei Dorado | 204 | EL DORADO | 589 | Reconstruir la vía de acceso a la vereda San Pedro. | 2307 | Reconstruir la vía de acceso a la vereda San Pedro. | Construcción de placa huella | Materiales | COMPLETO | Certificación de no riesgo geológico, certificado de mano de obra, Certificado de zonificación de censo, Ficha de aprobación de proyecto, Formato de orden de suministro de materiales, Formato de coordinación de entrega, notificación de concertación para entrega | NO APLICA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------|-----|--------------------------------------|-------|---|-------|--|---|------------|----------|---|-----------|
| NE 21 | Putumayo | PUTUMAYO | San Miguel | 58 | LA DORADA | 28056 | Fortalecer espacios de encuentro, participación y convivencia ciudadana | 28057 | Fortalecer la casa de la cultura de Puerto Colón mediante dotación de mobiliario y elementos tecnológicos. | MOBILIAIRIO SPAE CASA DE LA CULTURA PUERTO COLON | Mobiliario | COMPLETO | Acta de entrega de mobiliario, Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| NE 22 | Putumayo | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 59 | EL PLACER | 242 | FACILITAR LA RECUPERACION DE LA CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL ESTADO. Recuperación de la Institucionalidad propia del Estado Social de Derecho a través de acciones y medidas tendientes a fortalecer la presencia permanente de las instituciones, con fundamento en el respeto y promoción de los derechos humanos, la capacidad de respuesta local para la garantía de derechos, la transformación de la cultura institucional, así como los mecanismos ciudadanos e institucionales de control y participación. | 1563 | Recuperación e intervención de la oficina de la inspección de policía. | PROYECTO DOTACION DE MOBILIARIO OFICINA INSPECCION DE POLICIA SRC EL PLACER | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| NE 23 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Caicedo | 10 | CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO | 27040 | Facilitar la creación y/o fortalecimiento de las unidades de negocios orientadas a generar ingresos, empleo y autoempleo, priorizando organizaciones de mujeres, grupo de jóvenes, discapacitados y población en general. | 27043 | Fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento, asociaciones y organizaciones productivas orientadas a generación de empleo y autoempleo, priorizando la población mujeres, jóvenes, adulto mayor y discapacitados | PROYECTO DOTACION MOBILIARIO ASOCIACIONES DE MUJERES SRC PUERTO CAICEDO | Mobiliario | COMPLETO | Acta de entrega de mobiliario, Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| NE 24 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Caicedo | 10 | CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO | 27035 | Fortalecimiento de espacios para la memoria histórica | 27036 | Dotación de mobiliario y equipos tecnológicos para espacios de promoción de la memoria | Dotación de mobiliario para el Centro de Convivencia de Puerto Caicedo | Mobiliario | COMPLETO | Acta de entrega, Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| NE 25 | Antioquia | ANTIOQUIA | Cocomá | 103 | CABECERA MUNICIPAL DE COCORNA | 80 | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1143 | Adecuación a la infraestructura y dotación al hogar juvenil campesino | Dotar con mobiliario el hogar juvenil campesino | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |

| ID REVISIÓN | DT | DPTO. | MPIO | ID SUJETO | NOMBRE SUJETO | ID MEDIDA | MEDIDA | ID ACCIÓN | ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | ESTADO DOCUMENTAL | OTROS DOCUMENTOS DISPONIBLES | DOCUMENTOS FALTANTES |
|-------------|----------|----------|-------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|--|--|------------------|-------------------|--|---|
| E1 | URABA | CHOCÓ | ACANDÍ | 36 | RESGUARDO+F3:F7 CHIDIMA TOLÓ - EMBERA KATIOS | 30968 | Restitución | 30969 | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Materiales | COMPLETO | Certificación de destinación a uso público, Ficha de evaluación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de materiales, Presentación diseño Tambo | NO APLICA |
| E2 | URABA | CHOCÓ | ACANDÍ | 37 | RESGUARDO PESCADITO - EMBERA DOBIDA | 31026 | Restitución | 31027 | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Adecuar y dotar el tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de las prácticas culturales y políticas propias del pueblo embera. | Materiales | COMPLETO | Certificación de destinación a uso público, Ficha de evaluación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de materiales, Presentación diseño Tambo | NO APLICA |
| E3 | CHOCÓ | CHOCÓ | BAGADÓ | 183 | RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA | 31275 | Restitución | 31293 | Adecuar y dotar 4 (Tambos) colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias del pueblo embera katio, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina ancestral del pueblo katio, reuniones institucionales y demás. Uno (1) en cada una de las cuatro (4) zonas que conforman el resguardo. | Adecuar y dotar 4 (Tambos) colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias del pueblo embera katio, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina ancestral del pueblo katio, reuniones institucionales y demás. Uno (1) en cada una de las cuatro (4) zonas que conforman el resguardo. | Materiales | COMPLETO | Certificación de destinación a uso público, Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de materiales, Presentación diseño Tambo | NO APLICA |
| E4 | PUTUMAYO | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMÚEZ | 236 | CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA | 29815 | Restitución | 29824 | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arboleda. B. Dotación tecnológica de las aulas escolares. | Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la escuela Villa Arboleda. B. Dotación tecnológica de las aulas escolares. | Materiales | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| E5 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 186 | COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA | 30494 | Restitución de capacidades organizativas, comunitarias y políticas. | 30495 | Adecuación de bodega y tienda comunitaria en cemento en dimensión 8 x 11 de dos pisos. | Adecuación de bodega y tienda comunitaria en cemento en dimensión 8 x 11 de dos pisos. | Materiales | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| E6 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 186 | COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA | 30494 | Restitución de capacidades organizativas, comunitarias y políticas. | 30497 | Adecuación del local para la recuperación de la panadería comunitaria de la comunidad de Bellavista en cemento de 7 x 11 de 2 pisos con tanque de almacenamiento. | Adecuación del local para la recuperación de la panadería comunitaria de la comunidad de Bellavista en cemento de 7 x 11 de 2 pisos con tanque de almacenamiento. | Materiales | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| E7 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUI | 31223 | Restitución | 31233 | Apoyo al mejoramiento y reacondicionamiento de los senderos en palafitos que conectan las casas de la comunidad y el acceso a el centro de salud y las instituciones educativas. | Apoyo al mejoramiento y reacondicionamiento de los senderos en palafitos que conectan las casas de la comunidad y el acceso a el centro de salud y las instituciones educativas. | Materiales | COMPLETO | Certificación de destinación a uso público, Ficha de evaluación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de materiales | NO APLICA |
| E8 | CAUCA | CAUCA | JAMBALÓ | 231 | Comunidad Indígena Nasa del Resguardo Jambaló | 29721 | Restitución | 29741 | Crear el Banco de semillas propias a través de la investigación y construcción de un invernadero que conserve las propiedades de las semillas que se estaban desapareciendo por la dinámica del conflicto armado. | Construcción banco de semillas del Resguardo Jambaló | Materiales | COMPLETO | Certificación de destinación a uso público, Ficha de evaluación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de materiales | NO APLICA |
| E9 | CHOCÓ | CHOCÓ | UNGUÍA | 39 | RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS | 28446 | Restitución | 28458 | Construir y dotar un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como mingas, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina propia, reuniones institucionales y demás. | Construir y dotar un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas propias como mingas, palabros, bailes, actividades de cantos, prácticas de medicina | Materiales | COMPLETO | Certificación de destinación a uso público, Ficha de evaluación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de materiales, Presentación diseño Tambo | NO APLICA |
| E10 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 414 | COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DÓBIDA DE BOJAYÁ | 31302 | Restitución | 316 | Adecuar y dotar, por cada zona, un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas de medicina propia. CAMAIBO (Comunidad de lana) DRUA WANDRA (Comunidad Punto Cedro) ACIRUP(Comunidad Tagua) | Adecuar y dotar, por cada zona, un tambo colectivo comunitario para la realización de actividades que fomentan la revitalización de prácticas de medicina propia. CAMAIBO (Comunidad de lana) DRUA WANDRA (Comunidad Punto Cedro) ACIRUP(Comunidad Tagua) | Materiales | INCOMPLETO | Formato de coordinación de entrega | Formato de estructura técnica (FET), Carta de presentación de proyecto, Título colectivo, Certificación de no riesgo por eventos naturales, Certificación de viabilidad, Compromiso de sostenibilidad, Censo de población beneficiada, Certificado de ejecución y supervisión, Certificado de cumplimiento de normas técnicas (NSR 10), Planos del proyecto y memorias de cálculo de cantidades de obra |
| E11 | CHOCÓ | CHOCÓ | UNGUÍA | 146 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO - COCOMAUNGUIA | 31202 | Restitución | 31211 | Suministro de materiales para el mejoramiento de puerto de desembarque artesanal de las comunidades de agua. La comunidad se compromete a poner la mano de obra | Suministro de materiales para el mejoramiento de puerto de desembarque artesanal de las comunidades de agua. La comunidad se compromete a poner la mano de obra | Materiales | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-------------------|-----|--|-------|--------------|-------|---|---|------------|----------|---|-----------|
| E12 | CHOCÓ | CHOCÓ | BOJAYÁ | 186 | COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA | 30494 | Restitución | 30502 | Fortalecer el Comité Dos de Mayo a través de dotación de mobiliario. | Fortalecer el Comité Dos de Mayo a través de dotación de mobiliario. | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E13 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | MAHATES | 125 | PALENQUE DE SAN BASILIO -LA BONGA | 31167 | Restitución | 31169 | Adecuación, mejoramiento y dotación de mobiliario escolar a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de San Basilio de palenque de la Institucion educativa y sus sedes (según reporte secretaria de educacion municipal) | Adecuación, mejoramiento y dotación de mobiliario escolar a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de San Basilio de palenque de la Institucion educativa y sus sedes (según reporte secretaria de educacion municipal) | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E14 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | MAHATES | 125 | PALENQUE DE SAN BASILIO -LA BONGA | 31167 | Restitución | 31177 | Mejoramiento de la infraestructura y dotación del jardín comunitario de San Basilio de Palenque, sector La Bonga que permita contar con un lugar que garantice el encuentro comunitario | Mejoramiento de la infraestructura y dotación del jardín comunitario de San Basilio de Palenque, sector La Bonga que permita contar con un lugar que garantice el encuentro comunitario | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E15 | URABA | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN | 145 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO JIGUAMIANDO | 31100 | Satisfacción | 31105 | Apoyar la revitalización y dotación de la casa de los ancestros. | Apoyar la revitalización y dotación de la casa de los ancestros. | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E16 | URABA | CHOCÓ | UNGÚÍA | 146 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO -COCOMAUNGUÍA | 31202 | Restitución | 31207 | Dotar con mobiliario comunitario el centro social comunitario con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna. Esta dotación incluirá el manejo necesario para los encuentros comunitarios. | Dotar con mobiliario comunitario el centro social comunitario con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna. Esta dotación incluirá el manejo necesario para los encuentros comunitarios. | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E17 | CHOCÓ | CHOCÓ | BAGADÓ | 183 | RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA | 31274 | Restitución | 31285 | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de la comodidad, y apoyar el fortalecimiento de la construcción de espacio intergeneracionales con fines de recuperar la memoria como pueblo embera katio. | Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de la comodidad, y apoyar el fortalecimiento de la construcción de espacio intergeneracionales con fines de recuperar la memoria como pueblo embera katio. | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E18 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUÍ | 31223 | Restitución | 31224 | Adecuación y dotación de mobiliario para las casa comunitaria, como aporte al fortalecimiento de la gobernabilidad. | Adecuación y dotación de mobiliario para las casa comunitaria, como aporte al fortalecimiento de la gobernabilidad. | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E19 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 226 | CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ. CONSEJOS COMUNITARIOS DE VILLAGRANDE, CHAPARROSA Y NUEVA ESPERANZA | 31050 | Satisfacción | 31076 | Fortalecer los comités juveniles a través de asistencia / capacitación técnica y dotación en materiales tecnológicos y de comunicaciones | Fortalecer los comités juveniles a través de asistencia / capacitación técnica y dotación en materiales tecnológicos y de comunicaciones | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E20 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 226 | CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ. CONSEJOS COMUNITARIOS DE VILLAGRANDE, CHAPARROSA Y NUEVA ESPERANZA | 31054 | Restitución | 31068 | Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrosa y Villagrande. | Mejoramiento y dotación de las casetas comunitarias de los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Chaparrosa y Villagrande. | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |
| E21 | CHOCÓ | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | 197 | CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUÍ | 31223 | Restitución | 31232 | Suministro material y dotación de dos espacios comunitarios de prácticas culturales, uno para adultos mayores y el otro para las mujeres. | Suministro material y dotación de dos espacios comunitarios de prácticas culturales, uno para adultos mayores y el otro para las mujeres. | Mobiliario | COMPLETO | Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega, Formato de orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |

| ID REVISIÓN | DT | DPTO. | MPIO | ID SUJETO | NOMBRE SUJETO | ID MEDIDA | MEDIDA | ID ACCIÓN | ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | ESTADO DOCUMENTAL | OTROS DOCUMENTOS DISPONIBLES | DOCUMENTOS FALTANTES |
|-------------|---------|---------|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|---|------------------|-------------------|--|----------------------|
| OMG1 | Bolivar | Bolivar | Simiti | 42 | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DEL HOGAR JUVENIL DE MONTERREY | 654 | 1. Implementar la Estrategia Reparacion con sentido del ICBF, para 60 NNA del Hogar Juvenil de Monterrey durante primer año de ejecución del plan. A través de tres (03) talleres de formación dirigidos a niñas, niños y adolescentes. | 2463 | 7. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura donde se encuentra ubicado el Hogar Juvenil de Monterrey. - Construcción hogar juvenil | Suministrar materiales de construcción para la construcción del Hogar Juvenil de Monterrey (Simiti-Bolivar) | Materiales | COMPLETO | Acta de entrega de materiales, Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega de materiales, Informe de visita_entrega, Orden de suministro de materiales | NO APLICA |
| OMG2 | Bolivar | Bolivar | Simiti | 42 | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DEL HOGAR JUVENIL DE MONTERREY | 654 | 1. Implementar la Estrategia Reparacion con sentido del ICBF, para 60 NNA del Hogar Juvenil de Monterrey durante primer año de ejecución del plan. A través de tres (03) talleres de formación dirigidos a niñas, niños y adolescentes. | 2463 | 7. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura donde se encuentra ubicado el Hogar Juvenil de Monterrey. - Construcción hogar juvenil | Suministrar dotación de mobiliario para el Hogar Juvenil de Monterrey (Simiti-Bolivar) | Mobiliario | COMPLETO | Acta de entrega de mobiliario, Ficha de aprobación de proyecto, Formato de coordinación de entrega de mobiliario, Informe de visita_entrega, Orden de suministro de mobiliario | NO APLICA |

ANEXO 20. Anexo 4 de tercer informe parcial de práctica



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE VICHADA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ÁREA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA



620

Puerto Carreño, Vichada 10 de septiembre de 2019

Doctor
CARLOS ARTURO PARDO ALEZONES
Director Territorial Meta y Llanos Orientales
Unidad para las Víctimas
E. S. D.




Asunto: Diseño Aula Escolar Comunidad Indígena Kanalitojo, Municipio de Puerto Carreño.

Cordial Saludo:

En atención a oficio con radicado SAC VIC2019ER004486, mediante el cual se solicita diseños arquitectónicos de un aula de clase y unidad sanitaria con destino a la escuela de la comunidad Kanalitojo, a fin de iniciar acciones referente al fallo proferido a favor de la comunidad.

Me permito allegar en medio magnético al correo electrónico yonik.lesmes@unidadvictimas.gov.co, diseño tipo de aula rural, unidad sanitaria por género, los cuales se allegan en formato Autocad y Pdf, así mismo presupuesto aproximado con precios e incrementos manejados por la Entidad Territorial donde se refleja los ambientes escolares (aula tipo, unidad sanitaria, pozo profundo con sistema autónomo fotovoltaico), esto con el fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido en el quinto comité de justicia transicional, en el cual la Secretaría de Educación de Vichada en cabeza del señor Secretario de Educación presento proyecto que se encuentra formulado y radicado ante el banco de programas y proyectos departamental, con el cual se busca atender en mejores condiciones a los niños, niñas y adolescentes que allí se encuentran focalizados en pro de mejorar su calidad de vida.


Atentamente,


PEDRO WILSON SOLANO HERRERA
Líder de Planeación Educativa
Secretaría de Educación de Vichada


Elabora:
CAROL VONNE MARENTES,
Profesional Universitario P y P SECV

Calle 18 No. 7-25 Barrio El Centro "Secretaría de Educación" Puerto Carreño
Tel. (8) 56 54 975 Cód. Postal 99001 / Nit 800 094 067 - 8
E-mail: planeacion@sedvichada.gov.co / www.sedvichada.gov.co


PLANTA ARQUITECTONICA AULA

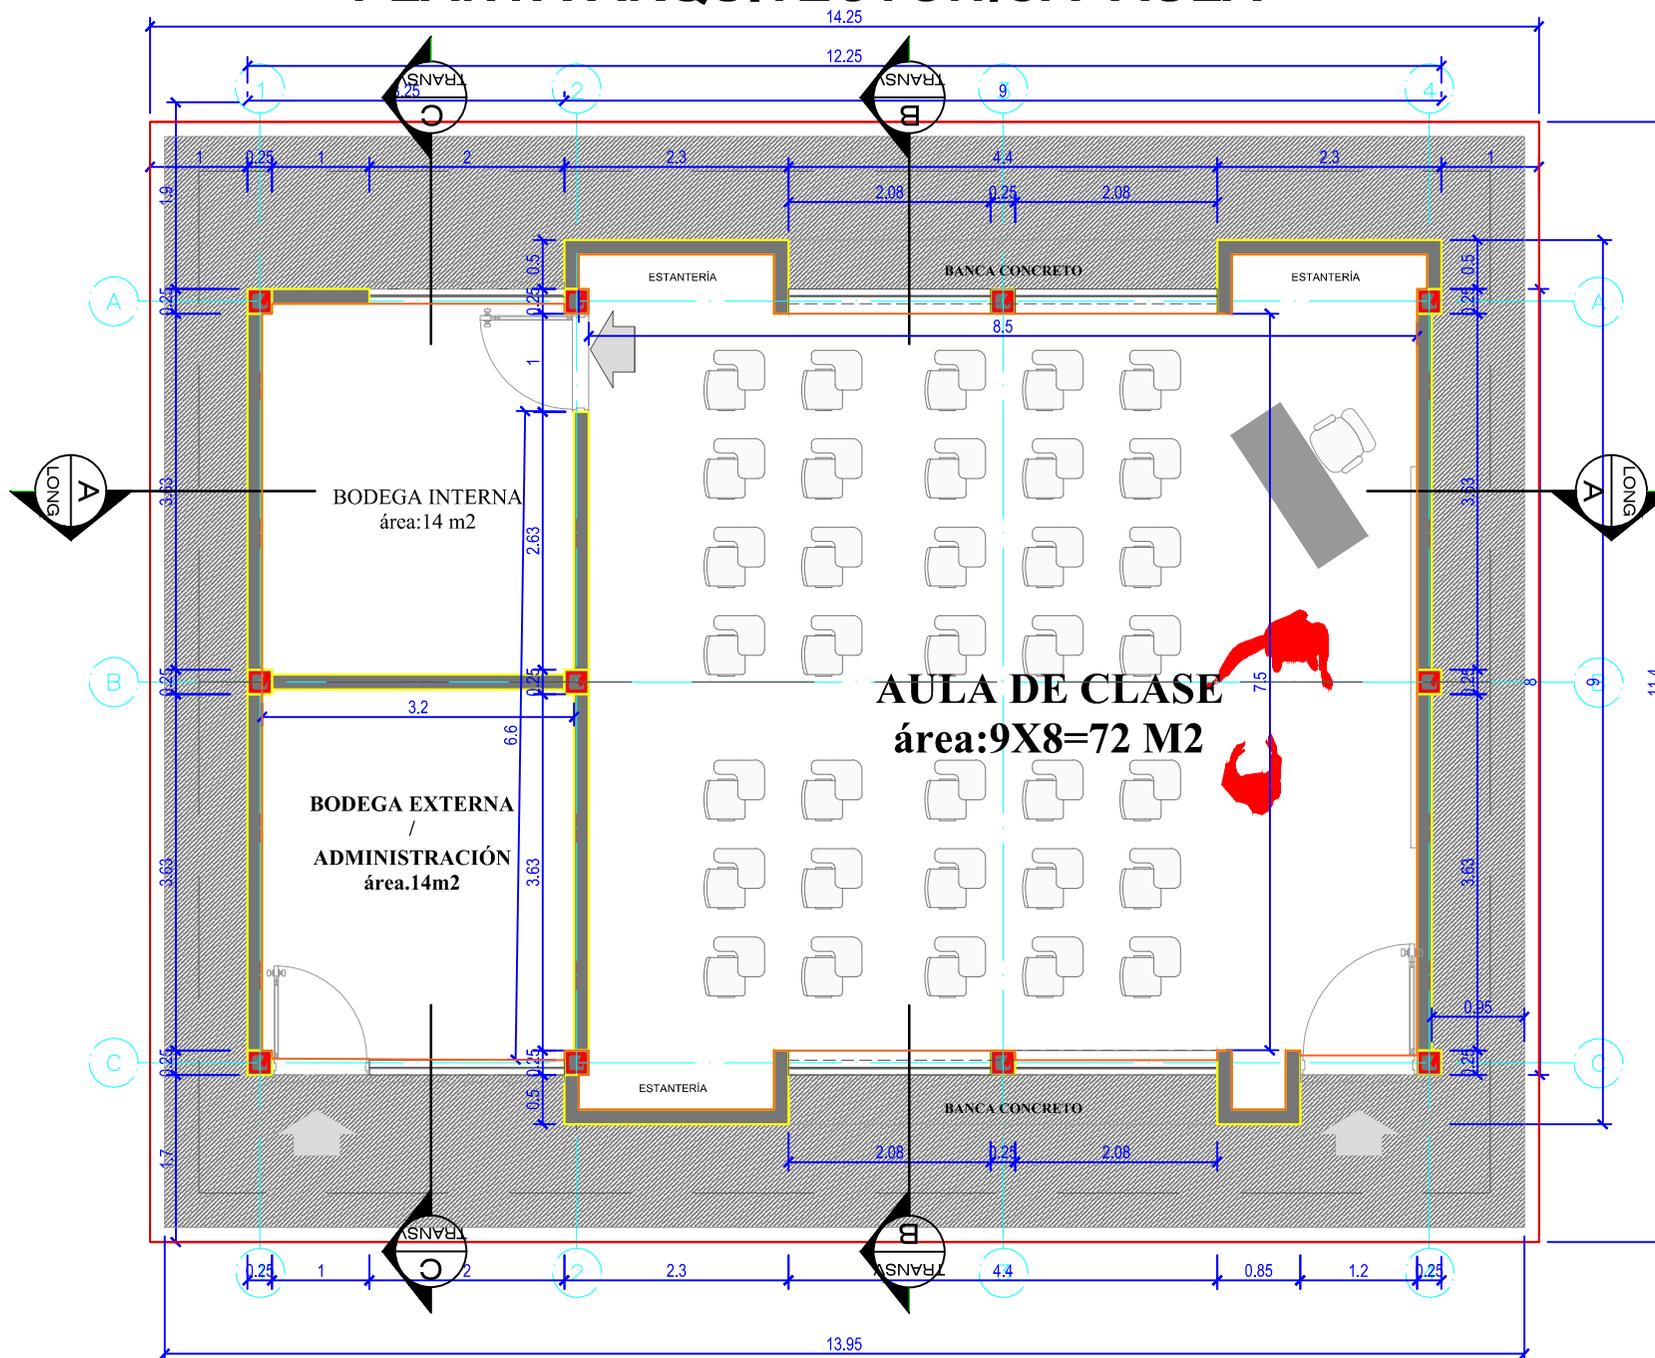


PLANTA CIMENTACION VIGA DE CIMENTACIÓN TIPO 1:25X25-TIPO 2:15X15

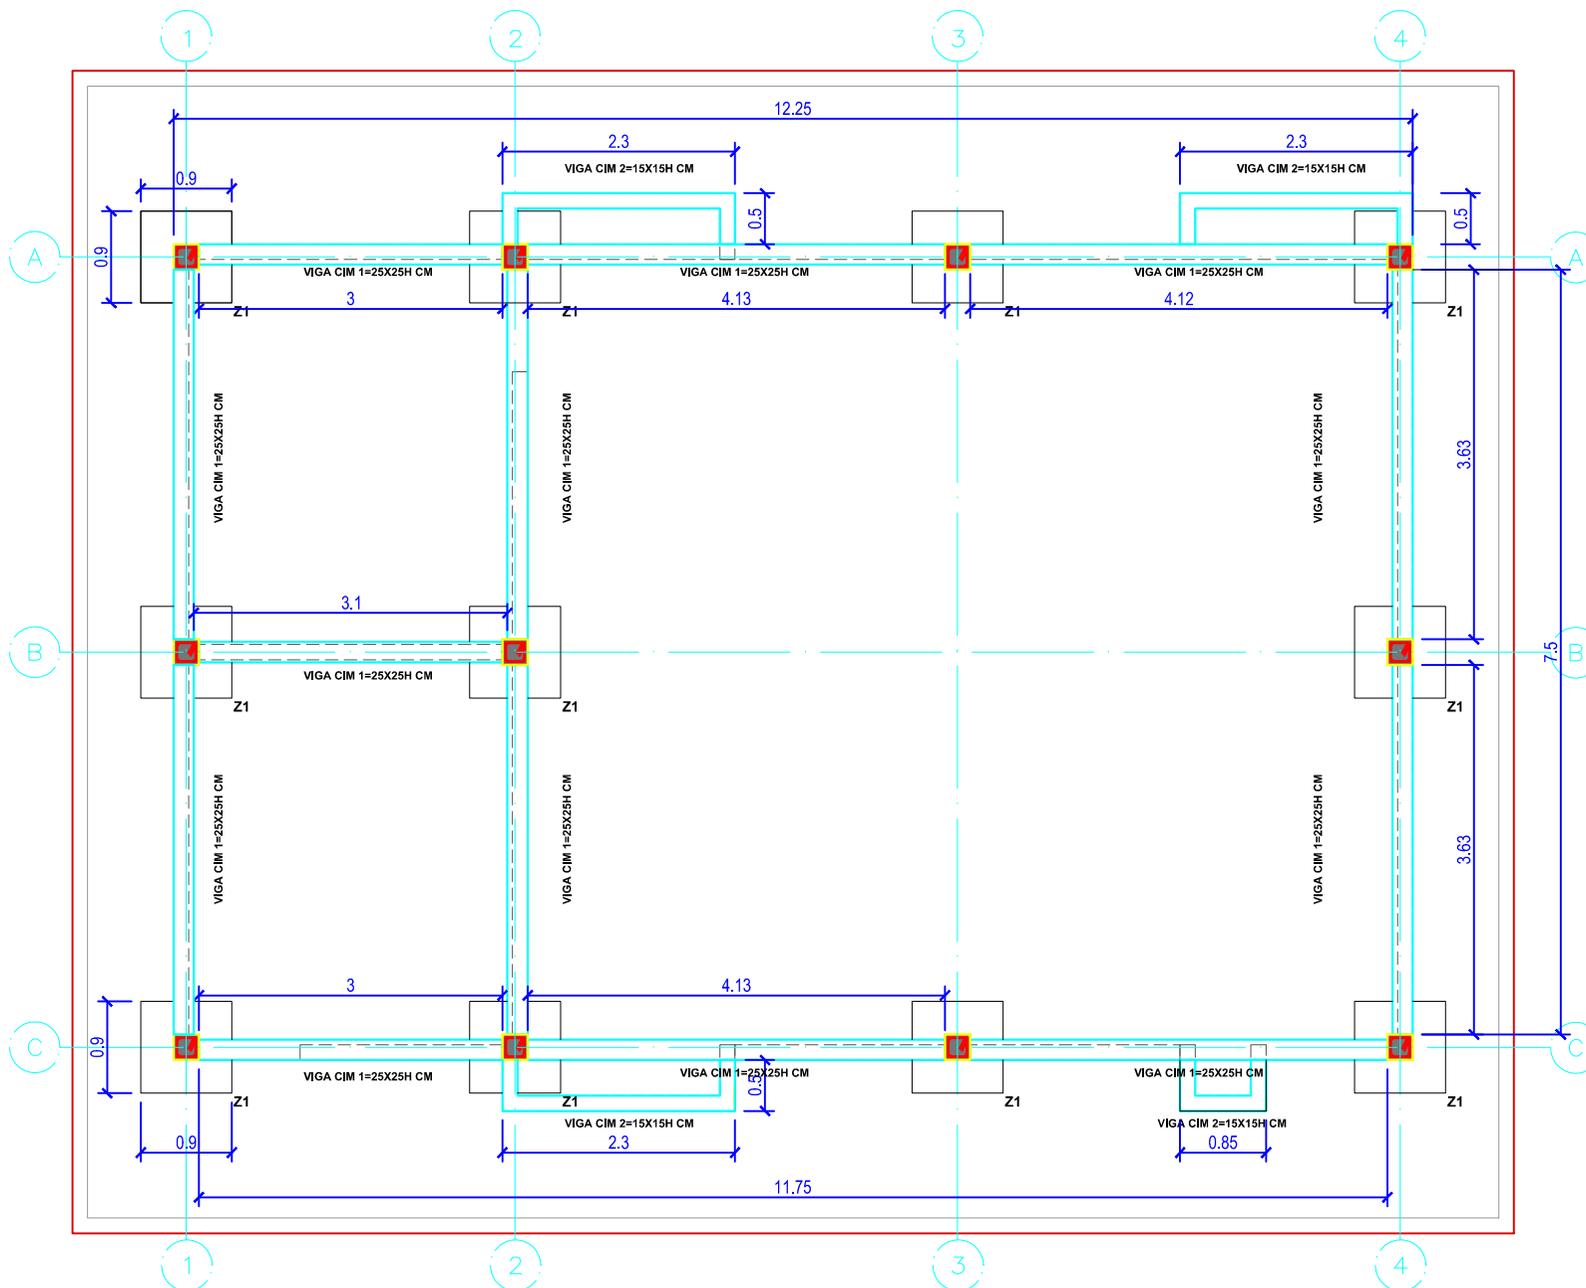


PLANTA CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL-COLOR VERDE

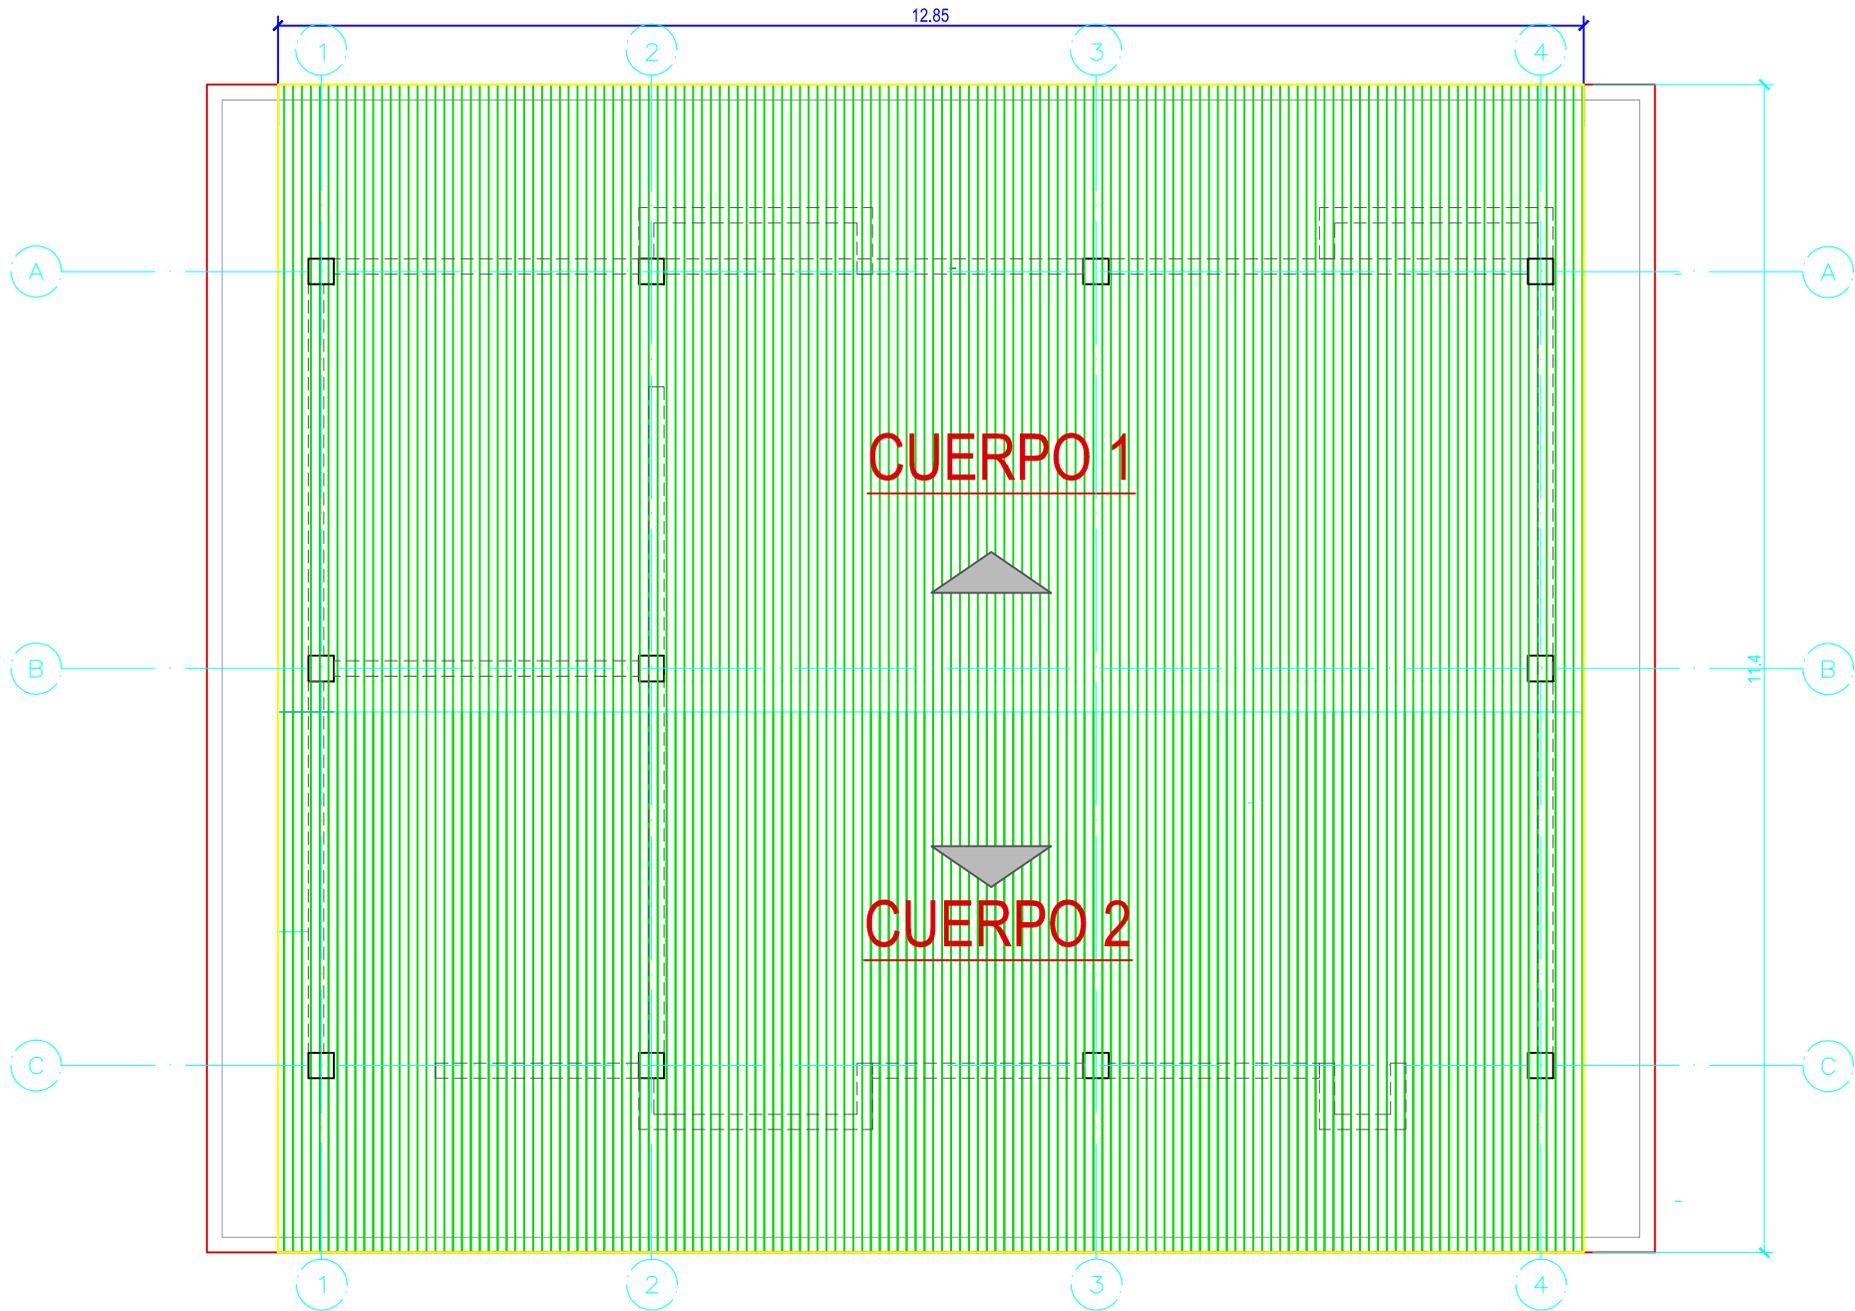

PLANTA ESTRUCTURA CUBIERTA CERCHA TUBULAR -3 X 1/2 -70X40

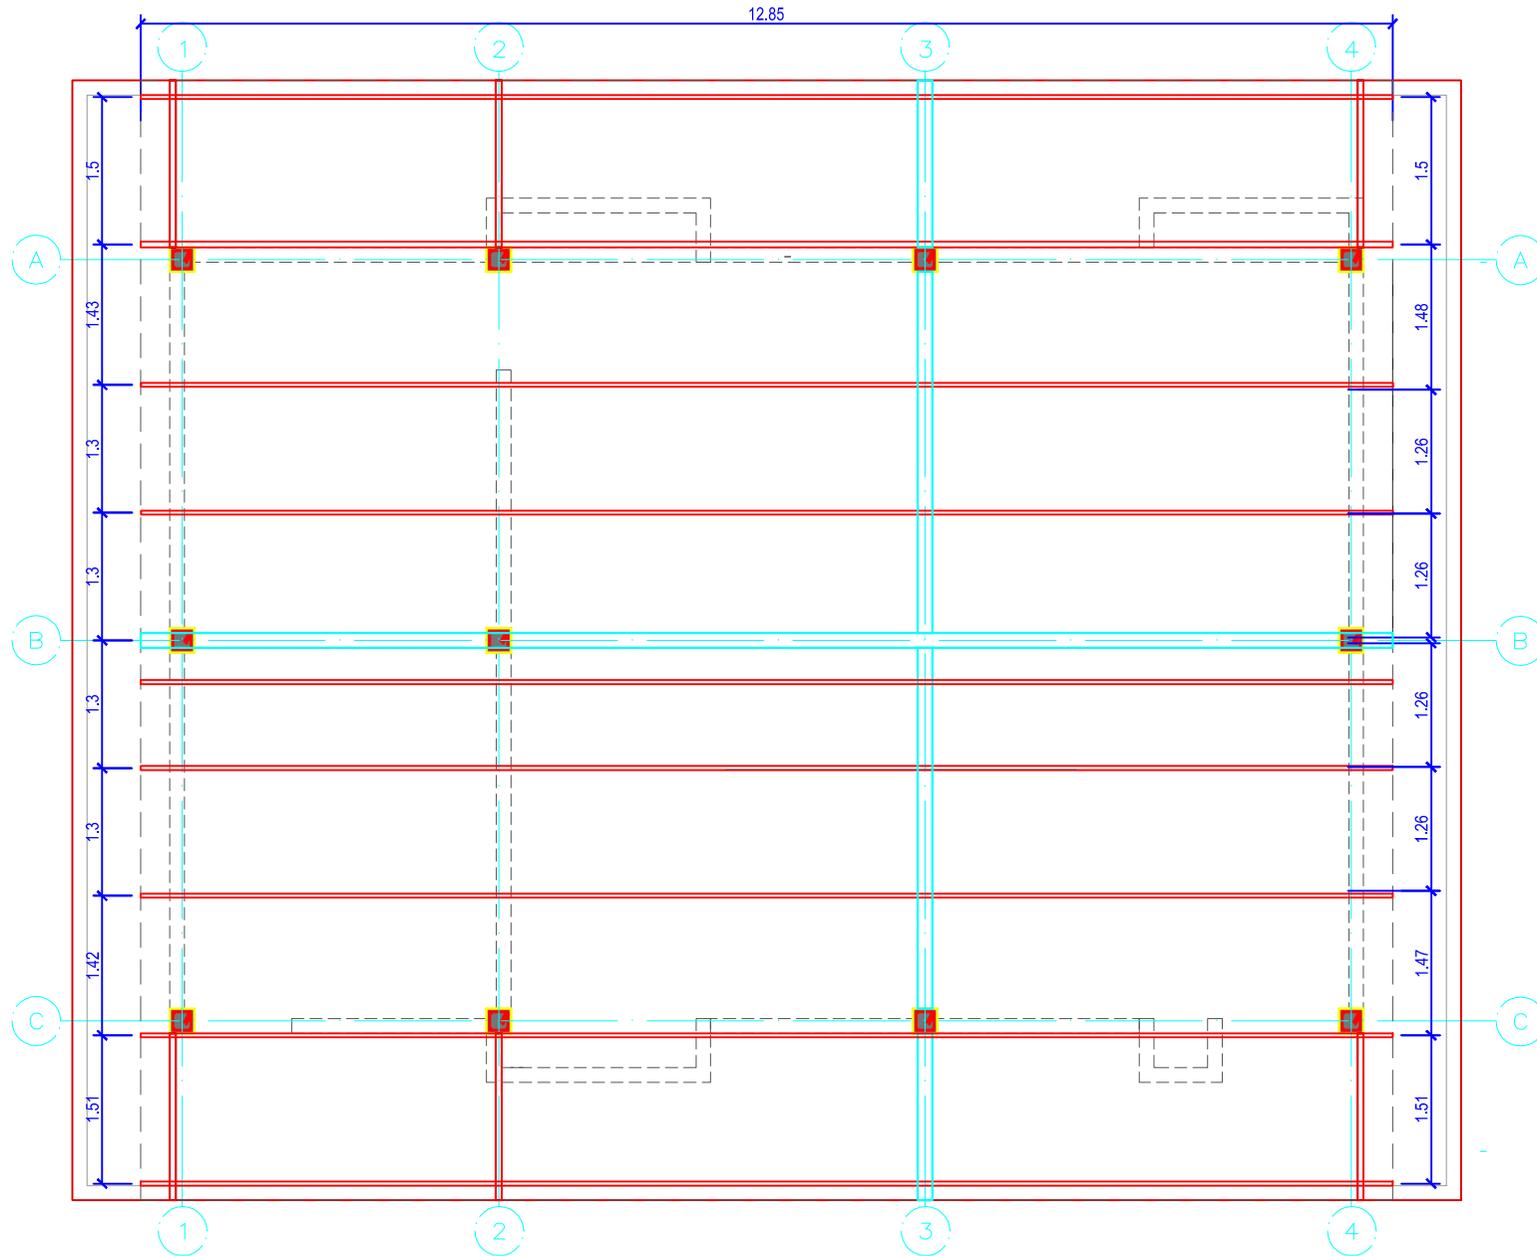


PLANTA VIGAS AEREAS 25X25

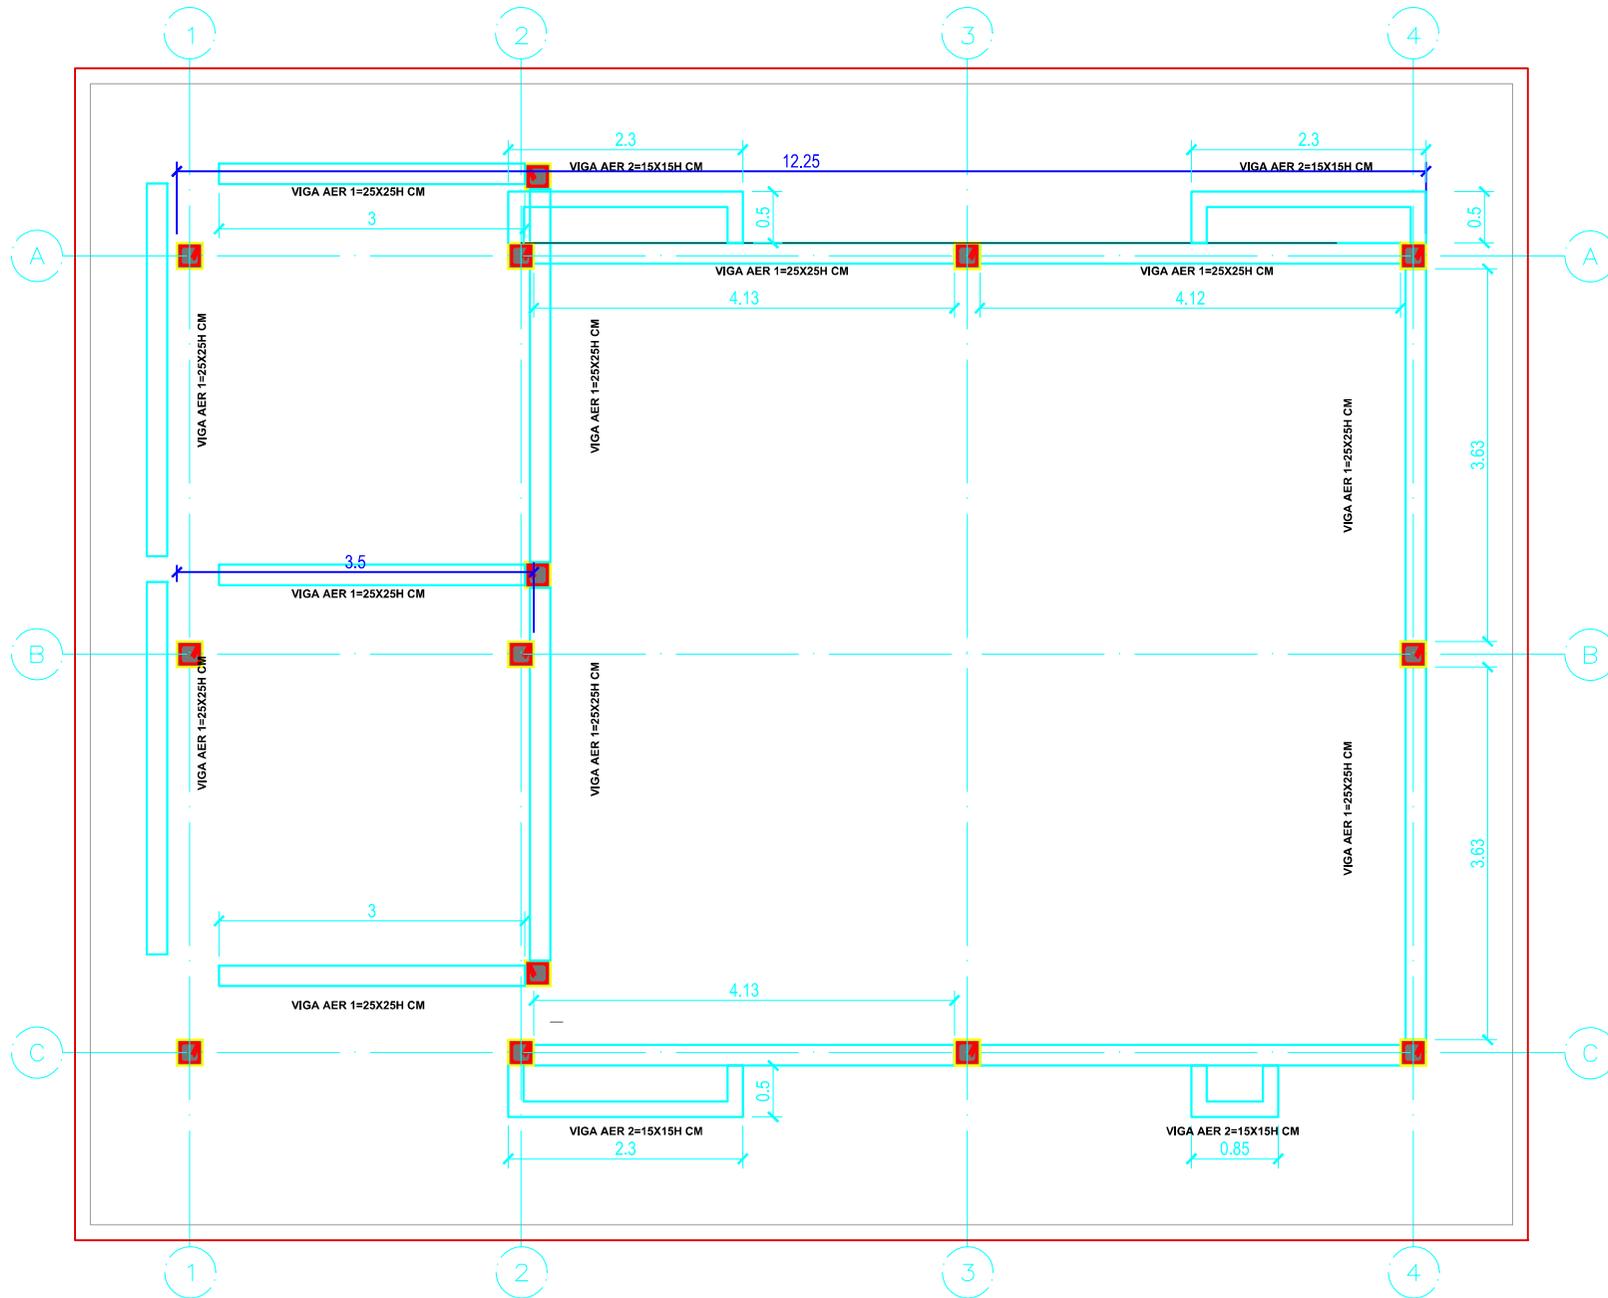


PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS

CONVENCIONES

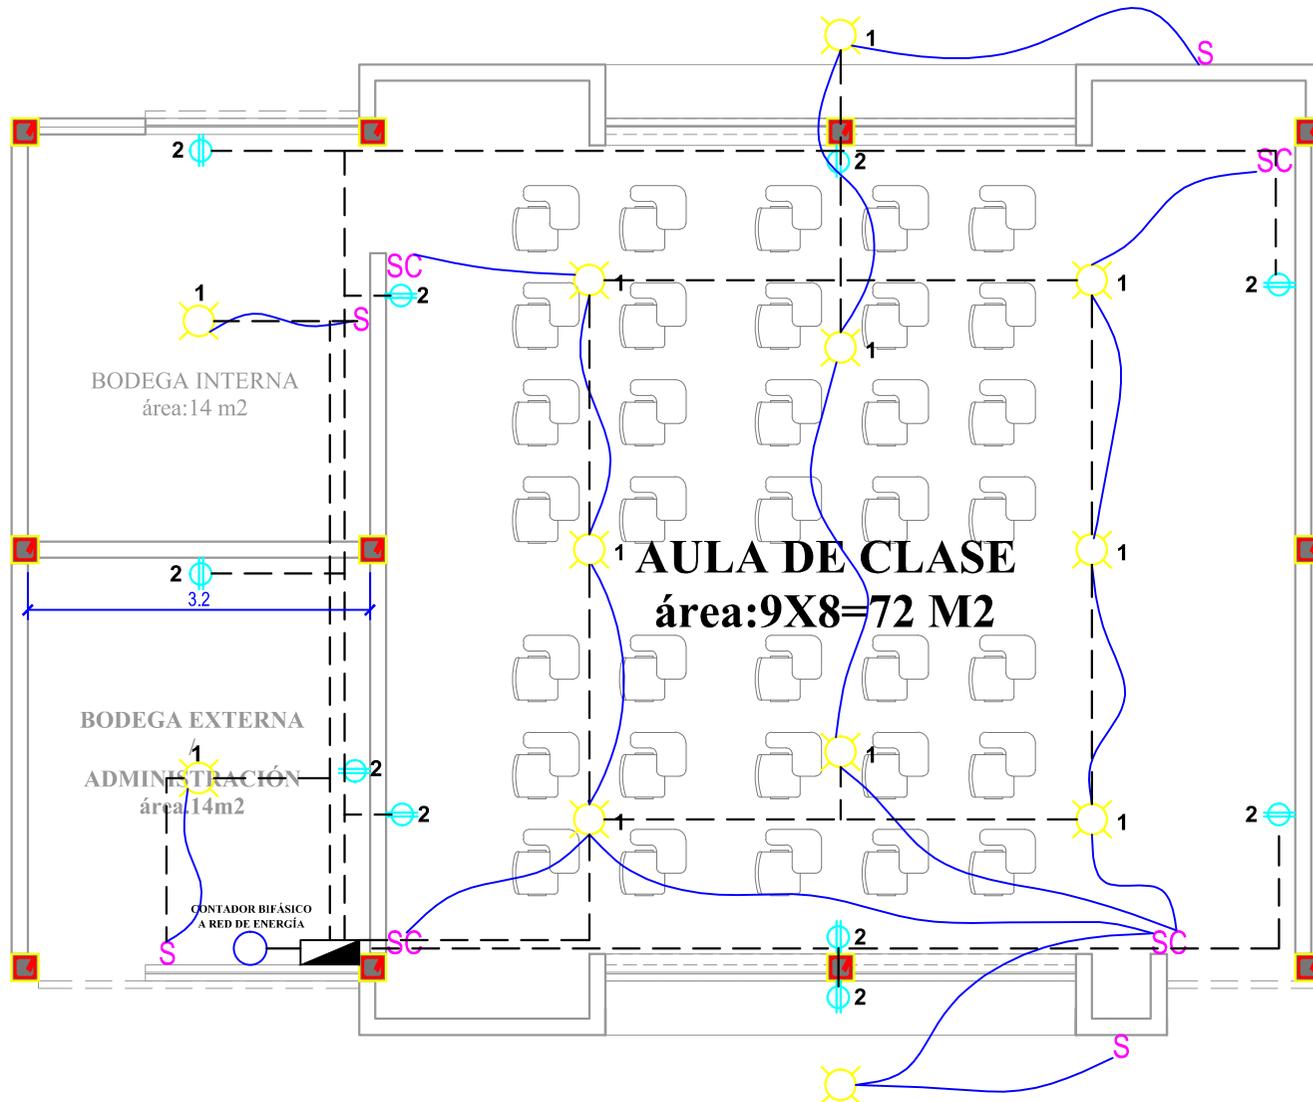


11.4


FACHADA POSTERIOR

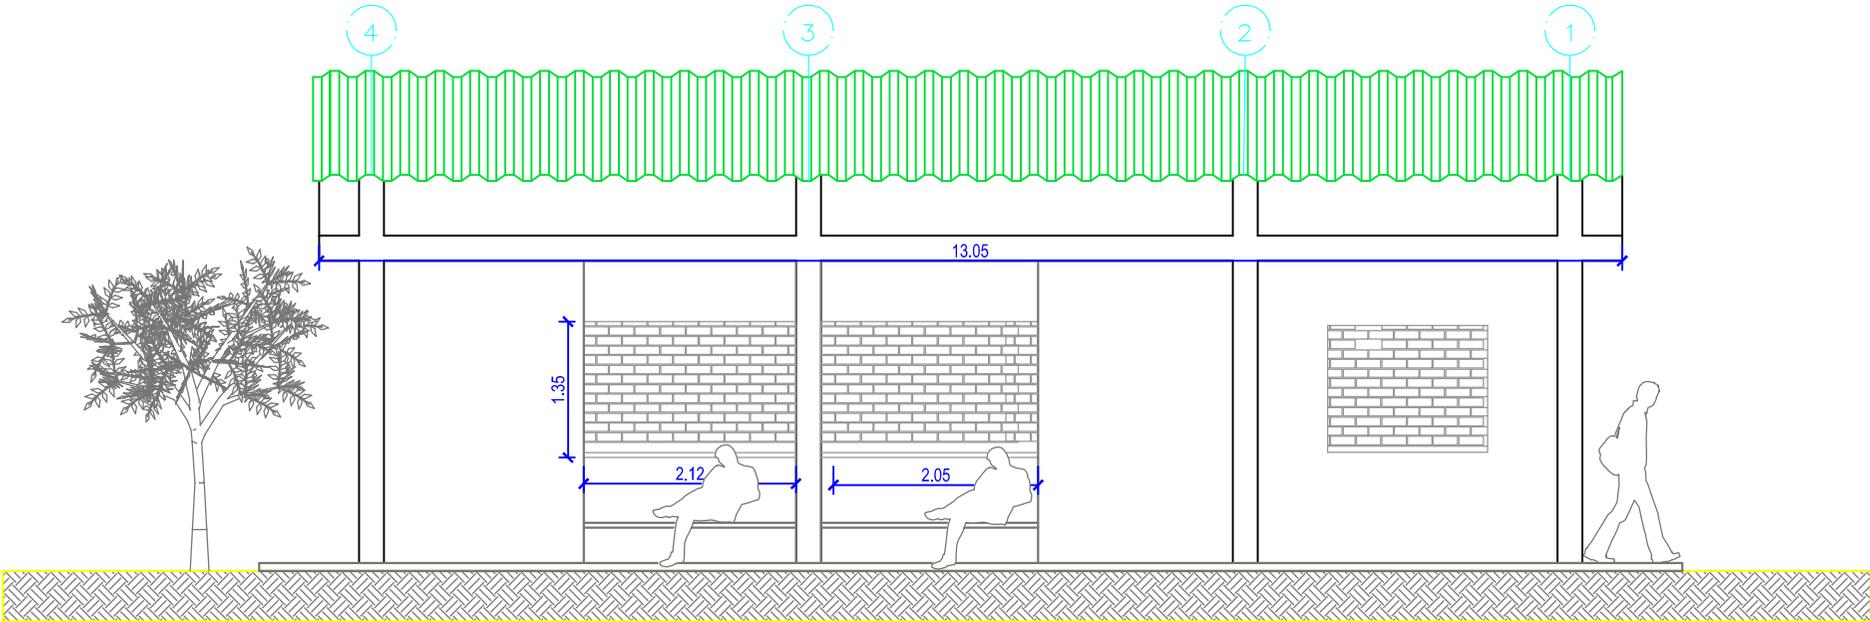


FACHADA LATERAL IZQUIERDA

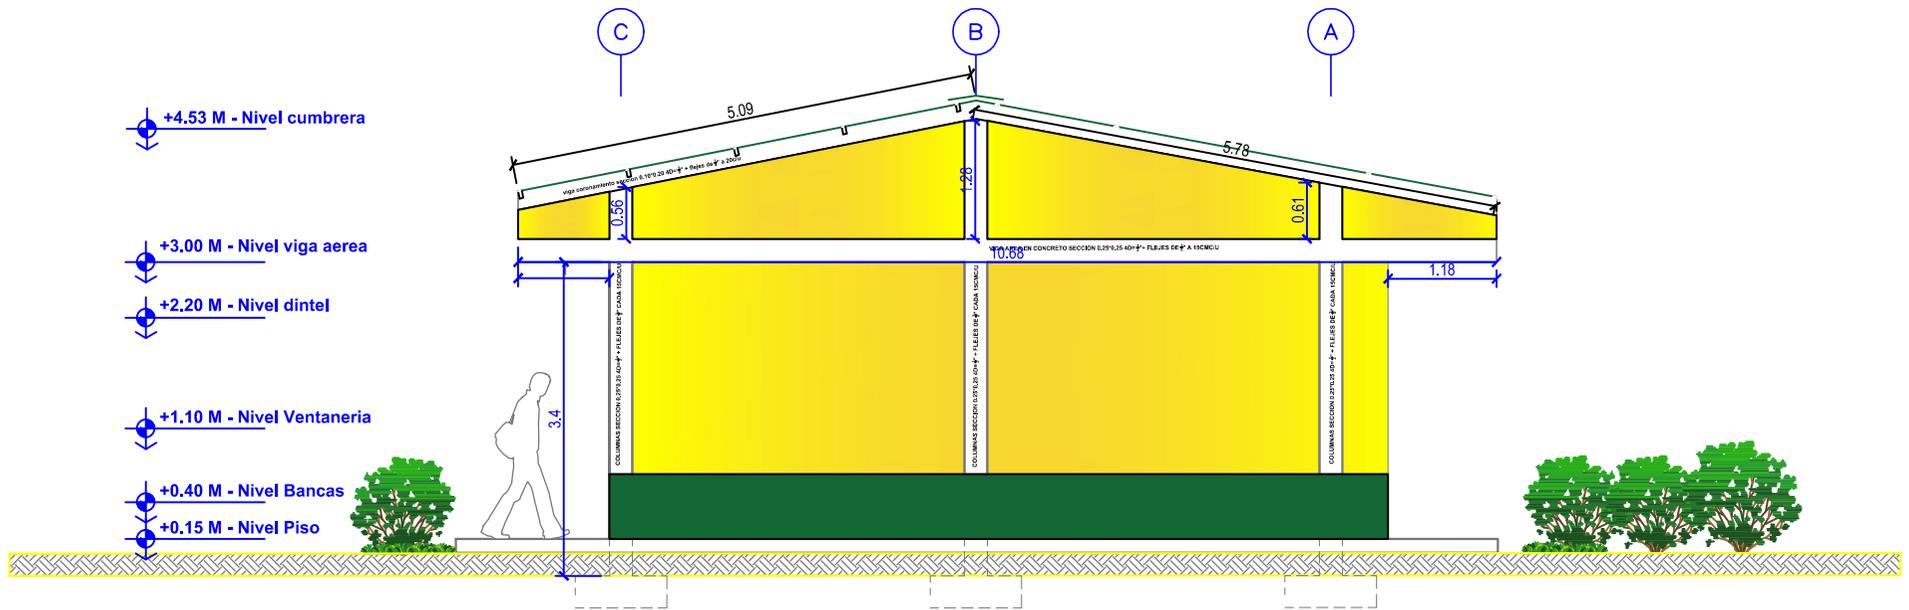

FACHADA FRONTAL

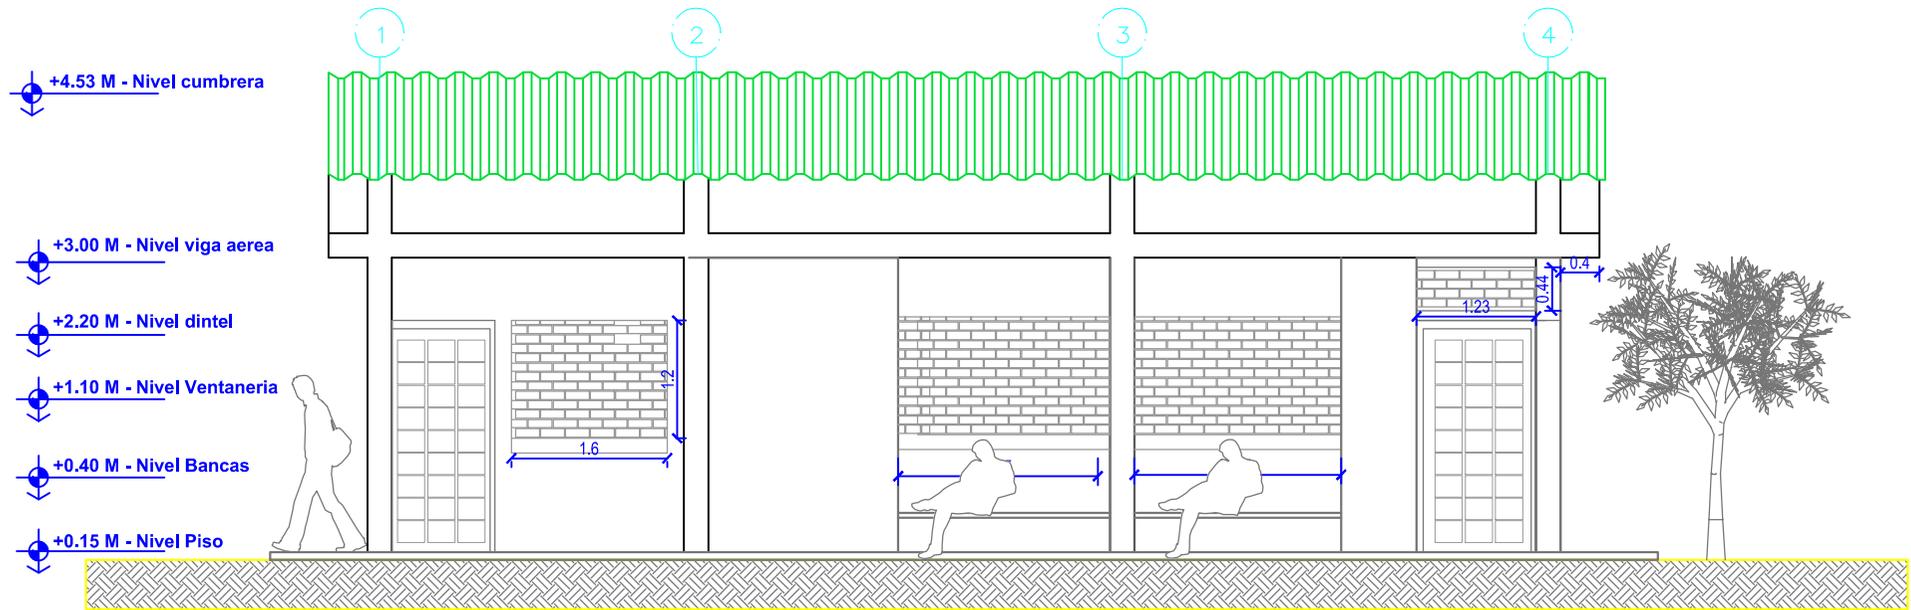

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

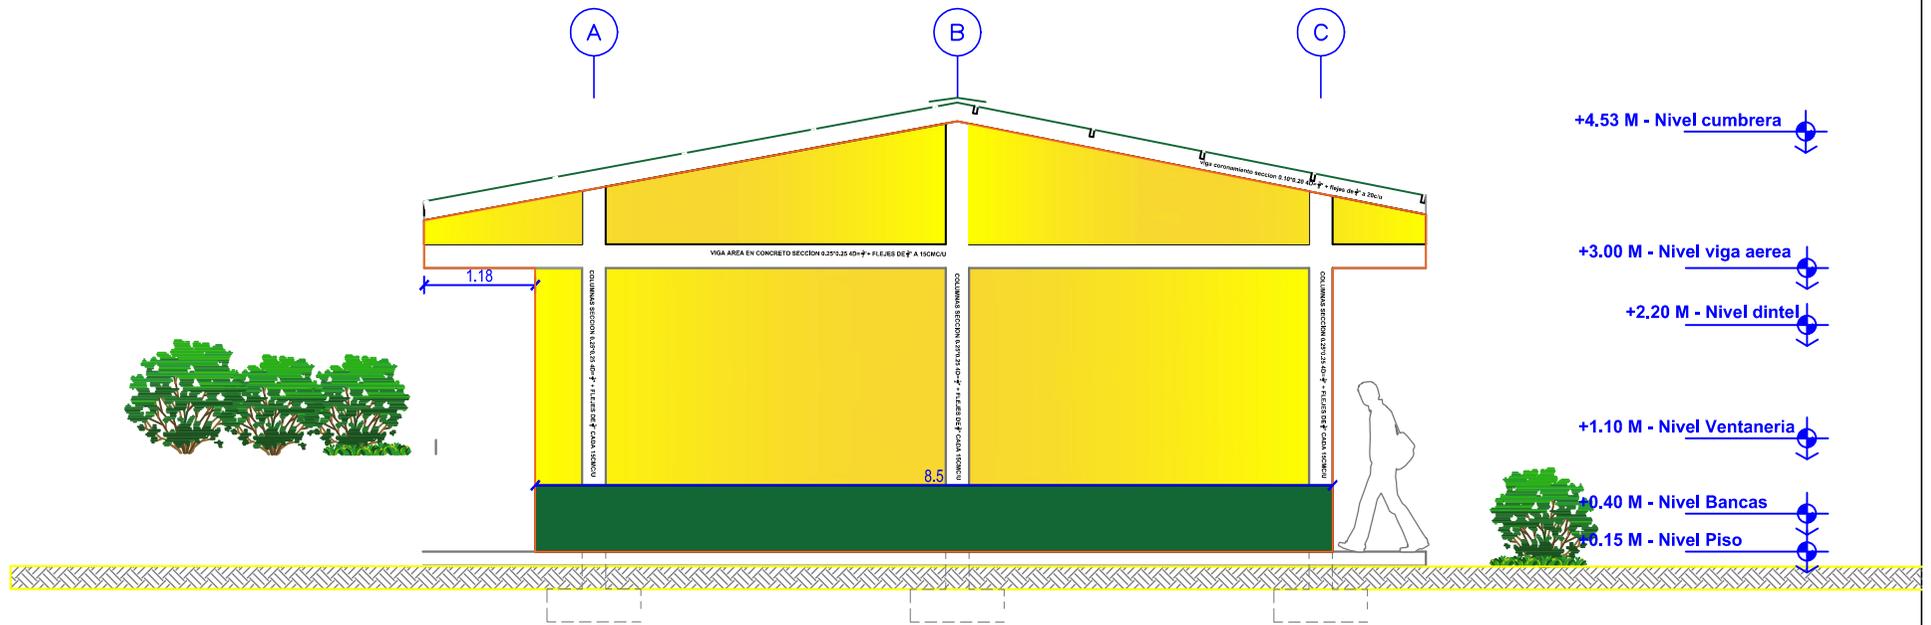



| CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA EN SEDE EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE KANALITOJO, MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO VICHADA | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------|-----------|
| ÍTEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| A | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA | | | | |
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | M2 | 10,50 | 5.512 | 57.876 |
| 1,2 | Descapote manual, nivelación y retiro | M2 | 10,50 | 5.231 | 54.926 |
| 1,3 | Excavación manual conglomerado y retiro | M3 | 2,00 | 42.154 | 84.308 |
| 1,4 | Relleno de recebo compactación manual | M3 | 2,33 | 51.304 | 119.282 |
| 1,5 | Concreto para solados pisos 2500 psi | M3 | 0,21 | 315.298 | 66.843 |
| 1,6 | Concreto para zapatas 3000 psi (0,6*0,6*0,6) | M3 | 0,86 | 656.397 | 567.127 |
| 1,7 | Viga de .20*.25 4D1/2+flejes 3/8" a cada 15 c/u | ML | 12,50 | 110.211 | 1.377.638 |
| 1,8 | Columnas sección de 0,20*0,20 4d=1/2" + fejes 3/8" a 15 c/u concreto 3000psi | ML | 13,20 | 92.223 | 1.217.344 |
| 1,9 | Vigas aéreas sección .20*.20 4D=1/2 + flejes 3/8 a .15 c/u concreto 3000 psi | ML | 12,50 | 95.600 | 1.195.000 |
| 1,10 | Placa Piso en concreto de 3,000PSI, e=8 cms., incluye malla electrosoldada. | M2 | 6,25 | 74.190 | 463.688 |
| 1,11 | Sardinel en concreto 3000 PSI B = 0.20 B = 0.15 H = 0.40 | MI | 12,00 | 53.621 | 643.452 |
| 1,12 | Acero de refuerzo 60.000 psi | Kg | 140,00 | 6.352 | 889.280 |
| 1,13 | Andenes en concreto de 3000 psi | M2 | 7,00 | 63.850 | 446.950 |
| 1,14 | Placa maciza e=0,15, incluye refuerzo d=1/2" 0,10 cm c/u en ambos sentidos | M2 | 8,40 | 237.274 | 1.993.102 |
| 1,15 | Rampa en concreto de 3000 psi acero de refuerzo de 1/2 C/20 cms. en ambas direcciones de e=12 cms. | M2 | 4,00 | \$ 162.697,60 | 650.790 |
| 2.0 | MAMPOSTERIA | | | | |
| 2,1 | Muro en ladrillo flexa No.4 | M2 | 30,16 | 61.548 | 1.856.288 |
| 2,2 | Pañete liso sobre muros, mortero 1:3 incluye filos y dilataciones | M2 | 60,32 | 27.039 | 1.630.992 |
| 3.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | |
| 3,1 | Acometida en 1" | gl | 1,00 | 268.599 | 268.599 |
| 3,3 | Red de distribución de 1/2" (tubo pvc-p 1/2") | ml | 15,00 | 7.523 | 112.845 |
| 3,4 | Tubería pvc (tubo pvc-s 4") | ml | 12,00 | 45.202 | 542.424 |
| 3,5 | Tubería de 2" pvc (tubo pvc-s liviano 2" reventil.) | ml | 4,00 | 26.243 | 104.972 |
| 3,6 | Puntos hidráulicos de 1/2" | pto | 4,00 | 31.942 | 127.768 |
| 3,7 | Red de desagües de 3" | ml | 12,00 | 34.317 | 411.804 |
| 3,10 | Punto sanitario de 2" | pto | 2,00 | 50.816 | 101.632 |
| 3,11 | Punto sanitario de 3" incluye accesorios | pto | 2,00 | 71.505 | 143.010 |
| 4.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 4,1 | Acometida eléctrica monofásica (incluye alambre THW 2#8) | MI | 20,00 | 8.260 | 165.200 |
| 4,2 | Salida para bombillo de 110 Vatios (incluye bombillo ahorrador y accesorios caja plastica, roseta, tubería, etc) | Pto | 3,00 | 81.370 | 244.110 |
| 5.0 | ENCHAPES | | | | |
| 5,1 | Enchapes muros baño | M2 | 15,24 | 46.730 | 712.165 |
| 5,2 | Enchape piso baño | M2 | 4,29 | 69.750 | 299.534 |
| | Suministro e Instalación de Tablón en gres para zona de corredor | M2 | 7,40 | 87.503 | 647.522 |
| 60.0 | CARPINTERIA | | | | |
| 6,1 | Ventana Persiana en lamina Cold Rolled P | M2 | 0,60 | 168.869 | 101.321 |
| 6,2 | Puerta lamina cold - rolled cal 20 0,70*1,80 mts incluye pasador | Und | 2,00 | 599.354 | 1.198.708 |
| 6,3 | Puerta lamina cold - rolled cal 20 0,70*1,80 mts incluye pasador | Und | 2,00 | 445.465 | 890.930 |
| 9.0 | APARATOS SANITARIOS | | | | |
| 9,1 | Sanitario blanco línea acuser | Und | 2,00 | 329.974 | 659.948 |
| 9,2 | Lavamanos blanco línea acuser | Und | 2,00 | 189.735 | 379.470 |
| 10.0 | PINTURA | | | | |
| 10,1 | Pintura vinilo tipo 1 sobre muro 3 manos | m ² | 35,90 | 14.807 | 531.571 |
| 10,2 | Zocalo en pintura esmalte h= 70 cm | M2 | 5,70 | 32.499 | 185.179 |
| 11.0 | TANQUE ELEVADO | | | | |
| 11,2 | Tanque plástico de almacenamiento de 500 litros, con tapa y accesorios | Und | 2,00 | 358.824 | 717.648 |
| 12.0 | POZO SEPTICO DE 2*1,5*2 | | | | |
| 12,1 | Excavación manual conglomerado y retiro | m3 | 6,00 | 42.154 | 252.924 |
| 12,2 | Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI de 0.15X0.15 MTS 4 D1/2 + fleje 3/8" a cada 15c/u | MI | 6,20 | 92.400 | 572.880 |
| 12,3 | Muro en ladrillo flexa no.4 | m2 | 14,00 | 61.548 | 861.672 |
| 12,4 | Columna en concreto de 3000 psi 0,20 x 0,20 mts, 4D1/2+flejes 3/8" a cada 15 c/u | MI | 8,00 | 92.223 | 737.784 |
| 12,5 | Viga de amarre superior 0,15x 0,20 en concreto de 3000 psi. 4D1/2+flejes 3/8" a cada 15 c/u | MI | 6,20 | 78.600 | 487.320 |
| 12,6 | Placa en concreto de 3000 psi e= 8 cm (incluye acero de refuerzo de 1/2 cada 25 cm ambas direcciones). | m2 | 3,36 | 186.466 | 626.526 |
| 12,7 | Acero de refuerzo 60.000 psi | kg | 100,00 | 6.352 | 635.200 |
| 12,8 | Cajas de inspeccion de .60x.60 | und | 2,00 | 720.588 | 1.441.176 |
| 12,9 | Tubería PVC sanitaria de 4" para campo de infiltración (incluye excavacion) | ml | 30,00 | 55.052 | 1.651.560 |
| 12,10 | Filtro en ripio e=0,3 | m3 | 2,00 | 132.794 | 265.588 |
| 12,11 | Pañete liso sobre muro pozo septico. | m2 | 14,00 | 27.039 | 378.546 |
| 12,12 | Placa piso en concreto de 3000 psi e=8 cms | m2 | 3,00 | 97.339 | 292.017 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|--------|---------------|--|-----------------------|
| 14,0 | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO. | | | | | - |
| 14,1 | Perforación pozo profundo en 6" encamisado en 4" con sus respectivos filtros, perforación de 20 ml, encamisado de 17 metros, revestimiento en tubería de p.v.c de 4" de 24ml. con filtro interno v externo. | glo | 1,00 | \$ 12.374.040 | | 12.374.040 |
| 15 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | | | | | - |
| 15,1 | Sistema de Bombeo fotovoltaico (incluye 4 paneles solares de 190 watts c/u, Electrobomba sumergible PH 150 C., controlador solar TH 320, soporte para paneles solares tipo poste, cable de interconexión panel-controlador-Bomba, Valvula de nivel tipo flotador, sistema puesta a tierra, sensor de nivel del pozo, cabina de fijación prefabricada) | glo | 1,00 | \$ 13.126.337 | | 13.126.337 |
| A | CONSTRUCCIÓN AULAS | | | | | - |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES | | | | | - |
| 1,1 | Localización y replanteo | M2 | 159,60 | 5.512 | | 879.715 |
| 1,2 | Descapote manual, nivelación y retiro | M2 | 159,60 | 5.231 | | 834.868 |
| 2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | | | | | - |
| 2,1 | Excavación manual conglomerado y retiro | M3 | 13,26 | 42.154 | | 558.783 |
| 2,2 | Relleno de recebo compactación manual | M3 | 30,02 | 51.304 | | 1.540.102 |
| 3 | CIMENTACIÓN ZAPATAS | | | | | - |
| 3,1 | Concreto para solados 2500 PSI | M3 | 1,18 | 315.298 | | 371.263 |
| 3,2 | Concreto para zapatas 3000 psi (0,90*0,90*1,10) | M3 | 9,80 | 656.397 | | 6.433.347 |
| 4 | ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNAS | | | | | - |
| 4,1 | Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI de 0,25 X0,25 mt incluye hierro 4 D1/2 + fleje 3/8" a cada 15c/u | ML | 51,60 | 135.200 | | 6.976.320 |
| 4,2 | Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI de 0,15X0,15 MTS 4 D1/2 + fleje 3/8" a cada 15c/u | ML | 11,60 | 92.400 | | 1.071.840 |
| 4,3 | Columnas sección de 0,25*0,25 concreto de 3000 PSI 4D=1/2" + FLEJES DE 3/8" a 15c/u | ML | 35,70 | 98.500 | | 3.516.450 |
| 4,4 | Viga aerea en concreto de 3000 PSI de 0,25X0,25 4D=1/2" + FLEJES DE 3/8" a 15c/u | ML | 61,50 | 97.200 | | 5.977.800 |
| 4,5 | Viga de coronamiento culata sección 0,10 *0,20 4D=3/8" + FLEJES 1/4 A .20 C/U CONCRETO 3000 PSI | ML | 36,10 | 64.176 | | 2.316.754 |
| 5 | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | | | | | - |
| 5,1 | Placa en concreto de 3000 PSI E=0,08 M Incluye malla electrosoldada | M2 | 92,54 | 74.190 | | 6.865.595 |
| 5,2 | Sardinel en concreto 3000 PSI B = 0,20 B = 0,15 H = 0,40 | ML | 50,78 | 53.621 | | 2.722.874 |
| 5,3 | Andenes en concreto de 3000 PSI | M2 | 58,65 | 108.734 | | 6.377.032 |
| | Rampa en concreto de 3000 psi acero de refuerzo de 1/2 C/20 cms. en ambas direcciones de e=12 cms. | M2 | 4,00 | \$ 162.697,60 | | 650.790 |
| 6 | MAMPOSTERIA PAÑETE Y PISO | | | | | - |
| 6,1 | Muro en ladrillo flexa No.4 | M2 | 148,10 | 61.548 | | 9.115.259 |
| 6,2 | Pañete liso sobre muro, mortero 1:3 incluye filos y dilataciones | M2 | 296,20 | 27.039 | | 8.008.952 |
| 7 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | | | | | - |
| 7,1 | Alfaja en concreto de 3000 PSI A= 12 cm E= 0,05 cm, refuerzo 2D1/8" y alambón | ML | 8,00 | 35.637 | | 285.096 |
| 7,2 | Banca en concreto de 3000 PSI, refuerzo en varilla de 1/2 en ambos sentidos | M2 | 8,80 | 67.130 | | 590.744 |
| 7,3 | Repisas internas para biblioteca en concreto 3000 PSI, incluye varilla de 1/2 en ambos sentidos | M2 | 12,00 | 63.590 | | 763.080 |
| 7,4 | Suministro e instalación de tablero acrílico de 2,45 m x 1,20 m | UN | 1,00 | 250.000 | | 250.000 |
| 8 | PISOS Y BASES | | | | | - |
| 8,1 | Tablón en gres con dilatación en gravilla zona exterior | M2 | 58,65 | 87.503 | | 5.131.876 |
| 8,2 | Cerámica tráfico pesado (Piso interno) | M2 | 92,54 | 83.949 | | 7.768.699 |
| 8,3 | Guarda escoba en tableta | MI | 95,04 | 21.118 | | 2.007.055 |
| 9 | CUBIERTAS METALICA | | | | | - |
| 9,1 | Suministro e instalación Cubierta en teja termo acustica incluye ganchos auto perforantes (Según Diseño) | M2 | 159,47 | 95.033 | | 15.154.913 |
| 9,2 | Caballote para teja termo acustica incluye ganchos | ML | 14,50 | 48.959 | | 709.906 |
| 9,3 | Suministro e instalación de Tubo estructural rectangular 120*60*2mm (Incluye anticorrosivo y esmalte) | ML | 12,85 | 75.967 | | 976.176 |
| 9,4 | Correas metálicas 3 x 1 1/2 con anticorrosivo y esmalte | ML | 129,00 | 38.277 | | 4.937.733 |
| 10 | CARPINTERIA | | | | | - |
| 10,1 | Suministro e Instalación de Puerta Metálica de 1x2,1 m en tablero completo, incluye chapa, manija y plalquetas ; lavadero | UND | 3,00 | 453.715 | | 1.361.145 |
| 10,2 | Suministro Instalacion de reja tipo bancario en tubo cuadrado de 3/4" (Incluye pintura esmalte) | M2 | 17,00 | 223.000 | | 3.791.000 |
| 11 | PINTURA | | | | | - |
| 11,1 | Pintura vinilo tipo 1 sobre muro 3 manos | M2 | 294,47 | 14.807 | | 4.360.217 |
| 12 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | - |
| 12,1 | Acometida eléctrica monofásica (incluye alambre THW 2#8) | MI | 25,00 | 8.260 | | 206.500 |
| 12,2 | Suministro e instalacion de tablero parcial para 12 circuitos. (Incluye breakers) | Und | 1,00 | 607.153 | | 607.153 |
| 12,3 | Salida para bombillo de 110 Vatios (incluye bombillo ahorrador y accesorios caja plastica, roceta, tubería, etc) | Pto | 3,00 | 81.370 | | 244.110 |
| 12,4 | Salida eléctrica + toma doble con polo a tierra 100 v 15 amp (incluye tubo PVC conduit, alambre THW 2# 12 + 1# 14 desnudo toma, accesorios regatas v resanes) | PTO | 10 | 124.730 | | 1.247.300 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 170.175.261 |
| ADMINISTRACION (25%) | | | | | | \$ 42.543.815 |
| IMPREVISTO (2%) | | | | | | \$ 3.403.505 |
| UTILIDAD (5%) | | | | | | \$ 8.508.763 |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA. | | | | | | \$ 224.631.345 |

| CONCRETO VOLUMENES (M3) | |
|---------------------------|---------------|
| ZAPATAS (4)(0,6*0,6*0,35) | 0,504 |
| VIGAS CIMENTACION | 0,476 |
| VIGAS AEREAS | 0,476 |
| COLUMNAS (4)(0,2*0,2) | 0,448 |
| PLACA PISO | 1,3311 |
| PLACA CUBIERTA | 0,783 |
| VOLUMEN TOTAL (M3) | 4,0181 |

PARA GARANTIZAR 2700-3300 PSI (NO ESPECIFICADO EN PLANOS)

| PROP. AGR. | 1 M3 | TOTAL M3 (5% DESP) | BULTOS C. |
|------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 | Kg C 350 | Kg C 1.476,65 | 29,533035 |
| 2 | M3 F 0,56 | M3 F 2,36 | |
| 3 | M3 G 0,84 | M3 G 3,54 | |

CONCRETO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS (1500 PSI) (ESPESOR 0,05M)

| PROP. AGR. | 1 M3 | TOTAL M3 (5% DESP) | BULTOS C. |
|------------|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | Kg C 235 | Kg C 17,77 | 0,35532 |
| 3 | M3 F 0,56004 | M3 F 0,04 | |
| 5 | M3 G 0,9334 | M3 G 0,07 | |

VOL (M3) 0,072

| ACERO DE REFUERZO (1/2" Y 3/8") | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------|------|------|-------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ELEMENTO | ELEMENTOS Y LOCALIZACIÓN | | | | LONGITUDINAL 1/2" | | | | TRANSVERSAL 3/8" | | | |
| | LOCALIZACIÓN | LARGO | ALTO | BASE | long. refuerzo | No. Elementos | Long. total | Nº Varillas | long estribo | No. elementos | Long. Total | Nº varillas |
| VIGA CIMENTACIÓN | B-A | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 12,8 | 2 | 25,6 | 4,267 | 0,75 | 14,5 | 10,875 | 1,81 |
| | A-B | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 10,8 | 1 | 10,8 | 1,800 | 0,75 | 10,5 | 7,875 | 1,31 |
| | 1-2-3 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 15,6 | 2 | 31,2 | 5,200 | 0,75 | 15,5 | 11,625 | 1,94 |
| VIGA AEREA | 1-2-3 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 19,5 | 2 | 39 | 6,500 | 0,75 | 15,5 | 11,625 | 1,94 |
| | A-B | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 13,5 | 1 | 13,5 | 2,250 | 0,75 | 10,5 | 7,875 | 1,31 |
| | B-A | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 16 | 2 | 32 | 5,333 | 0,75 | 14,5 | 10,875 | 1,81 |
| PLACAS | | 2,9 | 0,17 | 2,7 | 55 | 2 | 109,8 | 18,300 | | | | |
| | | 2,9 | 0,1 | 2,7 | 55,1 | 2 | 110,2 | 18,367 | | | | |
| COLUMNAS | | | | | 4,865 | 4 | 116,76 | 19,460 | 0,75 | 20,35 | 15,2625 | 2,54 |
| ZAPATAS | | 0,6 | 0,35 | 0,6 | 0,7 | 4 | 28 | 4,667 | | | | |
| | | | | | | | | TOAL 1/2" | | | | 86,143 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL 3/8" | 12,669 |

| MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|----------|------------------------------|--------------|---------|----------|-------------------|---------------|
| AREA MAMPOSTERIA (M2) | | DIMENSION BLOQUE (cm) | | | PARED/M2 | | MORTERO DE PEGA (M3/M2 MURO) | MORTERO / M3 | | | 25,14 M2 (5%DESP) | |
| MUROS LATERALES | 13,50 | 30 | Largo | Cant. Hor. | Cant. Vert. | PR. AGR. | | Cb | 9 | Nº BLOQ. | 389,74 | |
| MURO FRONTAL | 4,59 | 10 | Espesor | 3,174603175 | 4,651162791 | 1 | Kg cemento | 450 | Kg CEM | 118,78 | | |
| MURO POSTERIOR | 7,05 | 20 | Alto | Nº BLOQ. | 14,76559616 | 0,01 | 3 | M3 F 1,08 | M3 ARE. | 0,29 | | |
| AREA TOTAL (M2) | 25,14 | | | | | | | | | | 2,375541 | B, CEM |
| MORTERO PEGA (cm) | | 1,5 | | | | | | | | | | |

| PAÑETE INTERNO Y EXTERNO | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|------|--|--------|
| AREA PAÑETE (M2) | | MORTERO/M2 | | PAÑETE 62,276 M2 (ESPESOR 0,02 M) DESPERDICIO DE 10% | |
| MUROS LATERALES | 34,2 | KG CEMENTO | 450 | KG CEMENTO | 616,53 |
| MURO FRONTAL | 11,576 | ARENA (M3) | 1,08 | ARENA (M3) | 1,48 |
| MURO POSTERIOR | 16,5 | | | | |
| TOTAL (M2) | 62,276 | | | | |
| | | 12,330648 B. CEMENTO | | | |

| AREA PINTURA (M2) | | RENDIMIENTO A 2 MANOS (M2/GALON) | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| EXTERIOR | | INTERIORES | | EXTERIOR | INTERIORES |
| MUROS LATERALES | 11,78 | MUROS LATERALES | 18 | 8 | 20 |
| MURO FRONTAL | 6,078 | MURO FRONTAL | 5,788 | | |
| MURO POSTERIOR | 8,54 | MURO POSTERIOR | 8,25 | | |
| TOTAL (M2) | 26,398 | TECHO | 7,83 | | |
| | | TOTAL (M2) | 39,868 | 3,4647375 | 2,09307 |

Buen día Arquitecta María Alejandra:

Encontré inconsistencias en el plano de la batería sanitaria del proyecto del aula en Knalitojo. Según la planta de las vigas de cimentación y aéreas, estas tienen secciones transversales de (0.2 x 0.20) m, pero se presentan en el plano secciones cuyas dimensiones no corresponden a estas, por tanto, no es posible aun hacer cálculos con certeza de las cantidades de obra requeridas. Considero deberíamos hacer esa observación en el formato correspondiente para solicitar las correcciones en la información suministrada del proyecto.

Voy a estar adelantando la formulación del calculo de cantidades para la construcción de la unidad sanitaria mientras se remite la corrección de los planos y poder hacer el calculo de las cantidades con certeza.

Hace falta caja de inspección para la unidad sanitaria y su respectivo detalle en planos de acero de refuerzo-mampostería.

Hace falta un plano de alzado del refuerzo columnas-zapatras (para saber la distancia de las zapatas debajo de las vigas de cimentación), falta especificar los ganchos del acero de refuerzo longitudinal en vigas aéreas y de cimentación, igualmente los ganchos de los estribos.

No es claro si los elementos de mampostería son ladrillos o bloques

No hay plano eléctrico, los baños requieren iluminación eléctrica

Agradezco tu atención, estoy pendiente a requerimientos

ANEXO 21. Cuarto informe parcial de práctica

CUARTO INFORME PARCIAL DE PASANTÍA EN LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

| | |
|--|--|
| Nombres completo del practicante | Jairo Alonso Segura Pulido |
| Documento de identidad del practicante | 1023917216 |
| Institución de Educación Superior | Universidad Antonio Nariño |
| Programa académico | Ingeniería Civil |
| Entidad pública donde desarrolla la práctica | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas |
| Caja de Compensación Familiar | Compensar |
| Objetivo general de la práctica | Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad |
| Duración de la práctica | (5) meses |
| Número de informe | 4 (Noviembre de 2019) |

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|--|---------------|
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 78,95 % | Archivo .xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de medidas de reparación colectiva en las áreas de infraestructura, mobiliario e insumos agrícolas para el año 2017 | ANEXO 1 |
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 100 % | Acta de asistencia a reunión de equipo de proyectos para la implementación de estrategias de mejora continua en la gestión de la información financiera. | ANEXO 2 |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 78,95 % | Archivo .xlsx con la construcción de matriz financiera de inversiones históricas en implementación de medidas de reparación colectiva entre los años 2017 a 2019 | ANEXO 3 |

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 78.95 % | Archivo xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de medidas de reparación colectiva en las áreas de infraestructura, mobiliario e insumos agrícolas para el año 2017. | ANEXO 1 |
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 100 % | Lista de asistencia a reunión de equipo del área de proyectos para la socialización de estrategias de mejora continua en la gestión financiera. | ANEXO 4 |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 78.95 % | Archivos xlsx con la determinación de inversión del año 2019 (con corte a octubre) en operaciones logísticas en el territorio nacional como apoyo a la ejecución de medidas de reparación colectiva | ANEXO 5 |

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA

| ITEM | ACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MESES Y SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|----|----|----|------------|--------|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|--------|----|-----------|----|----|----|
| | | | Meses del año 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1 | Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % AVANCE | 78,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |
| | | % AVANCE | 33,33% | | | | | 33,33% | | | | | | | | | 33,34% | | | | | |
| 3 | Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % AVANCE | 78,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % AVANCE | 78,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % AVANCE | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % AVANCE | 78,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


APRUEBAN



JUANITA ECHEZ SANTAMARÍA
TUTOR DE PRÁCTICA
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



JAIR ALONSO SEGURA P. LÓO
PRÁCTICANTE
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



ALEJANDRA MORALES
SUPERVISOR DE PRÁCTICA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ANEXO 22. Anexo 1 de cuarto informe parcial de práctica

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 319 | LA COMUNIDAD DE GUADUAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO | | \$ 12.085.666,60 | | | \$ 177.461.182,33 | \$ 20.521.046,82 | | \$ 210.067.895,76 | | | | | | |
| 332 | CABECERA MUNICIPAL DE SAMANA | | \$ 38.458.399,95 | | | | | | \$ 38.458.399,95 | | | | | | |
| 334 | SAN JOSE DE PLAYON | | | | | | \$ 39.543.143,95 | | \$ 39.543.143,95 | | | | | | |
| TOTALES POR AREA DE INVERSION/RESPONSABLE AREA (2017) | | \$ | 2.815.724.632,00 | \$ | 771.555.631,30 | \$ | 71.829.529,00 | \$ | 1.367.761.430,00 | \$ | 2.126.844.658,47 | \$ | 464.100.000,00 | \$ | 468.609.621,62 |

GRAN TOTAL (2017): \$ 8.086.425.502,39 \$ 8.086.425.502,39

ANEXO 23. Anexo 2 de cuarto informe parcial de práctica

| | | |
|--|---|--|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO | Código: 710.14.15-10 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Versión: 03 |
| | PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG | Fecha: 16/09/2019 Página 1 de 3 |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| No. de Acta: | Fecha: 31/10/2019 | Nombre Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva |
| Lugar: Piso 3, sede de La Unidad para las Víctimas, Bogotá | | Hora Inicio: 10:00 AM Hora Final: 11:20 AM |

OBJETIVO:

Revisión de la información financiera histórica y de los procesos por líneas de inversión de la subdirección de Reparación Colectiva para la identificación de ajustes y compromisos que se expondrán como trabajo en la mesa técnica del Plan de mejoramiento.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El 31 de Octubre del año 2019, se convoca a reunión del grupo de proyectos y Financiero de la Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, con la finalidad de establecer los diferentes aspectos que impactan en el desempeño de la gestión y tratamiento de la información financiera y contable histórica y que se registran en la Matriz de Costos aprobada, producto de esta reunión **se han establecido por los integrantes del grupo de trabajo los siguientes compromisos** para la implementación inmediata de las respectivas estrategias de mejora:

1. Se realizará un compendio de información financiera y contable histórica para su revisión con el objetivo de determinar antecedentes y evidencias que permitan sustentar la información que se consolidará en la matriz de costos históricos de inversión en sujetos de reparación colectiva.
2. Todos los integrantes del equipo de trabajo realizarán según sus respectivas líneas, un análisis en el cual puedan comparar las metodologías de presentación de la información financiera de sus respectivas áreas con respecto a la matriz de Costo Histórico del SIG con el fin de identificar y proponer mejoras de acuerdo con sus necesidades de trabajo
3. Asistir a la mesa técnica de acuerdo con la ruta de trabajo para comprometer fechas de entrega de información consolidada de la siguiente manera:
 - Información de 2018 hasta 30 de Noviembre
 - Información 2019 hasta 30 de Diciembre

Como conclusión de la reunión, el equipo de trabajo del área de proyectos ratifica su compromiso con el cumplimiento y disposición para cumplir con las fechas acordadas

Firman los asistentes



El futuro
es de todos

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: 710.14.15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 03

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SIG

Fecha: 18/02/2019

Página **2** de **3**

Responsable de la reunión:

Firma:

Nombre: Nelson Meza

Cargo: Coordinador del equipo de proyectos

Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva

| | | |
|--|---|--|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO | Código:710.14.15-10 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Versión:03 |
| | PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG | Fecha: 18/02/2019 Página 3 de 3 |



Ministerio de Salud
 Gobierno de la República

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: 710.14.15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 03

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN
 DOCUMENTADA DEL SIG

Fecha: / /2019

Página 2 de 2

No. de Acta:

Fecha de Reunión: 31-10/19

Objetivo:

Plan de trabajo Equipos de Proyectos y Financiera
 Para plan de Mejoramiento

| No. | Nombre | * Género M/F | ** Etnia A/I/G/NA | Entidad o Dependencia | E-mail | Teléfono | Firma |
|-----|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------|
| 1 | Nelson Meza Herrera | M | N/A | SRC | nelson.meza | 4252 | [Firma] |
| 2 | Juan Pablo Urrego | M | N/A | SRC | Juan.Urrego | | [Firma] |
| 3 | Fairo A. Segura Paludo | M | N/A. | SRC | fairo.segura | 3124705701 | [Firma] |
| 4 | Familia Vasquez Familia | F | N/A | Sec | Familia.Vasquez | | [Firma] |
| 5 | Famira Rouva Rondero | F | A | SRC | Zamira.rouva@ | 4237 | [Firma] |
| 6 | MORTICA ORTIZ | F | NA | ORC | MORTICA ORTIZ | | [Firma] |
| 7 | CHRISTIAN SOTO NÚÑEZ | M | N.A. | SRC | christian.soto | | [Firma] |
| 8 | MARIA A MARIBEL | F | NA | SALC | maribel.maria | | [Firma] |
| 9 | Diana Dujardin | | | | | | |
| 10 | Jose Jair Acero | M | N/A | UAGRV | Jose.acero | | [Firma] |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

* Género: M: Masculino / F: Femenino
 ** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA: No aplica

ANEXO 24. Anexo 3 de cuarto informe parcial de práctica

| ID | NOMBRE | 2016-2018 Dependencia interna de METU | Tipo | Fecha del referendum 2016 | Comunidad | División Territorial | Munic. Cant. | Municipi- cipio | POD | Opin. Cant. | Departamento | Estratificación por Sexo | | | | | | | | | | Valor Netos Empagare | | | | | | | | | | Operador Negocio | | | | | | | | | | Resoluciones Emplombones | | | | | | | | | | Administraciones | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | | | | | | | |
| 1 | REGISTRARIO ALTO NIQUARA - SIEMPRE | Comando | META Llanos Oriental | 88713 | COMANDOS | META Llanos | 88713 | COMANDOS | NO | NO | NIQUARA | 25.178.16100 | 27.740.57000 | 45.565.95147 | 37.754.65000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO 25. Anexo 4 de cuarto informe parcial de práctica

| | | |
|--|---|----------------------|
|  El futuro es de todos. | FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO | Código: 710.14.15-10 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Versión: 03 |
| | PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG | Fecha: / / 2019 |
| | | Página 2 de 2 |

No. de Acta: _____
 Fecha de Reunión: _____
 Objetivo: Revisión Procedimiento y Matriz SIG Control Financ. cto

| No. | Nombre | * Género M/F | ** Etnia A/I/G/NA | Entidad o Dependencia | E-mail | Teléfono | Firma |
|-----|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------|-------|
| 1 | Nelson Meze Herrera | M | N/A | SRC | nelson.meze | 4252 | |
| 2 | Yamila Vasquez L. | F | N/A | SEC | Yamila.Vasquez | | |
| 3 | Jairo A. Segura Pulido | M | N/A | SRC | jairo.segura | 3124763784 | |
| 4 | Jose Javi Acos | M | N/A | SEC | Jose.acos | — | |
| 5 | Juan Pablo Urrego | M | N/A | SRC | Juan Urrego | — | |
| 6 | Zamira Rovira Londoño | F | A | SRC | Zamira.rovira | 4237 | |
| 7 | Christian Soto Núñez | M | N.A | SRC | christian.sot | — | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

* Género: M: Masculino / F: Femenino

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA: No aplica

ANEXO 26. Anexo 5 de cuarto informe parcial de práctica

ANEXO 27. Quinto informe parcial de práctica

QUINTO INFORME PARCIAL DE PASANTÍA EN LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

| | |
|--|--|
| Nombres completo del practicante | Jairo Alonso Segura Pulido |
| Documento de identidad del practicante | 1023917216 |
| Institución de Educación Superior | Universidad Antonio Nariño |
| Programa académico | Ingeniería Civil |
| Entidad pública donde desarrolla la práctica | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas |
| Caja de Compensación Familiar | Compensar |
| Objetivo general de la práctica | Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad |
| Duración de la práctica | (5) meses |
| Número de informe | 5 (Diciembre de 2019) |

| ACTIVIDADES DEL PLAN DE PRÁCTICA | % DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO ENTREGADO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---|--|
| Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | 89,47 % | Archivos .xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de medidas de reparación colectiva con recursos del Banco Mundial en el año 2019. | ANEXO 1 |
| Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 100 % | No se generó producto para esta actividad en el mes de Diciembre, dado que se programó solo hasta el mes de Noviembre | Se ejecutó en el 100% en el mes de Noviembre como consta en los informes precedentes |
| Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | 89,47 % | Archivo .xlsx con la actualización de rubros en la matriz financiera de inversiones históricas en implementación de medidas de reparación colectiva entre los años 2017 a 2019. | ANEXO 2 |

| | | | |
|--|---------|---|--|
| Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | 89,47 % | Archivos .xlsx con la determinación del consolidado de inversión en ejecución de eventos para el cierre de medidas de reparación colectiva en las áreas de infraestructura, mobiliario e insumos agrícolas para el mes de Noviembre del año 2019. | ANEXO 3 |
| Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | 100 % | No se generó producto para esta actividad en el mes de Diciembre, dado que se programó solo hasta el mes de Noviembre | Se ejecuto en el 100% en el mes de Noviembre como consta en los informes precedentes |
| Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | 89,47 % | Archivos .xlsx con la determinación de inversión histórica por sujeto de las vigencias 2018 y 2019 (con corte a Noviembre) en operaciones logísticas en el territorio nacional como apoyo a la ejecución de medidas de reparación colectiva | ANEXO 4 |

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA

| ITEM | ACTIVIDAD | INDICADOR | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MESES Y SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|----|----|-----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Meses del año 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | | | | | | | | |
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | | | | | |
| 1 | Apoyar los procesos y procedimientos operativos que aporten a la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 89,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistir a las capacitaciones sobre los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 33,33% | | | | 33,33% | | | | | | | | | | | | | | 33,34% | | | | | | | | | |
| 3 | Participar propositiva y activamente en las actividades que den respuesta a las necesidades de la entidad | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 89,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar los reportes e informes solicitados de acuerdo con los temas designados por la Subdirección de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 89,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acompañar técnica y logísticamente las capacitaciones, conferencias y actividades relacionadas con la implementación de planes de reparación colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | |
| 6 | Apoyar técnica y operativamente los proyectos encaminados a la implementación de acciones de los Planes de Reparación Colectiva | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | %AVANCE | 89,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

APRUEBAN



JUANITA IBANEZ SANTAMARIA
TUTOR DE PRÁCTICA
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



ALEJANDRA MORALES
SUPERVISOR DE PRÁCTICA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



JAIRO ALONSO SEGURA PULIDO
PRÁCTICANTE
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ANEXO 28. Anexo 1 de quinto informe parcial de práctica

| Year | Country | Company | Revenue | Profit | Assets | Liabilities | Equity | Debt | Capital | Dividend | EPS | P/E | BV/P | Dividend Yield | Market Cap | Market Value | Enterprise Value |
|------|---------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------|------|------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2018 | USA | Amazon.com Inc | 50543000000 | 8145000000 | 191000000000 | 150000000000 | 41000000000 | 150000000000 | 26000000000 | 0 | 5.15 | 19.7 | 35 | 0.00 | 184000000000 | 184000000000 | 150000000000 |
| 2019 | USA | Amazon.com Inc | 61093000000 | 9970000000 | 212000000000 | 163000000000 | 49000000000 | 163000000000 | 26000000000 | 0 | 5.48 | 19.2 | 0.00 | 205000000000 | 205000000000 | 163000000000 | |
| 2020 | USA | Amazon.com Inc | 81389000000 | 14170000000 | 248000000000 | 195000000000 | 53000000000 | 195000000000 | 26000000000 | 0 | 6.01 | 18.8 | 0.00 | 256000000000 | 256000000000 | 195000000000 | |
| 2021 | USA | Amazon.com Inc | 106758000000 | 20160000000 | 270000000000 | 210000000000 | 60000000000 | 210000000000 | 26000000000 | 0 | 6.61 | 18.2 | 0.00 | 322000000000 | 322000000000 | 210000000000 | |
| 2022 | USA | Amazon.com Inc | 137140000000 | 31100000000 | 291000000000 | 223000000000 | 68000000000 | 223000000000 | 26000000000 | 0 | 7.18 | 17.5 | 0.00 | 374000000000 | 374000000000 | 223000000000 | |
| 2023 | USA | Amazon.com Inc | 170553000000 | 42300000000 | 310000000000 | 235000000000 | 75000000000 | 235000000000 | 26000000000 | 0 | 7.74 | 16.8 | 0.00 | 427000000000 | 427000000000 | 235000000000 | |
| 2024 | USA | Amazon.com Inc | 215920000000 | 55400000000 | 327000000000 | 245000000000 | 82000000000 | 245000000000 | 26000000000 | 0 | 8.28 | 16.1 | 0.00 | 480000000000 | 480000000000 | 245000000000 | |
| 2018 | USA | Apple Inc | 22548000000 | 6345000000 | 111000000000 | 84000000000 | 27000000000 | 84000000000 | 27000000000 | 0 | 12.42 | 15.2 | 0.00 | 180000000000 | 180000000000 | 84000000000 | |
| 2019 | USA | Apple Inc | 24592000000 | 7615000000 | 117000000000 | 89000000000 | 28000000000 | 89000000000 | 28000000000 | 0 | 13.45 | 14.9 | 0.00 | 195000000000 | 195000000000 | 89000000000 | |
| 2020 | USA | Apple Inc | 29938000000 | 9735000000 | 129000000000 | 97000000000 | 32000000000 | 97000000000 | 32000000000 | 0 | 14.53 | 14.6 | 0.00 | 215000000000 | 215000000000 | 97000000000 | |
| 2021 | USA | Apple Inc | 36582000000 | 12910000000 | 143000000000 | 108000000000 | 35000000000 | 108000000000 | 35000000000 | 0 | 15.55 | 14.4 | 0.00 | 235000000000 | 235000000000 | 108000000000 | |
| 2022 | USA | Apple Inc | 44115000000 | 18040000000 | 156000000000 | 117000000000 | 39000000000 | 117000000000 | 39000000000 | 0 | 16.55 | 14.1 | 0.00 | 255000000000 | 255000000000 | 117000000000 | |
| 2023 | USA | Apple Inc | 52761000000 | 24180000000 | 166000000000 | 124000000000 | 42000000000 | 124000000000 | 42000000000 | 0 | 17.53 | 13.7 | 0.00 | 275000000000 | 275000000000 | 124000000000 | |
| 2024 | USA | Apple Inc | 62569000000 | 31100000000 | 173000000000 | 130000000000 | 43000000000 | 130000000000 | 43000000000 | 0 | 18.53 | 13.2 | 0.00 | 295000000000 | 295000000000 | 130000000000 | |
| 2018 | USA | Microsoft Corp | 11467000000 | 3145000000 | 117000000000 | 89000000000 | 28000000000 | 89000000000 | 28000000000 | 0 | 12.58 | 13.8 | 0.00 | 170000000000 | 170000000000 | 89000000000 | |
| 2019 | USA | Microsoft Corp | 14581000000 | 4115000000 | 122000000000 | 93000000000 | 29000000000 | 93000000000 | 29000000000 | 0 | 13.53 | 13.5 | 0.00 | 180000000000 | 180000000000 | 93000000000 | |
| 2020 | USA | Microsoft Corp | 17650000000 | 5615000000 | 129000000000 | 98000000000 | 31000000000 | 98000000000 | 31000000000 | 0 | 14.55 | 13.1 | 0.00 | 190000000000 | 190000000000 | 98000000000 | |
| 2021 | USA | Microsoft Corp | 21310000000 | 7515000000 | 138000000000 | 106000000000 | 32000000000 | 106000000000 | 32000000000 | 0 | 15.55 | 12.7 | 0.00 | 200000000000 | 200000000000 | 106000000000 | |
| 2022 | USA | Microsoft Corp | 25110000000 | 10115000000 | 146000000000 | 112000000000 | 34000000000 | 112000000000 | 34000000000 | 0 | 16.55 | 12.3 | 0.00 | 210000000000 | 210000000000 | 112000000000 | |
| 2023 | USA | Microsoft Corp | 29110000000 | 13215000000 | 154000000000 | 118000000000 | 36000000000 | 118000000000 | 36000000000 | 0 | 17.53 | 11.9 | 0.00 | 220000000000 | 220000000000 | 118000000000 | |
| 2024 | USA | Microsoft Corp | 33110000000 | 17215000000 | 162000000000 | 124000000000 | 38000000000 | 124000000000 | 38000000000 | 0 | 18.53 | 11.5 | 0.00 | 230000000000 | 230000000000 | 124000000000 | |
| 2018 | USA | Facebook Inc | 18049000000 | 5945000000 | 100000000000 | 78000000000 | 22000000000 | 78000000000 | 22000000000 | 0 | 10.58 | 12.1 | 0.00 | 150000000000 | 150000000000 | 78000000000 | |
| 2019 | USA | Facebook Inc | 22419000000 | 8115000000 | 106000000000 | 83000000000 | 23000000000 | 83000000000 | 23000000000 | 0 | 11.53 | 11.8 | 0.00 | 160000000000 | 160000000000 | 83000000000 | |
| 2020 | USA | Facebook Inc | 27699000000 | 11315000000 | 112000000000 | 88000000000 | 24000000000 | 88000000000 | 24000000000 | 0 | 12.53 | 11.5 | 0.00 | 170000000000 | 170000000000 | 88000000000 | |
| 2021 | USA | Facebook Inc | 33949000000 | 15615000000 | 119000000000 | 93000000000 | 26000000000 | 93000000000 | 26000000000 | 0 | 13.53 | 11.2 | 0.00 | 180000000000 | 180000000000 | 93000000000 | |
| 2022 | USA | Facebook Inc | 41199000000 | 20415000000 | 126000000000 | 98000000000 | 28000000000 | 98000000000 | 28000000000 | 0 | 14.53 | 10.9 | 0.00 | 190000000000 | 190000000000 | 98000000000 | |
| 2023 | USA | Facebook Inc | 49449000000 | 27215000000 | 133000000000 | 103000000000 | 30000000000 | 103000000000 | 30000000000 | 0 | 15.53 | 10.6 | 0.00 | 200000000000 | 200000000000 | 103000000000 | |
| 2024 | USA | Facebook Inc | 58699000000 | 36415000000 | 140000000000 | 108000000000 | 32000000000 | 108000000000 | 32000000000 | 0 | 16.53 | 10.3 | 0.00 | 210000000000 | 210000000000 | 108000000000 | |
| 2018 | USA | Alphabet Inc | 6314000000 | 2145000000 | 63000000000 | 50000000000 | 13000000000 | 50000000000 | 13000000000 | 0 | 12.58 | 13.8 | 0.00 | 100000000000 | 100000000000 | 50000000000 | |
| 2019 | USA | Alphabet Inc | 7940000000 | 2815000000 | 68000000000 | 54000000000 | 14000000000 | 54000000000 | 14000000000 | 0 | 13.53 | 13.5 | 0.00 | 105000000000 | 105000000000 | 54000000000 | |
| 2020 | USA | Alphabet Inc | 9560000000 | 3715000000 | 73000000000 | 59000000000 | 14000000000 | 59000000000 | 14000000000 | 0 | 14.55 | 13.1 | 0.00 | 110000000000 | 110000000000 | 59000000000 | |
| 2021 | USA | Alphabet Inc | 11180000000 | 4915000000 | 78000000000 | 64000000000 | 14000000000 | 64000000000 | 14000000000 | 0 | 15.55 | 12.7 | 0.00 | 115000000000 | 115000000000 | 64000000000 | |
| 2022 | USA | Alphabet Inc | 12800000000 | 6515000000 | 83000000000 | 69000000000 | 14000000000 | 69000000000 | 14000000000 | 0 | 16.55 | 12.3 | 0.00 | 120000000000 | 120000000000 | 69000000000 | |
| 2023 | USA | Alphabet Inc | 14420000000 | 8315000000 | 88000000000 | 74000000000 | 14000000000 | 74000000000 | 14000000000 | 0 | 17.53 | 11.9 | 0.00 | 125000000000 | 125000000000 | 74000000000 | |
| 2024 | USA | Alphabet Inc | 16060000000 | 10715000000 | 93000000000 | 79000000000 | 14000000000 | 79000000000 | 14000000000 | 0 | 18.53 | 11.5 | 0.00 | 130000000000 | 130000000000 | 79000000000 | |
| 2018 | USA | Google Inc | 11467000000 | 3145000000 | 117000000000 | 89000000000 | 28000000000 | 89000000000 | 28000000000 | 0 | 12.58 | 13.8 | 0.00 | 170000000000 | 170000000000 | 89000000000 | |
| 2019 | USA | Google Inc | 14581000000 | 4115000000 | 122000000000 | 93000000000 | 29000000000 | 93000000000 | 29000000000 | 0 | 13.53 | 13.5 | 0.00 | 180000000000 | 180000000000 | 93000000000 | |
| 2020 | USA | Google Inc | 17650000000 | 5615000000 | 129000000000 | 98000000000 | 31000000000 | 98000000000 | 31000000000 | 0 | 14.55 | 13.1 | 0.00 | 190000000000 | 190000000000 | 98000000000 | |
| 2021 | USA | Google Inc | 21310000000 | 7515000000 | 138000000000 | 106000000000 | 32000000000 | 106000000000 | 32000000000 | 0 | 15.55 | 12.7 | 0.00 | 200000000000 | 200000000000 | 106000000000 | |
| 2022 | USA | Google Inc | 25110000000 | 10115000000 | 146000000000 | 112000000000 | 34000000000 | 112000000000 | 34000000000 | 0 | 16.55 | 12.3 | 0.00 | 210000000000 | 210000000000 | 112000000000 | |
| 2023 | USA | Google Inc | 29110000000 | 13215000000 | 154000000000 | 118000000000 | 36000000000 | 118000000000 | 36000000000 | 0 | 17.53 | 11.9 | 0.00 | 220000000000 | 220000000000 | 118000000000 | |
| 2024 | USA | Google Inc | 33110000000 | 17215000000 | 162000000000 | 124000000000 | 38000000000 | 124000000000 | 38000000000 | 0 | 18.53 | 11.5 | 0.00 | 230000000000 | 230000000000 | 124000000000 | |

| Year | Entity | Country | Code | Industry | Revenue (USD) | Profit (USD) | Assets (USD) | Liabilities (USD) | Equity (USD) | Employees | Market Cap (USD) | Revenue Growth (%) | Profit Growth (%) | Assets Growth (%) | Liabilities Growth (%) | Equity Growth (%) | Employees Growth (%) | Market Cap Growth (%) |
|------|--------------|---------|------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 2010 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,200,000,000 | 100,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 0 | 10,000 | 1,200,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2011 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,300,000,000 | 110,000,000 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 0 | 11,000 | 1,300,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2012 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,400,000,000 | 120,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 0 | 12,000 | 1,400,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2013 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,500,000,000 | 130,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 13,000 | 1,500,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2014 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,600,000,000 | 140,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0 | 14,000 | 1,600,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2015 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,700,000,000 | 150,000,000 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | 15,000 | 1,700,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2016 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,800,000,000 | 160,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 0 | 16,000 | 1,800,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2017 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 1,900,000,000 | 170,000,000 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 0 | 17,000 | 1,900,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2018 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,000,000,000 | 180,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 18,000 | 2,000,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2019 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,100,000,000 | 190,000,000 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 0 | 19,000 | 2,100,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2020 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,200,000,000 | 200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 20,000 | 2,200,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2021 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,300,000,000 | 210,000,000 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 0 | 21,000 | 2,300,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2022 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,400,000,000 | 220,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 0 | 22,000 | 2,400,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2023 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,500,000,000 | 230,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 23,000 | 2,500,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2024 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,600,000,000 | 240,000,000 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | 0 | 24,000 | 2,600,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2025 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,700,000,000 | 250,000,000 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 0 | 25,000 | 2,700,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2026 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,800,000,000 | 260,000,000 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 0 | 26,000 | 2,800,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2027 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 2,900,000,000 | 270,000,000 | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 | 0 | 27,000 | 2,900,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2028 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 3,000,000,000 | 280,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 28,000 | 3,000,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2029 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 3,100,000,000 | 290,000,000 | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | 0 | 29,000 | 3,100,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 2030 | ALUMINA S.A. | Brazil | ALUM | Non-Ferrous Metals | 3,200,000,000 | 300,000,000 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | 0 | 30,000 | 3,200,000,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |

ANEXO 29. Anexo 2 de quinto informe parcial de práctica

| ID | Entity Name | Entity Type | Country | Industry | Revenue | Employees | Profit | Assets | Liabilities | Equity | Debt | ROE | EPS | Dividend | Yield | P/E | Market Cap | Shares Out | Market Val | Volatility | Correlation | Beta | Alpha | Risk | Rating |
|----|-----------------------------|-------------|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|-----|-------|----------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|-------|------|--------|
| 1 | ALUMINUM COMPANY OF AMERICA | Non | USA | Metals | 100000000 | 1000 | 20000000 | 100000000 | 50000000 | 50000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 2 | AMERICAN AIRLINES | Non | USA | Airlines | 150000000 | 5000 | 30000000 | 150000000 | 80000000 | 70000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 3 | AMERICAN ELECTRIC POWER | Non | USA | Electricity | 120000000 | 8000 | 24000000 | 120000000 | 60000000 | 60000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 4 | AMERICAN PETROLEUM CORP | Non | USA | Oil & Gas | 180000000 | 10000 | 36000000 | 180000000 | 90000000 | 90000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 5 | AMERICAN SALES AND MFG | Non | USA | Manufacturing | 80000000 | 5000 | 16000000 | 80000000 | 40000000 | 40000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 6 | AMERICAN STORES INC | Non | USA | Retail | 90000000 | 10000 | 18000000 | 90000000 | 45000000 | 45000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 7 | AMERICA'S WATER WORKS | Non | USA | Water Supply | 70000000 | 5000 | 14000000 | 70000000 | 35000000 | 35000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 8 | AMERISOURCE BERNEIS | Non | USA | Pharmaceutical | 110000000 | 8000 | 22000000 | 110000000 | 55000000 | 55000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 9 | AMERSON INC | Non | USA | Electric Equipment | 60000000 | 4000 | 12000000 | 60000000 | 30000000 | 30000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 10 | AMGEN | Non | USA | Pharmaceutical | 130000000 | 9000 | 26000000 | 130000000 | 65000000 | 65000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 11 | AMGEN HOLDINGS | Non | USA | Pharmaceutical | 130000000 | 9000 | 26000000 | 130000000 | 65000000 | 65000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 12 | AMGEN HOLDINGS LTD | Non | USA | Pharmaceutical | 130000000 | 9000 | 26000000 | 130000000 | 65000000 | 65000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 13 | AMGEN HOLDINGS PLC | Non | USA | Pharmaceutical | 130000000 | 9000 | 26000000 | 130000000 | 65000000 | 65000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 14 | AMGEN HOLDINGS INC | Non | USA | Pharmaceutical | 130000000 | 9000 | 26000000 | 130000000 | 65000000 | 65000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |
| 15 | AMGEN HOLDINGS LTD | Non | USA | Pharmaceutical | 130000000 | 9000 | 26000000 | 130000000 | 65000000 | 65000000 | 10000000 | 100 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | |

ANEXO 30. Anexo 3 de quinto informe parcial de práctica

| | | | | | | Subdirección de Reparación Colectiva | |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Código Municipi | Nombre Departamento | Nombre Municipio | Dirección Territorial | Valor Programado Departam | Valor Ejecutado | Valor Compromisos por | Valor Ejecutado - Obligaciones (31 de |
| | | | | | | Municipio2 (31 de Agosto) | Agosto)2 |
| | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | | | |
| 5001 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | | | \$ 28.070.966,08 | \$ 28.070.966,08 |
| 5002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | | | | |
| 5004 | ANTIOQUIA | ABRIAQUÍ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5021 | ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5030 | ANTIOQUIA | AMAGÁ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5031 | ANTIOQUIA | AMALFI | ANTIOQUIA | | | | |
| 5034 | ANTIOQUIA | ANDES | ANTIOQUIA | | | | |
| 5036 | ANTIOQUIA | ANGELÓPOLIS | ANTIOQUIA | | | | |
| 5038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5040 | ANTIOQUIA | ANORÍ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5042 | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5044 | ANTIOQUIA | ANZÁ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5045 | ANTIOQUIA | APARTADÓ | URABA | | | | |
| 5051 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | URABA | | | | |
| 5055 | ANTIOQUIA | ARGELIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5059 | ANTIOQUIA | ARMENIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5079 | ANTIOQUIA | BARBOSA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5086 | ANTIOQUIA | BELMIRA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5088 | ANTIOQUIA | BELLO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5091 | ANTIOQUIA | BETANIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5093 | ANTIOQUIA | BETULIA | ANTIOQUIA | | | \$ 991.966,64 | \$ 991.966,64 |
| 5101 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLÍVAR | ANTIOQUIA | | | | |
| 5107 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5113 | ANTIOQUIA | BURITICÁ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5120 | ANTIOQUIA | CÁCERES | ANTIOQUIA | | | | |
| 5125 | ANTIOQUIA | CAICEDO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5129 | ANTIOQUIA | CALDAS | ANTIOQUIA | | | | |
| 5134 | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5138 | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | | | | |
| 5142 | ANTIOQUIA | CARACOLÍ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5145 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5147 | ANTIOQUIA | CAREPA | URABA | | | | |
| 5148 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA | | | | |
| 5150 | ANTIOQUIA | CAROLINA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5154 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5172 | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | URABA | | | \$ 337.960,00 | \$ 337.960,00 |
| 5190 | ANTIOQUIA | CISNEROS | ANTIOQUIA | | | | |
| 5197 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | ANTIOQUIA | | | \$ 1.665.732,25 | \$ 1.665.732,25 |
| 5206 | ANTIOQUIA | CONCEPCIÓN | ANTIOQUIA | | | | |
| 5209 | ANTIOQUIA | CONCORDIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5212 | ANTIOQUIA | COPACABANA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5234 | ANTIOQUIA | DABEIBA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5237 | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | ANTIOQUIA | | | | |
| 5240 | ANTIOQUIA | EBÉJICO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5250 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ANTIOQUIA | | | | |
| 5264 | ANTIOQUIA | ENTRERRÍOS | ANTIOQUIA | | | | |
| 5266 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5282 | ANTIOQUIA | FREDONIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5284 | ANTIOQUIA | FRONTINO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5306 | ANTIOQUIA | GIRALDO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5308 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5310 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5313 | ANTIOQUIA | GRANADA | ANTIOQUIA | | | \$ 1.405.773,09 | \$ 1.405.773,09 |
| 5315 | ANTIOQUIA | GUADALUPE | ANTIOQUIA | | | | |
| 5318 | ANTIOQUIA | GUARNE | ANTIOQUIA | | | | |
| 5321 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5347 | ANTIOQUIA | HELICONIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5353 | ANTIOQUIA | HISPANIA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5360 | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5361 | ANTIOQUIA | ITUANGO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5364 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ANTIOQUIA | | | | |
| 5368 | ANTIOQUIA | JERICÓ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5376 | ANTIOQUIA | LA CEJA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5380 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5390 | ANTIOQUIA | LA PINTADA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5400 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | ANTIOQUIA | | | | |
| 5411 | ANTIOQUIA | LIBORINA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5425 | ANTIOQUIA | MACEO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5440 | ANTIOQUIA | MARINILLA | ANTIOQUIA | | | \$ 15.470.546,98 | \$ 15.470.546,98 |
| 5467 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5475 | ANTIOQUIA | MURINDÓ | URABA | | | | |
| 5480 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | URABA | | | | |
| 5483 | ANTIOQUIA | NARIÑO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5490 | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | URABA | | | | |
| 5495 | ANTIOQUIA | NECHÍ | ANTIOQUIA | | | | |
| 5501 | ANTIOQUIA | OLAYA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5541 | ANTIOQUIA | PEÑOL | ANTIOQUIA | | | | |
| 5543 | ANTIOQUIA | PEQUE | ANTIOQUIA | | | | |
| 5576 | ANTIOQUIA | PUEBLORRICO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5579 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | MAGDALENA MEDIO | | | | |
| 5585 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | MAGDALENA MEDIO | | | | |
| 5591 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5604 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | ANTIOQUIA | | | \$ 145.653.439,86 | \$ 145.653.439,86 |
| 5607 | ANTIOQUIA | RETIRO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5615 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | ANTIOQUIA | | | | |
| 5628 | ANTIOQUIA | SABANALARGA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5631 | ANTIOQUIA | SABANETA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5642 | ANTIOQUIA | SALGAR | ANTIOQUIA | | | | |
| 5647 | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | ANTIOQUIA | | | | |
| 5649 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| 5652 | ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | ANTIOQUIA | | |
| 5656 | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | ANTIOQUIA | | |
| 5658 | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | ANTIOQUIA | | |
| 5659 | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | URABA | | |
| 5660 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | ANTIOQUIA | | |
| 5664 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | ANTIOQUIA | | |
| 5665 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | URABA | | |
| 5667 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | ANTIOQUIA | | |
| 5670 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | | |
| 5674 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE FERRER | ANTIOQUIA | | |
| 5679 | ANTIOQUIA | SANTA BÁRBARA | ANTIOQUIA | | |
| 5686 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | | |
| 5690 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | ANTIOQUIA | | |
| 5697 | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | ANTIOQUIA | | |
| 5736 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | ANTIOQUIA | \$ 3.722.396,16 | \$ 3.722.396,16 |
| 5756 | ANTIOQUIA | SONSÓN | ANTIOQUIA | | |
| 5761 | ANTIOQUIA | SOPETRÁN | ANTIOQUIA | | |
| 5789 | ANTIOQUIA | TÁMESIS | ANTIOQUIA | | |
| 5790 | ANTIOQUIA | TARAZÁ | ANTIOQUIA | | |
| 5792 | ANTIOQUIA | TARSO | ANTIOQUIA | | |
| 5809 | ANTIOQUIA | TITIRIBÍ | ANTIOQUIA | | |
| 5819 | ANTIOQUIA | TOLEDO | ANTIOQUIA | | |
| 5837 | ANTIOQUIA | TURBO | URABA | | |
| 5842 | ANTIOQUIA | URAMITA | ANTIOQUIA | \$ 102.142.482,75 | \$ 102.142.482,75 |
| 5847 | ANTIOQUIA | URRAO | ANTIOQUIA | | |
| 5854 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | ANTIOQUIA | \$ 1.013.880,00 | \$ 1.013.880,00 |
| 5856 | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | ANTIOQUIA | | |
| 5858 | ANTIOQUIA | VEGACHÍ | ANTIOQUIA | | |
| 5861 | ANTIOQUIA | VENECIA | ANTIOQUIA | | |
| 5873 | ANTIOQUIA | VIGÍA DEL FUERTE | ANTIOQUIA | | |
| 5885 | ANTIOQUIA | YALÍ | ANTIOQUIA | | |
| 5887 | ANTIOQUIA | YARUMAL | ANTIOQUIA | | |
| 5890 | ANTIOQUIA | YOLOMBÓ | ANTIOQUIA | | |
| 5893 | ANTIOQUIA | YONDÓ | MAGDALENA MEDIO | | |
| 5895 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | ANTIOQUIA | | |
| ATLÁNTICO | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 8001 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | \$ 9.054.005,52 | \$ 9.054.005,52 |
| 8078 | ATLÁNTICO | BARANOA | ATLÁNTICO | | |
| 8137 | ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | ATLÁNTICO | | |
| 8141 | ATLÁNTICO | CANDELARIA | ATLÁNTICO | | |
| 8296 | ATLÁNTICO | GALAPA | ATLÁNTICO | | |
| 8372 | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | ATLÁNTICO | | |
| 8421 | ATLÁNTICO | LURUACO | ATLÁNTICO | | |
| 8433 | ATLÁNTICO | MALAMBO | ATLÁNTICO | | |
| 8436 | ATLÁNTICO | MANATÍ | ATLÁNTICO | | |
| 8520 | ATLÁNTICO | PALMAR DE VARELA | ATLÁNTICO | | |
| 8549 | ATLÁNTICO | PIOJÓ | ATLÁNTICO | | |
| 8558 | ATLÁNTICO | POLONUEVO | ATLÁNTICO | | |
| 8560 | ATLÁNTICO | PONEDERA | ATLÁNTICO | | |
| 8573 | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | ATLÁNTICO | | |
| 8606 | ATLÁNTICO | REPELÓN | ATLÁNTICO | | |
| 8634 | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | ATLÁNTICO | | |
| 8638 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | ATLÁNTICO | \$ 4.321.614,52 | \$ 4.321.614,52 |
| 8675 | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA | ATLÁNTICO | | |
| 8685 | ATLÁNTICO | SANTO TOMÁS | ATLÁNTICO | | |
| 8758 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | ATLÁNTICO | | |
| 8770 | ATLÁNTICO | SUAN | ATLÁNTICO | | |
| 8832 | ATLÁNTICO | TUBARÁ | ATLÁNTICO | | |
| 8849 | ATLÁNTICO | USIACURÍ | ATLÁNTICO | | |
| BOGOTÁ, D. C. | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 11001 | BOGOTÁ, D. C. | BOGOTÁ, D.C. | CENTRO | \$ 92.922.203,17 | \$ 92.922.203,17 |
| BOLÍVAR | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 13001 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | \$ 13.776.404,09 | \$ 13.776.404,09 |
| 13006 | BOLÍVAR | ACHÍ | BOLÍVAR | | |
| 13030 | BOLÍVAR | ALTOS DEL ROSARIO | BOLÍVAR | | |
| 13042 | BOLÍVAR | ARENAL | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13052 | BOLÍVAR | ARJONA | BOLÍVAR | | |
| 13062 | BOLÍVAR | ARROYOHONDO | BOLÍVAR | | |
| 13074 | BOLÍVAR | BARRANCO DE LOBA | BOLÍVAR | | |
| 13140 | BOLÍVAR | CALAMAR | BOLÍVAR | | |
| 13160 | BOLÍVAR | CANTAGALLO | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13188 | BOLÍVAR | CICUCO | BOLÍVAR | | |
| 13212 | BOLÍVAR | CÓRDOBA | BOLÍVAR | | |
| 13222 | BOLÍVAR | CLEMENCIA | BOLÍVAR | | |
| 13244 | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | BOLÍVAR | \$ 13.219.074,30 | \$ 13.219.074,30 |
| 13248 | BOLÍVAR | EL GUAMO | BOLÍVAR | | |
| 13268 | BOLÍVAR | EL PEÑÓN | BOLÍVAR | \$ 3.358.347,01 | \$ 3.358.347,01 |
| 13300 | BOLÍVAR | HATILLO DE LOBA | BOLÍVAR | | |
| 13430 | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | | |
| 13433 | BOLÍVAR | MAHATES | BOLÍVAR | \$ 10.022.106,74 | \$ 10.022.106,74 |
| 13440 | BOLÍVAR | MARGARITA | BOLÍVAR | | |
| 13442 | BOLÍVAR | MARÍA LA BAJA | BOLÍVAR | \$ 5.342.411,70 | \$ 5.342.411,70 |
| 13458 | BOLÍVAR | MONTECRISTO | BOLÍVAR | | |
| 13468 | BOLÍVAR | MOMPÓS | BOLÍVAR | | |
| 13473 | BOLÍVAR | MORALES | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13490 | BOLÍVAR | NOROSÍ | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13549 | BOLÍVAR | PINILLOS | BOLÍVAR | | |
| 13580 | BOLÍVAR | REGIDOR | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13600 | BOLÍVAR | RÍO VIEJO | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13620 | BOLÍVAR | SAN CRISTÓBAL | BOLÍVAR | | |
| 13647 | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | BOLÍVAR | | |
| 13650 | BOLÍVAR | SAN FERNANDO | BOLÍVAR | | |
| 13654 | BOLÍVAR | SAN JACINTO | BOLÍVAR | \$ 6.586.280,27 | \$ 6.586.280,27 |
| 13655 | BOLÍVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | BOLÍVAR | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|---------------------|---------------------------|----|---------------|
| 13657 | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | BOLIVAR | | |
| 13667 | BOLÍVAR | SAN MARTÍN DE LOBA | BOLIVAR | \$ | 11.831.325,28 |
| 13670 | BOLÍVAR | SAN PABLO | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13673 | BOLÍVAR | SANTA CATALINA | BOLIVAR | | |
| 13683 | BOLÍVAR | SANTA ROSA | BOLIVAR | | |
| 13688 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | MAGDALENA MEDIO | | |
| 13744 | BOLÍVAR | SIMITÍ | MAGDALENA MEDIO | \$ | 5.182.960,51 |
| 13760 | BOLÍVAR | SOPLAVIENTO | BOLIVAR | | |
| 13780 | BOLÍVAR | TALAIAGUA NUEVO | BOLIVAR | | |
| 13810 | BOLÍVAR | TIQUISIO | BOLIVAR | \$ | 6.914.624,79 |
| 13836 | BOLÍVAR | TURBACO | BOLIVAR | | |
| 13838 | BOLÍVAR | TURBANÁ | BOLIVAR | | |
| 13873 | BOLÍVAR | VILLANUEVA | BOLIVAR | | |
| 13894 | BOLÍVAR | ZAMBRANO | BOLIVAR | | |
| | BOYACÁ | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 15001 | BOYACÁ | TUNJA | CENTRO | | |
| 15022 | BOYACÁ | ALMEIDA | CENTRO | | |
| 15047 | BOYACÁ | AQUITANIA | CENTRO | | |
| 15051 | BOYACÁ | ARCABUCO | CENTRO | | |
| 15087 | BOYACÁ | BELÉN | CENTRO | | |
| 15090 | BOYACÁ | BERBEO | CENTRO | | |
| 15092 | BOYACÁ | BETÉITIVA | CENTRO | | |
| 15097 | BOYACÁ | BOAVITA | CENTRO | | |
| 15104 | BOYACÁ | BOYACÁ | CENTRO | | |
| 15106 | BOYACÁ | BRICEÑO | CENTRO | | |
| 15109 | BOYACÁ | BUENAVISTA | CENTRO | | |
| 15114 | BOYACÁ | BUSBANZÁ | CENTRO | | |
| 15131 | BOYACÁ | CALDAS | CENTRO | | |
| 15135 | BOYACÁ | CAMPOHERMOSO | CENTRO | | |
| 15162 | BOYACÁ | CERINZA | CENTRO | | |
| 15172 | BOYACÁ | CHINAVITA | CENTRO | | |
| 15176 | BOYACÁ | CHIQUNQUIRÁ | CENTRO | | |
| 15180 | BOYACÁ | CHISCAS | CENTRO | | |
| 15183 | BOYACÁ | CHITA | CENTRO | | |
| 15185 | BOYACÁ | CHITARAQUE | CENTRO | | |
| 15187 | BOYACÁ | CHIVATÁ | CENTRO | | |
| 15189 | BOYACÁ | CIÉNEGA | CENTRO | | |
| 15204 | BOYACÁ | CÓMBITA | CENTRO | | |
| 15212 | BOYACÁ | COPER | CENTRO | | |
| 15215 | BOYACÁ | CORRALES | CENTRO | | |
| 15218 | BOYACÁ | COVARACHÍA | CENTRO | | |
| 15223 | BOYACÁ | CUBARÁ | CENTRO | | |
| 15224 | BOYACÁ | CUCAITA | CENTRO | | |
| 15226 | BOYACÁ | CUÍTIVA | CENTRO | | |
| 15232 | BOYACÁ | CHÍQUIZA | CENTRO | | |
| 15236 | BOYACÁ | CHIVOR | CENTRO | | |
| 15238 | BOYACÁ | DUITAMA | CENTRO | | |
| 15244 | BOYACÁ | EL COCUY | CENTRO | | |
| 15248 | BOYACÁ | EL ESPINO | CENTRO | | |
| 15272 | BOYACÁ | FIRAVITOBÁ | CENTRO | | |
| 15276 | BOYACÁ | FLORESTA | CENTRO | | |
| 15293 | BOYACÁ | GACHANTIVÁ | CENTRO | | |
| 15296 | BOYACÁ | GÁMEZA | CENTRO | | |
| 15299 | BOYACÁ | GARAGOA | CENTRO | | |
| 15317 | BOYACÁ | GUACAMAYAS | CENTRO | | |
| 15322 | BOYACÁ | GUATEQUE | CENTRO | | |
| 15325 | BOYACÁ | GUAYATÁ | CENTRO | | |
| 15332 | BOYACÁ | GÜICÁN DE LA SIERRA | CENTRO | | |
| 15362 | BOYACÁ | IZA | CENTRO | | |
| 15367 | BOYACÁ | JÉNESANO | CENTRO | | |
| 15368 | BOYACÁ | JERICÓ | CENTRO | | |
| 15377 | BOYACÁ | LABRANZAGRANDE | CENTRO | | |
| 15380 | BOYACÁ | LA CAPILLA | CENTRO | | |
| 15401 | BOYACÁ | LA VICTORIA | CENTRO | | |
| 15403 | BOYACÁ | LA UVITA | CENTRO | | |
| 15407 | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | CENTRO | | |
| 15425 | BOYACÁ | MACANAL | CENTRO | | |
| 15442 | BOYACÁ | MARIPÍ | CENTRO | | |
| 15455 | BOYACÁ | MIRAFLORES | CENTRO | | |
| 15464 | BOYACÁ | MONGUA | CENTRO | | |
| 15466 | BOYACÁ | MONGUÍ | CENTRO | | |
| 15469 | BOYACÁ | MONIQUIRÁ | CENTRO | | |
| 15476 | BOYACÁ | MOTAVITA | CENTRO | | |
| 15480 | BOYACÁ | MUZO | CENTRO | | |
| 15491 | BOYACÁ | NOBSA | CENTRO | | |
| 15494 | BOYACÁ | NUEVO COLÓN | CENTRO | | |
| 15500 | BOYACÁ | OICATÁ | CENTRO | | |
| 15507 | BOYACÁ | OTANCHE | CENTRO | | |
| 15511 | BOYACÁ | PACHAVITA | CENTRO | | |
| 15514 | BOYACÁ | PÁEZ | CENTRO | | |
| 15516 | BOYACÁ | PAIPA | CENTRO | \$ | 4.743.935,00 |
| 15518 | BOYACÁ | PAJARITO | CENTRO | | |
| 15522 | BOYACÁ | PANQUEBA | CENTRO | | |
| 15531 | BOYACÁ | PAUNA | CENTRO | | |
| 15533 | BOYACÁ | PAYA | CENTRO | | |
| 15537 | BOYACÁ | PAZ DE RÍO | CENTRO | | |
| 15542 | BOYACÁ | PESCA | CENTRO | | |
| 15550 | BOYACÁ | PISBA | CENTRO | | |
| 15572 | BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | CENTRO | | |
| 15580 | BOYACÁ | QUÍPAMA | CENTRO | | |
| 15599 | BOYACÁ | RAMIRIQUÍ | CENTRO | | |
| 15600 | BOYACÁ | RÁQUIRA | CENTRO | | |
| 15621 | BOYACÁ | RONDÓN | CENTRO | | |
| 15632 | BOYACÁ | SABOYÁ | CENTRO | | |
| 15638 | BOYACÁ | SÁCHICA | CENTRO | | |
| 15646 | BOYACÁ | SAMACÁ | CENTRO | | |

| | | | | | |
|---------|---------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 15660 | BOYACÁ | SAN EDUARDO | CENTRO | | |
| 15664 | BOYACÁ | SAN JOSÉ DE PARE | CENTRO | | |
| 15667 | BOYACÁ | SAN LUIS DE GACENO | CENTRO | | |
| 15673 | BOYACÁ | SAN MATEO | CENTRO | | |
| 15676 | BOYACÁ | SAN MIGUEL DE SEMA | CENTRO | | |
| 15681 | BOYACÁ | SAN PABLO DE BORBUR | CENTRO | | |
| 15686 | BOYACÁ | SANTANA | CENTRO | | |
| 15690 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | CENTRO | | |
| 15693 | BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | CENTRO | | |
| 15696 | BOYACÁ | SANTA SOFÍA | CENTRO | | |
| 15720 | BOYACÁ | SATIVANORTE | CENTRO | | |
| 15723 | BOYACÁ | SATIVASUR | CENTRO | | |
| 15740 | BOYACÁ | SIACHOQUE | CENTRO | | |
| 15753 | BOYACÁ | SOATÁ | CENTRO | | |
| 15755 | BOYACÁ | SOCOTÁ | CENTRO | | |
| 15757 | BOYACÁ | SOCHA | CENTRO | | |
| 15759 | BOYACÁ | SOGAMOSO | CENTRO | | |
| 15761 | BOYACÁ | SOMONDOCO | CENTRO | | |
| 15762 | BOYACÁ | SORA | CENTRO | | |
| 15763 | BOYACÁ | SOTAQUIRÁ | CENTRO | | |
| 15764 | BOYACÁ | SORACÁ | CENTRO | | |
| 15774 | BOYACÁ | SUSACÓN | CENTRO | | |
| 15776 | BOYACÁ | SUTAMARCHÁN | CENTRO | | |
| 15778 | BOYACÁ | SUTATENZA | CENTRO | | |
| 15790 | BOYACÁ | TASCO | CENTRO | | |
| 15798 | BOYACÁ | TENZA | CENTRO | | |
| 15804 | BOYACÁ | TIBANÁ | CENTRO | | |
| 15806 | BOYACÁ | TIBASOSA | CENTRO | | |
| 15808 | BOYACÁ | TINJACÁ | CENTRO | | |
| 15810 | BOYACÁ | TIPACOQUE | CENTRO | | |
| 15814 | BOYACÁ | TOCA | CENTRO | | |
| 15816 | BOYACÁ | TOGÚJ | CENTRO | | |
| 15820 | BOYACÁ | TÓPAGA | CENTRO | | |
| 15822 | BOYACÁ | TOTA | CENTRO | | |
| 15832 | BOYACÁ | TUNUNGUÁ | CENTRO | | |
| 15835 | BOYACÁ | TURMEQUÉ | CENTRO | | |
| 15837 | BOYACÁ | TUTA | CENTRO | | |
| 15839 | BOYACÁ | TUTAZÁ | CENTRO | | |
| 15842 | BOYACÁ | ÚMBITA | CENTRO | | |
| 15861 | BOYACÁ | VENTAQUEMADA | CENTRO | | |
| 15879 | BOYACÁ | VIRACACHÁ | CENTRO | | |
| 15897 | BOYACÁ | ZETAQUIRA | CENTRO | | |
| CALDAS | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 17001 | CALDAS | MANIZALES | EJE CAFETERO | | |
| 17013 | CALDAS | AGUADAS | EJE CAFETERO | | |
| 17042 | CALDAS | ANSERMA | EJE CAFETERO | | |
| 17050 | CALDAS | ARANZAZU | EJE CAFETERO | | |
| 17088 | CALDAS | BELALCÁZAR | EJE CAFETERO | | |
| 17174 | CALDAS | CHINCHINÁ | EJE CAFETERO | | |
| 17272 | CALDAS | FILADELFIA | EJE CAFETERO | | |
| 17380 | CALDAS | LA DORADA | EJE CAFETERO | | |
| 17388 | CALDAS | LA MERCED | EJE CAFETERO | | |
| 17433 | CALDAS | MANZANARES | EJE CAFETERO | | |
| 17442 | CALDAS | MARMATO | EJE CAFETERO | | |
| 17444 | CALDAS | MARQUETALIA | EJE CAFETERO | | |
| 17446 | CALDAS | MARULANDA | EJE CAFETERO | | |
| 17486 | CALDAS | NEIRA | EJE CAFETERO | | |
| 17495 | CALDAS | NORCASIA | EJE CAFETERO | | |
| 17513 | CALDAS | PÁCORÁ | EJE CAFETERO | | |
| 17524 | CALDAS | PALESTINA | EJE CAFETERO | | |
| 17541 | CALDAS | PENSILVANIA | EJE CAFETERO | \$ 5.684.746,48 | \$ 5.684.746,48 |
| 17614 | CALDAS | RIOSUCIO | EJE CAFETERO | \$ 13.304.340,45 | \$ 13.304.340,45 |
| 17616 | CALDAS | RISARALDA | EJE CAFETERO | | |
| 17653 | CALDAS | SALAMINA | EJE CAFETERO | | |
| 17662 | CALDAS | SAMANÁ | EJE CAFETERO | \$ 492.499,35 | \$ 492.499,35 |
| 17665 | CALDAS | SAN JOSÉ | EJE CAFETERO | | |
| 17777 | CALDAS | SUPIÁ | EJE CAFETERO | | |
| 17867 | CALDAS | VICTORIA | EJE CAFETERO | | |
| 17873 | CALDAS | VILLAMARÍA | EJE CAFETERO | | |
| 17877 | CALDAS | VITERBO | EJE CAFETERO | | |
| CAQUETÁ | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 18001 | CAQUETÁ | FLORENCIA | CAQUETA Y HUILA | \$ 17.794.381,38 | \$ 17.794.381,38 |
| 18029 | CAQUETÁ | ALBANIA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18094 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | CAQUETA Y HUILA | \$ 19.210.786,63 | \$ 19.210.786,63 |
| 18150 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18205 | CAQUETÁ | CURILLO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18247 | CAQUETÁ | EL DONCELLO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18256 | CAQUETÁ | EL PAUJÍL | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18410 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18460 | CAQUETÁ | MILÁN | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18479 | CAQUETÁ | MORELIA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18592 | CAQUETÁ | PUERTO RICO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18610 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18753 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18756 | CAQUETÁ | SOLANO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18785 | CAQUETÁ | SOLITA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 18860 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO | CAQUETA Y HUILA | | |
| CAUCA | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 19001 | CAUCA | POPAYÁN | CAUCA | \$ 85.808.542,61 | \$ 85.808.542,61 |
| 19022 | CAUCA | ALMAGUER | CAUCA | \$ 15.682.674,42 | \$ 15.682.674,42 |
| 19050 | CAUCA | ARGELIA | CAUCA | | |
| 19075 | CAUCA | BALBOA | CAUCA | \$ 3.764.624,50 | \$ 3.764.624,50 |
| 19100 | CAUCA | BOLÍVAR | CAUCA | | |
| 19110 | CAUCA | BUENOS AIRES | CAUCA | | |
| 19130 | CAUCA | CAJIBÍO | CAUCA | \$ 5.903.516,36 | \$ 5.903.516,36 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----|----------------|
| 19137 | CAUCA | CALDONO | CAUCA | \$ | 25.842.109,67 | \$ | 25.842.109,67 |
| 19142 | CAUCA | CALOTO | CAUCA | \$ | 8.115.931,32 | \$ | 8.115.931,32 |
| 19212 | CAUCA | CORINTO | CAUCA | | | | |
| 19256 | CAUCA | EL TAMBO | CAUCA | | | | |
| 19290 | CAUCA | FLORENCIA | CAUCA | | | | |
| 19300 | CAUCA | GUACHENÉ | CAUCA | | | | |
| 19318 | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA | | | | |
| 19355 | CAUCA | INZÁ | CAUCA | \$ | 5.588.874,20 | \$ | 5.588.874,20 |
| 19364 | CAUCA | JAMBALÓ | CAUCA | \$ | 6.814.965,96 | \$ | 6.814.965,96 |
| 19392 | CAUCA | LA SIERRA | CAUCA | | | | |
| 19397 | CAUCA | LA VEGA | CAUCA | | | | |
| 19418 | CAUCA | LÓPEZ DE MICAY | CAUCA | | | | |
| 19450 | CAUCA | MERCADERES | CAUCA | | | | |
| 19455 | CAUCA | MIRANDA | CAUCA | | | | |
| 19473 | CAUCA | MORALES | CAUCA | \$ | 5.189.709,00 | \$ | 5.189.709,00 |
| 19513 | CAUCA | PADILLA | CAUCA | | | | |
| 19517 | CAUCA | PÁEZ | CAUCA | | | | |
| 19532 | CAUCA | PATÍA | CAUCA | | | | |
| 19533 | CAUCA | PIAMONTE | CAUCA | | | | |
| 19548 | CAUCA | PIENDAMÓ | CAUCA | | | | |
| 19573 | CAUCA | PUERTO TEJADA | CAUCA | | | | |
| 19585 | CAUCA | PURACÉ | CAUCA | | | | |
| 19622 | CAUCA | ROSAS | CAUCA | | | | |
| 19693 | CAUCA | SAN SEBASTIÁN | CAUCA | \$ | 12.840.359,42 | \$ | 12.840.359,42 |
| 19698 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | | | | |
| 19701 | CAUCA | SANTA ROSA | CAUCA | | | | |
| 19743 | CAUCA | SILVIA | CAUCA | \$ | 120.899.002,62 | \$ | 120.899.002,62 |
| 19760 | CAUCA | SOTARA | CAUCA | | | | |
| 19780 | CAUCA | SUÁREZ | CAUCA | | | | |
| 19785 | CAUCA | SUCRE | CAUCA | | | | |
| 19807 | CAUCA | TIMBIO | CAUCA | | | | |
| 19809 | CAUCA | TIMBIQUÍ | CAUCA | \$ | 15.876.965,20 | \$ | 15.876.965,20 |
| 19821 | CAUCA | TORIBÍO | CAUCA | | | | |
| 19824 | CAUCA | TOTORÓ | CAUCA | \$ | 2.983.877,40 | \$ | 2.983.877,40 |
| 19845 | CAUCA | VILLA RICA | CAUCA | | | | |
| CESAR | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | | |
| 20001 | CESAR | VALLEDUPAR | CESAR Y GUAJIRA | \$ | 16.988.148,43 | \$ | 16.988.148,43 |
| 20011 | CESAR | AGUACHICA | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20013 | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | CESAR Y GUAJIRA | \$ | 33.049.541,56 | \$ | 33.049.541,56 |
| 20032 | CESAR | ASTREA | CESAR Y GUAJIRA | \$ | 10.281.611,90 | \$ | 10.281.611,90 |
| 20045 | CESAR | BECERRIL | CESAR Y GUAJIRA | \$ | 4.787.143,90 | \$ | 4.787.143,90 |
| 20060 | CESAR | BOSCONIA | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20175 | CESAR | CHIMICHAGUA | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20178 | CESAR | CHIRIGUANÁ | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20228 | CESAR | CURUMANÍ | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20238 | CESAR | EL COPEY | CESAR Y GUAJIRA | \$ | 6.357.339,38 | \$ | 6.357.339,38 |
| 20250 | CESAR | EL PASO | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20295 | CESAR | GAMARRA | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20310 | CESAR | GONZÁLEZ | MAGDALENA MEDIO | | | | |
| 20383 | CESAR | LA GLORIA | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20400 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20443 | CESAR | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20517 | CESAR | PAILITAS | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20550 | CESAR | PELAYA | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20570 | CESAR | PUEBLO BELLO | CESAR Y GUAJIRA | \$ | 13.227.568,76 | \$ | 13.227.568,76 |
| 20614 | CESAR | RÍO DE ORO | MAGDALENA MEDIO | | | | |
| 20621 | CESAR | LA PAZ | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20710 | CESAR | SAN ALBERTO | MAGDALENA MEDIO | | | | |
| 20750 | CESAR | SAN DIEGO | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20770 | CESAR | SAN MARTÍN | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| 20787 | CESAR | TAMALAMEQUE | CESAR Y GUAJIRA | | | | |
| CÓRDOBA | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | | |
| 23001 | CÓRDOBA | MONTERÍA | CÓRDOBA | | | | |
| 23068 | CÓRDOBA | AYAPEL | CÓRDOBA | | | | |
| 23079 | CÓRDOBA | BUENAVISTA | CÓRDOBA | | | | |
| 23090 | CÓRDOBA | CANALETE | CÓRDOBA | | | | |
| 23162 | CÓRDOBA | CERETÉ | CÓRDOBA | | | | |
| 23168 | CÓRDOBA | CHIMÁ | CÓRDOBA | | | | |
| 23182 | CÓRDOBA | CHINÚ | CÓRDOBA | | | | |
| 23189 | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA | | | | |
| 23300 | CÓRDOBA | COTORRA | CÓRDOBA | | | | |
| 23350 | CÓRDOBA | LA APARTADA | CÓRDOBA | | | | |
| 23417 | CÓRDOBA | LORICA | CÓRDOBA | | | | |
| 23419 | CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | CÓRDOBA | | | | |
| 23464 | CÓRDOBA | MOMIL | CÓRDOBA | | | | |
| 23466 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CÓRDOBA | | | | |
| 23500 | CÓRDOBA | MOÑITOS | CÓRDOBA | | | | |
| 23555 | CÓRDOBA | PLANETA RICA | CÓRDOBA | | | | |
| 23570 | CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CÓRDOBA | | | | |
| 23574 | CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | CÓRDOBA | | | | |
| 23580 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CÓRDOBA | | | | |
| 23586 | CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | CÓRDOBA | | | | |
| 23660 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | CÓRDOBA | | | | |
| 23670 | CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | CÓRDOBA | | | | |
| 23672 | CÓRDOBA | SAN ANTERO | CÓRDOBA | | | | |
| 23675 | CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | CÓRDOBA | | | | |
| 23678 | CÓRDOBA | SAN CARLOS | CÓRDOBA | | | | |
| 23682 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | CÓRDOBA | \$ | 4.069.750,42 | \$ | 4.069.750,42 |
| 23686 | CÓRDOBA | SAN PELAYO | CÓRDOBA | | | | |
| 23807 | CÓRDOBA | TIERRALTA | CÓRDOBA | | | | |
| 23815 | CÓRDOBA | TUCHÍN | CÓRDOBA | | | | |

| 23855 | CÓRDOBA | VALENCIA | CÓRDOBA | | |
|-------|--------------|-------------------------------|--------------------|----|---------------|
| | CUNDINAMARCA | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 25001 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | CENTRO | | |
| 25019 | CUNDINAMARCA | ALBÁN | CENTRO | | |
| 25035 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | CENTRO | | |
| 25040 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | CENTRO | | |
| 25053 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ | CENTRO | | |
| 25086 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN | CENTRO | | |
| 25095 | CUNDINAMARCA | BITUIMA | CENTRO | | |
| 25099 | CUNDINAMARCA | BOJACÁ | CENTRO | | |
| 25120 | CUNDINAMARCA | CABRERA | CENTRO | | |
| 25123 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY | CENTRO | | |
| 25126 | CUNDINAMARCA | CAIICÁ | CENTRO | | |
| 25148 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ | CENTRO | | |
| 25151 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA | CENTRO | | |
| 25154 | CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA | CENTRO | | |
| 25168 | CUNDINAMARCA | CHAGUANÍ | CENTRO | | |
| 25175 | CUNDINAMARCA | CHÍA | CENTRO | | |
| 25178 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | CENTRO | | |
| 25181 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ | CENTRO | | |
| 25183 | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | CENTRO | | |
| 25200 | CUNDINAMARCA | COGUA | CENTRO | | |
| 25214 | CUNDINAMARCA | COTA | CENTRO | | |
| 25224 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ | CENTRO | | |
| 25245 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | CENTRO | | |
| 25258 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN | CENTRO | | |
| 25260 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | CENTRO | | |
| 25269 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | CENTRO | | |
| 25279 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE | CENTRO | | |
| 25281 | CUNDINAMARCA | FOSCA | CENTRO | | |
| 25286 | CUNDINAMARCA | FUNZA | CENTRO | | |
| 25288 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE | CENTRO | | |
| 25290 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | CENTRO | | |
| 25293 | CUNDINAMARCA | GACHALÁ | CENTRO | | |
| 25295 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ | CENTRO | | |
| 25297 | CUNDINAMARCA | GACHETÁ | CENTRO | | |
| 25299 | CUNDINAMARCA | GAMA | CENTRO | | |
| 25307 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CENTRO | | |
| 25312 | CUNDINAMARCA | GRANADA | CENTRO | | |
| 25317 | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | CENTRO | | |
| 25320 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | CENTRO | | |
| 25322 | CUNDINAMARCA | GUASCA | CENTRO | | |
| 25324 | CUNDINAMARCA | GUATAQUÍ | CENTRO | | |
| 25326 | CUNDINAMARCA | GUATAVITA | CENTRO | | |
| 25328 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SÍQUIMA | CENTRO | | |
| 25335 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | CENTRO | | |
| 25339 | CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | CENTRO | | |
| 25368 | CUNDINAMARCA | JERUSALEN | CENTRO | | |
| 25372 | CUNDINAMARCA | JUNÍN | CENTRO | | |
| 25377 | CUNDINAMARCA | LA CALERA | CENTRO | | |
| 25386 | CUNDINAMARCA | LA MESA | CENTRO | | |
| 25394 | CUNDINAMARCA | LA PALMA | CENTRO | \$ | 11.330.912,25 |
| 25398 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA | CENTRO | \$ | 11.330.912,25 |
| 25402 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | CENTRO | | |
| 25407 | CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE | CENTRO | | |
| 25426 | CUNDINAMARCA | MACHETÁ | CENTRO | | |
| 25430 | CUNDINAMARCA | MADRID | CENTRO | | |
| 25436 | CUNDINAMARCA | MANTA | CENTRO | | |
| 25438 | CUNDINAMARCA | MEDINA | CENTRO | | |
| 25473 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CENTRO | | |
| 25483 | CUNDINAMARCA | NARIÑO | CENTRO | | |
| 25486 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN | CENTRO | | |
| 25488 | CUNDINAMARCA | NILO | CENTRO | | |
| 25489 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA | CENTRO | | |
| 25491 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA | CENTRO | | |
| 25506 | CUNDINAMARCA | VENECIA | CENTRO | | |
| 25513 | CUNDINAMARCA | PACHO | CENTRO | | |
| 25518 | CUNDINAMARCA | PAIME | CENTRO | | |
| 25524 | CUNDINAMARCA | PANDI | CENTRO | | |
| 25530 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | CENTRO | | |
| 25535 | CUNDINAMARCA | PASCA | CENTRO | | |
| 25572 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | CENTRO | | |
| 25580 | CUNDINAMARCA | PULÍ | CENTRO | | |
| 25592 | CUNDINAMARCA | QUEBRADANEGRA | CENTRO | | |
| 25594 | CUNDINAMARCA | QUETAME | CENTRO | | |
| 25596 | CUNDINAMARCA | QUIPILE | CENTRO | | |
| 25599 | CUNDINAMARCA | APULO | CENTRO | | |
| 25612 | CUNDINAMARCA | RICAUARTE | CENTRO | | |
| 25645 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CENTRO | | |
| 25649 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | CENTRO | | |
| 25653 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO | CENTRO | | |
| 25658 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | CENTRO | | |
| 25662 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO | CENTRO | | |
| 25718 | CUNDINAMARCA | SASAIMA | CENTRO | | |
| 25736 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ | CENTRO | | |
| 25740 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | CENTRO | | |
| 25743 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | CENTRO | | |
| 25745 | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | CENTRO | | |
| 25754 | CUNDINAMARCA | SOACHA | CENTRO | | |
| 25758 | CUNDINAMARCA | SOPÓ | CENTRO | | |
| 25769 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | CENTRO | | |
| 25772 | CUNDINAMARCA | SUESCA | CENTRO | | |
| 25777 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ | CENTRO | | |
| 25779 | CUNDINAMARCA | SUSA | CENTRO | | |
| 25781 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA | CENTRO | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| 25785 | CUNDINAMARCA | TABIO | CENTRO | | |
| 25793 | CUNDINAMARCA | TAUSA | CENTRO | | |
| 25797 | CUNDINAMARCA | TENA | CENTRO | | |
| 25799 | CUNDINAMARCA | TENJO | CENTRO | | |
| 25805 | CUNDINAMARCA | TIBACUY | CENTRO | | |
| 25807 | CUNDINAMARCA | TIBIRITA | CENTRO | | |
| 25815 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | CENTRO | | |
| 25817 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | CENTRO | | |
| 25823 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ | CENTRO | | |
| 25839 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | CENTRO | | |
| 25841 | CUNDINAMARCA | UBAQUE | CENTRO | | |
| 25843 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | CENTRO | | |
| 25845 | CUNDINAMARCA | UNE | CENTRO | | |
| 25851 | CUNDINAMARCA | ÚTICA | CENTRO | | |
| 25862 | CUNDINAMARCA | VERGARA | CENTRO | | |
| 25867 | CUNDINAMARCA | VIANÍ | CENTRO | | |
| 25871 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ | CENTRO | | |
| 25873 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN | CENTRO | | |
| 25875 | CUNDINAMARCA | VILLETA | CENTRO | \$ 11.191.700,45 | \$ 11.191.700,45 |
| 25878 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ | CENTRO | | |
| 25885 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ | CENTRO | | |
| 25898 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | CENTRO | | |
| 25899 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | CENTRO | | |
| CHOCO | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 27001 | CHOCÓ | QUIBDÓ | CHOCO | | |
| 27006 | CHOCÓ | ACANDÍ | URABA | \$ 36.547.034,24 | \$ 36.547.034,24 |
| 27025 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ | CHOCO | | |
| 27050 | CHOCÓ | ATRATO | CHOCO | | |
| 27073 | CHOCÓ | BAGADÓ | CHOCO | | |
| 27075 | CHOCÓ | BAHÍA SOLANO | CHOCO | | |
| 27077 | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | CHOCO | | |
| 27099 | CHOCÓ | BOJAYÁ | CHOCO | | |
| 27135 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO | CHOCO | | |
| 27150 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN | URABA | \$ 21.879.796,08 | \$ 21.879.796,08 |
| 27160 | CHOCÓ | CÉRTEGUI | CHOCO | | |
| 27205 | CHOCÓ | CONDOTO | CHOCO | | |
| 27245 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO | CHOCO | \$ 168.967.503,91 | \$ 168.967.503,91 |
| 27250 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN | CHOCO | | |
| 27361 | CHOCÓ | ISTMINA | CHOCO | | |
| 27372 | CHOCÓ | JURADÓ | CHOCO | | |
| 27413 | CHOCÓ | LLORÓ | CHOCO | | |
| 27425 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | CHOCO | \$ 6.753.988,88 | \$ 6.753.988,88 |
| 27430 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ | CHOCO | | |
| 27450 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN | CHOCO | | |
| 27491 | CHOCÓ | NÓVITA | CHOCO | | |
| 27495 | CHOCÓ | NUQUÍ | CHOCO | | |
| 27580 | CHOCÓ | RÍO IRÓ | CHOCO | | |
| 27600 | CHOCÓ | RÍO QUITO | CHOCO | | |
| 27615 | CHOCÓ | RIOSUCIO | URABA | \$ 21.895.836,46 | \$ 21.895.836,46 |
| 27660 | CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR | CHOCO | \$ 7.047.239,50 | \$ 7.047.239,50 |
| 27745 | CHOCÓ | SIPI | CHOCO | | |
| 27787 | CHOCÓ | TADÓ | CHOCO | | |
| 27800 | CHOCÓ | UNGUÍA | URABA | \$ 48.598.598,32 | \$ 48.598.598,32 |
| 27810 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA | CHOCO | | |
| HUILA | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 41001 | HUILA | NEIVA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41006 | HUILA | ACEVEDO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41013 | HUILA | AGRADO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41016 | HUILA | AIPE | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41020 | HUILA | ALGECIRAS | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41026 | HUILA | ALTAMIRA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41078 | HUILA | BARAYA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41132 | HUILA | CAMPOALEGRE | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41206 | HUILA | COLOMBIA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41244 | HUILA | ELÍAS | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41298 | HUILA | GARZÓN | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41306 | HUILA | GIGANTE | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41319 | HUILA | GUADALUPE | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41349 | HUILA | HOBO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41357 | HUILA | ÍQUIRA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41359 | HUILA | ISNOS | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41378 | HUILA | LA ARGENTINA | CAQUETA Y HUILA | \$ 25.117.252,69 | \$ 25.117.252,69 |
| 41396 | HUILA | LA PLATA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41483 | HUILA | NÁTAGA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41503 | HUILA | OPORAPA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41518 | HUILA | PAICOL | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41524 | HUILA | PALERMO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41530 | HUILA | PALESTINA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41548 | HUILA | PITAL | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41551 | HUILA | PITALITO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41615 | HUILA | RIVERA | CAQUETA Y HUILA | \$ 15.482.972,03 | \$ 15.482.972,03 |
| 41660 | HUILA | SALADOBLANCO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41668 | HUILA | SAN AGUSTÍN | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41676 | HUILA | SANTA MARÍA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41770 | HUILA | SUAZA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41791 | HUILA | TARQUI | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41797 | HUILA | TESALIA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41799 | HUILA | TELLO | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41801 | HUILA | TERUEL | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41807 | HUILA | TIMANÁ | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41872 | HUILA | VILLAVIEJA | CAQUETA Y HUILA | | |
| 41885 | HUILA | YAGUARÁ | CAQUETA Y HUILA | | |
| GUAJIRA | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 44001 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CESAR Y GUAJIRA | | |

| | | | | | |
|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 44035 | LA GUAJIRA | ALBANIA | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44078 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44090 | LA GUAJIRA | DIBULLA | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44098 | LA GUAJIRA | DISTRACCIÓN | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44110 | LA GUAJIRA | EL MOLINO | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44279 | LA GUAJIRA | FONSECA | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44378 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44420 | LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44430 | LA GUAJIRA | MAICAO | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44560 | LA GUAJIRA | MANAURE | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44650 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44847 | LA GUAJIRA | URIBIA | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44855 | LA GUAJIRA | URUMITA | CESAR Y GUAJIRA | | |
| 44874 | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | CESAR Y GUAJIRA | | |
| MAGDALENA | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 47001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | MAGDALENA | \$ 58.701.099,54 | \$ 58.701.099,54 |
| 47030 | MAGDALENA | ALGARROBO | MAGDALENA | | |
| 47053 | MAGDALENA | ARACATACA | MAGDALENA | | |
| 47058 | MAGDALENA | ARIGUANÍ | MAGDALENA | | |
| 47161 | MAGDALENA | CERRO DE SAN ANTONIO | MAGDALENA | | |
| 47170 | MAGDALENA | CHIVOLO | MAGDALENA | \$ 9.260.829,90 | \$ 9.260.829,90 |
| 47189 | MAGDALENA | CIÉNAGA | MAGDALENA | \$ 34.941.595,15 | \$ 34.941.595,15 |
| 47205 | MAGDALENA | CONCORDIA | MAGDALENA | | |
| 47245 | MAGDALENA | EL BANCO | MAGDALENA | | |
| 47258 | MAGDALENA | EL PIÑÓN | MAGDALENA | | |
| 47268 | MAGDALENA | EL RETÉN | MAGDALENA | | |
| 47288 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | MAGDALENA | | |
| 47318 | MAGDALENA | GUAMAL | MAGDALENA | | |
| 47460 | MAGDALENA | NUEVA GRANADA | MAGDALENA | | |
| 47541 | MAGDALENA | PEDRAZA | MAGDALENA | | |
| 47545 | MAGDALENA | PIJIÑO DEL CARMEN | MAGDALENA | | |
| 47551 | MAGDALENA | PIVJAY | MAGDALENA | \$ 20.183.076,92 | \$ 20.183.076,92 |
| 47555 | MAGDALENA | PLATO | MAGDALENA | | |
| 47570 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | MAGDALENA | | |
| 47605 | MAGDALENA | REMOLINO | MAGDALENA | \$ 2.601.780,30 | \$ 2.601.780,30 |
| 47660 | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ÁNGEL | MAGDALENA | | |
| 47675 | MAGDALENA | SALAMINA | MAGDALENA | | |
| 47692 | MAGDALENA | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | MAGDALENA | | |
| 47703 | MAGDALENA | SAN ZENÓN | MAGDALENA | | |
| 47707 | MAGDALENA | SANTA ANA | MAGDALENA | | |
| 47720 | MAGDALENA | SANTA BÁRBARA DE PINTO | MAGDALENA | | |
| 47745 | MAGDALENA | SITIONUEVO | MAGDALENA | | |
| 47798 | MAGDALENA | TENERIFE | MAGDALENA | | |
| 47960 | MAGDALENA | ZAPAYÁN | MAGDALENA | | |
| 47980 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | MAGDALENA | | |
| META | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 50001 | META | VILLAVICENCIO | META Y LLANOS ORIENTALES | \$ 37.471.505,36 | \$ 37.471.505,36 |
| 50006 | META | ACACÍAS | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50110 | META | BARRANCA DE UPIÁ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50124 | META | CABUYARO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50150 | META | CASTILLA LA NUEVA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50223 | META | CUBARRAL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50226 | META | CUMARAL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50245 | META | EL CALVARIO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50251 | META | EL CASTILLO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50270 | META | EL DORADO | META Y LLANOS ORIENTALES | \$ 21.180.331,62 | \$ 21.180.331,62 |
| 50287 | META | FUENTE DE ORO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50313 | META | GRANADA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50318 | META | GUAMAL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50325 | META | MAPIRIPÁN | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50330 | META | MESETAS | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50350 | META | LA MACARENA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50370 | META | URIBE | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50400 | META | LEJANÍAS | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50450 | META | PUERTO CONCORDIA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50568 | META | PUERTO GAITÁN | META Y LLANOS ORIENTALES | \$ 2.983.877,40 | \$ 2.983.877,40 |
| 50573 | META | PUERTO LÓPEZ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50577 | META | PUERTO LLERAS | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50590 | META | PUERTO RICO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50606 | META | RESTREPO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50680 | META | SAN CARLOS DE GUAROA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50683 | META | SAN JUAN DE ARAMA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50686 | META | SAN JUANITO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50689 | META | SAN MARTÍN | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 50711 | META | VISTAHERMOSA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| NARIÑO | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 52001 | NARIÑO | PASTO | NARIÑO | \$ 5.216.795,01 | \$ 5.216.795,01 |
| 52019 | NARIÑO | ALBÁN | NARIÑO | | |
| 52022 | NARIÑO | ALDANA | NARIÑO | | |
| 52036 | NARIÑO | ANCUYÁ | NARIÑO | | |
| 52051 | NARIÑO | ARBOLEDA | NARIÑO | | |
| 52079 | NARIÑO | BARBACOAS | NARIÑO | | |
| 52083 | NARIÑO | BELÉN | NARIÑO | | |
| 52110 | NARIÑO | BUESACO | NARIÑO | | |
| 52203 | NARIÑO | COLÓN | NARIÑO | | |
| 52207 | NARIÑO | CONSACÁ | NARIÑO | | |
| 52210 | NARIÑO | CONTADERO | NARIÑO | | |
| 52215 | NARIÑO | CÓRDOBA | NARIÑO | | |
| 52224 | NARIÑO | CUASPÚD | NARIÑO | | |
| 52227 | NARIÑO | CUMBAL | NARIÑO | | |
| 52233 | NARIÑO | CUMBITARA | NARIÑO | | |
| 52240 | NARIÑO | CHACHAGÚÍ | NARIÑO | | |
| 52250 | NARIÑO | EL CHARCO | NARIÑO | | |
| 52254 | NARIÑO | EL PEÑOL | NARIÑO | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----|---------------|
| 52256 | NARIÑO | EL ROSARIO | NARIÑO | \$ | 9.946.258,00 | \$ | 9.946.258,00 |
| 52258 | NARIÑO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | NARIÑO | | | | |
| 52260 | NARIÑO | EL TAMBO | NARIÑO | | | | |
| 52287 | NARIÑO | FUNES | NARIÑO | | | | |
| 52317 | NARIÑO | GUACHUCAL | NARIÑO | | | | |
| 52320 | NARIÑO | GUAITARILLA | NARIÑO | | | | |
| 52323 | NARIÑO | GUALMATÁN | NARIÑO | | | | |
| 52352 | NARIÑO | ILES | NARIÑO | | | | |
| 52354 | NARIÑO | IMUÉS | NARIÑO | | | | |
| 52356 | NARIÑO | IPIALES | NARIÑO | | | | |
| 52378 | NARIÑO | LA CRUZ | NARIÑO | \$ | 8.767.905,72 | \$ | 8.767.905,72 |
| 52381 | NARIÑO | LA FLORIDA | NARIÑO | | | | |
| 52385 | NARIÑO | LA LLANADA | NARIÑO | | | | |
| 52390 | NARIÑO | LA TOLA | NARIÑO | | | | |
| 52399 | NARIÑO | LA UNIÓN | NARIÑO | | | | |
| 52405 | NARIÑO | LEIVA | NARIÑO | | | | |
| 52411 | NARIÑO | LINARES | NARIÑO | | | | |
| 52418 | NARIÑO | LOS ANDES | NARIÑO | \$ | 2.486.564,50 | \$ | 2.486.564,50 |
| 52427 | NARIÑO | MAGÚI | NARIÑO | | | | |
| 52435 | NARIÑO | MALLAMA | NARIÑO | | | | |
| 52473 | NARIÑO | MOSQUERA | NARIÑO | | | | |
| 52480 | NARIÑO | NARIÑO | NARIÑO | | | | |
| OLAYA HERRERA | NARIÑO | OLAYA HERRERA | NARIÑO | | | | |
| 52490 | NARIÑO | OLAYA HERRERA | NARIÑO | | | | |
| 52506 | NARIÑO | OSPINA | NARIÑO | | | | |
| 52520 | NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | NARIÑO | | | | |
| 52540 | NARIÑO | POLICARPA | NARIÑO | | | | |
| 52560 | NARIÑO | POTOSÍ | NARIÑO | | | | |
| 52565 | NARIÑO | PROVIDENCIA | NARIÑO | | | | |
| 52573 | NARIÑO | PUERRES | NARIÑO | | | | |
| 52585 | NARIÑO | PUPIALES | NARIÑO | | | | |
| 52612 | NARIÑO | RICAUORTE | NARIÑO | \$ | 11.778.039,27 | \$ | 11.778.039,27 |
| 52621 | NARIÑO | ROBERTO PAYÁN | NARIÑO | | | | |
| 52678 | NARIÑO | SAMANIEGO | NARIÑO | | | | |
| 52683 | NARIÑO | SANDONÁ | NARIÑO | | | | |
| 52685 | NARIÑO | SAN BERNARDO | NARIÑO | | | | |
| 52687 | NARIÑO | SAN LORENZO | NARIÑO | | | | |
| 52693 | NARIÑO | SAN PABLO | NARIÑO | | | | |
| 52694 | NARIÑO | SAN PEDRO DE CARTAGO | NARIÑO | | | | |
| 52696 | NARIÑO | SANTA BÁRBARA | NARIÑO | | | | |
| 52699 | NARIÑO | SANTACRUZ | NARIÑO | | | | |
| 52720 | NARIÑO | SAPUYES | NARIÑO | | | | |
| 52786 | NARIÑO | TAMINANGO | NARIÑO | | | | |
| 52788 | NARIÑO | TANGUA | NARIÑO | | | | |
| 52835 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | NARIÑO | | | | |
| 52838 | NARIÑO | TÚQUERRES | NARIÑO | | | | |
| 52885 | NARIÑO | YACUANQUER | NARIÑO | | | | |
| NORTE DE SANTANDER | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | | |
| 54001 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | \$ | 14.956.936,26 | \$ | 14.956.936,26 |
| 54003 | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54051 | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54099 | NORTE DE SANTANDER | BOCHALEMA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54109 | NORTE DE SANTANDER | BUCARASICA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54125 | NORTE DE SANTANDER | CÁCOTA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54128 | NORTE DE SANTANDER | CÁCHIRA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54172 | NORTE DE SANTANDER | CHINÁCOTA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54174 | NORTE DE SANTANDER | CHITAGÁ | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54206 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54223 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTILLA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54239 | NORTE DE SANTANDER | DURANIA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54245 | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54250 | NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54261 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54313 | NORTE DE SANTANDER | GRAMALOTE | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54344 | NORTE DE SANTANDER | HACARÍ | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54347 | NORTE DE SANTANDER | HERRÁN | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54377 | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54385 | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54398 | NORTE DE SANTANDER | LA PLAYA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54405 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |
| 54418 | NORTE DE SANTANDER | LOURDES | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 54480 | NORTE DE SANTANDER | MUTISCUA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54498 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54518 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54520 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONITA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54553 | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54599 | NORTE DE SANTANDER | RAGONVALIA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54660 | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54670 | NORTE DE SANTANDER | SAN CALIXTO | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54673 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54680 | NORTE DE SANTANDER | SANTIAGO | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54720 | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54743 | NORTE DE SANTANDER | SILOS | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54800 | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54810 | NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54820 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54871 | NORTE DE SANTANDER | VILLA CARO | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| 54874 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA |
| QUINDIO | | | TOTAL DEPARTAMENTO |
| 63001 | QUINDÍO | ARMENIA | EJE CAFETERO |
| 63111 | QUINDÍO | BUENAVISTA | EJE CAFETERO |
| 63130 | QUINDÍO | CALARCÁ | EJE CAFETERO |
| 63190 | QUINDÍO | CIRCASIA | EJE CAFETERO |
| 63212 | QUINDÍO | CÓRDOBA | EJE CAFETERO |
| 63272 | QUINDÍO | FILANDIA | EJE CAFETERO |
| 63302 | QUINDÍO | GÉNOVA | EJE CAFETERO |
| 63401 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | EJE CAFETERO |
| 63470 | QUINDÍO | MONTENEGRO | EJE CAFETERO |
| 63548 | QUINDÍO | PIJAO | EJE CAFETERO |
| 63594 | QUINDÍO | QUIMBAYA | EJE CAFETERO |
| 63690 | QUINDÍO | SALENTO | EJE CAFETERO |
| RISARALDA | | | TOTAL DEPARTAMENTO |
| 66001 | RISARALDA | PEREIRA | EJE CAFETERO |
| 66045 | RISARALDA | APIÁ | EJE CAFETERO |
| 66075 | RISARALDA | BALBOA | EJE CAFETERO |
| 66088 | RISARALDA | BELÉN DE UMBRÍA | EJE CAFETERO |
| 66170 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | EJE CAFETERO |
| 66318 | RISARALDA | GUÁTICA | EJE CAFETERO |
| 66383 | RISARALDA | LA CELIA | EJE CAFETERO |
| 66400 | RISARALDA | LA VIRGINIA | EJE CAFETERO |
| 66440 | RISARALDA | MARSELLA | EJE CAFETERO |
| 66456 | RISARALDA | MISTRATÓ | EJE CAFETERO |
| 66572 | RISARALDA | PUEBLO RICO | EJE CAFETERO |
| 66594 | RISARALDA | QUINCHÍA | EJE CAFETERO |
| 66682 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | EJE CAFETERO |
| 66687 | RISARALDA | SANTUARIO | EJE CAFETERO |
| SANTANDER | | | TOTAL DEPARTAMENTO |
| 68001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | SANTANDER |
| 68013 | SANTANDER | AGUADA | SANTANDER |
| 68020 | SANTANDER | ALBANIA | SANTANDER |
| 68051 | SANTANDER | ARATOCA | SANTANDER |
| 68077 | SANTANDER | BARBOSA | SANTANDER |
| 68079 | SANTANDER | BARICHARA | SANTANDER |
| 68081 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | MAGDALENA MEDIO |
| 68092 | SANTANDER | BETULIA | SANTANDER |
| 68101 | SANTANDER | BOLÍVAR | SANTANDER |
| 68121 | SANTANDER | CABRERA | SANTANDER |
| 68132 | SANTANDER | CALIFORNIA | SANTANDER |
| 68147 | SANTANDER | CAPITANEJO | SANTANDER |
| 68152 | SANTANDER | CARCASÍ | SANTANDER |
| 68160 | SANTANDER | CEPITÁ | SANTANDER |
| 68162 | SANTANDER | CERRITO | SANTANDER |
| 68167 | SANTANDER | CHARALÁ | SANTANDER |
| 68169 | SANTANDER | CHARTA | SANTANDER |
| 68176 | SANTANDER | CHIMA | SANTANDER |
| 68179 | SANTANDER | CHIPATÁ | SANTANDER |
| 68190 | SANTANDER | CIMITARRA | MAGDALENA MEDIO |
| 68207 | SANTANDER | CONCEPCIÓN | SANTANDER |
| 68209 | SANTANDER | CONFINES | SANTANDER |
| 68211 | SANTANDER | CONTRATACIÓN | SANTANDER |
| 68217 | SANTANDER | COROMORO | SANTANDER |
| 68229 | SANTANDER | CURITÍ | SANTANDER |
| 68235 | SANTANDER | EL CARMEN DE CHUCURÍ | SANTANDER |
| 68245 | SANTANDER | EL GUACAMAYO | SANTANDER |
| 68250 | SANTANDER | EL PEÑÓN | SANTANDER |
| 68255 | SANTANDER | EL PLAYÓN | SANTANDER |
| 68264 | SANTANDER | ENCINO | SANTANDER |
| 68266 | SANTANDER | ENCISO | SANTANDER |
| 68271 | SANTANDER | FLORIÁN | SANTANDER |
| 68276 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | SANTANDER |

\$ 966.445,15 \$ 966.445,15

\$ 5.987.898,65 \$ 5.987.898,65

\$ 4.835.291,67 \$ 4.835.291,67

\$ 2.891.328,00 \$ 2.891.328,00

\$ 9.734.243,32 \$ 9.734.243,32

\$ 1.693.375,57 \$ 1.693.375,57

\$ 4.724.472,55 \$ 4.724.472,55

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 68296 | SANTANDER | GALÁN | SANTANDER | | |
| 68298 | SANTANDER | GÁMBITA | SANTANDER | | |
| 68307 | SANTANDER | GIRÓN | SANTANDER | \$ | 8.418.159,37 |
| 68318 | SANTANDER | GUACA | SANTANDER | \$ | 8.418.159,37 |
| 68320 | SANTANDER | GUADALUPE | SANTANDER | | |
| 68322 | SANTANDER | GUAPOTÁ | SANTANDER | | |
| 68324 | SANTANDER | GUAVATÁ | SANTANDER | | |
| 68327 | SANTANDER | GÜEPSA | SANTANDER | | |
| 68344 | SANTANDER | HATO | SANTANDER | | |
| 68368 | SANTANDER | JESÚS MARÍA | SANTANDER | | |
| 68370 | SANTANDER | JORDÁN | SANTANDER | | |
| 68377 | SANTANDER | LA BELLEZA | SANTANDER | | |
| 68385 | SANTANDER | LANDÁZURI | MAGDALENA MEDIO | \$ | 1.864.306,70 |
| 68397 | SANTANDER | LA PAZ | SANTANDER | \$ | 1.864.306,70 |
| 68406 | SANTANDER | LEBRUJA | SANTANDER | | |
| 68418 | SANTANDER | LOS SANTOS | SANTANDER | | |
| 68425 | SANTANDER | MACARAVITA | SANTANDER | | |
| 68432 | SANTANDER | MÁLAGA | SANTANDER | | |
| 68444 | SANTANDER | MATANZA | SANTANDER | | |
| 68464 | SANTANDER | MOGOTES | SANTANDER | | |
| 68468 | SANTANDER | MOLAGAVITA | SANTANDER | | |
| 68498 | SANTANDER | OCAMONTE | SANTANDER | | |
| 68500 | SANTANDER | OIBA | SANTANDER | | |
| 68502 | SANTANDER | ONZAGA | SANTANDER | | |
| 68522 | SANTANDER | PALMAR | SANTANDER | | |
| 68524 | SANTANDER | PALMAS DEL SOCORRO | SANTANDER | | |
| 68533 | SANTANDER | PÁRAMO | SANTANDER | | |
| 68547 | SANTANDER | PIEDECUESTA | SANTANDER | | |
| 68549 | SANTANDER | PINCHOTE | SANTANDER | | |
| 68572 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | SANTANDER | | |
| 68573 | SANTANDER | PUERTO PARRA | MAGDALENA MEDIO | | |
| 68575 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | MAGDALENA MEDIO | | |
| 68615 | SANTANDER | RIONEGRO | SANTANDER | | |
| 68655 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | MAGDALENA MEDIO | | |
| 68669 | SANTANDER | SAN ANDRÉS | SANTANDER | | |
| 68673 | SANTANDER | SAN BENITO | SANTANDER | | |
| 68679 | SANTANDER | SAN GIL | SANTANDER | | |
| 68682 | SANTANDER | SAN JOAQUÍN | SANTANDER | | |
| 68684 | SANTANDER | SAN JOSÉ DE MIRANDA | SANTANDER | | |
| 68686 | SANTANDER | SAN MIGUEL | SANTANDER | | |
| 68689 | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | SANTANDER | | |
| 68705 | SANTANDER | SANTA BÁRBARA | SANTANDER | | |
| 68720 | SANTANDER | SANTA HELENA DEL OPÓN | SANTANDER | | |
| 68745 | SANTANDER | SIMACOTA | SANTANDER | \$ | 2.112.250,00 |
| 68755 | SANTANDER | SOCORRO | SANTANDER | \$ | 2.112.250,00 |
| 68770 | SANTANDER | SUAITA | SANTANDER | | |
| 68773 | SANTANDER | SUCRE | SANTANDER | | |
| 68780 | SANTANDER | SURATÁ | SANTANDER | \$ | 28.856.137,16 |
| 68820 | SANTANDER | TONA | SANTANDER | \$ | 28.856.137,16 |
| 68855 | SANTANDER | VALLE DE SAN JOSÉ | SANTANDER | | |
| 68861 | SANTANDER | VÉLEZ | SANTANDER | | |
| 68867 | SANTANDER | VETAS | SANTANDER | | |
| 68872 | SANTANDER | VILLANUEVA | SANTANDER | | |
| 68895 | SANTANDER | ZAPATOCA | SANTANDER | | |
| SUCRE | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 70001 | SUCRE | SINCELEJO | SUCRE | | |
| 70110 | SUCRE | BUENAVISTA | SUCRE | | |
| 70124 | SUCRE | CAIMITO | SUCRE | | |
| 70204 | SUCRE | COLOSÓ | SUCRE | | |
| 70215 | SUCRE | COROZAL | SUCRE | | |
| 70221 | SUCRE | COVEÑAS | SUCRE | | |
| 70230 | SUCRE | CHALÁN | SUCRE | | |
| 70233 | SUCRE | EL ROBLE | SUCRE | | |
| 70235 | SUCRE | GALERAS | SUCRE | | |
| 70265 | SUCRE | GUARANDA | SUCRE | | |
| 70400 | SUCRE | LA UNIÓN | SUCRE | | |
| 70418 | SUCRE | LOS PALMITOS | SUCRE | | |
| 70429 | SUCRE | MAJAGUAL | SUCRE | | |
| 70473 | SUCRE | MORROA | SUCRE | | |
| 70508 | SUCRE | OVEJAS | SUCRE | \$ | 16.250.185,55 |
| 70523 | SUCRE | PALMITO | SUCRE | \$ | 16.250.185,55 |
| 70670 | SUCRE | SAMPUÉS | SUCRE | | |
| 70678 | SUCRE | SAN BENITO ABAD | SUCRE | | |
| 70702 | SUCRE | SAN JUAN DE BETULIA | SUCRE | | |
| 70708 | SUCRE | SAN MARCOS | SUCRE | | |
| 70713 | SUCRE | SAN ONOFRE | SUCRE | | |
| 70717 | SUCRE | SAN PEDRO | SUCRE | | |
| 70742 | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SUCRE | | |
| 70771 | SUCRE | SUCRE | SUCRE | | |
| 70820 | SUCRE | SANTIAGO DE TOLÚ | SUCRE | | |
| 70823 | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SUCRE | | |
| TOLIMA | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 73001 | TOLIMA | IBAGUÉ | CENTRO | \$ | 5.401.595,64 |
| 73024 | TOLIMA | ALPUJARRA | CENTRO | \$ | 5.401.595,64 |
| 73026 | TOLIMA | ALVARADO | CENTRO | | |
| 73030 | TOLIMA | AMBALEMA | CENTRO | | |
| 73043 | TOLIMA | ANZOÁTEGUI | CENTRO | | |
| 73055 | TOLIMA | ARMERO GUAYABAL | CENTRO | | |
| 73067 | TOLIMA | ATACO | CENTRO | \$ | 31.214.593,70 |
| 73124 | TOLIMA | CAJAMARCA | CENTRO | \$ | 31.214.593,70 |
| 73148 | TOLIMA | CARMEN DE APICALÁ | CENTRO | | |
| 73152 | TOLIMA | CASABIANCA | CENTRO | | |
| 73168 | TOLIMA | CHAPARRAL | CENTRO | | |
| 73200 | TOLIMA | COELLO | CENTRO | | |
| 73217 | TOLIMA | COYAIMA | CENTRO | | |
| 73226 | TOLIMA | CUNDAY | CENTRO | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 73236 | TOLIMA | DOLORES | CENTRO | | |
| 73268 | TOLIMA | ESPINAL | CENTRO | | |
| 73270 | TOLIMA | FALAN | CENTRO | | |
| 73275 | TOLIMA | FLANDES | CENTRO | | |
| 73283 | TOLIMA | FRESNO | CENTRO | | |
| 73319 | TOLIMA | GUAMO | CENTRO | | |
| 73347 | TOLIMA | HERVEO | CENTRO | | |
| 73349 | TOLIMA | HONDA | CENTRO | | |
| 73352 | TOLIMA | ICONONZO | CENTRO | | |
| 73408 | TOLIMA | LÉRIDA | CENTRO | | |
| 73411 | TOLIMA | LÍBANO | CENTRO | | |
| 73443 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | CENTRO | | |
| 73449 | TOLIMA | MELGAR | CENTRO | | |
| 73461 | TOLIMA | MURILLO | CENTRO | | |
| 73483 | TOLIMA | NATAGAIMA | CENTRO | | |
| 73504 | TOLIMA | ORTEGA | CENTRO | | |
| 73520 | TOLIMA | PALOCABILDO | CENTRO | | |
| 73547 | TOLIMA | PIEDRAS | CENTRO | | |
| 73555 | TOLIMA | PLANADAS | CENTRO | | |
| 73563 | TOLIMA | PRADO | CENTRO | | |
| 73585 | TOLIMA | PURIFICACIÓN | CENTRO | | |
| 73616 | TOLIMA | RIOBLANCO | CENTRO | | |
| 73622 | TOLIMA | RONCESVALLES | CENTRO | | |
| 73624 | TOLIMA | ROVIRA | CENTRO | | |
| 73671 | TOLIMA | SALDAÑA | CENTRO | | |
| 73675 | TOLIMA | SAN ANTONIO | CENTRO | | |
| 73678 | TOLIMA | SAN LUIS | CENTRO | | |
| 73686 | TOLIMA | SANTA ISABEL | CENTRO | | |
| 73770 | TOLIMA | SUÁREZ | CENTRO | | |
| 73854 | TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | CENTRO | | |
| 73861 | TOLIMA | VENADILLO | CENTRO | | |
| 73870 | TOLIMA | VILLAHERMOSA | CENTRO | | |
| 73873 | TOLIMA | VILLARRICA | CENTRO | | |
| VALLE DEL CAUCA | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 76001 | VALLE DEL CAUCA | CALI | VALLE | \$ 44.770.118,82 | \$ 44.770.118,82 |
| 76020 | VALLE DEL CAUCA | ALCALÁ | VALLE | | |
| 76036 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | VALLE | | |
| 76041 | VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | VALLE | | |
| 76054 | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | VALLE | | |
| 76100 | VALLE DEL CAUCA | BOLÍVAR | VALLE | | |
| 76109 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | VALLE | | |
| 76111 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | \$ 41.259.173,06 | \$ 41.259.173,06 |
| 76113 | VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | VALLE | | |
| 76122 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | VALLE | | |
| 76126 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | VALLE | | |
| 76130 | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | VALLE | | |
| 76147 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | VALLE | | |
| 76233 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | VALLE | | |
| 76243 | VALLE DEL CAUCA | EL ÁGUILA | VALLE | | |
| 76246 | VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | VALLE | | |
| 76248 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | VALLE | | |
| 76250 | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | VALLE | | |
| 76275 | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | VALLE | | |
| 76306 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | VALLE | | |
| 76318 | VALLE DEL CAUCA | GUACARÍ | VALLE | | |
| 76364 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | VALLE | | |
| 76377 | VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | VALLE | | |
| 76400 | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | VALLE | | |
| 76403 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | VALLE | | |
| 76497 | VALLE DEL CAUCA | OBANDO | VALLE | | |
| 76520 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | VALLE | | |
| 76563 | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | VALLE | \$ 17.560.676,49 | \$ 17.560.676,49 |
| 76606 | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | VALLE | | |
| 76616 | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | VALLE | | |
| 76622 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | VALLE | | |
| 76670 | VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | VALLE | | |
| 76736 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | VALLE | | |
| 76823 | VALLE DEL CAUCA | TORO | VALLE | | |
| 76828 | VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | VALLE | \$ 25.246.135,60 | \$ 25.246.135,60 |
| 76834 | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | VALLE | | |
| 76845 | VALLE DEL CAUCA | ULLOA | VALLE | | |
| 76863 | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | VALLE | | |
| 76869 | VALLE DEL CAUCA | VIJES | VALLE | | |
| 76890 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | VALLE | | |
| 76892 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | VALLE | | |
| 76895 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | VALLE | | |
| ARAUCA | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 81001 | ARAUCA | ARAUCA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | \$ 20.378.016,22 | \$ 20.378.016,22 |
| 81065 | ARAUCA | ARAUQUITA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | |
| 81220 | ARAUCA | CRAVO NORTE | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | |
| 81300 | ARAUCA | FORTUL | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | \$ 6.869.642,00 | \$ 6.869.642,00 |
| 81591 | ARAUCA | PUERTO RONDÓN | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | |
| 81736 | ARAUCA | SARAVENA | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | | |
| 81794 | ARAUCA | TAME | NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | \$ 3.717.728,21 | \$ 3.717.728,21 |
| CASANARE | | | | TOTAL DEPARTAMENTO | |
| 85001 | CASANARE | YOPAL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85010 | CASANARE | AGUAZUL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85015 | CASANARE | CHÁMEZA | META Y LLANOS ORIENTALES | \$ 8.058.308,49 | \$ 8.058.308,49 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 85125 | CASANARE | HATO COROZAL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85136 | CASANARE | LA SALINA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85139 | CASANARE | MANÍ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85162 | CASANARE | MONTERREY | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85225 | CASANARE | NUNCHÍA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85230 | CASANARE | OROQUÉ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85250 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85263 | CASANARE | PORE | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85279 | CASANARE | RECETOR | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85300 | CASANARE | SABANALARGA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85315 | CASANARE | SÁCAMA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85325 | CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85400 | CASANARE | TÁMARA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85410 | CASANARE | TAURAMENA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85430 | CASANARE | TRINIDAD | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 85440 | CASANARE | VILLANUEVA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| PUTUMAYO | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 86001 | PUTUMAYO | MOCOA | PUTUMAYO | | |
| 86219 | PUTUMAYO | COLÓN | PUTUMAYO | | |
| 86320 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | \$ 7.616.856,24 | \$ 7.616.856,24 |
| 86568 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | PUTUMAYO | \$ 17.820.851,04 | \$ 17.820.851,04 |
| 86569 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PUTUMAYO | | |
| 86571 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | PUTUMAYO | | |
| 86573 | PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | PUTUMAYO | | |
| 86749 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | PUTUMAYO | | |
| 86755 | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO | PUTUMAYO | | |
| 86757 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | \$ 10.595.628,54 | \$ 10.595.628,54 |
| 86760 | PUTUMAYO | SANTIAGO | PUTUMAYO | | |
| 86865 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | PUTUMAYO | \$ 42.892.066,86 | \$ 42.892.066,86 |
| 86885 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN | PUTUMAYO | \$ 1.770.272,52 | \$ 1.770.272,52 |
| ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 88001 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | SAN ANDRÉS | BOLIVAR | | |
| 88564 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | PROVIDENCIA | BOLIVAR | | |
| AMAZONAS | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 91001 | AMAZONAS | LETICIA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91263 | AMAZONAS | EL ENCANTO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91405 | AMAZONAS | LA CHORRERA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91407 | AMAZONAS | LA PEDRERA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91430 | AMAZONAS | LA VICTORIA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91460 | AMAZONAS | MIRITÍ - PARANÁ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91530 | AMAZONAS | PUERTO ALEGRÍA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91536 | AMAZONAS | PUERTO ARICA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91540 | AMAZONAS | PUERTO NARIÑO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91669 | AMAZONAS | PUERTO SANTANDER | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 91798 | AMAZONAS | TARAPACÁ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| GUAINIA | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 94001 | GUAINIA | INÍRIDA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94343 | GUAINIA | BARRANCO MINAS | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94663 | GUAINIA | MAPIRIPANA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94883 | GUAINIA | SAN FELIPE | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94884 | GUAINIA | PUERTO COLOMBIA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94885 | GUAINIA | LA GUADALUPE | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94886 | GUAINIA | CACAHUAL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94887 | GUAINIA | PANA PANA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 94888 | GUAINIA | MORICHAL | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| GUAVIARE | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 95001 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | META Y LLANOS ORIENTALES | \$ 5.160.920,52 | \$ 5.160.920,52 |
| 95015 | GUAVIARE | CALAMAR | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 95025 | GUAVIARE | EL RETORNO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 95200 | GUAVIARE | MIRAFLORES | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| VAUPES | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 97001 | VAUPÉS | MITÚ | META Y LLANOS ORIENTALES | \$ 10.691.914,38 | \$ 10.691.914,38 |
| 97161 | VAUPÉS | CARURÚ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 97511 | VAUPÉS | PACOA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 97666 | VAUPÉS | TARAIRA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 97777 | VAUPÉS | PAPUNAU | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 97889 | VAUPÉS | YAVARATÉ | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| VICHADA | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| 99001 | VICHADA | PUERTO CARREÑO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 99524 | VICHADA | LA PRIMAVERA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 99624 | VICHADA | SANTA ROSALÍA | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| 99773 | VICHADA | CUMARIBO | META Y LLANOS ORIENTALES | | |
| POR REGIONALIZAR | | | TOTAL DEPARTAMENTO | | |
| TOTAL | | | | \$ 1.952.957.469,82 | \$ 1.952.957.469,82 |

| AGOSTO | | | | CDP | | | | JULIO | | | |
|--------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|-----------------|---------------------|-------|--|--|--|
| 22319 | TIQUETES | \$ 152.118.416,00 | \$ 152.118.416,00 | POR REGIONALIZAR | 22319 | TIQUETES | \$ 123.301.711,00 | | | | |
| 12019 | OPERADOR 1 | \$ 1.084.039.001,00 | \$ 1.084.039.001,00 | REGIONALIZADO | 12019 | OPERADOR 1 | \$ 673.968.260,00 | | | | |
| 22419 | OPERADOR 1 | \$ 1.502.045.548,00 | | LA DIFERENCIA A BOGOTA | 22419 | OPERADOR 1 | \$ 1.724.949.949,00 | | | | |
| 21019 | OPERADOR 2 | \$ 7.437.696.810,00 | \$ 1.760.951.292,00 | | 21019 | OPERADOR 2 | \$ 7.437.696.810,00 | | | | |
| 17619 | INDENNIZACIONES | \$ 1.809.786.055,00 | \$ 974.888.228,00 | REGIONALIZADO | 17619 | INDENNIZACIONES | \$ 1.283.417.955,00 | | | | |
| 2319 | OPS | \$ 3.806.375.075,00 | \$ 1.999.334.282,00 | REGIONALIZADO | 2319 | OPS | \$ 4.462.718.840,00 | | | | |
| 18419 | VIATICOS | \$ 474.258.204,00 | \$ 260.622.823,00 | REGIONALIZADO | 18419 | VIATICOS | \$ 230.204.578,00 | | | | |
| 12219 | ARL | \$ 139.153.666,03 | \$ 23.192.277,67 | REGIONALIZADO | 12219 | ARL | \$ 113.512.600,00 | | | | |
| 18319 | INDENNIZACIONES | \$ 494.385.252,00 | \$ 494.385.252,00 | REGIONALIZADO | 20319 | U.PRODUCTIVAS | \$ 2.862.635.602,47 | | | | |
| 25619 | REFUGIADOS | \$ 135.243.248,00 | | | 18319 | INDENNIZACIONES | \$ 494.385.252,00 | | | | |

ANEXO 31. Anexo 4 de quinto informe parcial de práctica


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---|------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|---|----------------------|----|-----------|------------------------------------|----|---|-----|----|-----------|----------|---|
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 312 | GOBIERNO LAS PAMAS - SAN JACINTO, BOLIVAR | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | REVISIÓN DE CAMIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE RESTITUCIÓN 2018 | 14/01/2019 | 2/10/2019 | SAN JACINTO | BOLIVAR | BOLIVAR | SAN JACINTO | Juan Manuel Daza Medina | No aplica | 1- INVERSIÓN REALIZADA PARA MEDICIÓN GEOMÉTRICA EN LOS PASES | Implementación | \$ | 3.418,43 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.418,43 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 312 | GOBIERNO LAS PAMAS - SAN JACINTO, BOLIVAR | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Revisión del plan de reparación preventiva del puente para el mantenimiento. Revisión de la media planilla de control para el mantenimiento y cierre de medio 471 a julio 2016 | 1/11/2019 | 1/11/2019 | SAN JACINTO | BOLIVAR | BOLIVAR | SAN JACINTO | Juan Manuel Daza Medina | No aplica | 2- INVERSIÓN REALIZADA PARA MEDICIÓN GEOMÉTRICA EN LOS PASES | Implementación | \$ | 2.008,14 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.008,14 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 317 | FERRONTEGAS | Organizaciones y Grupos | Organizaciones y Grupos | CONT. MP 1334 | Plan programático de inversión para el mantenimiento preventivo de la infraestructura de comunicación con los municipios de Boga, TTC y FERRONTEGAS para el periodo 2018-2020 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | BOGOTÁ | BOGOTÁ | Selvestre Romero | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 2.751,74 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.751,74 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 319 | LA COMUNIDAD DE CHAGUAYABANDERA DEL MUNICIPIO DE ANAPITAMA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Jarabá presentación expediente para la adquisición de vehículos de emergencia | 18/10/2019 | 18/10/2019 | EL CARMEN DE ATARJO | CHOCO | CHOCO | EL CARMEN DE ATARJO | Luis Carlos Loraño Acosta | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Implementación | \$ | 2.621,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.621,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 319 | LA COMUNIDAD DE CHAGUAYABANDERA DEL MUNICIPIO DE ANAPITAMA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito presentación de expediente para adquisición de vehículos de emergencia | 1/11/2019 | 1/11/2019 | EL CARMEN DE ATARJO | CHOCO | CHOCO | EL CARMEN DE ATARJO | Luis Carlos Loraño Acosta | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Implementación | \$ | 5.792,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 5.792,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 322 | CABECERA MUNICIPAL DE SAMARÁ | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo: 01 L13 con 01 SE | 31/12/2019 | 31/12/2019 | SAMARÁ | E.E. CAJETERO | CALDAS | SAMARÁ | Uely Yuliana Aguirre Escobar | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Implementación | \$ | 492,40 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 492,40 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 323 | SUDAN | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar la concertación para la implementación del servicio "Ruedas humanas" y así contribuir a la inclusión de personas con discapacidad "Ruedas humanas" Participación en mesa técnica con representantes de entidades que participarán con el fin de realizar conjuntamente la implementación de acciones | 16/10/2019 | 16/10/2019 | TUQUISO | BOLIVAR | BOLIVAR | TUQUISO | Grey Masa | No aplica | 1- INVERSIÓN REALIZADA PARA MEDICIÓN GEOMÉTRICA EN LOS PASES | Implementación | \$ | 2.827,09 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.827,09 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 323 | SUDAN | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar la implementación del servicio "Ruedas humanas" y así contribuir a la inclusión de personas con discapacidad "Ruedas humanas" | 8/11/2019 | 8/11/2019 | TUQUISO | BOLIVAR | BOLIVAR | TUQUISO | Grey Masa | No aplica | 2- INVERSIÓN REALIZADA PARA MEDICIÓN GEOMÉTRICA EN LOS PASES | Implementación | \$ | 6.092,00 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 6.092,00 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: INVADO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 324 | SAN JOSE DE FINCH | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Contribución a la implementación del Sistema de Reparación Colectiva en caso de FURTO, INCENDIO Y/O VANDALISMO en los sectores de saneamiento de agua suministrados por el SAC | 7/03/2019 | 9/03/2019 | MARÍA LA BARRA | BOLIVAR | BOLIVAR | MARÍA LA BARRA | Dayra del Carmen Rivera Barrios | No aplica | 1- INVERSIÓN REALIZADA PARA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Implementación | \$ | 14.614,72 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 14.614,72 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 325 | JOHN PAVAL DE OJALA YERVA VIEJA, MENSUAL, LOS OJOS, BARRANCO, MUJIBÁ Y OJOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Y LA PLATA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica | 14/09/2019 | 14/09/2019 | OJESAL | SUCRE | SUCRE | OJESAL | Paula Esther Vilabona Benda | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Implementación | \$ | 4.338,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 4.338,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 326 | RIO DEL MONTE, SAN RAFAEL Y LA PLATA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica | 5/11/2019 | 8/11/2019 | OJESAL | SUCRE | SUCRE | OJESAL | Paula Esther Vilabona Benda | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 4.337,13 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 4.337,13 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 373 | CHENGUE | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Plan de Servicio al Cliente - Charge-Down | 31/03/2019 | 31/03/2019 | OJESAL | SUCRE | SUCRE | OJESAL | José Carlos Peña Donado | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 1.248,13 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.248,13 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 376 | COMUNIDAD DEL BARRIO BELAVISTA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar el mantenimiento preventivo de líneas y formación del SAC por SISC para el mantenimiento | 28/10/2019 | 28/10/2019 | BALBOA | CAUCA | CAUCA | BALBOA | Yuryly Graciela Gomez | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 5.330,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 5.330,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 376 | COMUNIDAD DEL BARRIO BELAVISTA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar el mantenimiento preventivo de líneas y formación del SAC por SISC para el mantenimiento | 24/11/2019 | 24/11/2019 | BALBOA | CAUCA | CAUCA | BALBOA | Yuryly Graciela Gomez | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 7.086,00 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 7.086,00 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 380 | UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO | Organizaciones y Grupos | Organizaciones y Grupos | CONT. MP 1334 | Requisito de revisión del documento de adquisición del SAC en el momento de entrega del SAC | 7/11/2019 | 8/11/2019 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Catherine Moreno | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 9.054,00 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 9.054,00 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: INVADO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 381 | COMUNIDAD DE PUERTO TOMÉS | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Formulación SAC | 18/10/2019 | 18/10/2019 | BELEN DE LOS ANDAGUELES | CAQUETA Y HUILA | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAGUELES | Edith Oca Cervigón | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 2.360,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.360,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 381 | COMUNIDAD DE PUERTO TOMÉS | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Formulación SAC | 8/11/2019 | 8/11/2019 | BELEN DE LOS ANDAGUELES | CAQUETA Y HUILA | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAGUELES | Edith Oca Cervigón | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 5.022,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 5.022,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 382 | COMUNIDAD DE PUERTO TOMÉS | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Formulación SAC | 24/08/2019 | 24/08/2019 | BELEN DE LOS ANDAGUELES | CAQUETA Y HUILA | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAGUELES | Edith Oca Cervigón | No aplica | 3- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 1.094,12 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.094,12 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 382 | COMUNIDAD DE PUERTO TOMÉS | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Formulación SAC | 31/12/2019 | 31/12/2019 | BELEN DE LOS ANDAGUELES | CAQUETA Y HUILA | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAGUELES | Edith Oca Cervigón | No aplica | 4- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 6.287,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 6.287,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 386 | COMUNIDAD DE MEROO | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de diagnóstico del SAC | 8/10/2019 | 9/10/2019 | NOROSI | MAGDALENA MEDIO | BOLIVAR | NOROSI | Dayra Carolina Restrepo Mendez | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 16.028,00 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 16.028,00 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 427 | COMUNIDAD DEL CORRALGORDO DE VALDERRAMA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar primera jornada de atención al usuario | 14/10/2019 | 17/10/2019 | SAN SEBASTIÁN | CAUCA | CAUCA | SAN SEBASTIÁN | Yuryly Graciela Gomez | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 11.028,80 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 11.028,80 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 427 | COMUNIDAD DEL CORRALGORDO DE VALDERRAMA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar primera jornada de atención al usuario | 20/11/2019 | 21/11/2019 | SAN SEBASTIÁN | CAUCA | CAUCA | SAN SEBASTIÁN | Yuryly Graciela Gomez | No aplica | 3- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 13.849,50 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 13.849,50 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 438 | COMUNIDAD DEL MANEJO DE ALMAGUER | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar primera jornada de diagnóstico del SAC en el momento de entrega del SAC | 8/10/2019 | 9/10/2019 | ALMAGUER | CAUCA | CAUCA | ALMAGUER | Yuryly Graciela Gomez | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 16.281,80 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 16.281,80 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 438 | COMUNIDAD DEL MANEJO DE ALMAGUER | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Realizar primera jornada de diagnóstico del SAC en el momento de entrega del SAC | 6/11/2019 | 7/11/2019 | ALMAGUER | CAUCA | CAUCA | ALMAGUER | Yuryly Graciela Gomez | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 15.882,47 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 15.882,47 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 467 | COMUNIDAD CORRALGORDO SAN JUAN Y LOS 22 VEREDAS | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Centro de Atención al Usuario - Computarización y estructuración del SAC | 14/10/2019 | 14/10/2019 | PEÑASULANA | E.E. CAJETERO | CALDAS | PEÑASULANA | Uely Yuliana Aguirre Escobar | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 3.475,00 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.475,00 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 471 | CABECERA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica | 16/03/2019 | 15/03/2019 | MORALES | CAUCA | CAUCA | MORALES | Alejandra Torres Gallego | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 3.997,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.997,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 471 | CABECERA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica | 29/10/2019 | 29/10/2019 | MORALES | CAUCA | CAUCA | MORALES | Alejandra Torres Gallego | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 1.898,07 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.898,07 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 528 | CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LIBA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica | 10/10/2019 | 11/10/2019 | SAN MARTÍN DE LIBA | BOLIVAR | BOLIVAR | SAN MARTÍN DE LIBA | Meléndre Herrera Estrona | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 7.078,00 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 7.078,00 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 532 | GOBIERNO DEL PASTO | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Primera y segunda jornada de diagnóstico del SAC | 29/10/2019 | 30/10/2019 | CALDITO | CAUCA | CAUCA | CALDITO | David Aguirre Acosta | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 3.387,80 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.387,80 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 566 | CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS MANEJO DE OJOS | Organizaciones y Grupos | Organizaciones y Grupos | CONT. MP 1334 | Revisión técnica de sistema para el servicio de atención al usuario | 1/11/2019 | 1/11/2019 | BARRANCABEEMBA | MAGDALENA MEDIO | SANTANDER | BARRANCABEEMBA | Vera del Carmen Retamoso Cobles | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 1.919,34 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.919,34 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 570 | LA FERRONTEGA MUNICIPIO DE CAMBÓ | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Primera jornada de Atención al Usuario | 15/01/2019 | 15/01/2019 | CAMBÓ | CAUCA | CAUCA | CAMBÓ | David Aguirre Acosta | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 8.651,80 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 8.651,80 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 570 | LA FERRONTEGA MUNICIPIO DE CAMBÓ | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Primera y segunda jornada de diagnóstico del SAC | 17/10/2019 | 18/10/2019 | CAMBÓ | CAUCA | CAUCA | CAMBÓ | David Aguirre Acosta | No aplica | 3- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 5.702,40 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 5.702,40 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 570 | LA FERRONTEGA MUNICIPIO DE CAMBÓ | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Desarrollo del plan "Ser rápido, ser preciso y ser eficiente" para el servicio de atención al usuario | 10/10/2019 | 10/10/2019 | CAMBÓ | CAUCA | CAUCA | CAMBÓ | Uely Yuliana Aguirre Escobar | No aplica | 4- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 1.998,07 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.998,07 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 577 | CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica | 18/10/2019 | 18/10/2019 | TOTORÓ | CAUCA | CAUCA | TOTORÓ | Alejandra Torres Gallego | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 1.461,30 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.461,30 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 577 | CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Requisito de adquisición de vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica | 12/10/2019 | 11/10/2019 | TOTORÓ | CAUCA | CAUCA | TOTORÓ | Alejandra Torres Gallego | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 1.998,07 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.998,07 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 578 | GOBIERNO DEL ESTADO UNIDO Y LA VERDEZ | No Estruct | No Estruct | CONT. MP 1334 | Presentación de la unidad, la forma y los canales de atención al usuario | 4/10/2019 | 4/10/2019 | BECCEREL | CEPES Y GUABARÁ | CEPES | BECCEREL | María Claudia Silva Paredes | No aplica | 2- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Absortamiento | \$ | 3.490,20 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.490,20 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| 24/11/2019 | Varilla Vasquez Leñita | 579 | ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORES E INGENIEROS EMPRESARIALES DE IBARRA | Organizaciones y Grupos | Organizaciones y Grupos | CONT. MP 1334 | Primera jornada de diagnóstico del SAC | 6/11/2019 | 6/11/2019 | APATACADO | URUBÁ | ANTIOQUIA | APATACADO | Gloria Yelena Vianque Arango | No aplica | 1- INVERSIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS DE RENOVACIÓN COLECTIVA POR FASES Generar para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ | 51.523,97 | SOBRECOSTO DE RENOVACIÓN COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 51.523,97 | DIRRECTA | MP EVENTO 2018: COORDONO OPERACIÓN LOGÍSTICA. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fecha | Nombre Unidad | Nº | Título | Organización u Grupo | Organización u Grupo | Código | Fecha Emisión | Fecha Vigencia | Procedimiento | Estado | Responsable | Entidad | Actividad | Impacto | Valor | Beneficiarios | Observaciones | Valor | Observaciones | Valor | Observaciones | Valor | Observaciones | Valor | Observaciones | Valor | Observaciones |
|------------|----------------------|----|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|--|--|
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 21 | MANANA PARA Vivir | Organización u Grupo | Organización u Grupo | CONT. Nº 1134 | 28/02/2018 | 26/02/2019 | SENA JUN MOPALMAYO | BOLIVAR | BOLIVAR | SAN JUAN MOPALMAYO | Angelo Emparano Caballero | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 4.899.000 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 4.899.000 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3098 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 22 | CAMARSA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 4/05/2018 | 4/05/2019 | CAMARSA | METAY LINDAS ORDENALES | COPACABANA | CHAMANZA | Graciela Saco Maldonado | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 700.400 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 700.400 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3468 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 24 | COMUNIDAD DE CONVIVENCIA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 1/07/2019 | 1/07/2019 | SAN ONDRE | COLODO | SUCRE | SUCRE | SAN ONDRE | Jose Carlos Perez | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.062.225 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.062.225 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3228 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 25 | COMORGANIZACION DE CONVIVENCIA, CIBER, COMUN Y VEREDA ABIERTA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 18/06/2018 | 18/06/2019 | COLODO | SUCRE | SUCRE | COLODO | Jose Carlos Perez | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.089.230 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.089.230 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3816 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 26 | COMORGANIZACION DE CONVIVENCIA, CIBER, COMUN Y VEREDA ABIERTA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 14/07/2018 | 14/07/2019 | COLODO | SUCRE | SUCRE | COLODO | Jose Carlos Perez | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.062.225 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.062.225 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 4216 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 25 | COMORGANIZACION DE CONVIVENCIA, CIBER, COMUN Y VEREDA ABIERTA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | COLODO | SUCRE | SUCRE | COLODO | Jose Carlos Perez | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.062.225 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.062.225 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3487 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 30 | AGUSTIN CODAZO COMORGANIZACION CASACARANA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | AGUSTIN CODAZO | CEMA Y GUABARA | CEMA | AGUSTIN CODAZO | Maria Chudela Urua | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 9.122.320 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 9.122.320 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3214 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 33 | AGUSTIN CODAZO COMORGANIZACION CASACARANA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | AGUSTIN CODAZO | CEMA Y GUABARA | CEMA | AGUSTIN CODAZO | Maria Chudela Urua | Comparte de No Reportación | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 4.079.230 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 4.079.230 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3241 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 34 | AGUSTIN CODAZO COMORGANIZACION CASACARANA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 17/06/2018 | 17/06/2018 | AGUSTIN CODAZO | CEMA Y GUABARA | CEMA | AGUSTIN CODAZO | Maria Chudela Urua | Comparte de No Reportación | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.476.358 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.476.358 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3706 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 36 | REGISSUARDO CIUDADES TONTO. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 9/10/2019 | 12/05/2019 | ACANDI | URUBA | CHICO | ACANDI | Freder Peraldo | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 12.092.420 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 12.092.420 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 2226 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 36 | REGISSUARDO CIUDADES TONTO. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 07/12/2019 | 07/12/2019 | ACANDI | URUBA | CHICO | ACANDI | Freder Peraldo | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 15.048.600 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 15.048.600 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 2710 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 37 | REGISSUARDO CIUDADES TONTO. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 08/03/2019 | 02/03/2019 | ACANDI | URUBA | CHICO | ACANDI | Freder Peraldo | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 14.791.570 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 14.791.570 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 2328 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 37 | REGISSUARDO CIUDADES TONTO. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 07/12/2019 | 07/12/2019 | ACANDI | URUBA | CHICO | ACANDI | Freder Peraldo | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 4.490.760 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 4.490.760 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 2735 BARRIO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 38 | PUERTO CUYA TONTO (REGISSUARDO ARENAS) | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 21/06/2019 | 27/06/2019 | UNGUIA | URUBA | CHICO | UNGUIA | Ricardo del Flor | No aplica | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Diagnóstico y Formulación | \$ 4.284.380 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 4.284.380 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 2654 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 39 | REGISSUARDO CIUDADES TONTO. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | UNGUIA | URUBA | CHICO | UNGUIA | Paola Andrea Valencia | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 3.269.350 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 3.269.350 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3086 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 39 | REGISSUARDO CIUDADES TONTO. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | UNGUIA | URUBA | CHICO | UNGUIA | Nadhia Luisa Mesa | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.357.830 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.357.830 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3611 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 40 | REGISSUARDO YANALA. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | UNGUIA | URUBA | CHICO | UNGUIA | Paola Andrea Valencia | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 4.235.470 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 4.235.470 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3875 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 40 | REGISSUARDO YANALA. EMBAZAR KATIOS | Etica | Etica | CONT. Nº 1134 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | UNGUIA | URUBA | CHICO | UNGUIA | Nadhia Luisa Mesa | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.050.730 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.050.730 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 2554 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 41 | LA COMUNIDAD DE CONVIVENCIA Y VEREDA ABIERTA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | BARANACOMEZUELA | MAGDALENA | SANTANDER | BARANACOMEZUELA | Diana Carolina Ruiz Diaz | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 3.039.420 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 3.039.420 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3625 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 42 | HÉRCLES, MÓNTE Y MÓDULO CENTRAL DEL LOGAR CIUDADES DE MONTERRÍ | Organización u Grupo | Organización u Grupo | CONT. Nº 1134 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | SMIT | MAGDALENA | BOLIVAR | SMIT | Vía del Cerro de Mataruca | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 4.385.490 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 4.385.490 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3285 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 44 | SEGUNDA CONVIVENCIA EN LA VEREDA POPULAR CAMPESINA DEL ALTO ORDADO. COORDINACION DE CONVIVENCIA Y COMUNICACION. VEREDA YANALA QUARITE | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 0/06/2018 | 4/06/2018 | BACALO | CHOCO | CHOCO | MACAGO | Lucy Carolina Sosa | No aplica | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ 11.495.440 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 11.495.440 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3476 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 51 | LA COMUNIDAD DE BARRO CERRO NORTE | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | COCUITA | NORTE DE SANTANDER Y SUCRE | NORTE DE SANTANDER | COCUITA | Alexis Vargas Sarmiento | Satisfacción | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Implementación | \$ 13.776.420 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 13.776.420 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3801 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 54 | LA COMUNIDAD DEL COMORGANIZADO DE PUEBLO NUEVO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 14/07/2019 | 13/07/2019 | COLEÑA | NORTE DE SANTANDER Y SUCRE | NORTE DE SANTANDER | COLEÑA | Alexis Vargas Sarmiento | No aplica | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Diagnóstico y Formulación | \$ 3.231.260 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 3.231.260 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3335 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 56 | COMORGANIZADO DE MACHO BURJANA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | BUENAVENTURA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | BUENAVENTURA | Alex Saldarriaga | No aplica | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Diagnóstico del Dato | \$ 2.965.350 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 2.965.350 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3338 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 56 | COMORGANIZADO DE MACHO BURJANA | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 20/07/2019 | 20/07/2019 | VALLE DEL GUAMUZO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUZO | Maria Alejandra Cedeño | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 2.965.350 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 2.965.350 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 4336 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 63 | COMORGANIZADO DE LA PARROQUIA DEL CORDON LA PAZ DE LA VEREDA SAN GONDO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 6/06/2018 | 7/06/2018 | SAN ALBERTO | MAGDALENA | MEDELLA | SAN ALBERTO | Diana Carolina Ruiz Diaz | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.508.410 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.508.410 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 4116 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 63 | COMORGANIZADO DE LA PARROQUIA DEL CORDON LA PAZ DE LA VEREDA SAN GONDO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 24/06/2018 | 27/06/2018 | SAN ALBERTO | MAGDALENA | MEDELLA | CEMA | SAN ALBERTO | Diana Carolina Ruiz Diaz | Satisfacción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 5.094.440 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 5.094.440 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3564 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 64 | COMORGANIZADO DE LA PARROQUIA DEL CORDON LA PAZ DE LA VEREDA SAN GONDO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | SMIT | MAGDALENA | BOLIVAR | SMIT | Vía del Cerro de Mataruca | No aplica | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Diagnóstico y Formulación | \$ 3.723.040 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 3.723.040 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3618 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 64 | COMORGANIZADO DE LA PARROQUIA DEL CORDON LA PAZ DE LA VEREDA SAN GONDO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | SMIT | MAGDALENA | BOLIVAR | SMIT | Vía del Cerro de Mataruca | No aplica | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Diagnóstico y Formulación | \$ 10.247.420 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 10.247.420 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3618 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 64 | COMORGANIZADO DE LA PARROQUIA DEL CORDON LA PAZ DE LA VEREDA SAN GONDO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 18/09/2018 | 20/09/2018 | SMIT | MAGDALENA | BOLIVAR | SMIT | Vía del Cerro de Mataruca | No aplica | 1. INVERSION PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA FASECGETER para operación del programa | Diagnóstico y Formulación | \$ 8.062.310 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 8.062.310 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 4471 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 66 | COMORGANIZADO DE LA PARROQUIA DEL CORDON LA PAZ DE LA VEREDA SAN GONDO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 14/09/2019 | 14/09/2019 | CHIVOLO | MAGDALENA | MAGDALENA | CHIVOLO | Mariela Margarita Mejía | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 899.400 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 899.400 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3786 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 67 | VEREDA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PLATO | MAGDALENA | MAGDALENA | PLATO | Mery María Angulo | Restricción | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 855.960 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 855.960 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3881 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 67 | VEREDA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CHIVOLO | MAGDALENA | MAGDALENA | CHIVOLO | Mariela Margarita Mejía | No aplica | 1. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 2. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 3. INVERSION REALIZADA PARA MEJORAR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | Implementación | \$ 1.570.210 | SUBSECCION DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | - | N/A | \$ | 1.570.210 | DIRRECTA | Nº EVENTO: 3985 LOTAFADO OPERACION LOGISTICA | |
| 2012/02/01 | Famda Vespuzo Unidad | 68 | VEREDA BELLO FRETO (CHIVOLO) | No Estado | No Estado | CONT. Nº 1134 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----|---|-----------|-----------|---------------|---|------------|------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------------|----|------------|--------------------------------------|----|---|-----|----|------------|---------|---|
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 86 | REGISMANDO OMBRA LA OMA CEPABANA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | Asamblea informativa con autoridades del Regimiento Etnico para explicar sobre el proceso del programa de RCT y preparar para el desarrollo de la obra. El RCT se encuentra en fase de desarrollo del obra | 20/08/2019 | 20/08/2019 | METRAYO | EE CAFETERO | ESGADADA | METRAYO | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 3.434.312 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.434.312 | DIRECTA | N° EVENTO: 1365 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 87 | REGISMANDO OMBRA OPERADO | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | Asamblea informativa con autoridades del Regimiento Etnico para explicar sobre el proceso del programa de RCT y preparar para el desarrollo de la obra. El RCT se encuentra en fase de desarrollo del obra | 18/08/2019 | 18/08/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 2.634.120 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.634.120 | DIRECTA | N° EVENTO: 1365 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 87 | REGISMANDO OMBRA OPERADO | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | Implementación tecnológica e implementación de sistemas de gestión en obra y Atención a las necesidades de los beneficiarios | 21/03/2019 | 13/01/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 1.465.650 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.465.650 | DIRECTA | N° EVENTO: 2145 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 87 | REGISMANDO OMBRA OPERADO | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | IMPLEMENTACION DE OMBRA, MANIPULACION TECNOLÓGICA DE OBRA DE TIEMPO, PARA LA OMBRA Y MANIPULACION TECNOLÓGICA DE OBRA DE TIEMPO, PARA LA OMBRA Y MANIPULACION TECNOLÓGICA A LOS BENEFICIARIOS | 14/12/2019 | 15/11/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 722.830 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 722.830 | DIRECTA | N° EVENTO: 2735 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 87 | REGISMANDO OMBRA OPERADO | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | Asamblea informativa con autoridades del Regimiento Etnico para explicar sobre el proceso del programa de RCT y preparar para el desarrollo de la obra. El RCT se encuentra en fase de desarrollo del obra | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 3.389.420 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.389.420 | DIRECTA | N° EVENTO: 2735 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 87 | REGISMANDO OMBRA OPERADO | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | IMPLEMENTACION DE OMBRA, MANIPULACION TECNOLÓGICA DE OBRA DE TIEMPO, PARA LA OMBRA Y MANIPULACION TECNOLÓGICA A LOS BENEFICIARIOS | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 1.465.100 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.465.100 | DIRECTA | N° EVENTO: 2735 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 88 | REGISMANDO QTO DOMAU | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | Asamblea informativa con autoridades del Regimiento Etnico para explicar sobre el proceso del programa de RCT y preparar para el desarrollo de la obra. El RCT se encuentra en fase de desarrollo del obra | 03/09/2019 | 03/09/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 2.776.700 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.776.700 | DIRECTA | N° EVENTO: 1365 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 88 | REGISMANDO QTO DOMAU | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | Asamblea informativa con autoridades del Regimiento Etnico para explicar sobre el proceso del programa de RCT y preparar para el desarrollo de la obra. El RCT se encuentra en fase de desarrollo del obra | 18/08/2019 | 18/08/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 3.434.312 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.434.312 | DIRECTA | N° EVENTO: 1365 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 88 | REGISMANDO QTO DOMAU | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | IMPLEMENTACION DE OMBRA, MANIPULACION TECNOLÓGICA DE OBRA DE TIEMPO, PARA LA OMBRA Y MANIPULACION TECNOLÓGICA A LOS BENEFICIARIOS | 07/12/2019 | 07/12/2019 | PUEBLO RED | EE CAFETERO | ESGADADA | PUEBLO RED | Ivan Darío Velasco | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 1.465.650 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.465.650 | DIRECTA | N° EVENTO: 2735 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 93 | RELEVETA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Relevación y verificación de acciones en la ciudad. Implementación de la gestión de calidad. | 18/08/2019 | 18/08/2019 | ALGAROBÓ | MANGAERA | MANGAERA | ALGAROBÓ | Marlene Margareta Mojica | Satisfacción | 1-INVERSION REALIZADA PARA MODIFICACION EN OBRA DE MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Implementación | \$ | 1.177.800 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.177.800 | DIRECTA | N° EVENTO: 1957 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 97 | REGISMANDO CALLE SANTA ROSA COMANDOS LAS FORAS, LA SERA, CENTRO CALLE SANTA ROSA, VEREDAS, SAPODORA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 14/07/2019 | 20/07/2019 | TAMBOJÍ | CAUCA | CAUCA | TAMBOJÍ | Marjory Paredes | No aplica | 1-INVERSION REALIZADA PARA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 5.320.283 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 5.320.283 | DIRECTA | N° EVENTO: 682 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 97 | REGISMANDO CALLE SANTA ROSA COMANDOS LAS FORAS, LA SERA, CENTRO CALLE SANTA ROSA, VEREDAS, SAPODORA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | VALIDACION DEL DOCUMENTO DE CONSTRUCCION DEL OBRA | 28/08/2019 | 17/02/2019 | TAMBOJÍ | CAUCA | CAUCA | TAMBOJÍ | Marjory Paredes | No aplica | 2-INVERSION REALIZADA PARA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Construcción del Dato | \$ | 6.944.105 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 6.944.105 | DIRECTA | N° EVENTO: 1957 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 97 | REGISMANDO CALLE SANTA ROSA COMANDOS LAS FORAS, LA SERA, CENTRO CALLE SANTA ROSA, VEREDAS, SAPODORA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | FORMULACION DEL PROYECTO | 15/12/2019 | 18/05/2019 | TAMBOJÍ | CAUCA | CAUCA | TAMBOJÍ | Marjory Paredes Ruiz | No aplica | 2-INVERSION REALIZADA PARA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 6.234.102 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 6.234.102 | DIRECTA | N° EVENTO: 2845 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 99 | REGISMANDO SAN ANTONIO DE POMBANA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | FASE DE ASESORAMIENTO TECNICO DEL REGIMINO SAN ANTONIO DE POMBANA | 07/08/2019 | 11/08/2019 | NDA | CAUCA | CAUCA | NDA | Daniel Antonio Navarro | No aplica | 2-INVERSION REALIZADA PARA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Asesoramiento | \$ | 2.806.950 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.806.950 | DIRECTA | N° EVENTO: 99 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 100 | CONSEJO COMUNITARIO DE CALCA COMUNIDAD SAN MIGUEL | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | ELABORACION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL BUSTA COLECTIVO PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, BUENOS AIRES CAUCA | 28/08/2019 | 28/08/2019 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAUCA | BUENOS AIRES | Gina Dora Diaz | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 547.000 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 547.000 | DIRECTA | N° EVENTO: 873 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 100 | CONSEJO COMUNITARIO NO CALCA COMUNIDAD SAN MIGUEL | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | ELABORACION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL BUSTA COLECTIVO PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, BUENOS AIRES CAUCA | 21/08/2019 | 21/08/2019 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAUCA | BUENOS AIRES | Gina Dora Diaz | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 1.095.403 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.095.403 | DIRECTA | N° EVENTO: 528 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 100 | CONSEJO COMUNITARIO NO CALCA COMUNIDAD SAN MIGUEL | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | ASAMBLA PARA PRODUCCION DEL PLAN DE MANIPULACION DE BUSTA COLECTIVA PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, BUENOS AIRES CAUCA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAUCA | BUENOS AIRES | Gina Dora Diaz | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 3.260.425 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.260.425 | DIRECTA | N° EVENTO: 2185 PARRANDA OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 101 | CONSEJO COMUNITARIO NO CALCA COMUNIDAD LOMINGA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | ELABORACION DE TRABAJO PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANIPULACION DE BUSTA COLECTIVA PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, BUENOS AIRES CAUCA | 07/08/2019 | 07/08/2019 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Gina Dora Diaz | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 547.000 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 547.000 | DIRECTA | N° EVENTO: 873 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 101 | CONSEJO COMUNITARIO NO CALCA COMUNIDAD LOMINGA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | ELABORACION DE TRABAJO PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANIPULACION DE BUSTA COLECTIVA PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, BUENOS AIRES CAUCA | 17/08/2019 | 17/08/2019 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Gina Dora Diaz | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 547.000 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 547.000 | DIRECTA | N° EVENTO: 925 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 101 | CONSEJO COMUNITARIO NO CALCA COMUNIDAD LOMINGA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | ELABORACION DE TRABAJO PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANIPULACION DE BUSTA COLECTIVA PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, BUENOS AIRES CAUCA | 14/08/2019 | 14/08/2019 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Gina Dora Diaz | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 547.000 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 547.000 | DIRECTA | N° EVENTO: 528 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 102 | CONSEJO COMUNITARIO NO CALCA COMUNIDAD LOMINGA | Etnica | Etnica | CONT. N° 1134 | ASAMBLA PARA PRODUCCION DEL PLAN DE MANIPULACION DE BUSTA COLECTIVA PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUEL, BUENOS AIRES CAUCA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Gina Dora Diaz | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 3.260.425 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 3.260.425 | DIRECTA | N° EVENTO: 2185 PARRANDA OPERACION LOGISTICA |
| 20/12/2019 | Vanda Vespas Landita | 104 | CENTRO POMBANA LA BAUTA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 11/07/2019 | 10/07/2019 | OMBEIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | OMBEIA | Juan Carlos Angar | Satisfacción | 1-INVERSION REALIZADA PARA MODIFICACION EN OBRA DE MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Implementación | \$ | 2.269.370 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.269.370 | DIRECTA | N° EVENTO: 647 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/12/2019 | Vanda Vespas Landita | 105 | COMSERVIDORIO EL AJO | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 18/07/2019 | 18/07/2019 | ITANSO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ITANSO | Juan Carlos Angar | No aplica | 2-INVERSION REALIZADA PARA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 2.138.403 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.138.403 | DIRECTA | N° EVENTO: 645 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/12/2019 | Vanda Vespas Landita | 106 | COMSERVIDORIO LA GERANA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 21/07/2019 | 21/07/2019 | ITANSO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ITANSO | Natalia Andrea Vargas | No aplica | 2-INVERSION REALIZADA PARA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Diseño y Formulación | \$ | 2.138.403 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.138.403 | DIRECTA | N° EVENTO: 647 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 107 | COMSERVIDORIO DE PUERTO VIDUA Y LAS VEREDAS DE EL CUCUPE, LA VEREDA LA VEREDA AGUACATE, EL FRAL, GUANAFIA, EL BOGOTE, ALMORRETES, FERRERA, VEREDA, QUESADA NEGRA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 22/08/2019 | 22/08/2019 | NARIÑO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | NARIÑO | María Bernabé Hidalgo | Satisfacción | 1-INVERSION REALIZADA PARA MODIFICACION EN OBRA DE MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Implementación | \$ | 2.294.000 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 2.294.000 | DIRECTA | N° EVENTO: 131 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 107 | COMSERVIDORIO DE PUERTO VIDUA Y LAS VEREDAS DE EL CUCUPE, LA VEREDA LA VEREDA AGUACATE, EL FRAL, GUANAFIA, EL BOGOTE, ALMORRETES, FERRERA, VEREDA, QUESADA NEGRA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 20/08/2019 | 20/08/2019 | NARIÑO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | NARIÑO | María Bernabé Hidalgo | Satisfacción | 1-INVERSION REALIZADA PARA MODIFICACION EN OBRA DE MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Implementación | \$ | 11.997.403 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 11.997.403 | DIRECTA | N° EVENTO: 2010 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 109 | CENTRO POMBANA BUENO AIRE, VEREDA LA VEREDA, YELLA NEGRAS, LA VEREDA EL TORREON, MANOSQUE, LAS MANOSQUE Y EL CUCUPE, CENTRO EL FRAL, VEREDA SAN ANTONIO, LOS PARES Y SAN MIGUEL | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 18/08/2019 | 18/08/2019 | SAN LUIS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SAN LUIS | Gloria Andrea Caldas | Satisfacción | 1-INVERSION REALIZADA PARA MODIFICACION EN OBRA DE MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Implementación | \$ | 5.673.100 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 5.673.100 | DIRECTA | N° EVENTO: 1975 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 111 | FRAJALÍ | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 6/06/2019 | 13/06/2019 | SEGOVIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SEGOVIA | Marta Clara Espinosa Botero | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 4.710.303 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 4.710.303 | DIRECTA | N° EVENTO: 2820 COTIDIANO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 111 | FRAJALÍ | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 13/08/2019 | 13/08/2019 | SEGOVIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SEGOVIA | Dago Anselmo Sanchez | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 1.103.888 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.103.888 | DIRECTA | N° EVENTO: 1325 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 113 | COMSERVIDORIO EJALÍ | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 20/07/2019 | 20/07/2019 | VERMILAN | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | VERMILAN | Natalia Andrea Vargas | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 1.138.418 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.138.418 | DIRECTA | N° EVENTO: 688 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 114 | VEREDA LA BOMACUAGA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 21/07/2019 | 21/07/2019 | ALLANDEA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ALLANDEA | Dago Anselmo | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 718.600 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 718.600 | DIRECTA | N° EVENTO: 776 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 115 | COMSERVIDORIO ATAMARA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 20/07/2019 | 20/07/2019 | BETULIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | BETULIA | Dago Anselmo Sanchez | No aplica | 2- INGRESOS PARA LA MANIPULACION DE BUSTA DE RENOVACION COLECTIVA POR FASEGestión para operación del programa | Dispositivo del Dato | \$ | 1.405.240 | SUBREGISTRON DE RENOVACION COLECTIVA | \$ | - | N/A | \$ | 1.405.240 | DIRECTA | N° EVENTO: 479 EJECUTIVO OPERACION LOGISTICA |
| 20/11/2019 | Vanda Vespas Landita | 115 | COMSERVIDORIO ATAMARA | No Etnica | No Etnica | CONT. N° 1134 | Ases de documento de trabajo para el estudio de factibilidad y construcción de obra de saneamiento básico. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO 32. Informe final de práctica laboral en la Unidad para las
Victimas


INFORME FINAL DE PRÁCTICA LABORAL EN LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

| | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|--|
| VINCULACIÓN FORMATIVA: | | RESOLUCIÓN NÚMERO 02183 DEL 24 DE JULIO DE 2019 | | | |
| NOMBRE DEL PRACTICANTE: | | Jairo Alonso Segura Pulido | | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | | 1023917216 | CORREO ELECTRÓNICO: jairosegura61@gmail.com | | |
| DIRECCIÓN: | | CLL 48 J sur N.º 5 H 16 | TELÉFONO: 312 4703781 | | |
| NOMBRE DEL TUTOR: | | Juanita Ibañez Santamaría | CORREO ELECTRÓNICO: juanita.ibanez@unidadvictimas.gov.co | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | | Alexandra Morales | CORREO ELECTRÓNICO: coordinador.ingenieria.civil@uan.edu.co | | |
| OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: Prestar sus servicios a la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para desarrollar actividades encaminadas al avance y gestión de la información de la ruta de reparación colectiva de la entidad. | | | | | |
| DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: | | Cinco (5) meses | | | |
| Fecha de Inicio: | | 01/08/2019 | Fecha terminación inicial: 31/12/2019 | | |
| INTERRUPCIÓN: NO APLICA | | | | | |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA: NO APLICA | | | | | |
| CONCEPTO DE TUTORA Y SUPERVISORA | | | | | |
| La tutora y la supervisora de práctica hacen constar que el practicante CUMPLIO (X) INCUMPLIO (___) con el objeto de la práctica y demás obligaciones de la vinculación formativa, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100 % | | | | | |
| CONSTANCIA DE ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS POR PARTE DEL PRACTICANTE: | | | | | |
| Tenía Bienes a cargo | | Devolución | | Verificación | |
| SI | | SI | N. A. | Tutor | Firma:  |
| NO | X | NO | N. A. | | |

OBSERVACIONES

NO APLICA

FIRMA RESPONSABLES



JUANITA IBÁÑEZ SANTAMARÍA
TUTOR DE PRÁCTICA
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



ALEXANDRA MORALES
SUPERVISOR DE PRÁCTICA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA: 31 de Diciembre de 2019
